BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
DBE MPY
17 rue Marius Tercé
Star Park - Bâtiment B
31300 TOULOUSE

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 29424807/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 05/12/2025

Référence au programme de travaux :
réalisé le 20/11/2025 par BV

DONNEUR D'ORDRE

MAISON ARRET ALBI
4 RUE ANDRE IMBERT
81000 ALBI

SITE D'INTERVENTION

MAISON ARRET ALBI

4 RUE ANDRE IMBERT
81000 ALBI

RAAT BAT A RIA - INCENDIE

Latitude : 43.918500 / Longitude : 2.125300

Date(s) d'intervention(s) :
Le 03/12/2025

SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Arnaud DE ALMEIDA	Diagnostiqueur immobilier	Certification N° DTI3122	Arnaud DE ALMEIDA

Le présent rapport comporte 34 pages, dont 22 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

Copyright BUREAU VERITAS

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION **3**
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 5

2. CONCLUSIONS **6**
2.1. Remarque(s) complémentaire(s) 6
2.2. Obligations réglementaires 7

3. INFORMATIONS GENERALES **8**
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 8
3.2. Parties prenantes 8

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE **8**
4.1. Références réglementaires 8

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE **9**
5.1. Date(s) de visite(s) 9
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 9
5.3. Conditions spécifiques 9
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 9

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **10**
6.1. Matériaux et produits repérés 10

7. ANNEXES **13**
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 13
7.2. Photos prélèvements 14
7.3. Photos sondages 18
7.4. Attestation d'assurance 19
7.5. Certificat de compétence 21
7.6. Croquis de repérage 22
7.7. Rapport d'analyse du laboratoire 27

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Travaux sur les parties murs uniquement mise en place de coffrets RIA (les sols , plinthes et plafonds sont exclus du périmètre de travaux sur l 'ensemble des zones) Concernant la partie combles on notera que le programme de travaux n 'est pas défini à ce jour

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Peintures, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints d'écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous-couches des revêtements souples

1.3. Périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Parties listés dans le corps du rapport uniquement

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Remarque(s) complémentaire(s)

On notera que les plans du RDC et R + 1 sont identiques vu avec notre interlocuteur sur place .
La nomination des locaux et les plans nous ont été indiqué et fournis.

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : MAISON ARRET ALBI
4 RUE ANDRE IMBERT
81000 ALBI

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
MAISON ARRET ALBI	Autres	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
- -	Donneur d'ordre	/	4 RUE ANDRE IMBERT 81000 ALBI	/
MAISON ARRET ALBI	Accompagnateur	/	/	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 03/12/2025

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
-	BV	20/11/2025	-	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT A -> Rdc -> Couloir	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	P5* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	P6 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	2	P7* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	2	P8 N	/	AN	/	Non
BAT A -> Rdc -> Couloir ucsa	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	/	S1	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	2	/	S2	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT A -> Rdc -> Cuisine entree couloir	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	/	3	P9* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	/	3	P10 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	4	P11* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	4	P12 N	/	AN	/	Non
BAT A -> Etage 1 -> Dgt 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	5	P13* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	5	P14 N	/	AN	/	Non
BAT A -> Etage 1 -> Semi liberté	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	5	/	S3	AN	/	Non
BAT A -> Etage 1 -> Couloir A premier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	6	P15* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	6	P16 N	/	AN	/	Non
BAT A -> Façade -> façade	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	/	/	7	/	S4	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	/	/	8	/	S5	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	/	/	7	P17* N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	/	/	7	P18 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT A -> Façade -> façade	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	/	/	8	P19* N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	/	/	8	P20 N	/	AN	/	Non
BAT A -> Combles -> combles QD	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	9	P21* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	9	P22 N	/	AN	/	Non
	Equipements	Soufflets	/	/	10	P23* N	/	AN	isolant	Non
	Equipements	Soufflets	/	/	10	P24 N	/	AN	/	Non
BAT A -> Combles -> Partie centrale	Equipements	Soufflets	/	/	11	P25* N	/	AN	/	Non
	Equipements	Soufflets	/	/	11	P26 N	/	AN	/	Non

7. ANNEXES

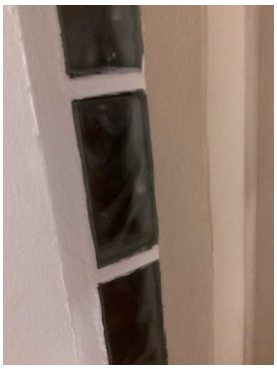
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
BAT A	/
BAT A -> Rdc	/
BAT A -> Rdc -> Couloir	/
BAT A -> Rdc -> Couloir ucsa	/
BAT A -> Rdc -> Cuisine entree couloir	/
BAT A -> Etage 1	/
BAT A -> Etage 1 -> Dgt 1	/
BAT A -> Etage 1 -> Semi liberté	/
BAT A -> Etage 1 -> Couloir A premier	/
BAT A -> Façade	/
BAT A -> Façade -> façade	/
BAT A -> Combles	/
BAT A -> Combles -> combles QD	/
BAT A -> Combles -> Partie centrale	/

7.2. Photos prélèvements

P6	ZPSO 1
BAT A -> Rdc -> Couloir	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

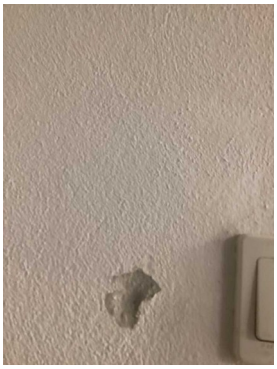
P7	ZPSO 2
BAT A -> Rdc -> Couloir	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P8	ZPSO 2
BAT A -> Rdc -> Couloir	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P9	ZPSO 3
BAT A -> Rdc -> Cuisine entree couloir	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

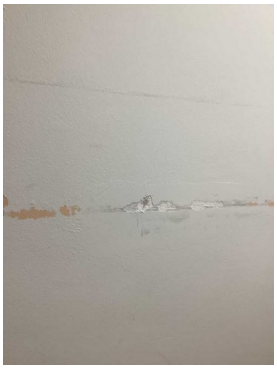
P10	ZPSO 3
BAT A -> Rdc -> Cuisine entree couloir	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

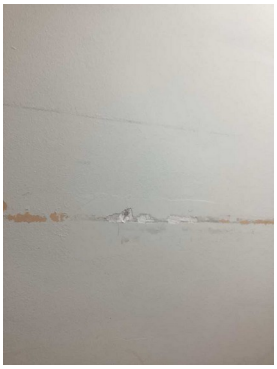
P11	ZPSO 4
BAT A -> Rdc -> Cuisine entree couloir	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P12	ZPSO 4
BAT A -> Rdc -> Cuisine entree couloir	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P13	ZPSO 5
BAT A -> Etage 1 -> Dgt 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P14	ZPSO 5
BAT A -> Etage 1 -> Dgt 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P15	ZPSO 6
BAT A -> Etage 1 -> Couloir A premier	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P16	ZPSO 6
BAT A -> Etage 1 -> Couloir A premier	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P17	ZPSO 7
BAT A -> Façade -> façade	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

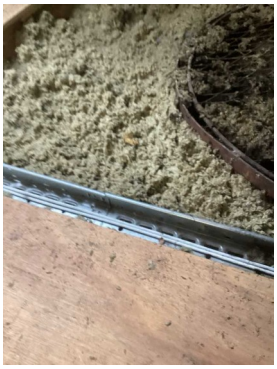
P18	ZPSO 7
BAT A -> Façade -> façade	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

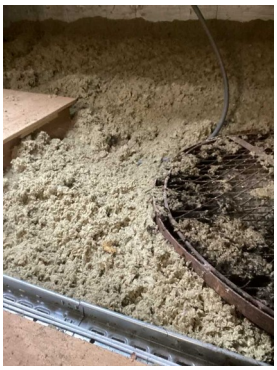
P19	ZPSO 8
BAT A -> Façade -> façade	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

P20	ZPSO 8
BAT A -> Façade -> façade	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

P21	ZPSO 9
BAT A -> Combles -> combles QD	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P22	ZPSO 9
BAT A -> Combles -> combles QD	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P23	ZPSO 10
BAT A -> Combles -> combles QD	
	
Equipements -> Soufflets	

P24	ZPSO 10
BAT A -> Combles -> combles QD	
	
Equipements -> Soufflets	

P25	ZPSO 11
BAT A -> Combles -> Partie centrale	
	
Equipements -> Soufflets	

P26	ZPSO 11
BAT A -> Combles -> Partie centrale	
	
Equipements -> Soufflets	

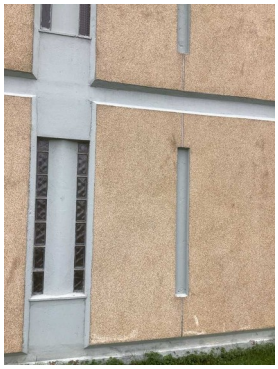
P26	ZPSO 11
BAT A -> Combles -> Partie centrale	
	
Equipements -> Soufflets	

7.3. Photos sondages

S1	ZPSO 1
BAT A -> Rdc -> Couloir ucsa	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S2	ZPSO 2
BAT A -> Rdc -> Couloir ucsa	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S3	ZPSO 5
BAT A -> Etage 1 -> Semi liberté	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S4	ZPSO 7
BAT A -> Façade -> façade	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

S5	ZPSO 8
BAT A -> Façade -> façade	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

7.4. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :
- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :
- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Allianz

Autres missions :
- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Signé par: Juliette Allavoine
E-mail: juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature: 07-01-2025 10:12:02
Adresse IP: 147.161.232.110

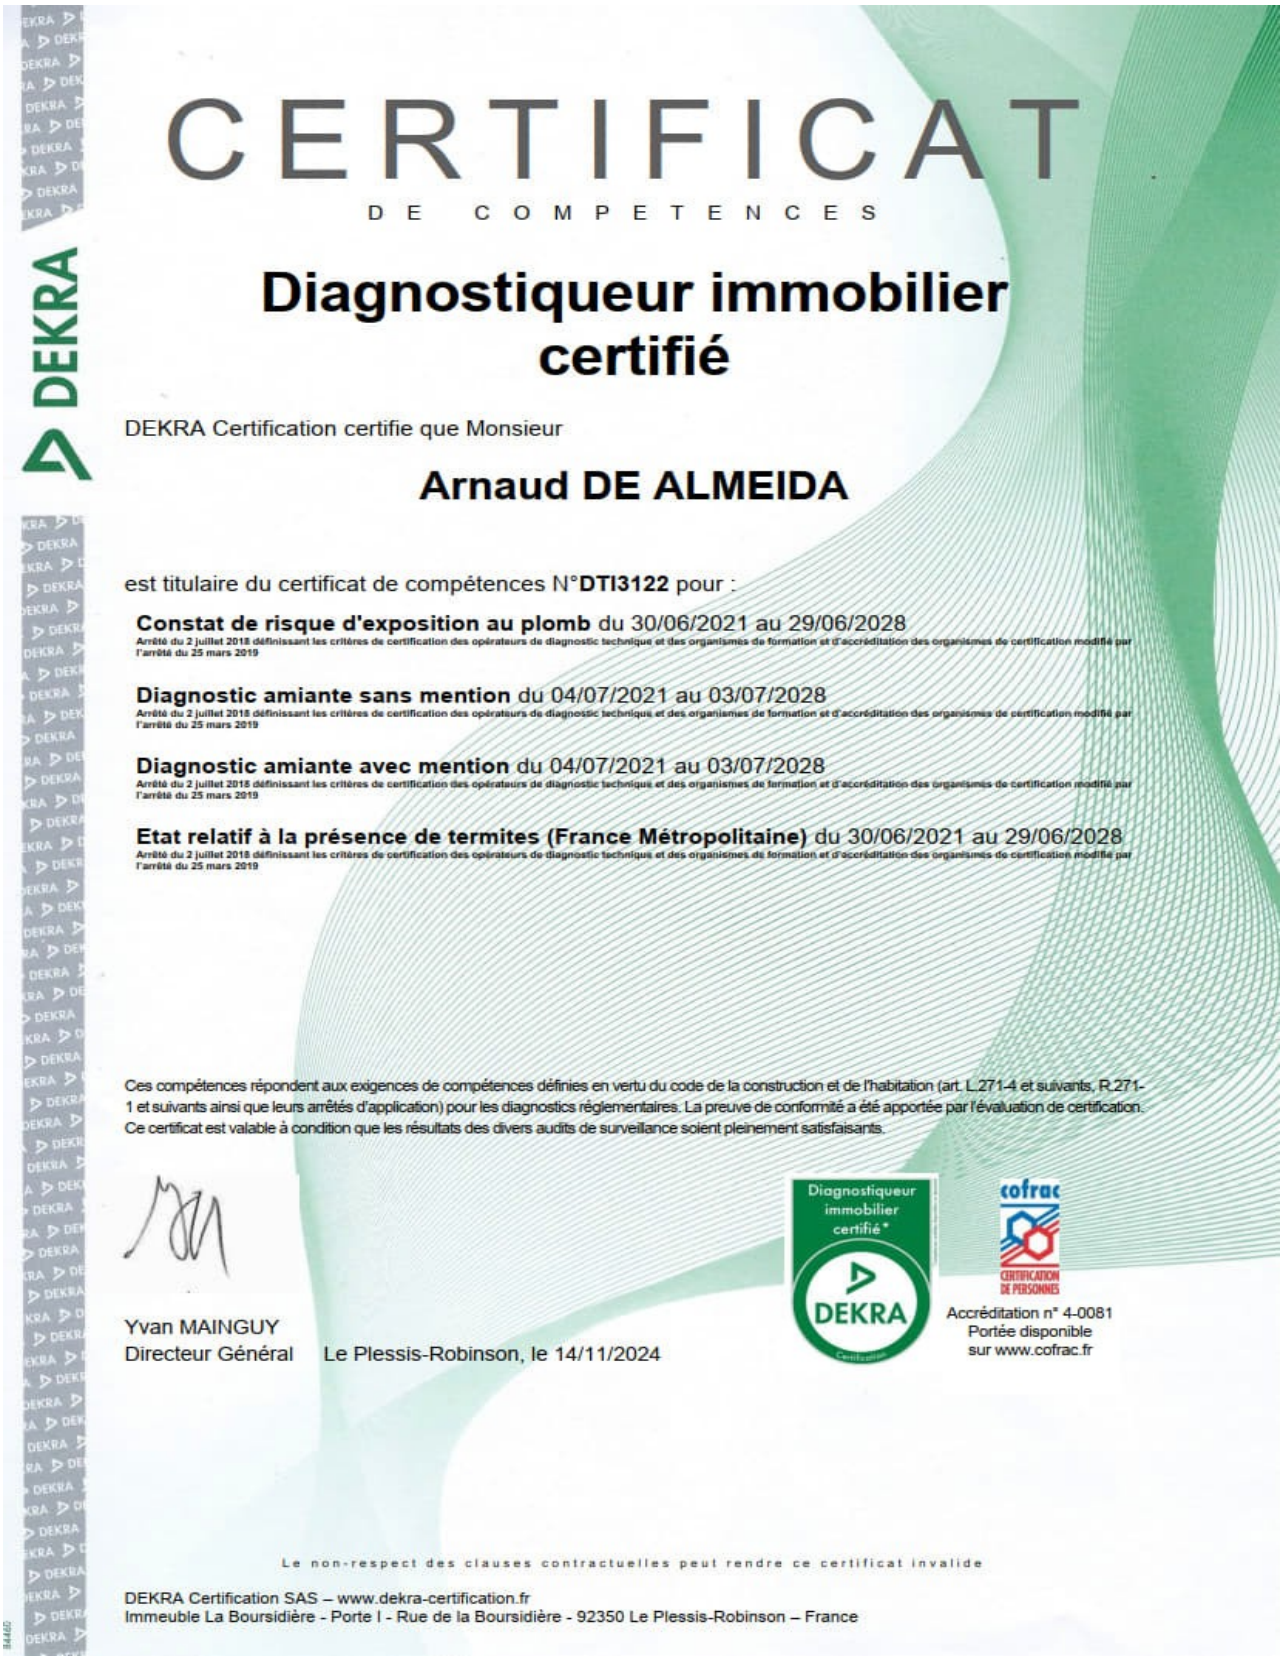
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR 00 487 424 608*

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.5. Certificat de compétence



CERTIFICAT

DE COMPETENCES

Diagnostiqueur immobilier certifié

DEKRA Certification certifie que Monsieur

Arnaud DE ALMEIDA

est titulaire du certificat de compétences N°**DTI3122** pour :

Constat de risque d'exposition au plomb du 30/06/2021 au 29/06/2028
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 25 mars 2019

Diagnostic amiante sans mention du 04/07/2021 au 03/07/2028
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 25 mars 2019

Diagnostic amiante avec mention du 04/07/2021 au 03/07/2028
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 25 mars 2019

Etat relatif à la présence de termites (France Métropolitaine) du 30/06/2021 au 29/06/2028
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 25 mars 2019

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification.
Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

Yvan MAINGUY
Directeur Général

Le Plessis-Robinson, le 14/11/2024

Diagnostiqueur immobilier certifié* DEKRA Certification

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES
Accréditation n° 4-0081
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Le non-respect des clauses contractuelles peut rendre ce certificat invalide

DEKRA Certification SAS – www.dekra-certification.fr
Immeuble La Boursidière - Porte I - Rue de la Boursidière - 92350 Le Plessis-Robinson – France

7.6. Croquis de repérage

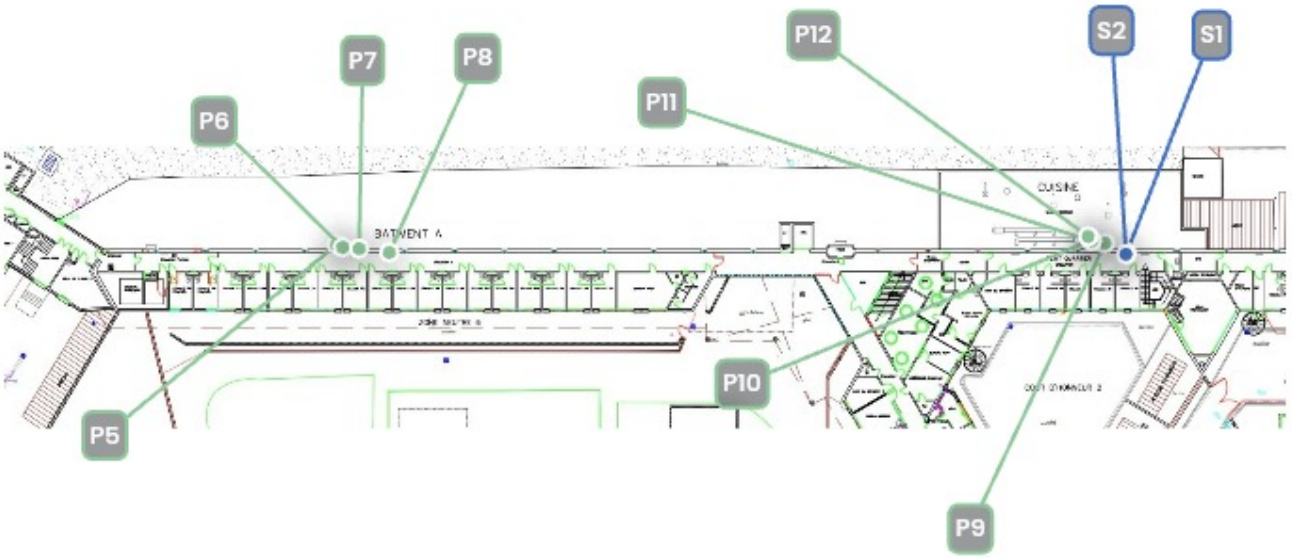
PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	MAISON ARRET ALBI 4 RUE ANDRE IMBERT 81000 ALBI	
Localisation BAT A > Rdc	Date visite	Le 03/12/2025
	Auteur	Arnaud DE ALMEIDA
	N° dossier	29424807/S1/1
	Planche	1 / 4
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

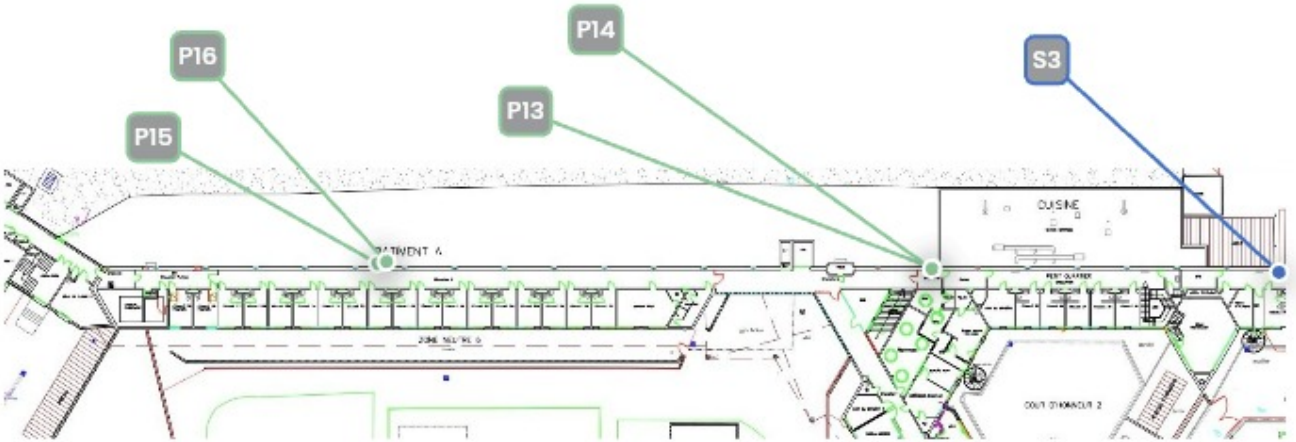
PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	MAISON ARRET ALBI 4 RUE ANDRE IMBERT 81000 ALBI	
Localisation BAT A > Etage 1	Date visite	Le 03/12/2025
	Auteur	Arnaud DE ALMEIDA
	N° dossier	29424807/S1/1
	Planche	2 / 4
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

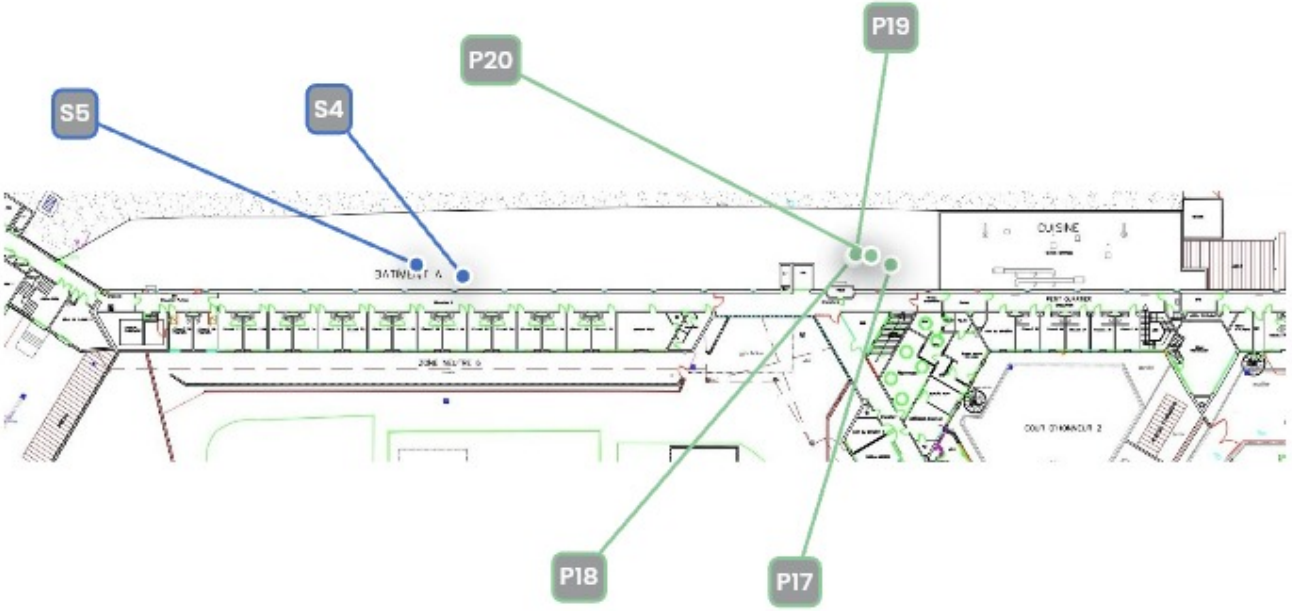
PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	MAISON ARRET ALBI 4 RUE ANDRE IMBERT 81000 ALBI	
Localisation BAT A > Façade	Date visite	Le 03/12/2025
	Auteur	Arnaud DE ALMEIDA
	N° dossier	29424807/S1/1
	Planche	3 / 4
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

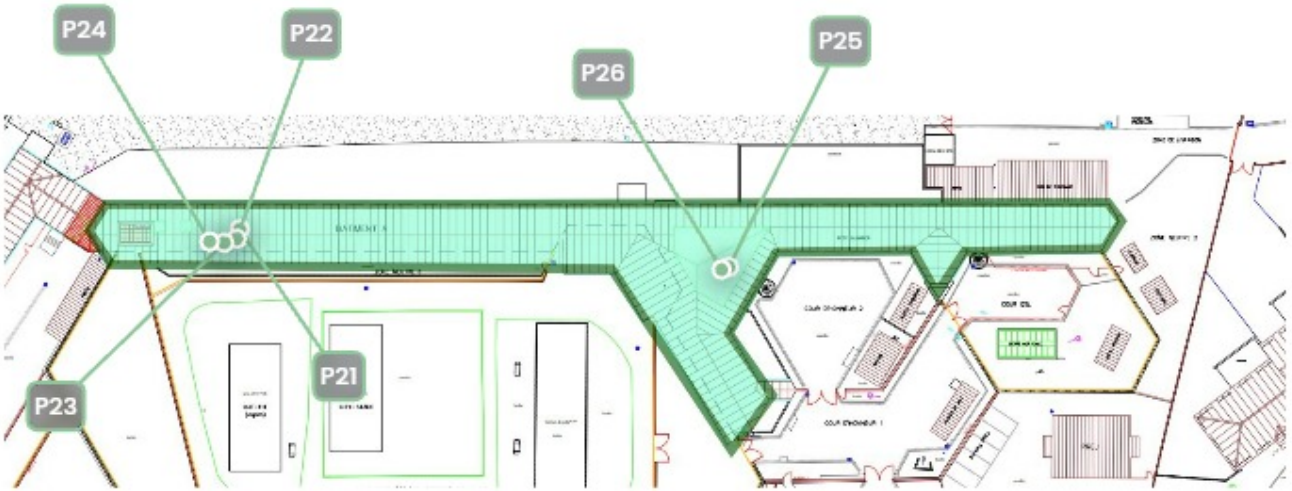
PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	MAISON ARRET ALBI 4 RUE ANDRE IMBERT 81000 ALBI	
Localisation BAT A > Combles	Date visite	Le 03/12/2025
	Auteur	Arnaud DE ALMEIDA
	N° dossier	29424807/S1/1
	Planche	4 / 4
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

7.7. Rapport d'analyse du laboratoire

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tel : 05.57.92.80.12
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-20603 EN DATE DU 05/12/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client :	BUREAU VERITAS EXPLOITATION - TOULOUSE 17 Rue Marius Tercé Star Park - Bâtiment B 31024 TOULOUSE	Réf. Commande ITGA :	IT0525-20603
		Réf. Commande Client :	1510797812/29424807/S1/1/1_29424807/1/1

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 04/12/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 29424807		Réf échantillon ITGA : IT052512-3461	
Réf échantillon client : BV3NF4767 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P15 BAT A - Etage 1 - Couloir A premier Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 05/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CZF (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 29424807		Réf échantillon ITGA : IT052512-3462	
Réf échantillon client : BV3NF4768 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P16 BAT A - Etage 1 - Couloir A premier Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 05/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CZF (3)
Réf dossier client : 29424807		Réf échantillon ITGA : IT052512-3463	
Réf échantillon client : BV3NF4771 - [Equipements : Soufflets] - [rel : P26 BAT A - Combles - Partie centrale Equipements : Soufflets]		Description ITGA : Carton bitumé / Matériau fibreux jaune avec poussières	
Carton bitumé non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières (1)	MOLP + META (B) le 05/12/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CZF (4)
Réf dossier client : 29424807		Réf échantillon ITGA : IT052512-3464	
Réf échantillon client : BV3NF4773 - [Equipements : Soufflets] - [rel : P25 BAT A - Combles - Partie centrale Equipements : Soufflets]		Description ITGA : Papier bitumé / Matériau fibreux jaune avec poussières	
Papier bitumé non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières (1)	MOLP + META (B) le 05/12/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HMR (4)
Réf dossier client : 29424807		Réf échantillon ITGA : IT052512-3465	
Réf échantillon client : BV3NF4774 - [Equipements : Soufflets] - [rel : P23 BAT A - Combles - combles QD Equipements : Soufflets]		Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières	
Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 05/12/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CZF

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-20603 EN DATE DU **05/12/2025**

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 29424807		Réf échantillon ITGA : IT052512-3466	
Réf échantillon client : BV3NF4775 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P21 BAT A - Combles - combles QD Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène	
▸ Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 05/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CZF
Réf dossier client : 29424807		Réf échantillon ITGA : IT052512-3467	
Réf échantillon client : BV3NF4776 - [Equipements : Soufflets] - [rel : P24 BAT A - Combles - combles QD Equipements : Soufflets]		Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières	
▸ Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 05/12/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CZF
Réf dossier client : 29424807		Réf échantillon ITGA : IT052512-3468	
Réf échantillon client : BV3NF4777 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P22 BAT A - Combles - combles QD Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène non séparable (1)	META (A) le 05/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HMR (4)
Réf dossier client : 29424807		Réf échantillon ITGA : IT052512-3469	
Réf échantillon client : BV3NF4779 - [Façades lourdes y compris poteaux : Enduits pelliculaires de lissage/débullage] - [rel : P20 BAT A - Façade - façade Façades lourdes y compris poteaux : Enduits pelliculaires de lissage/débullage]		Description ITGA : Enduit beige en vrac hétérogène	
▸ Enduit beige en vrac hétérogène	META (A) le 05/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CZF (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 29424807		Réf échantillon ITGA : IT052512-3470	
Réf échantillon client : BV3NF4780 - [Façades lourdes y compris poteaux : Enduits pelliculaires de lissage/débullage] - [rel : P19 BAT A - Façade - façade Façades lourdes y compris poteaux : Enduits pelliculaires de lissage/débullage]		Description ITGA : Enduit beige en vrac	
Enduit beige en vrac	META (A) le 05/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CZF (3)
Réf dossier client : 29424807		Réf échantillon ITGA : IT052512-3471	
Réf échantillon client : BV3NF4781 - [Façades lourdes y compris poteaux : Enduits pelliculaires de lissage/débullage] - [rel : P18 BAT A - Façade - façade Façades lourdes y compris poteaux : Enduits pelliculaires de lissage/débullage]		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable (1)	META (A) le 05/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CZF (3)
Réf dossier client : 29424807		Réf échantillon ITGA : IT052512-3472	
Réf échantillon client : BV3NF4782 - [Façades lourdes y compris poteaux : Enduits pelliculaires de lissage/débullage] - [rel : P17 BAT A - Façade - façade Façades lourdes y compris poteaux : Enduits pelliculaires de lissage/débullage]		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable (1)	META (A) le 05/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CZF (3)
Réf dossier client : 29424807		Réf échantillon ITGA : IT052512-3473	
Réf échantillon client : BV3NF4827 - [Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P12 BAT A - Rdc - Cuisine entree couloir Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 05/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CZF (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 29424807		Réf échantillon ITGA : IT052512-3474	
Réf échantillon client : BV3NF4828 - [Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P11 BAT A - Rdc - Cuisine entree couloir Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
‣ Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable (1)	META (A) le 05/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CZF (3)
Réf dossier client : 29424807		Réf échantillon ITGA : IT052512-3475	
Réf échantillon client : BV3NF4829 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence] - [rel : P10 BAT A - Rdc - Cuisine entree couloir Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence]		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Couche grise / Peinture	
Carrelage	---	Non analysé	
‣ Colle blanche non séparable + Couche grise non séparable + Peinture non séparable (1)	META (A) le 05/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CZF (4)
Réf dossier client : 29424807		Réf échantillon ITGA : IT052512-3476	
Réf échantillon client : BV3NF4830 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence] - [rel : P9 BAT A - Rdc - Cuisine entree couloir Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence]		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Couche grise	
Carrelage	---	Non analysé	
‣ Colle blanche non séparable + Couche grise non séparable (1)	META (A) le 05/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CZF (4)
Réf dossier client : 29424807		Réf échantillon ITGA : IT052512-3477	
Réf échantillon client : BV3NF4832 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P14 BAT A - Etage 1 - Dgt 1 Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
‣ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 05/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CZF (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 29424807		Réf échantillon ITGA : IT052512-3478	
Réf échantillon client : BV3NF4833 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P13 BAT A - Etage 1 - Dgt 1 Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 05/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CZF (3)
Réf dossier client : 29424807		Réf échantillon ITGA : IT052512-3479	
Réf échantillon client : BV3NF4834 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P6 BAT A - Rdc - Couloir Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en faible quantité en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable (1)	META (A) le 05/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HMR (3)
Réf dossier client : 29424807		Réf échantillon ITGA : IT052512-3480	
Réf échantillon client : BV3NF4835 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P5 BAT A - Rdc - Couloir Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA : Peinture / Enduit beige en vrac	
Peinture non séparable + Enduit beige en vrac non séparable (1)	META (A) le 05/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CZF (3)
Réf dossier client : 29424807		Réf échantillon ITGA : IT052512-3481	
Réf échantillon client : BV3NF4836 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P7 BAT A - Rdc - Couloir Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en vrac hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable (1)	META (A) le 05/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CZF (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-20603 EN DATE DU **05/12/2025**

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 29424807		Réf échantillon ITGA : IT052512-3482	
Réf échantillon client : BV3NF4837 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P8 BAT A - Rdc - Couloir Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en faible quantité en vrac hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Enduit gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable (1)	META (A) le 05/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HMR (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
