
SBJ Management de projet

Calendrier enveloppe des Travaux Urgents de mise en securité des installations éléctriques et du Système de sécurité incendie - Château de St Germain en laye

15/07/2026

N°	Lots	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**TCE**	**Trvx Urgents de MEC des install éléctriques et SSI - Château de St Germain en Laye**	**318 jours**	**Mar 01/12/26**	**Lun 27/03/28**
2	Moe, Moa	**OS Prépa et travaux**	1 jour	Mar 01/12/26	Mar 01/12/26
3	TCE	**Préparation de chantier**	2 mois	Mer 02/12/26	Mer 03/02/27
4	Mairie	Dépose des compteurs C4 et C5 au plus tard	20 jours	Mer 02/12/26	Mer 06/01/27
5	Lot 1, 2,3, 4	Travaux de répérages TZ/TN	2 mois	Mer 02/12/26	Mer 03/02/27
6	**TCE**	**ETUDES D'EXECUTION**	**100 jours**	**Mer 02/12/26**	**Jeu 29/04/27**
7	Lot 1	Lot 1	100 jours	Mer 02/12/26	Jeu 29/04/27
8	Lot 2	CFO	90 jours	Mer 02/12/26	Jeu 15/04/27
9	Lot 3	SSI	90 jours	Mer 02/12/26	Jeu 15/04/27
10	Lot 4	Protection Incendie	90 jours	Mer 02/12/26	Jeu 15/04/27
11	Lot 5	Menuiserie - Ebenisterie - Desenfumage Escaliers	100 jours	Mer 02/12/26	Jeu 29/04/27
12	**TCE**	**TRAVAUX**	**317 jours**	**Mer 02/12/26**	**Lun 27/03/28**
13	Lot 1, 2	Local Comptage : Travaux de Mise en service alimentation provisoire du château (CCPI)	5 mois	Mer 02/12/26	Jeu 29/04/27
14	Lot 1, 2	Local TGBT Provisoire : Mise en place TGBT transitoire + mise en service	5 mois	Mer 02/12/26	Jeu 29/04/27
15	Lot 1, 2	Raccordement des TD existants sur le TGBT transitoire	2 mois	Jeu 04/03/27	Jeu 29/04/27
16	Lot 2	Jalon de mise en service au plus tard des alimentations provisoires	1 jour	Ven 30/04/27	Ven 30/04/27
17	Lot 1, 2	Travaux local nouveau TGBT	3 mois	Lun 03/05/27	Mer 28/07/27
18	Lot 2	Installation nouveau comptage C4	3 mois	Lun 03/05/27	Mer 28/07/27
19	Lot 1,2,3,4	Dépose et curage	3 mois	Jeu 04/02/27	Jeu 29/04/27
20	Lot 1	Installation de chantier	1 mois	Lun 08/02/27	Ven 05/03/27
21	Lot 1	Tests lingettes	1 jour	Lun 08/03/27	Lun 08/03/27
22	Lot 1	Lot 1 - Installation de chantier / Echafaudages et moyens d'accès / Protections / Maçonnerie / Plâtrerie / Restauration en accompagnement des lots techniques	12,5 mois	Lun 15/03/27	Lun 27/03/28
23	Lot 4	Lot 4 - Protection Incendie	7,5 mois	Lun 03/05/27	Ven 17/12/27
24	**TCE**	**Travaux Colonnes montantes**	**200 jours**	**Lun 03/05/27**	**Ven 03/03/28**
25	Lot 1	Lot 1	10 mois	Lun 03/05/27	Ven 03/03/28
26	**TCE**	**Colonne 1 (Accompagnement)**	**50 jours**	**Lun 03/05/27**	**Mar 13/07/27**
27	Château	Libération de la colonne TN au plus tard	1 jour	Lun 03/05/27	Lun 03/05/27
28	Lot 1	Lot 01 - Travaux préparatoires intervention CFO / SSI	1 mois	Lun 03/05/27	Mar 01/06/27
29	**Lot 2,3**	**Niveau Sous sol (Rez de douve)**	**30 jours**	**Mer 02/06/27**	**Mar 13/07/27**
32	**Lot 2,3**	**Niveau 0 (RDC)**	**30 jours**	**Mer 02/06/27**	**Mar 13/07/27**
35	**Lot 2,3**	**Niveau 1 (1 er entresol)**	**30 jours**	**Mer 02/06/27**	**Mar 13/07/27**
38	**Lot 2,3**	**Niveau 3 (R+2 et Toiture)**	**30 jours**	**Mer 02/06/27**	**Mar 13/07/27**
41	**Lot 2,3**	**Essais - Réglages et mise en service Colonne 1**	**1 jour**	**Jeu 15/07/27**	**Jeu 15/07/27**
42	**TCE**	**Colonne 4 (Accompagnement)**	**50 jours**	**Jeu 15/07/27**	**Mer 06/10/27**
43	Château	Libération de la colonne TN au plus tard	1 jour	Jeu 15/07/27	Jeu 15/07/27
44	Lot 1	Lot 01 - Travaux préparatoires intervention CFO / SSI	1 mois	Jeu 15/07/27	Mer 25/08/27
45	**Lot 2, 3**	**Niveau Sous sol (Rez de douve)**	**30 jours**	**Jeu 26/08/27**	**Mer 06/10/27**
48	**Lot 2, 3**	**Niveau 0 (RDC) - Colonnes 4 et 5**	**30 jours**	**Jeu 26/08/27**	**Mer 06/10/27**
51		**Niveau 1 (1 er entresol)**	**30 jours**	**Jeu 26/08/27**	**Mer 06/10/27**
54	**Lot 2, 3**	**Niveau 2 (R+1 et 1 er entresol)**	**30 jours**	**Jeu 26/08/27**	**Mer 06/10/27**
57	**Lot 2, 3**	**Niveau 3 (R+2 et Toiture)**	**30 jours**	**Jeu 26/08/27**	**Mer 06/10/27**

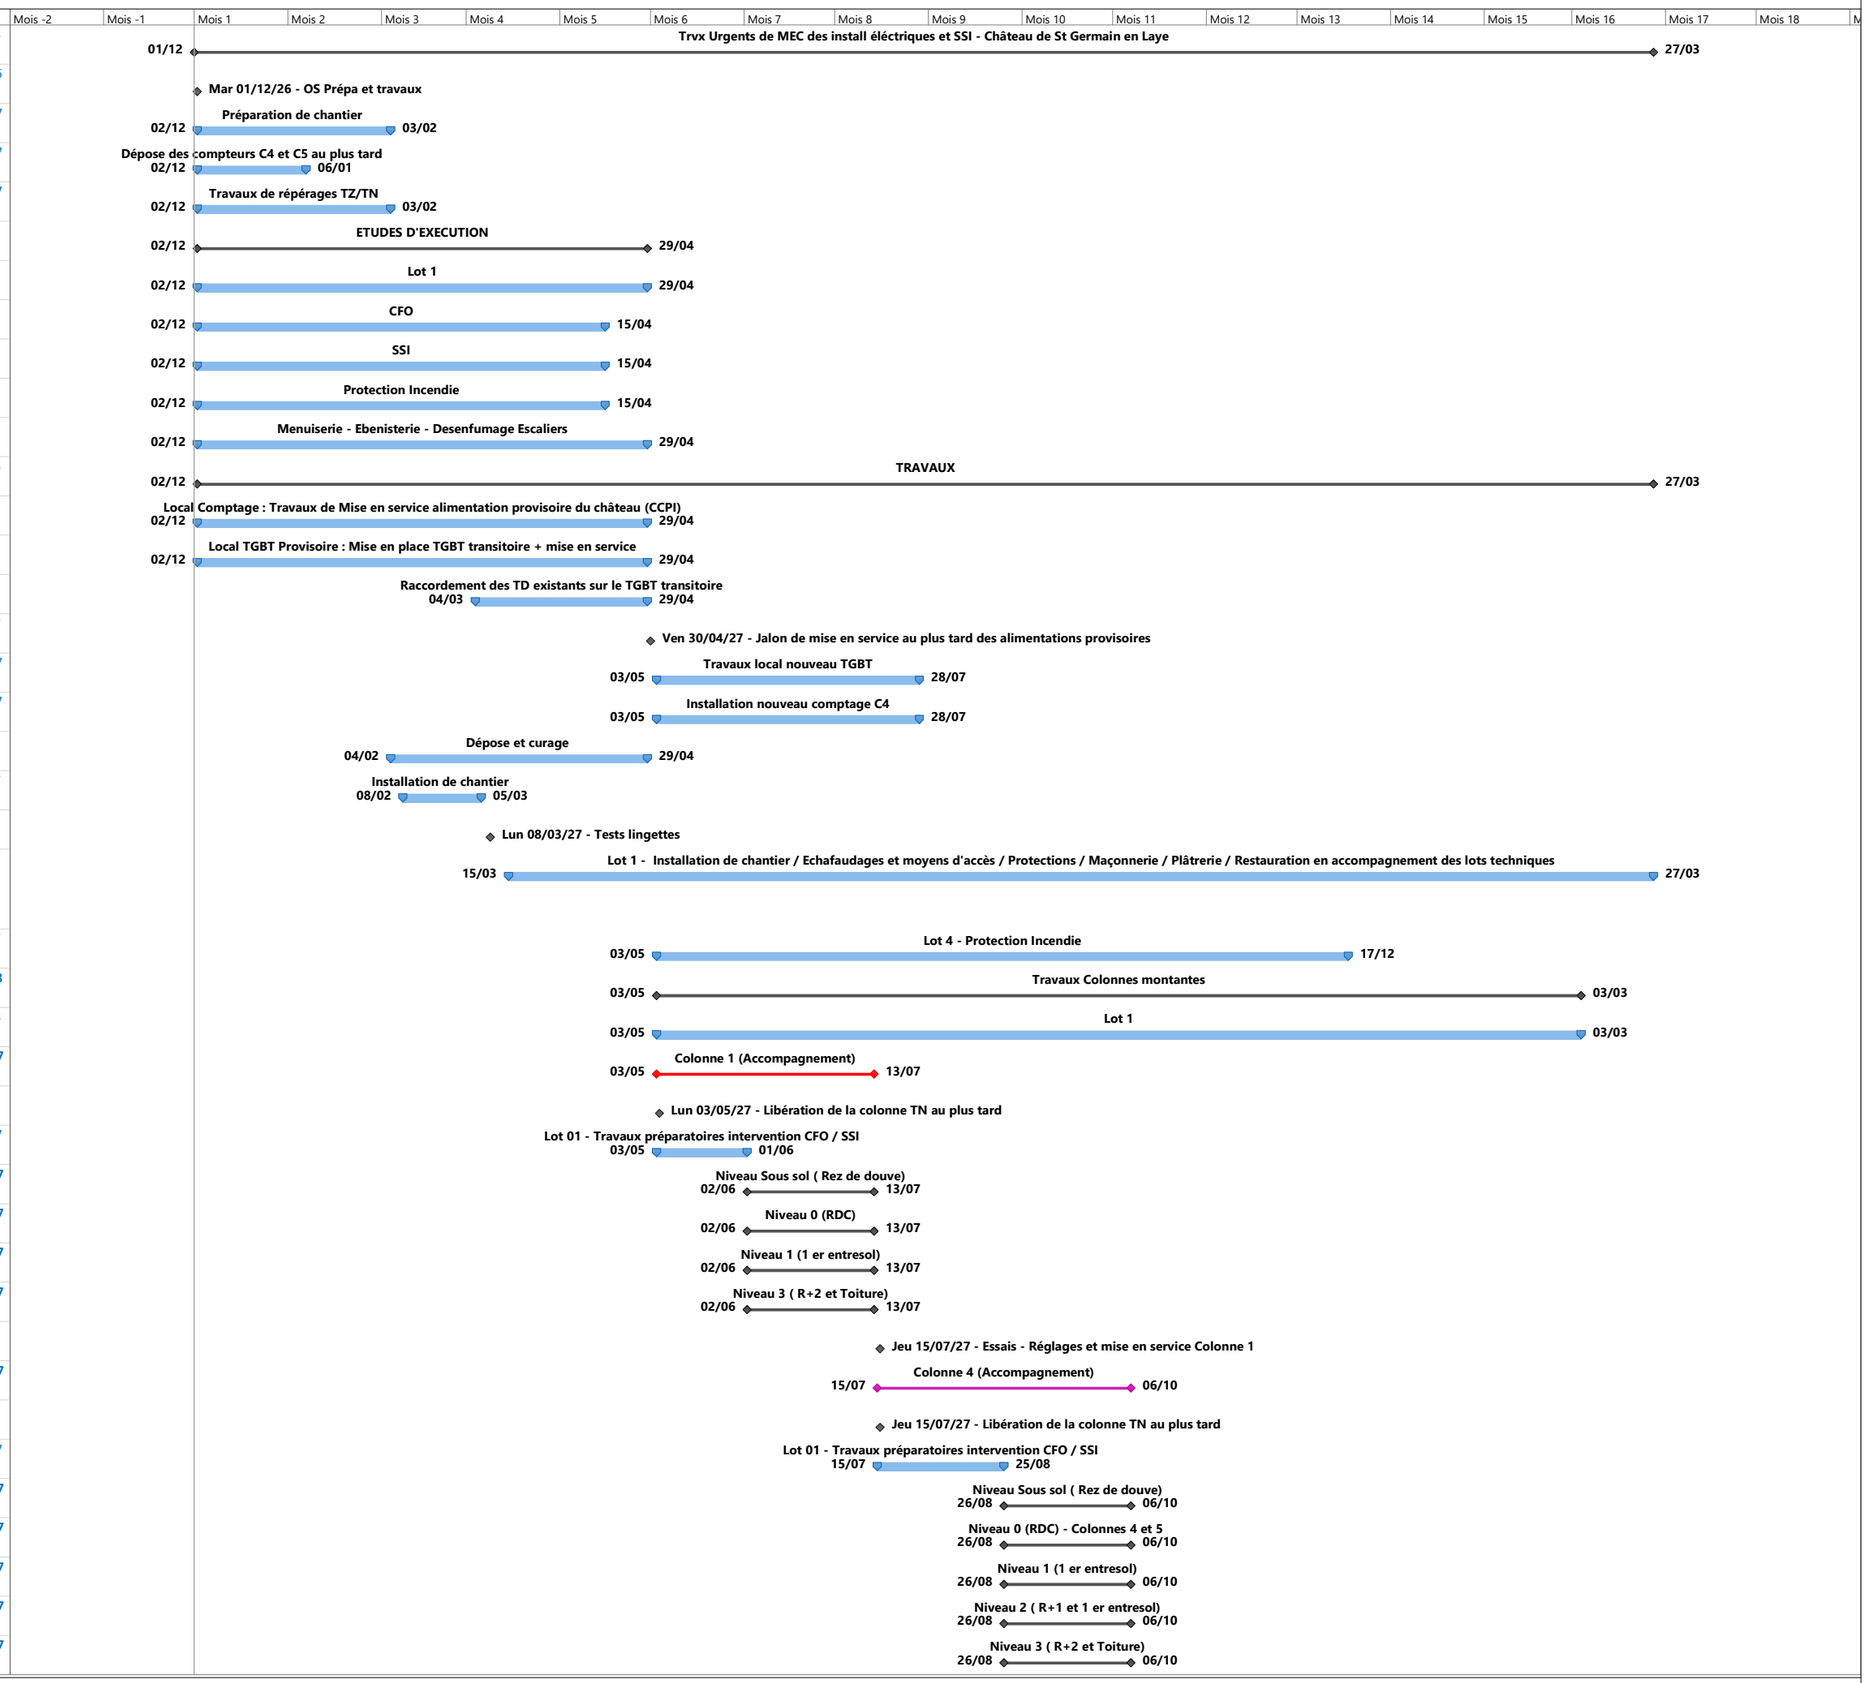

Calendrier enveloppe des Travaux Urgents de mise en securité des installations éléctriques et du Système de sécurité incendie - Château de St Germain en laye

15/07/2026

N°	Lots	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
60	**Lot 2, 3**	**Essais - Réglages et mise en service Colonne 4**	**1 jour**	**Mer 06/10/27**	**Mer 06/10/27**
61	**TCE**	**Colonne 2 (Accompagnement + surveillance)**	**50 jours**	**Jeu 07/10/27**	**Ven 17/12/27**
62	Château	Libération de la colonne TN au plus tard	1 jour	Jeu 07/10/27	Jeu 07/10/27
63	Lot 1	Lot 01 - Travaux préparatoires intervention CFO / SSI	1 mois	Jeu 07/10/27	Jeu 04/11/27
64	**Lot 2, 3**	**Niveau Sous sol (Rez de douve) - Colonnes 2 et 6**	**30 jours**	**Ven 05/11/27**	**Ven 17/12/27**
67	**Lot 2, 3**	**Niveau 0 (RDC) - colonnes 2 et 6**	**30 jours**	**Ven 05/11/27**	**Ven 17/12/27**
70	**Lot 2, 3**	**Niveau 1 (1 er entresol)**	**30 jours**	**Ven 05/11/27**	**Ven 17/12/27**
73	**Lot 2, 3**	**Niveau 2 (R+1 et 1 er entresol)**	**30 jours**	**Ven 05/11/27**	**Ven 17/12/27**
76	**Lot 2, 3**	**Niveau 3 (R+2 et Toiture)**	**30 jours**	**Ven 05/11/27**	**Ven 17/12/27**
79	**Lot 2, 3**	**Essais - Réglages et mise en service Colonne 2**	**3 jours**	**Mer 15/12/27**	**Ven 17/12/27**
80	**TCE**	**Colonne 3 (Accompagnement + Surveillance)**	**50 jours**	**Lun 20/12/27**	**Ven 03/03/28**
81	Château	Libération de la colonne TN au plus tard	1 jour	Lun 20/12/27	Lun 20/12/27
82	Lot 1	Lot 01 - Travaux préparatoires intervention CFO / SSI	1 mois	Lun 20/12/27	Ven 21/01/28
83	**Lot 2, 3**	**Niveau Sous sol (Rez de douve)**	**30 jours**	**Lun 24/01/28**	**Ven 03/03/28**
86	**Lot 2, 3**	**Niveau 0 (RDC)**	**30 jours**	**Lun 24/01/28**	**Ven 03/03/28**
89	**Lot 2, 3**	**Niveau 1 (1 er entresol)**	**30 jours**	**Lun 24/01/28**	**Ven 03/03/28**
92	**Lot 2, 3**	**Niveau 2 (R+1 et 1 er entresol)**	**30 jours**	**Lun 24/01/28**	**Ven 03/03/28**
95	**Lot 2, 3**	**Niveau 3 (R+2 et Toiture)**	**30 jours**	**Lun 24/01/28**	**Ven 03/03/28**
98	**Lot 2, 3**	**Essais - Réglages et mise en service Colonne 3**	**1 jour**	**Ven 03/03/28**	**Ven 03/03/28**
99	Lot 2, 3	**Bascule progressive TD vers TGBT definitif**	108 jours	Lun 04/10/27	Ven 10/03/28
100	**Lot 5**	Lot 5 - Menuiseries /Ebenisterie / Désenfumage des cages d'escalier	**68 jours**	**Lun 13/12/27**	**Mer 22/03/28**
101	Lot 1	Lot 1	3,4 mois	Lun 13/12/27	Mer 22/03/28
102	Lot 5	Escalier 1	0,5 mois	Mer 22/12/27	Mar 11/01/28
103	Lot 5	Test Mise en service	0,1 mois	Lun 10/01/28	Mar 11/01/28
104	Lot 5	Escalier 2 - Mercure	0,5 mois	Mer 12/01/28	Mar 25/01/28
105	Lot 5	Test Mise en service	0,1 mois	Lun 24/01/28	Mar 25/01/28
106	Lot 5	Escalier 3	0,5 mois	Mer 26/01/28	Mar 08/02/28
107	Lot 5	Test Mise en service	0,1 mois	Lun 07/02/28	Mar 08/02/28
108	Lot 5	Escalier 4	0,5 mois	Mer 09/02/28	Mar 22/02/28
109	Lot 5	Test Mise en service	0,1 mois	Lun 21/02/28	Mar 22/02/28
110	Lot 5	Escalie 5 - Chapelle	0,5 mois	Mer 23/02/28	Mar 07/03/28
111	Lot 5	Test Mise en service	0,1 mois	Lun 06/03/28	Mar 07/03/28
112	Lot 5	Escalier 7 - Bourbon	0,5 mois	Mer 08/03/28	Mar 21/03/28
113	Lot 5	Test Mise en service	0,1 mois	Lun 20/03/28	Mar 21/03/28
114	Lot 2,3,4,5	**Mises en service**	1 mois	Lun 28/02/28	Ven 24/03/28
115	TCE	**OPL**	30 jours	Ven 18/02/28	Jeu 30/03/28
116	TCE	**Reception - OPR**	1 jour	Ven 31/03/28	Ven 31/03/28
117		**Evacuation BV et nettoyage**	10 jours	Lun 03/04/28	Ven 14/04/28
118	TCE	**LR**	20 jours	Lun 03/04/28	Mar 02/05/28
119					

