
Date : Ven 04/09/26


Projet : Réamenagement intérieur de l'acceuil du centre des Finances de St Jean de Mauriene

V1

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Mode de Tâche
1	**Chantier**	**90 jours**	**Mer 04/11/26**	**Mar 09/03/27**	
2	**Préparation de chantier**	**42 jours**	**Mer 04/11/26**	**Jeu 31/12/26**	
3	notification des entreprises	1 jour	Mer 04/11/26	Mer 04/11/26	
4	Réalisation du DT	10 jours	Jeu 05/11/26	Mer 18/11/26	
5	Analyse de la MOE	5 jours	Jeu 19/11/26	Mer 25/11/26	
6	Recalage du DT	20 jours	Jeu 26/11/26	Mer 23/12/26	
7	Analyse de la MOE	6 jours	Jeu 24/12/26	Jeu 31/12/26	
8	**Chantier**	**47 jours**	**Lun 04/01/27**	**Mar 09/03/27**	
9	**Phase 1**	**25 jours**	**Lun 04/01/27**	**Ven 05/02/27**	
10	**Démolition**	**3 jours**	**Mar 05/01/27**	**Jeu 07/01/27**	
11	Création d'ouverture dans maconnerie (cis renfort)	1 jour	Mar 05/01/27	Mar 05/01/27	
12	Dépose du faux plafond	1 jour	Mer 06/01/27	Mer 06/01/27	
13	Dépose de cloison	1 jour	Jeu 07/01/27	Jeu 07/01/27	
14	**Menuiserie**	**5 jours**	**Ven 08/01/27**	**Jeu 14/01/27**	
15	Dépose des menuiseries ext	1 jour	Ven 08/01/27	Ven 08/01/27	
16	Pose des menuiseries ext	2 jours	Lun 11/01/27	Mar 12/01/27	
17	Pose d'un mur ossature métallique	2 jours	Mer 13/01/27	Jeu 14/01/27	
18	**Platrerie peinture**	**16 jours**	**Mer 13/01/27**	**Mer 03/02/27**	
19	Pose d'une cloison première peau	2 jours	Mer 13/01/27	Jeu 14/01/27	
20	Pose d'une cloison deuxième peau	2 jours	Mar 19/01/27	Mer 20/01/27	
21	Mise en peinture + habillage menuiseries	3 jours	Jeu 21/01/27	Lun 25/01/27	
22	Pose de l'ossature du faux plafond	3 jours	Lun 01/02/27	Mer 03/02/27	
23	**Plomberie sanitaire**	**4 jours**	**Mar 26/01/27**	**Ven 29/01/27**	
24	Dépose équipement plomberie	1 jour	Mar 26/01/27	Mar 26/01/27	
25	Pose/repose épose équipement plomberie	2 jours	Mer 27/01/27	Jeu 28/01/27	
26	Pose de la gaine de ventilation	1 jour	Ven 29/01/27	Ven 29/01/27	
27	**Sol dur & souple**	**6 jours**	**Mar 26/01/27**	**Mar 02/02/27**	
28	Pose de la faillance	1 jour	Lun 01/02/27	Lun 01/02/27	
29	Ragréage	2 jours	Mar 26/01/27	Mer 27/01/27	
30	Pose du sol	1 jour	Jeu 28/01/27	Jeu 28/01/27	
31	Nettoyage du sol	1 jour	Mar 02/02/27	Mar 02/02/27	
32	**Electricité**	**17 jours**	**Lun 04/01/27**	**Mar 26/01/27**	
33	Consignation	1 jour	Lun 04/01/27	Lun 04/01/27	
34	Pose des chemin de cable	3 jours	Ven 15/01/27	Mar 19/01/27	

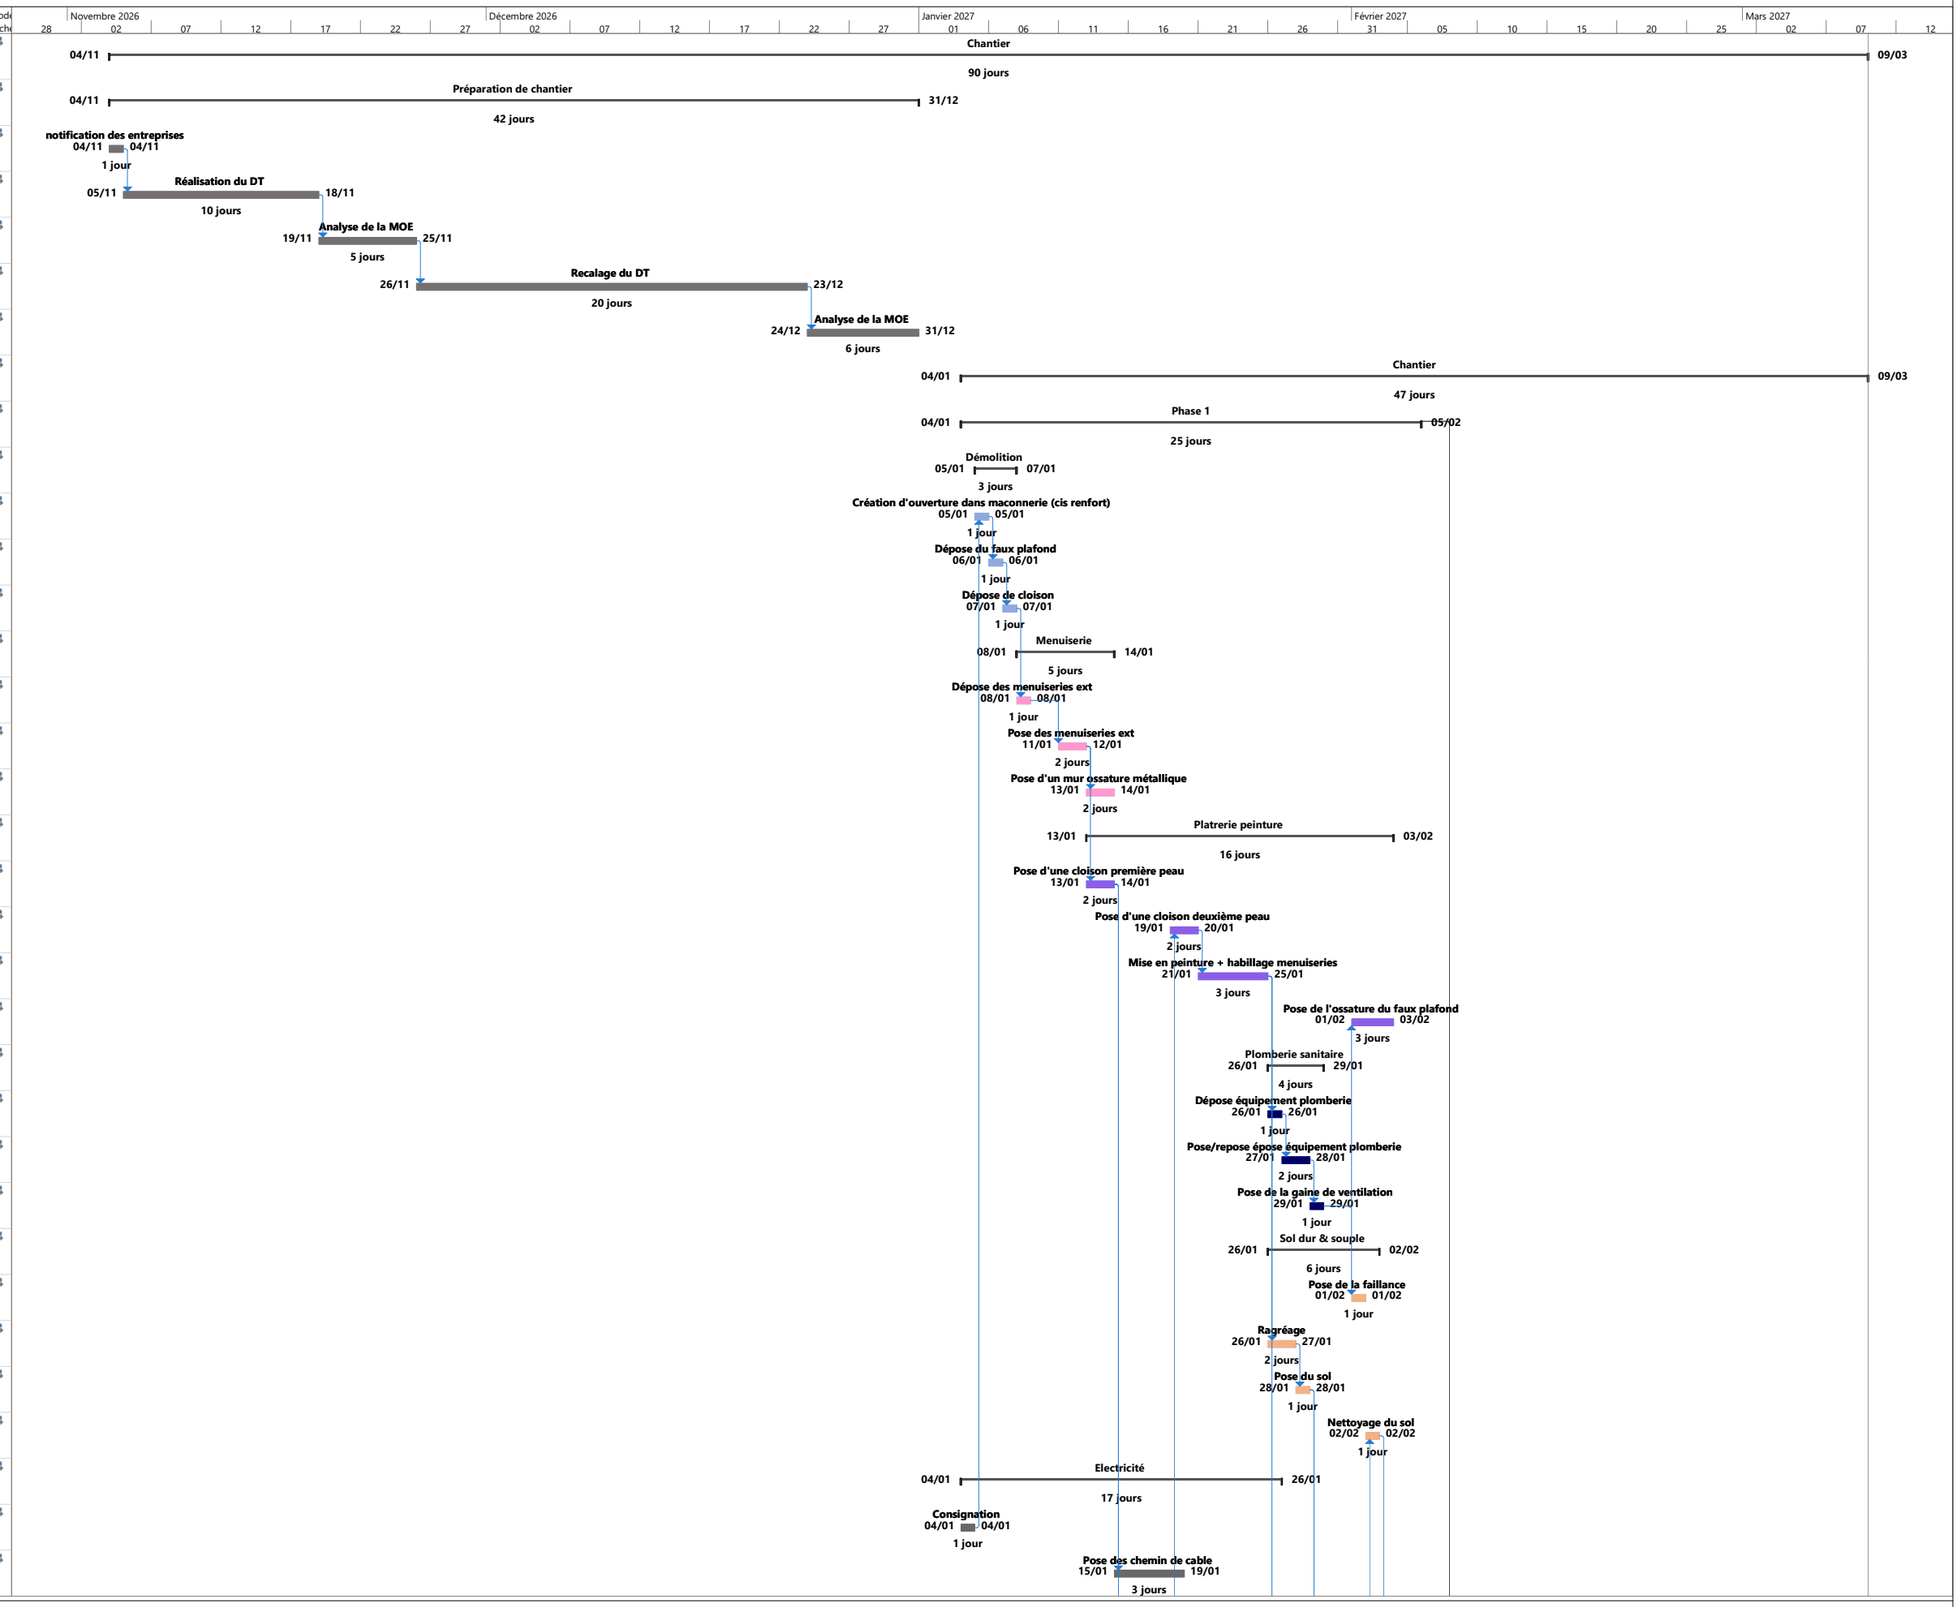

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Mode de Tâche
35	Pose des luminaires	1 jour	Mar 26/01/27	Mar 26/01/27	
36	Pose des prises	2 jours	Ven 15/01/27	Lun 18/01/27	
37	Pose du TD	2 jours	Ven 15/01/27	Lun 18/01/27	
38	Contrôle d'acces fil attente	3 jours	Ven 15/01/27	Mar 19/01/27	
39	**Menuiserie interieur**	**2 jours**	**Ven 29/01/27**	**Lun 01/02/27**	
40	Pose des portes	2 jours	Ven 29/01/27	Lun 01/02/27	
41	Signalitique	2 jours	Ven 29/01/27	Lun 01/02/27	
42	**Mobilier**	**3 jours**	**Mer 03/02/27**	**Ven 05/02/27**	
43	Pose du mobilier	3 jours	Mer 03/02/27	Ven 05/02/27	
44	**Phase 2**	**16 jours**	**Lun 08/02/27**	**Lun 01/03/27**	
45	**Démolition**	**2 jours**	**Mar 09/02/27**	**Mer 10/02/27**	
46	Création d'ouverture dans maconnerie (cis renfort)	1 jour	Mar 09/02/27	Mar 09/02/27	
47	Dépose du faux plafond	1 jour	Mer 10/02/27	Mer 10/02/27	
48	Dépose de cloison	1 jour	Mer 10/02/27	Mer 10/02/27	
49	**Menuiserie**	**3 jours**	**Jeu 11/02/27**	**Lun 15/02/27**	
50	Dépose des menuiseries ext	1 jour	Jeu 11/02/27	Jeu 11/02/27	
51	Pose des menuiseries ext	1 jour	Ven 12/02/27	Ven 12/02/27	
52	Pose d'un mur ossature métallique	1 jour	Lun 15/02/27	Lun 15/02/27	
53	**Platrerie peinture**	**9 jours**	**Lun 15/02/27**	**Jeu 25/02/27**	
54	Pose d'une cloison première peau	1 jour	Lun 15/02/27	Lun 15/02/27	
55	Pose d'une cloison deuxième peau	1 jour	Mer 17/02/27	Mer 17/02/27	
56	Mise en peinture + habillage menuiseries	2 jours	Jeu 18/02/27	Ven 19/02/27	
57	Pose du faux plafond	1 jour	Jeu 25/02/27	Jeu 25/02/27	
58	**Plomberie sanitaire**	**3 jours**	**Lun 22/02/27**	**Mer 24/02/27**	
59	Dépose équipement plomberie	1 jour	Lun 22/02/27	Lun 22/02/27	
60	Pose/repose épose équipement plomberie	1 jour	Mar 23/02/27	Mar 23/02/27	
61	Pose de la gaine de ventilation	1 jour	Mer 24/02/27	Mer 24/02/27	
62	**Sol dur & souple**	**4 jours**	**Lun 22/02/27**	**Jeu 25/02/27**	
63	Pose de la faillance	1 jour	Jeu 25/02/27	Jeu 25/02/27	
64	Ragréage	1 jour	Lun 22/02/27	Lun 22/02/27	
65	Pose du sol	1 jour	Mar 23/02/27	Mar 23/02/27	
66	Nettoyage du sol	1 jour	Jeu 25/02/27	Jeu 25/02/27	
67	**Electricité**	**11 jours**	**Lun 08/02/27**	**Lun 22/02/27**	
68	Consignation	1 jour	Lun 08/02/27	Lun 08/02/27	

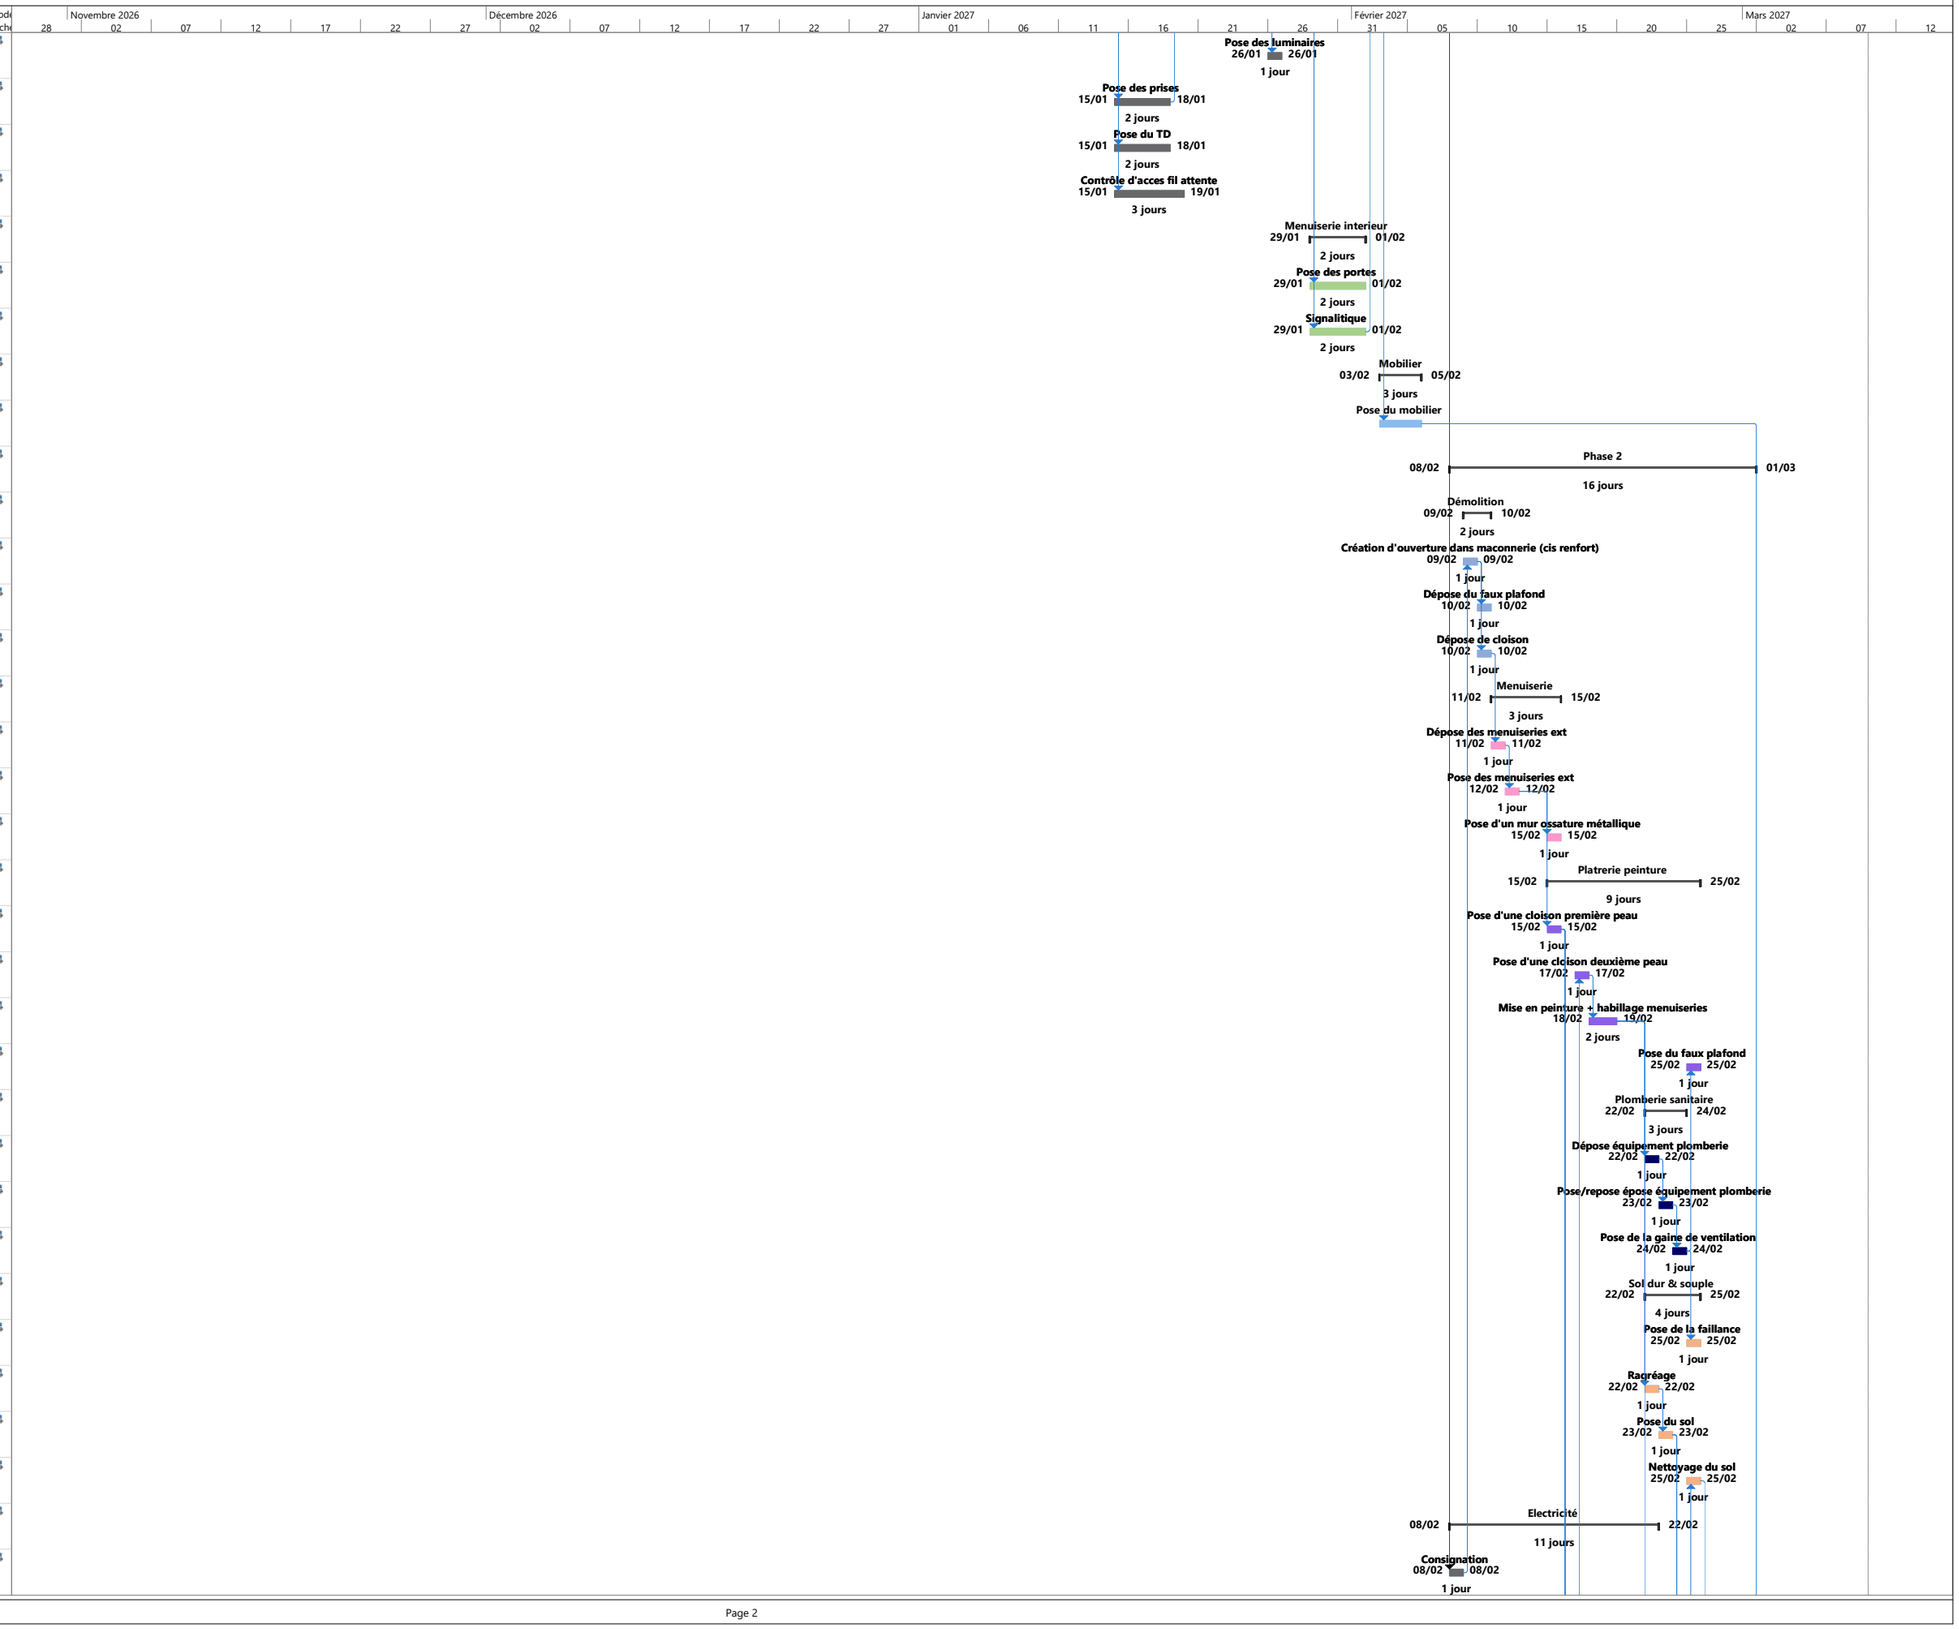

Date : Ven 04/09/26

Projet : Réamenagement intérieur de l'acceuil du centre des Finances de St Jean de Mauriene

V1

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Mode de Tâche
69	Pose des chemin de cable	1 jour	Mar 16/02/27	Mar 16/02/27	
70	Pose des luminaires	1 jour	Lun 22/02/27	Lun 22/02/27	
71	Pose des prises	1 jour	Mar 16/02/27	Mar 16/02/27	
72	Contrôle d'acces fil attente	1 jour	Mar 16/02/27	Mar 16/02/27	
73	**Menuiserie interieur**	**1 jour**	**Mer 24/02/27**	**Mer 24/02/27**	
74	Pose des portes	1 jour	Mer 24/02/27	Mer 24/02/27	
75	Signalitique	1 jour	Mer 24/02/27	Mer 24/02/27	
76	**Mobilier**	**2 jours**	**Ven 26/02/27**	**Lun 01/03/27**	
77	Pose du mobilier	2 jours	Ven 26/02/27	Lun 01/03/27	
78	**AOR**	**6 jours**	**Mar 02/03/27**	**Mar 09/03/27**	
79	OPR	5 jours	Mar 02/03/27	Lun 08/03/27	
80	Livraison	1 jour	Mar 09/03/27	Mar 09/03/27	

