
Opération 3412 - travaux
RDC de la buvette des parlementaires - phase 2027


N°	Nom de la tâche	Durée	Début
1	**Opération 3412 - travaux RDC de la buvette des parlementaires - phase 2027**	**150 jrs?**	**Lun 02/11/26**
2	**Travaux préparatoires**	**1 jr**	**Lun 01/02/27**
3	Déménagement DLP	0 jr	Lun 01/02/27
4	Consignation	0 jr	Lun 01/02/27
5	Installation coffrets de chantier	1 jr	Lun 01/02/27
6	Protection de chantier	1 jr	Lun 01/02/27
7	**Remplacement ascenseur**	**80 jrs**	**Lun 01/02/27**
8	Dépose ascenseur	15 jrs	Lun 01/02/27
9	Modification maçonnerie	15 jrs	Lun 22/02/27
10	Modification CFA/CFO	15 jrs	Lun 15/03/27
11	Pose nouvel ascenseur	30 jrs	Lun 05/04/27
12	Mise en peinture	5 jrs	Lun 17/05/27
13	**Circulation**	**80 jrs?**	**Lun 01/02/27**
14	Démolition tous faux-plafonds	5 jrs	Lun 01/02/27
15	Dépose / Scellement porte CF	5 jrs	Lun 01/02/27
16	Creusement tranchée raccordement EU	2 jrs	Lun 08/02/27
17	Passage des fontes	2 jrs	Mer 10/02/27
18	Fermeture tranchée	3 jrs	Ven 12/02/27
19	Passage des réseaux	50 jrs	Lun 08/02/27
20	Mise en place faux-plafond neuf	10 jrs	Lun 19/04/27
21	Résine de sol	10 jrs	Lun 03/05/27
22	Mise en peinture	5 jrs	Lun 17/05/27
23	**Local électrique**	**145 jrs**	**Lun 02/11/26**
24	Installation des armoires	40 jrs	Lun 02/11/26
25	Cablage armoires et réseaux restants	75 jrs	Lun 01/02/27
26	Raccords de peinture	5 jrs	Lun 17/05/27
27	**Prépa froide et plonge, pompe à bière et cave à vin**	**118 jrs?**	**Lun 07/12/26**
28	Etudes cuisiniste EXE (lot 01)	40 jrs	Lun 07/12/26
29	Saignées pour réseaux neufs	5 jrs	Lun 01/02/27
30	Dépose des réseaux fridorifiques / évaporateur / groupe ((lot 01)	2 jrs	Lun 08/02/27

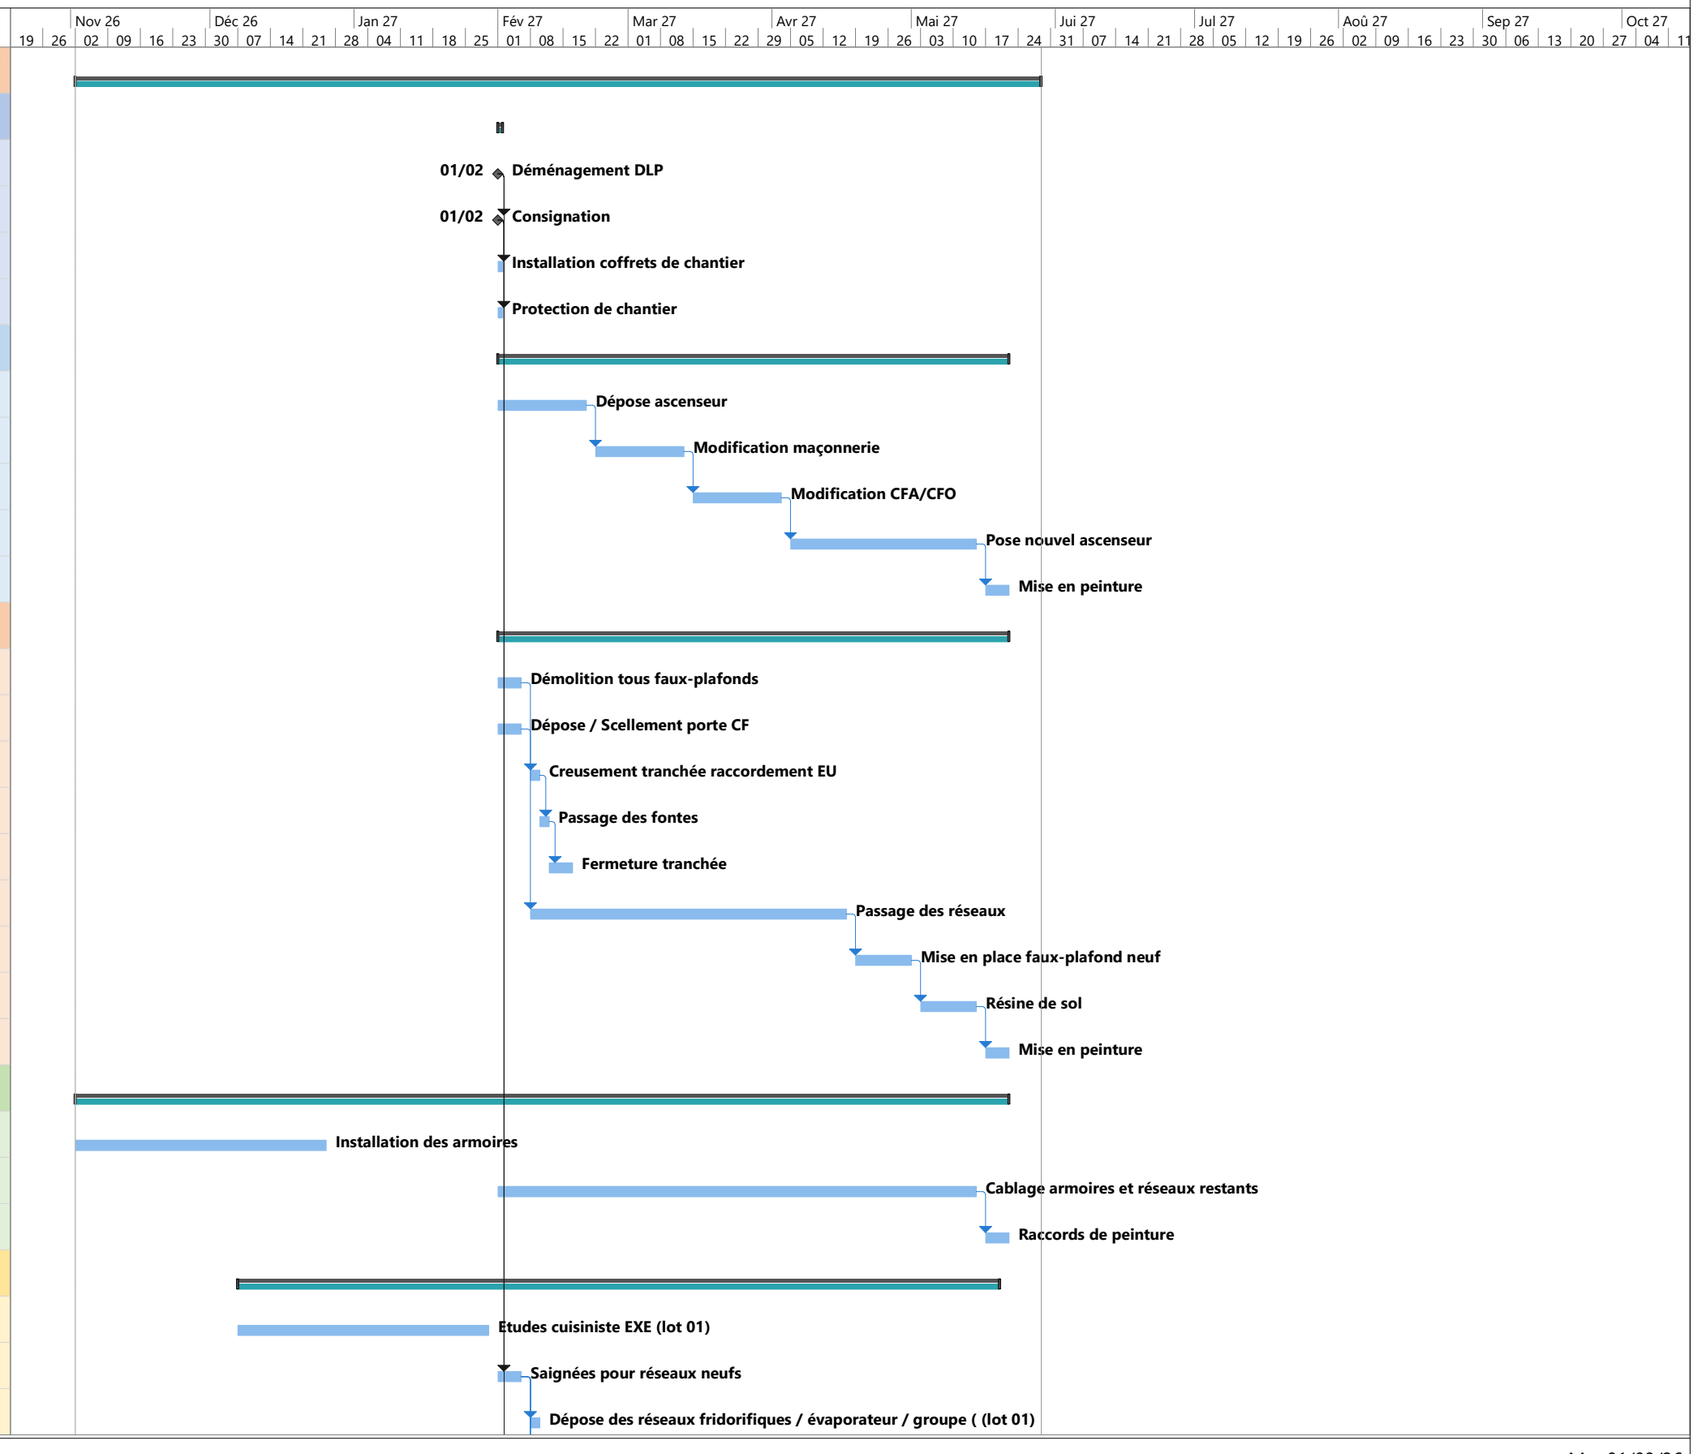

Mar 01/09/26

Opération 3412 - travaux
RDC de la buvette des parlementaires - phase 2027

N°	Nom de la tâche	Durée	Début
31	Pose des réseaux frigorifiques (lot 01)	5 jrs	Lun 08/02/27
32	Pose et raccordement du groupe en toiture (lot 01)	5 jrs	Lun 15/02/27
33	Complément réseaux CFO, CFA, DI	10 jrs	Lun 08/02/27
34	Complément réseaux CVC, plomberie	10 jrs	Lun 08/02/27
35	Calfeutrements et fermetures de saignées	5 jrs	Lun 22/02/27
36	Panneaux isothermes (portes, doublages et cloisons) (lot 01)	5 jrs	Lun 01/03/27
37	Doublage plaquiste (plonge)	5 jrs	Lun 08/03/27
38	Faux plafond	5 jrs	Lun 15/03/27
39	Etanchéité, socles, résine de sol, faïence murale	20 jrs	Lun 15/03/27
40	Appareillages CFO, CFA, DI	5 jrs	Lun 12/04/27
41	Passage réseaux CVC plomberie, mise en place cassette de clim (lot 01)	5 jrs	Lun 12/04/27
42	Equipements de cuisine (lot 01)	18 jrs	Lun 19/04/27
43	Mise en peinture	5 jrs	Jeu 13/05/27
44	**Bar R+1**	**30 jrs**	**Lun 01/02/27**
45	Dépose des réseaux / évaporateurs / groupe (lot 01)	10 jrs	Lun 01/02/27
46	Pose du nouveau groupe en toiture (lot 01)	10 jrs	Lun 15/02/27
47	Repose des nouveaux réseaux / évaporateurs	10 jrs	Lun 01/03/27
48	**Salle de repos, stockage, vestiaires femmes, économat**	**55 jrs**	**Lun 01/02/27**
49	Démolition cloisons et faux-plafonds	10 jrs	Lun 01/02/27
50	Modification CFO, CFA, DI	20 jrs	Lun 01/02/27
51	Modification CVC, plomberie	10 jrs	Lun 01/02/27
52	Cloison grillagée	10 jrs	Lun 01/03/27
53	Cloisonnements	15 jrs	Lun 01/03/27
54	Faux-plafonds neufs	5 jrs	Lun 22/03/27
55	Appareillage CFO / CFA / DI	5 jrs	Lun 29/03/27
56	Mise en peinture	15 jrs	Lun 29/03/27
57	**OPR**	**5 jrs**	**Lun 24/05/27**
58	OPR	5 jrs	Lun 24/05/27
59	Jalon réception des travaux	0 jr	Ven 28/05/27

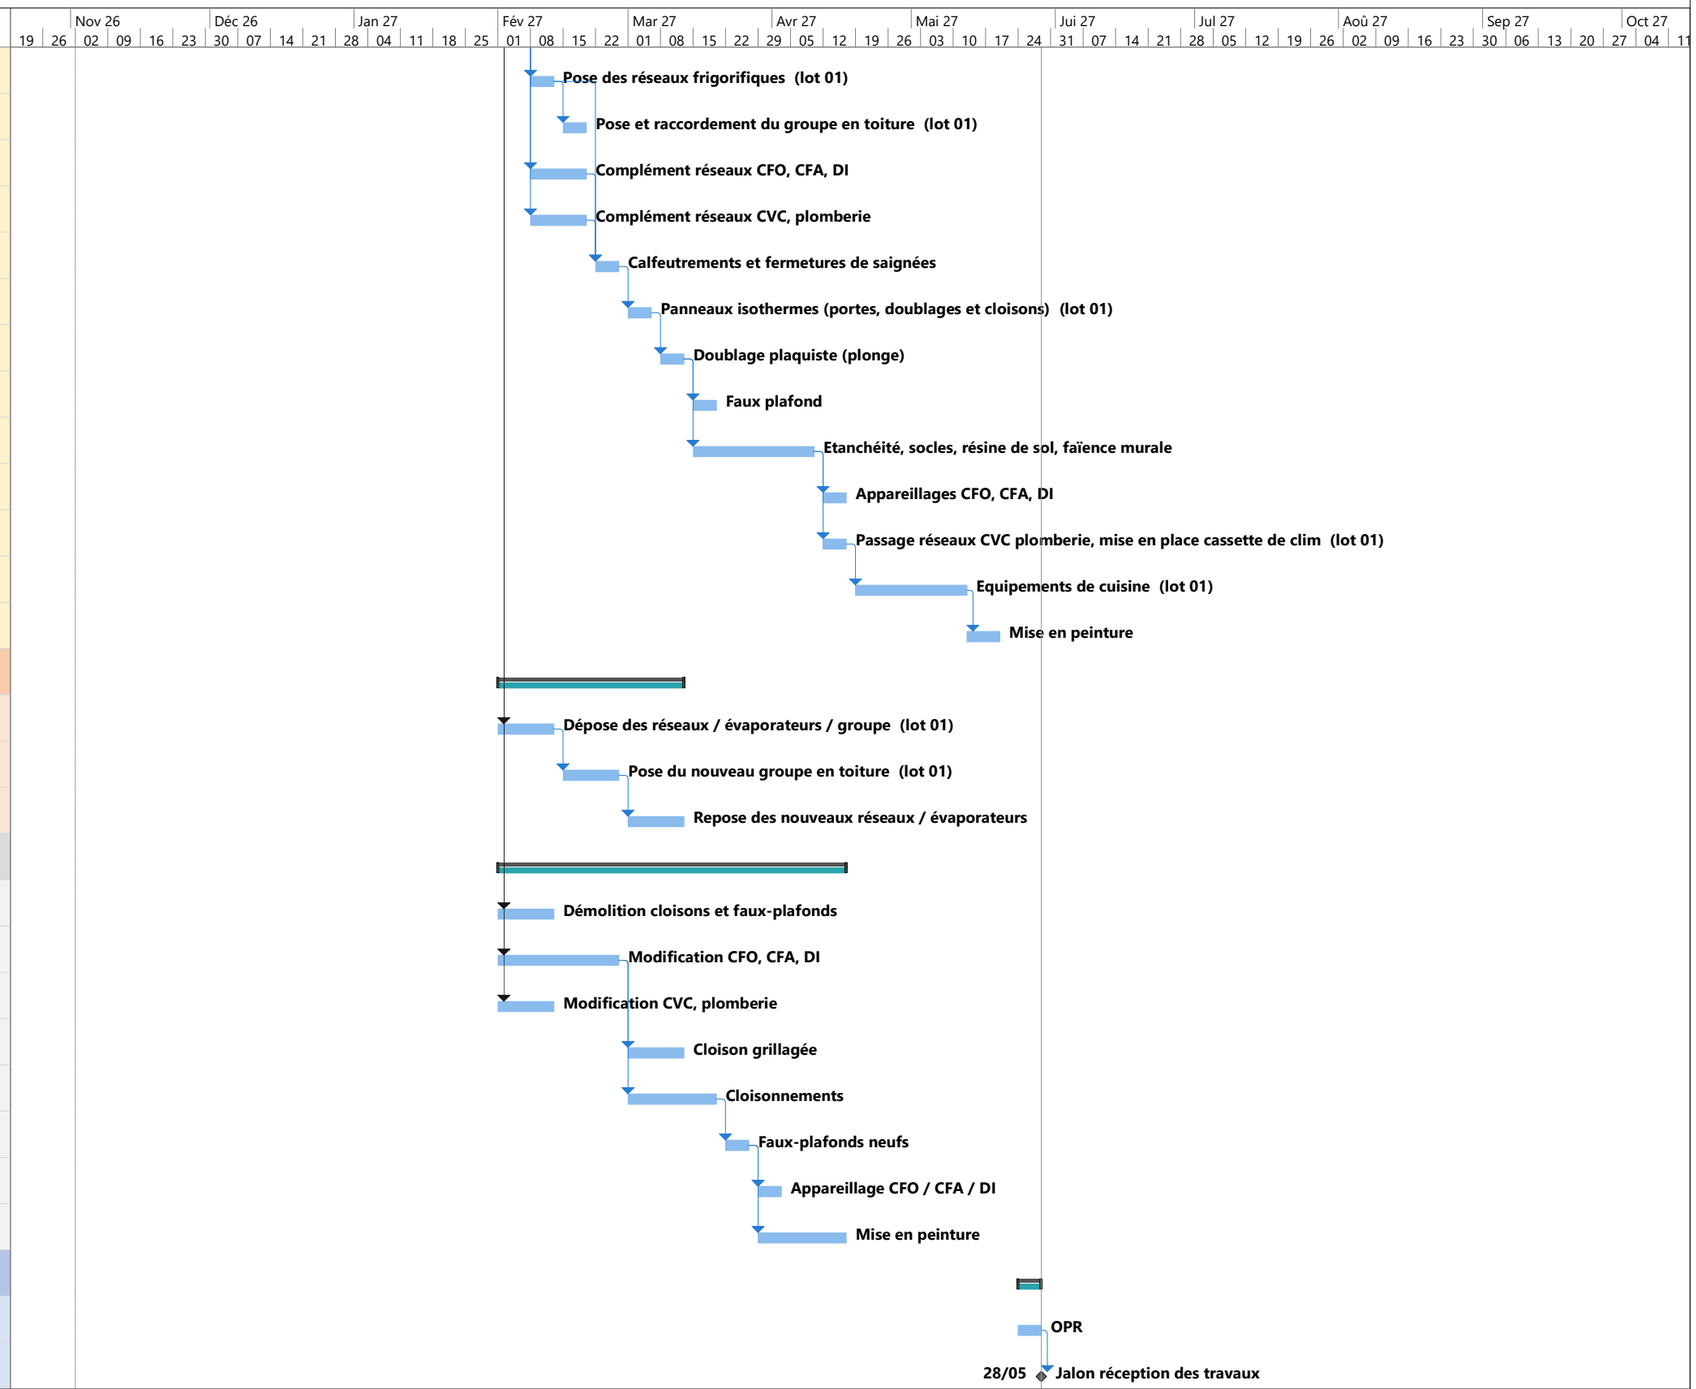

Mar 01/09/26
