BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
DBE 78 95 92
Immeuble Le GAIA
333 avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 31221074/S1/1/AM-RTV_V2

Rédigé le : 13/05/2026
Annule et remplace : 31221074/S1/1/AM-RTV_V1 en date du 16/04/2026
Référence au programme de travaux :
Mail réalisé le 16/03/2026 par Assemblée nationale - Claire Nathan

DONNEUR D'ORDRE

ASSEMBLEE NATIONALE

Maelle Bidan
126 RUE DE L UNIVERSITE
75355 PARIS

SITE D'INTERVENTION

PALAIS BOURBON

126 RUE DE L UNIVERSITE
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

ASC - BUVETTE PARLEMENTAIRE

Date(s) d'intervention(s) :
Du 01/04/2026 au 02/04/2026 ; Le 04/05/2026

SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Camille DUPONT	Chargé d'affaires	Certification N° CPDI7616 Version 001	Camille DUPONT

Le présent rapport comporte 48 pages, dont 29 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

Copyright BUREAU VERITAS

SOMMAIRE

0. HISTORIQUE DES VERSIONS 3

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION 3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 6

2. CONCLUSIONS 7
2.1. Obligations réglementaires 8

3. INFORMATIONS GENERALES 9
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 9
3.2. Parties prenantes 9

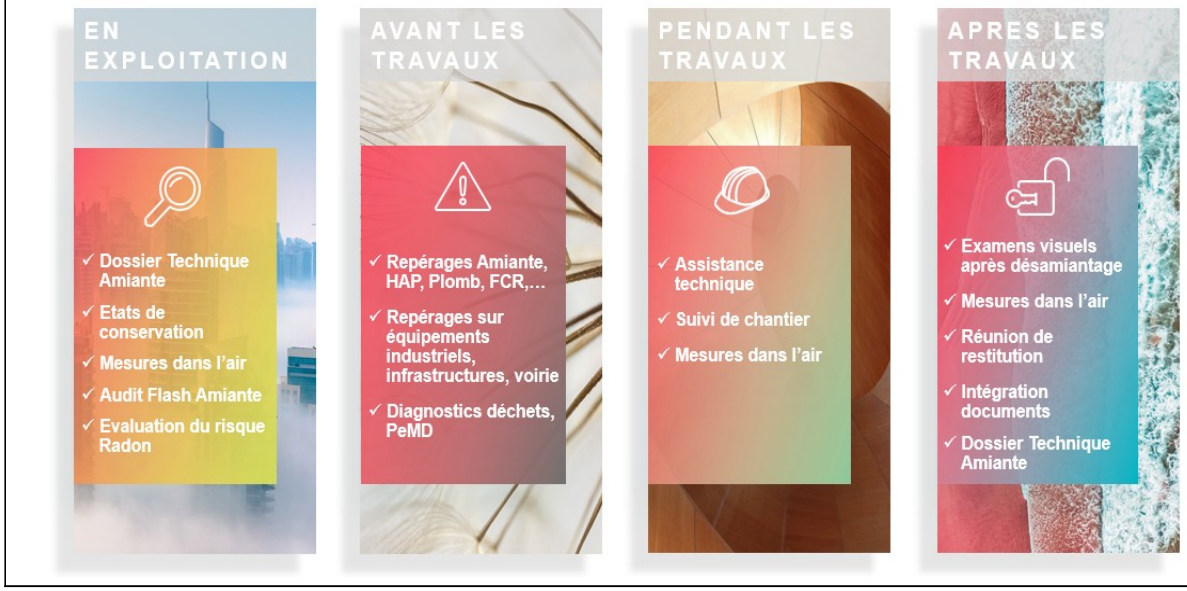
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE 9
4.1. Références réglementaires 9

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 10
5.1. Date(s) de visite(s) 10
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 10
5.3. Conditions spécifiques 10
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 10

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 11
6.1. Matériaux et produits repérés 11

7. ANNEXES 20
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 20
7.2. Photos prélèvements 21
7.3. Attestation d'assurance 27
7.4. Certificat de compétence 29
7.5. Croquis de repérage 30
7.6. Rapport d'analyse du laboratoire 34

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



0. HISTORIQUE DES VERSIONS

Version	Date version	Motif de révision
V1	16/04/2026	Repérage initial
V2	13/05/2026	Complément suite à la demande du client.

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
-Rénovation de l'ascenseur. -Curage des locaux : Stockage pompe à bière, Bureau, LT, Poubelles. -Réfection de la résine au sol et remise en peinture des locaux : Circulation 1 et 2, Stockage, Alcool,. -Dépose de la cloison vitrée entre la salle commune et la circulation 1. -Création d'un trou pour passage de câble/conduit dans le mur entre la salle Economat et Stockage pompe à bière. -Dépose des cloisons des locaux : Local 1 et 2.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Peintures, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints d'écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutrements, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutrements, Ossature, Rebouchages, Volets
07 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Cloisons palière monte-charges	Panneaux
Cloisons palières ascenseur	
Convecteurs électriques	Calorifugeages
Equipements	
Matériel en machinerie ascenseur	Eléments de protection contre les arcs électriques , Freins d'ascenseurs, Joints plats, Tresses
Matériel en machinerie escalier mécanique	Eléments de protection contre les arcs électriques , Joints plats, Tresses
Matériel en machinerie monte-charges	Eléments de protection contre les arcs électriques , Joints plats, Tresses
Parois des ascenseurs	Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Parois des escaliers mécaniques	Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Parois des monte-charges	Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Portes palière ascenseur	Panneaux
Portes palière monte-charges	
08 - Equipements divers et accessoires	
Aerothermes	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Bacs à sable incendie	Eléments en fibres-ciment
Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Câbles électriques	Gaine/Enveloppe, Tresses/Isolant
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Chaudières (mixtes, collectives)	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Chauffes bains	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Coffres-forts	Parois, Portes
Convecteurs électriques	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Isolants thermiques cartonnés, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses des diffuseurs
Equipements	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Embrayage, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Freins d'ascenseurs, Joints, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Mastics, Peintures, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Etuves	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Eviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Fours	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Fusibles à broche	Carton, Tresses
Groupes électrogènes	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Jardinières	Eléments en fibres-ciment
Poêles	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Portes de placard	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Pots de fleur	Eléments en fibres-ciment
Radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés, Tresses des diffuseurs
Radiateurs gaz modulables	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Tuyauteries	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

1.3. Périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

RDC : Zone buvette des parlementaires.
Machinerie ascenseur, gaine et cabine de l'ascenseur.

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : PALAIS BOURBON
126 RUE DE L UNIVERSITE
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
PALAIS BOURBON	Autres	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Maelle Bidan	Donneur d'ordre	ASSEMBLEE NATIONALE	126 RUE DE L UNIVERSITE 75355 PARIS	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 01/04/2026 au 02/04/2026
Le 04/05/2026

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux	Assemblée nationale - Claire Nathan	16/03/2026	Mail	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Stockage et pompe à bière	Conduits	Calorifugeages	/	/	13	P26* N	/	AN	/	Non
	Conduits	Enveloppes de calorifuges	/	/	13	P26* N	/	AN	/	Non
	Conduits	Calorifugeages	/	/	13	P27 N	/	AN	/	Non
	Conduits	Enveloppes de calorifuges	/	/	13	P27 N	/	AN	/	Non
	Conduits	Calorifugeages	/	/	15	P30* N	/	AN	/	Non
	Conduits	Enveloppes de calorifuges	/	/	15	P30* N	/	AN	/	Non
	Conduits	Calorifugeages	/	/	15	P31 N	/	AN	/	Non
	Conduits	Enveloppes de calorifuges	/	/	15	P31 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Stockage et pompe à bière	Conduits	Mastics	/	/	16	P32* N	/	AN	/	Non
	Conduits	Mastics	/	/	16	P33 N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	Idem P 14	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	4	Idem P 18	/	AN	Résine de sol	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	5	Idem P 13	/	AN	/	Non
RDC -> Economa	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	Idem P 14	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	4	Idem P 18	/	AN	Résine de sol	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	5	Idem P 13	/	AN	/	Non
RDC -> Circulation 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	Idem P 14	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	4	Idem P 18	/	AN	Résine de sol	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Circulation 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	5	Idem P 13	/	AN	/	Non
RDC -> Circulation 2	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	P14* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	6	P15* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	8	P16* N	/	AN	Résine de sol	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	8	P17 N	/	AN	Résine de sol	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	4	P18* N	/	AN	Résine de sol	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	5	P13* N	/	AN	/	Non
RDC -> Circulation 3	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	Idem P 14	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	11	Idem P 23	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	5	Idem P 13	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	18	Idem P 35	/	AN	/	Non
RDC -> Local 1	Faux plafonds	Plaques	/	/	17	P34* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Local 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	Idem P 14	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	11	Idem P 23	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	5	Idem P 13	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	18	Idem P 35	/	AN	/	Non
RDC -> Local 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	18	P35* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	18	P36 N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	Idem P 14	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	11	Idem P 23	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	5	Idem P 13	/	AN	/	Non
RDC -> Salle commune	Faux plafonds	Plaques	/	/	12	P25* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	14	P28* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	14	P29 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Salle commune	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	Idem P 14	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	5	Idem P 13	/	AN	/	Non
RDC -> Escalier	Conduits	Calorifugeages	/	/	23	P45* N	/	AN	/	Non
	Conduits	Enveloppes de calorifuges	/	/	23	P45* N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 2	Conduits	Calorifugeages	/	/	9	P19* N	/	AN	/	Non
	Conduits	Enveloppes de calorifuges	/	/	9	P19* N	/	AN	/	Non
	Conduits	Calorifugeages	/	/	9	P20 N	/	AN	/	Non
	Conduits	Enveloppes de calorifuges	/	/	9	P20 N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	Idem P 14	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	10	Idem P 21	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	/	10	Idem P 21	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	5	Idem P 13	/	AN	/	Non
RDC -> LT CVC	Equipements	Joints d'étanchéité	/	/	24	P46* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> LT CVC	Equipements	Joints d'étanchéité	/	/	25	P47* N	/	AN	/	Non
	Equipements	Joints d'étanchéité	/	/	26	P48* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	Idem P 14	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	10	Idem P 21	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	/	10	Idem P 21	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	5	Idem P 13	/	AN	/	Non
	Conduits	Calorifugeages	/	/	13	Idem P 26	/	AN	/	Non
	Conduits	Enveloppes de calorifuges	/	/	13	Idem P 26	/	AN	/	Non
	Conduits	Calorifugeages	/	/	15	Idem P 30	/	AN	/	Non
	Conduits	Enveloppes de calorifuges	/	/	15	Idem P 30	/	AN	/	Non
RDC -> Ascenseur	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	2	P4* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	2	P5 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	P1* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	P2 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Ascenseur	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	P3 N	/	AN	/	Non
RDC -> Poubelles	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	10	P21* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	/	10	P21* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	10	P22 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	/	10	P22 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	11	P23* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	11	P24 N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	Idem P 14	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	5	Idem P 13	/	AN	/	Non
RDC -> Stockage	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	6	P10 N	/	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	P11 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	4	P8 N	/	AN	Résine de sol	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	5	P9 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Alcools	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	5	P12 N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	Idem P 14	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	4	Idem P 18	/	AN	Résine de sol	Non
RDC -> LT	Conduits	Flocages	/	/	19	P37* N	/	AN	/	Non
	Conduits	Flocages	/	/	19	P38 N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	Idem P 14	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	10	Idem P 21	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	/	10	Idem P 21	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	5	Idem P 13	/	AN	/	Non
R+1 -> Ascenseur	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	3	P6* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	3	P7 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Cuisine	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	20	P39* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Cuisine	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	20	P40 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	21	P41* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	21	P42 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	/	22	P43* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	/	22	P44 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	5	Idem P 13	/	AN	/	Non
Local sur escalier	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	27	P49* N	/	AN	/	Non

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
RDC	/
RDC -> Stockage et pompe à bière	/
RDC -> Economa	/
RDC -> Circulation 1	/
RDC -> Circulation 2	/
RDC -> Circulation 3	/
RDC -> Local 1	/
RDC -> Local 2	/
RDC -> Salle commune	/
RDC -> Escalier	/
RDC -> Bureau 2	/
RDC -> LT CVC	/
RDC -> Ascenseur	/
RDC -> Poubelles	/
RDC -> Stockage	/
RDC -> Alcools	/
RDC -> LT	/
R+1	/
R+1 -> Ascenseur	/
R+1 -> Cuisine	/
Local sur escalier	/

7.2. Photos prélèvements

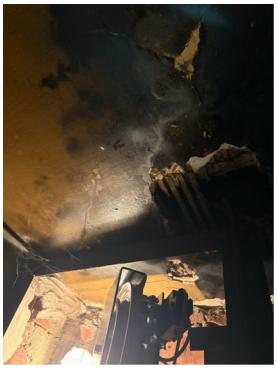
P1	ZPSO 1
RDC -> Ascenseur	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P2	ZPSO 1
RDC -> Ascenseur	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P3	ZPSO 1
RDC -> Ascenseur	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P4	ZPSO 2
RDC -> Ascenseur	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

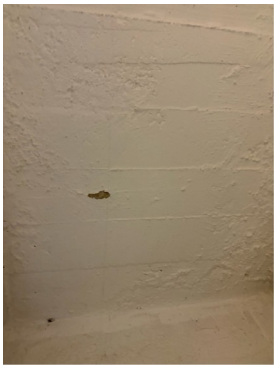
P5	ZPSO 2
RDC -> Ascenseur	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P6	ZPSO 3
R+1 -> Ascenseur	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P7	ZPSO 3
R+1 -> Ascenseur	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

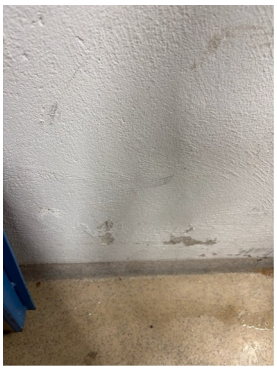
P8	ZPSO 4
RDC -> Stockage	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P9	ZPSO 5
RDC -> Stockage	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P10	ZPSO 6
RDC -> Stockage	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P11	ZPSO 7
RDC -> Stockage	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

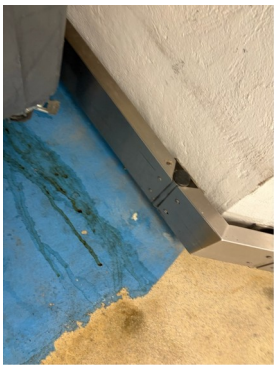
P12	ZPSO 5
RDC -> Alcools	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P13	ZPSO 5
RDC -> Circulation 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P14	ZPSO 7
RDC -> Circulation 2	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P15	ZPSO 6
RDC -> Circulation 2	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P16	ZPSO 8
RDC -> Circulation 2	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P17	ZPSO 8
RDC -> Circulation 2	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P18	ZPSO 4
RDC -> Circulation 2	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P19	ZPSO 9
RDC -> Bureau 2	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A) | Enveloppes de calorifuges	

P21	ZPSO 10
RDC -> Poubelles	
	
Revêtements de sol -> Ragréages | Peintures de sol	

P22	ZPSO 10
RDC -> Poubelles	
	
Revêtements de sol -> Ragréages | Peintures de sol	

P23	ZPSO 11
RDC -> Poubelles	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P25	ZPSO 12
RDC -> Salle commune	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P26	ZPSO 13
RDC -> Stockage et pompe à bière	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A) | Enveloppes de calorifuges	

Copyright BUREAU VERITAS

P27	ZPSO 13
RDC -> Stockage et pompe à bière	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A) | Enveloppes de calorifuges	

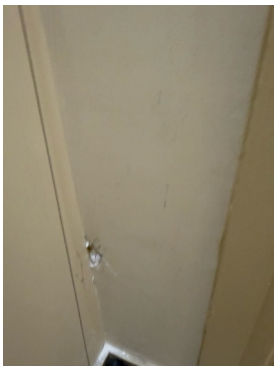
P28	ZPSO 14
RDC -> Salle commune	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P29	ZPSO 14
RDC -> Salle commune	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

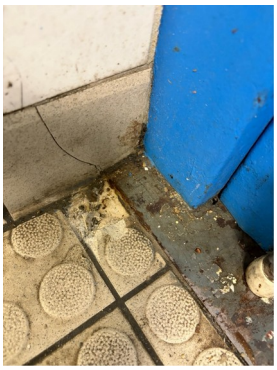
P30	ZPSO 15
RDC -> Stockage et pompe à bière	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A) | Enveloppes de calorifuges	

P31	ZPSO 15
RDC -> Stockage et pompe à bière	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A) | Enveloppes de calorifuges	

P32	ZPSO 16
RDC -> Stockage et pompe à bière	
	
Conduits -> Mastics	

P35	ZPSO 18
RDC -> Local 2	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P37	ZPSO 19
RDC -> LT	
	
Conduits -> Flocages (Liste A)	

P39	ZPSO 20
R+1 -> Cuisine	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P41	ZPSO 21
R+1 -> Cuisine	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P43	ZPSO 22
R+1 -> Cuisine	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

7.3. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Allianz

Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) ..... **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Signed by: LORENZO BATTISTI
EMail: lorenzo.battisti1@allianz.com
Signing time: 23-12-2025 10:46:58
IP address: 165.225.202.119

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.4. Certificat de compétence

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

Certificat diagnostiqueur immobilier numérique

N° CPDI7616 Version 001

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DUPONT Camille

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 10/11/2022 - Date d'expiration : 09/11/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 10/11/2022 - Date d'expiration : 09/11/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée en scannant le QR code ou à l'adresse suivante : https://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/
Valide à partir du 31/03/2026.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

cofrac ACCREDITATION N° 4-0522 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PERSONNES

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev23

7.5. Croquis de repérage

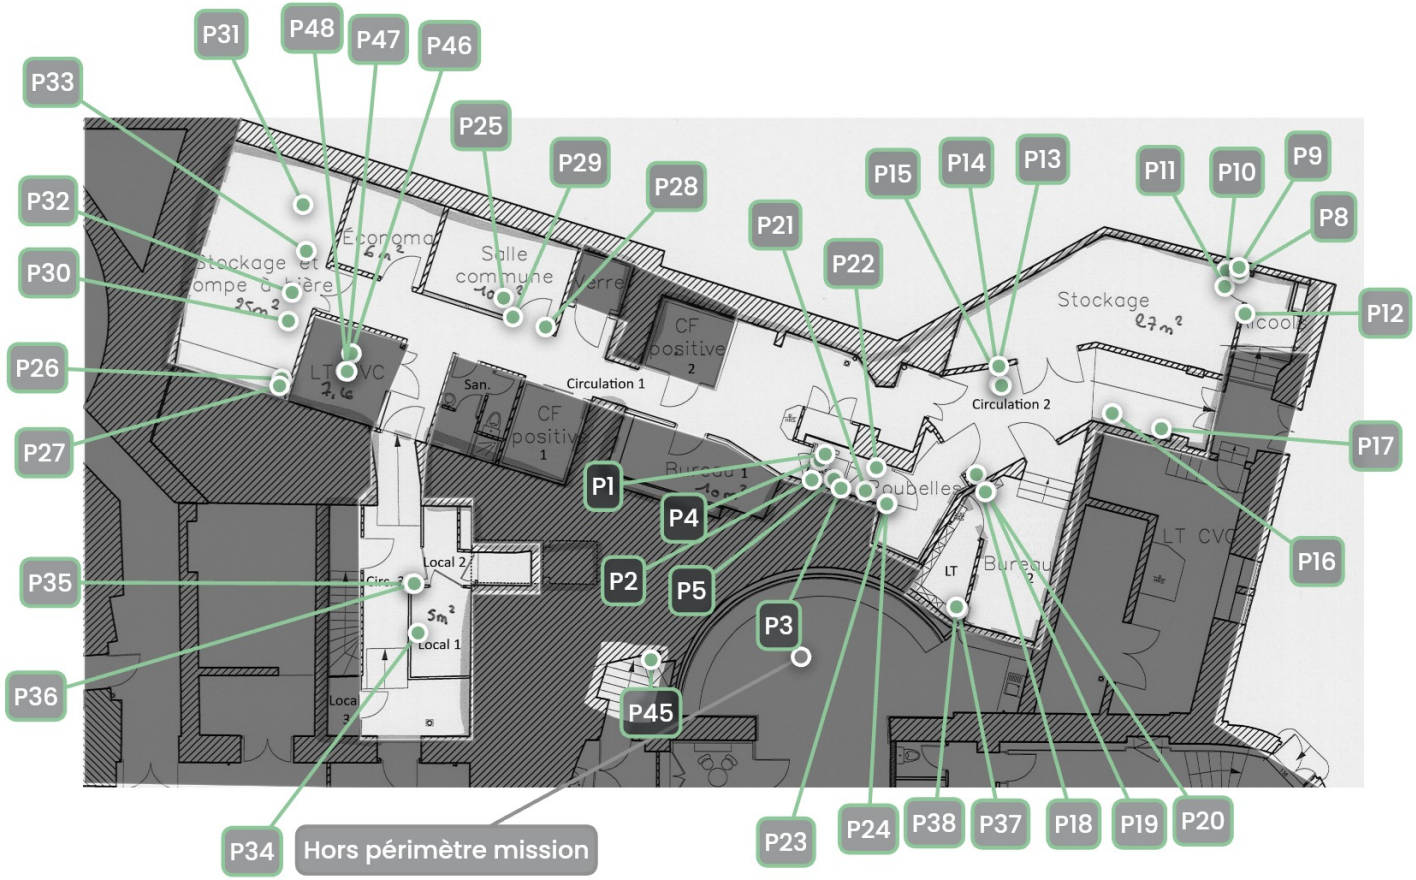
PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	PALAIS BOURBON 126 RUE DE L UNIVERSITE 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	
Localisation RDC	Date visite	Du 01/04/2026 au 02/04/2026
	Auteur	Camille DUPONT
	N° dossier	31221074/S1/1
	Planche	1 / 3
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

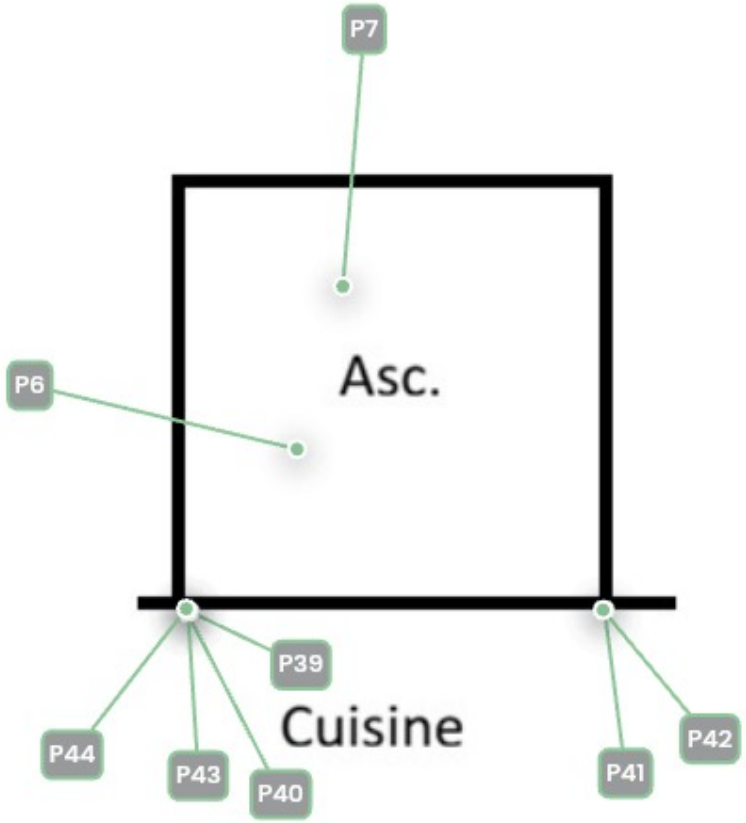
PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	PALAIS BOURBON 126 RUE DE L UNIVERSITE 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	
Localisation R+1	Date visite	Du 01/04/2026 au 02/04/2026
	Auteur	Camille DUPONT
	N° dossier	31221074/S1/1
	Planche	2 / 3
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

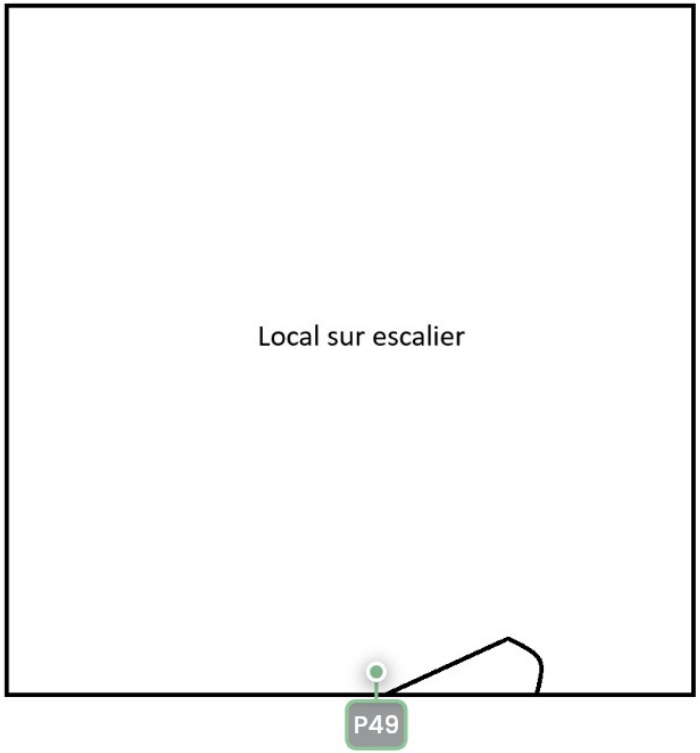
PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	PALAIS BOURBON 126 RUE DE L UNIVERSITE 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	
Localisation Local sur escalier	Date visite	Du 01/04/2026 au 02/04/2026
	Auteur	Camille DUPONT
	N° dossier	31221074/S1/1
	Planche	3 / 3
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-6085 EN DATE DU 08/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client :	BUREAU VERITAS EXPLOITATION - NANTERRE IMMEUBLE LE GAIA 333 Avenue Georges Clemenceau 92000 Nanterre	Réf. Commande ITGA :	IT1426-6085
		Réf. Commande Client :	1510797622/31221074/S1/1/1_31221074/1/1

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 03/04/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2084	
Réf échantillon client : ITM-RHKIK-2988193 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P1 RDC - Ascenseur Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec poussières	
Enduit plâtreux blanc avec poussières	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2085	
Réf échantillon client : ITM-SQZUG-2988192 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P2 RDC - Ascenseur Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène	
Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2086	
Réf échantillon client : ITM-JYBAM-2988191 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P3 RDC - Ascenseur Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA : Enduit beige en vrac hétérogène	
Enduit beige en vrac hétérogène	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB (5)
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2087	
Réf échantillon client : ITM-LRXBR-2988190 - [Revêtements de sol : Ragréages] - [rel : P4 RDC - Ascenseur Revêtements de sol : Ragréages]		Description ITGA : Ragréage gris hétérogène	
Ragréage gris hétérogène	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2088	
Réf échantillon client : ITM-ZFZDJ-2988189 - [Revêtements de sol : Ragréages] - [rel : P5 RDC - Ascenseur Revêtements de sol : Ragréages]		Description ITGA : Ragréage gris en vrac hétérogène	
Ragréage gris en vrac hétérogène	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB (5)
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2089	
Réf échantillon client : ITM-TNHLB-2988188 - [Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P6 R+1 - Ascenseur Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec poussières	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc avec poussières (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB (6)
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2090	
Réf échantillon client : ITM-RIGFV-2988187 - [Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P7 R+1 - Ascenseur Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2091	
Réf échantillon client : ITM-WQJYD-2988202 - [Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment] - [rel : P8 RDC - Stockage Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment]		Description ITGA : Matériau compact beige / Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact beige non séparable + Matériau compact gris hétérogène (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (6)
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2092	
Réf échantillon client : ITM-GLKNA-2988208 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P9 RDC - Stockage Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène	
Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB (5)
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2093	
Réf échantillon client : ITM-HHHJJ-2988207 - [Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P10 RDC - Stockage Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac / Bois massif	
Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB (5)
Bois massif	---	Non analysé	
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2094	
Réf échantillon client : ITM-CLFEZ-2988206 - [Poutres : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P11 RDC - Stockage Poutres : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène	
Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2095	
Réf échantillon client : ITM-AFSMG-2988205 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P12 RDC - Alcools Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB (5)
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2096	
Réf échantillon client : ITM-QXTIP-2988204 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P13 RDC - Circulation 2 Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB (5)
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2097	
Réf échantillon client : ITM-EHKAJ-2988203 - [Poutres : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P14 RDC - Circulation 2 Poutres : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB (5)
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2098	
Réf échantillon client : ITM-WDYHR-2988201 - [Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P15 RDC - Circulation 2 Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2099	
Réf échantillon client : ITM-LVRBN-2988200 - [Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment] - [rel : P16 RDC - Circulation 2 Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
Peinture non séparable + Matériau compact gris (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB (6)
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2100	
Réf échantillon client : ITM-RPWTW-2988225 - [Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment] - [rel : P17 RDC - Circulation 2 Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
Peinture non séparable + Matériau compact gris (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB (6)
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2101	
Réf échantillon client : ITM-UBHGR-2929737 - [Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment] - [rel : P18 RDC - Circulation 2 Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment]		Description ITGA : Matériau compact incolore / Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau compact incolore non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable (1)	META (A) le 08/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : REM (5)
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2102	
Réf échantillon client : ITM-EIIRR-2929738 - [Conduits : Calorifugeages (Liste A) / Enveloppes de calorifuges (Liste B)] - [rel : P19 RDC - Bureau 2 Conduits : Calorifugeages (Liste A) / Enveloppes de calorifuges (Liste B)]		Description ITGA : Toile blanche enduite / Matériau cotonneux blanc en vrac	
Toile blanche enduite non séparable + Matériau cotonneux blanc en vrac (1)	MOLP + META (A) le 08/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ICD (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2103	
Réf échantillon client : ITM-XJBJJ-2929739 - [Conduits : Calorifugeages (Liste A) / Enveloppes de calorifuges (Liste B)] - [rel : P20 RDC - Bureau 2 Conduits : Calorifugeages (Liste A) / Enveloppes de calorifuges (Liste B)]		Description ITGA : Toile blanche enduite / Matériau cotonneux blanc en vrac	
▸ Toile blanche enduite non séparable + Matériau cotonneux blanc en vrac (1)	MOLP + META (A) le 08/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ICD (5)
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2104	
Réf échantillon client : ITM-CWCFY-2929740 - [Revêtements de sol : Ragréages / Peintures de sol] - [rel : P21 RDC - Poubelles Revêtements de sol : Ragréages / Peintures de sol]		Description ITGA : Peinture / Ragréage gris	
▸ Peinture non séparable + Ragréage gris (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB (6)
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2105	
Réf échantillon client : ITM-YAXXX-2929654 - [Revêtements de sol : Ragréages / Peintures de sol] - [rel : P22 RDC - Poubelles Revêtements de sol : Ragréages / Peintures de sol]		Description ITGA : Peinture / Ragréage gris	
▸ Peinture non séparable + Ragréage gris (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (6)
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2106	
Réf échantillon client : ITM-IOCAJ-2929655 - [Revêtements de sol : Colles de carrelage] - [rel : P23 RDC - Poubelles Revêtements de sol : Colles de carrelage]		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2107	
Réf échantillon client : ITM-EHPMK-2929656 - [Revêtements de sol : Colles de carrelage] - [rel : P24 RDC - Poubelles Revêtements de sol : Colles de carrelage]		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (5)
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2108	
Réf échantillon client : ITM-GFACU-2929657 - [Faux plafonds : Plaques (Liste A)] - [rel : P25 RDC - Salle commune Faux plafonds : Plaques (Liste A)]		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux jaune avec poussières	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières (1)	MOLP + META (A) le 08/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ICD (6)
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2109	
Réf échantillon client : ITM-IADSZ-2929658 - [Conduits : Calorifugeages (Liste A) / Enveloppes de calorifuges (Liste B)] - [rel : P26 RDC - Stockage et pompe à bière Conduits : Calorifugeages (Liste A) / Enveloppes de calorifuges (Liste B)]		Description ITGA : Toile bitumée noire / Matériau bleu en mousse	
Toile bitumée noire non séparable + Matériau bleu en mousse non séparable (1)	META (B) le 08/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : REM (6)
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2110	
Réf échantillon client : ITM-YMJKG-2929659 - [Conduits : Calorifugeages (Liste A) / Enveloppes de calorifuges (Liste B)] - [rel : P27 RDC - Stockage et pompe à bière Conduits : Calorifugeages (Liste A) / Enveloppes de calorifuges (Liste B)]		Description ITGA : Toile bitumée noire / Matériau bleu en mousse	
Toile bitumée noire non séparable + Matériau bleu en mousse non séparable (1)	META (B) le 08/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : REM (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2111	
Réf échantillon client : ITM-RHLJC-2929660 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe] - [rel : P28 RDC - Salle commune Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe]		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Ragréage beige hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Ragréage beige hétérogène non séparable (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB (6)
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2112	
Réf échantillon client : ITM-KNSSC-2929661 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe] - [rel : P29 RDC - Salle commune Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe]		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2113	
Réf échantillon client : ITM-UBMUF-2929662 - [Conduits : Calorifugeages (Liste A) / Enveloppes de calorifuges (Liste B)] - [rel : P30 RDC - Stockage et pompe à bière Conduits : Calorifugeages (Liste A) / Enveloppes de calorifuges (Liste B)]		Description ITGA : Carton avec aluminium / Matériau fibreux jaune avec poussières	
Carton avec aluminium non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières (1)	MOLP + META (A) le 08/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : ICD (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2114	
Réf échantillon client : ITM-DDLTR-2929663 - [Conduits : Calorifugeages (Liste A) / Enveloppes de calorifuges (Liste B)] - [rel : P31 RDC - Stockage et pompe à bière Conduits : Calorifugeages (Liste A) / Enveloppes de calorifuges (Liste B)]		Description ITGA : Carton avec aluminium / Matériau fibreux jaune avec poussières	
Carton avec aluminium non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières (1)	MOLP + META (A) le 08/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : REM (6)
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2115	
Réf échantillon client : ITM-PZIZI-2929664 - [Conduits : Mastics] - [rel : P32 RDC - Stockage et pompe à bière Conduits : Mastics]		Description ITGA : Peinture / Matériau gris	
Peinture non séparable + Matériau gris non séparable (1)	META (A) le 08/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste(s) : KOB / HRA (6)
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2116	
Réf échantillon client : ITM-TSCWQ-2929665 - [Conduits : Mastics] - [rel : P33 RDC - Stockage et pompe à bière Conduits : Mastics]		Description ITGA : Peinture / Matériau gris	
Peinture non séparable + Matériau gris non séparable (1)	META (A) le 08/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : REM (6)
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2117	
Réf échantillon client : ITM-KPLYA-2929666 - [Faux plafonds : Plaques (Liste A)] - [rel : P34 RDC - Local 1 Faux plafonds : Plaques (Liste A)]		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige non séparable (1)	MOLP + META (A) le 08/04/2026 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HRA (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2118	
Réf échantillon client : ITM-CRYLB-2929667 - [Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot] - [rel : P35 RDC - Local 2 Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot]		Description ITGA : Peinture / Papier / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB (6)
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2119	
Réf échantillon client : ITM-XQRMD-2929668 - [Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot] - [rel : P36 RDC - Local 2 Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Autres fibres inhalables distinguées par D. (3),(4) Analyste : FAF (6)
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2120	
Réf échantillon client : ITM-GKWRE-2929669 - [Conduits : Flocages (Liste A)] - [rel : P37 RDC - LT Conduits : Flocages (Liste A)]		Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières	
▸ Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IUD
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2121	
Réf échantillon client : ITM-AZSWS-2929670 - [Conduits : Flocages (Liste A)] - [rel : P38 RDC - LT Conduits : Flocages (Liste A)]		Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières	
▸ Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 08/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ICD

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2122	
Réf échantillon client : ITM-BOXDS-2929671 - [Revêtements de sol : Colles de carrelage] - [rel : P39 R+1 - Cuisine Revêtements de sol : Colles de carrelage]		Description ITGA : Carrelage / Colle beige hétérogène / Joint cassant gris en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige hétérogène non séparable + Joint cassant gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (5)
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2123	
Réf échantillon client : ITM-OHVGL-2929672 - [Revêtements de sol : Colles de carrelage] - [rel : P40 R+1 - Cuisine Revêtements de sol : Colles de carrelage]		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (5)
▸ Joint cassant gris	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2124	
Réf échantillon client : ITM-QPPWU-2929673 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe] - [rel : P41 R+1 - Cuisine Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe]		Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac / Joint cassant gris / Peinture en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige en vrac	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB (5)
▸ Joint cassant gris + Peinture en faible quantité non séparable (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-6085 EN DATE DU **08/04/2026**

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2125	
Réf échantillon client : ITM-QSIEA-2929674 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe] - [rel : P42 R+1 - Cuisine Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe]		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2126	
Réf échantillon client : ITM-VJTDE-2929675 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence] - [rel : P43 R+1 - Cuisine Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence]		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac / Peinture en vrac / Couche plâtreuse blanche en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise en vrac + Peinture en vrac non séparable + Couche plâtreuse blanche en vrac (1)	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB (5)
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142604-2127	
Réf échantillon client : ITM-XKTJN-2929676 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence] - [rel : P44 R+1 - Cuisine Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence]		Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(4) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(5) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(6) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Marie-Yvonne FALEMATAGIA Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-8315 EN DATE DU 12/05/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client :	BUREAU VERITAS EXPLOITATION - NANTERRE IMMEUBLE LE GAIA 333 Avenue Georges Clemenceau 92000 Nanterre	Réf. Commande ITGA :	IT1426-8315
		Réf. Commande Client :	1510797622/31221074/S1/1/2_31221074/1/1

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 06/05/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142605-2526	
Réf échantillon client : ITM-HGGKZ-3011256 - [Conduits : Calorifugeages (Liste A) / Enveloppes de calorifuges (Liste B)] - [rel : P45 RDC - Escalier Conduits : Calorifugeages (Liste A) / Enveloppes de calorifuges (Liste B)]		Description ITGA : Peinture / Toile blanche plâtrée en vrac / Matériau fibreux jaune	
1 Peinture non séparable + Toile blanche plâtrée en vrac + Matériau fibreux jaune non séparable (1)	MOLP + META (A) le 12/05/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Autres fibres inhalables distinguées par D. (3),(4) Analyste : FAF (5)
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142605-2527	
Réf échantillon client : ITM-ENOHM-3011255 - [Equipements : Joints d'étanchéité] - [rel : P46 RDC - LT CVC Equipements : Joints d'étanchéité]		Description ITGA : Mousse noire	
1 Mousse noire	META (B) le 12/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-8315 EN DATE DU 12/05/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142605-2528	
Réf échantillon client : ITM-ZZBJW-3011254 - [Equipements : Joints d'étanchéité] - [rel : P47 RDC - LT CVC Equipements : Joints d'étanchéité]		Description ITGA : Mousse grise en vrac avec poussières	
1 Mousse grise en vrac avec poussières	META (B) le 12/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (5)
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142605-2529	
Réf échantillon client : ITM-XFFQE-3011253 - [Equipements : Joints d'étanchéité] - [rel : P48 RDC - LT CVC Equipements : Joints d'étanchéité]		Description ITGA : Mousse beige avec poussières	
1 Mousse beige avec poussières	META (B) le 12/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF
Réf dossier client : 31221074		Réf échantillon ITGA : IT142605-2530	
Réf échantillon client : ITM-HQDVT-3011252 - [Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples] - [rel : P49 Local sur escalier Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples]		Description ITGA : Revêtement souple noir avec couche en toile	
1 Revêtement souple noir avec couche en toile	META (A) le 12/05/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste(s) : REM / FAF

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(4) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(5) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
1.accréditation n° 1-5970

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
