L. AYDOSTIAN ARCHITECTE


SARL d'Architecture à associé unique
2, rue de la Thibaudière - 69007 LYON
T. 04 37 70 93 35 - agence@laydostian.com
www.laydostian.com
Siret 503 406 746 00027/ APE 7111Z

Planning général prévisionnel des travaux

Réhabilitation des pièces d'eau de la caserne Combe à Roanne, Loire

08/09/2026

Durée	Nom	Date de début	Date de fin
13	Validation DIAG	15/12/2025	13/01/2026
20	APS	14/01/2026	10/02/2026
0	Point intermédiaire sur dossier APS	26/01/2026	26/01/2026
0	Rendu APS	11/02/2026	11/02/2026
10	Validation APS	11/02/2026	24/02/2026
30	APD	25/02/2026	07/04/2026
0	Point intermédiaire sur dossier APD	11/03/2026	11/03/2026
0	Rendu APD	08/04/2026	08/04/2026
47	Validation APD	08/04/2026	15/06/2026
30	PRO	16/06/2026	28/07/2026
0	Rendu PRO	29/07/2026	29/07/2026
10	Validation PRO + retours BC et SPS	29/07/2026	11/08/2026
10	Mise au point DCE + pièces administratives	12/08/2026	09/09/2026
25	Consultation des entreprises	10/09/2026	14/10/2026
30	Analyse des offres	15/10/2026	26/11/2026
15	Présentation ACT notification des marchés	27/11/2026	17/12/2026
544	CHANTIER	18/12/2026	02/04/2029
20	préparation de chantier	18/12/2026	26/01/2027
43	BATIMENT D_5 logements	27/01/2027	26/03/2027
10	LOT 01 DESAMIANTAGE	27/01/2027	09/02/2027
28	LOT 02 SECOND OEUVRE	10/02/2027	19/03/2027
28	LOT 03 PLOMBERIE	10/02/2027	19/03/2027
28	LOT 04 ELECTRICITE	10/02/2027	19/03/2027
0	Appartement témoin?	27/01/2027	27/01/2027
0	D_Réception	22/03/2027	22/03/2027
5	D_Levée de réserves	22/03/2027	26/03/2027
118	BATIMENT E_36 logements	29/03/2027	27/09/2027
10	LOT 01 DESAMIANTAGE	29/03/2027	09/04/2027
103	LOT 02 SECOND OEUVRE	12/04/2027	20/09/2027
103	LOT 03 PLOMBERIE	12/04/2027	20/09/2027
103	LOT 04 ELECTRICITE	12/04/2027	20/09/2027
0	E_Réception	21/09/2027	21/09/2027
5	E_Levée de réserves	21/09/2027	27/09/2027
123	BATIMENT F_38 logements	28/09/2027	29/03/2028
10	LOT 01 DESAMIANTAGE	28/09/2027	11/10/2027
108	LOT 02 SECOND OEUVRE	12/10/2027	22/03/2028
108	LOT 03 PLOMBERIE	12/10/2027	22/03/2028
108	LOT 04 ELECTRICITE	12/10/2027	22/03/2028
0	F_Réception	23/03/2028	23/03/2028
5	F_Levée de réserves	23/03/2028	29/03/2028
123	BATIMENT G_38 logements	30/03/2028	09/10/2028
10	LOT 01 DESAMIANTAGE	30/03/2028	12/04/2028
108	LOT 02 SECOND OEUVRE	13/04/2028	02/10/2028
108	LOT 03 PLOMBERIE	13/04/2028	02/10/2028
108	LOT 04 ELECTRICITE	13/04/2028	02/10/2028
0	G_Réception	03/10/2028	03/10/2028
5	G_Levée de réserves	03/10/2028	09/10/2028

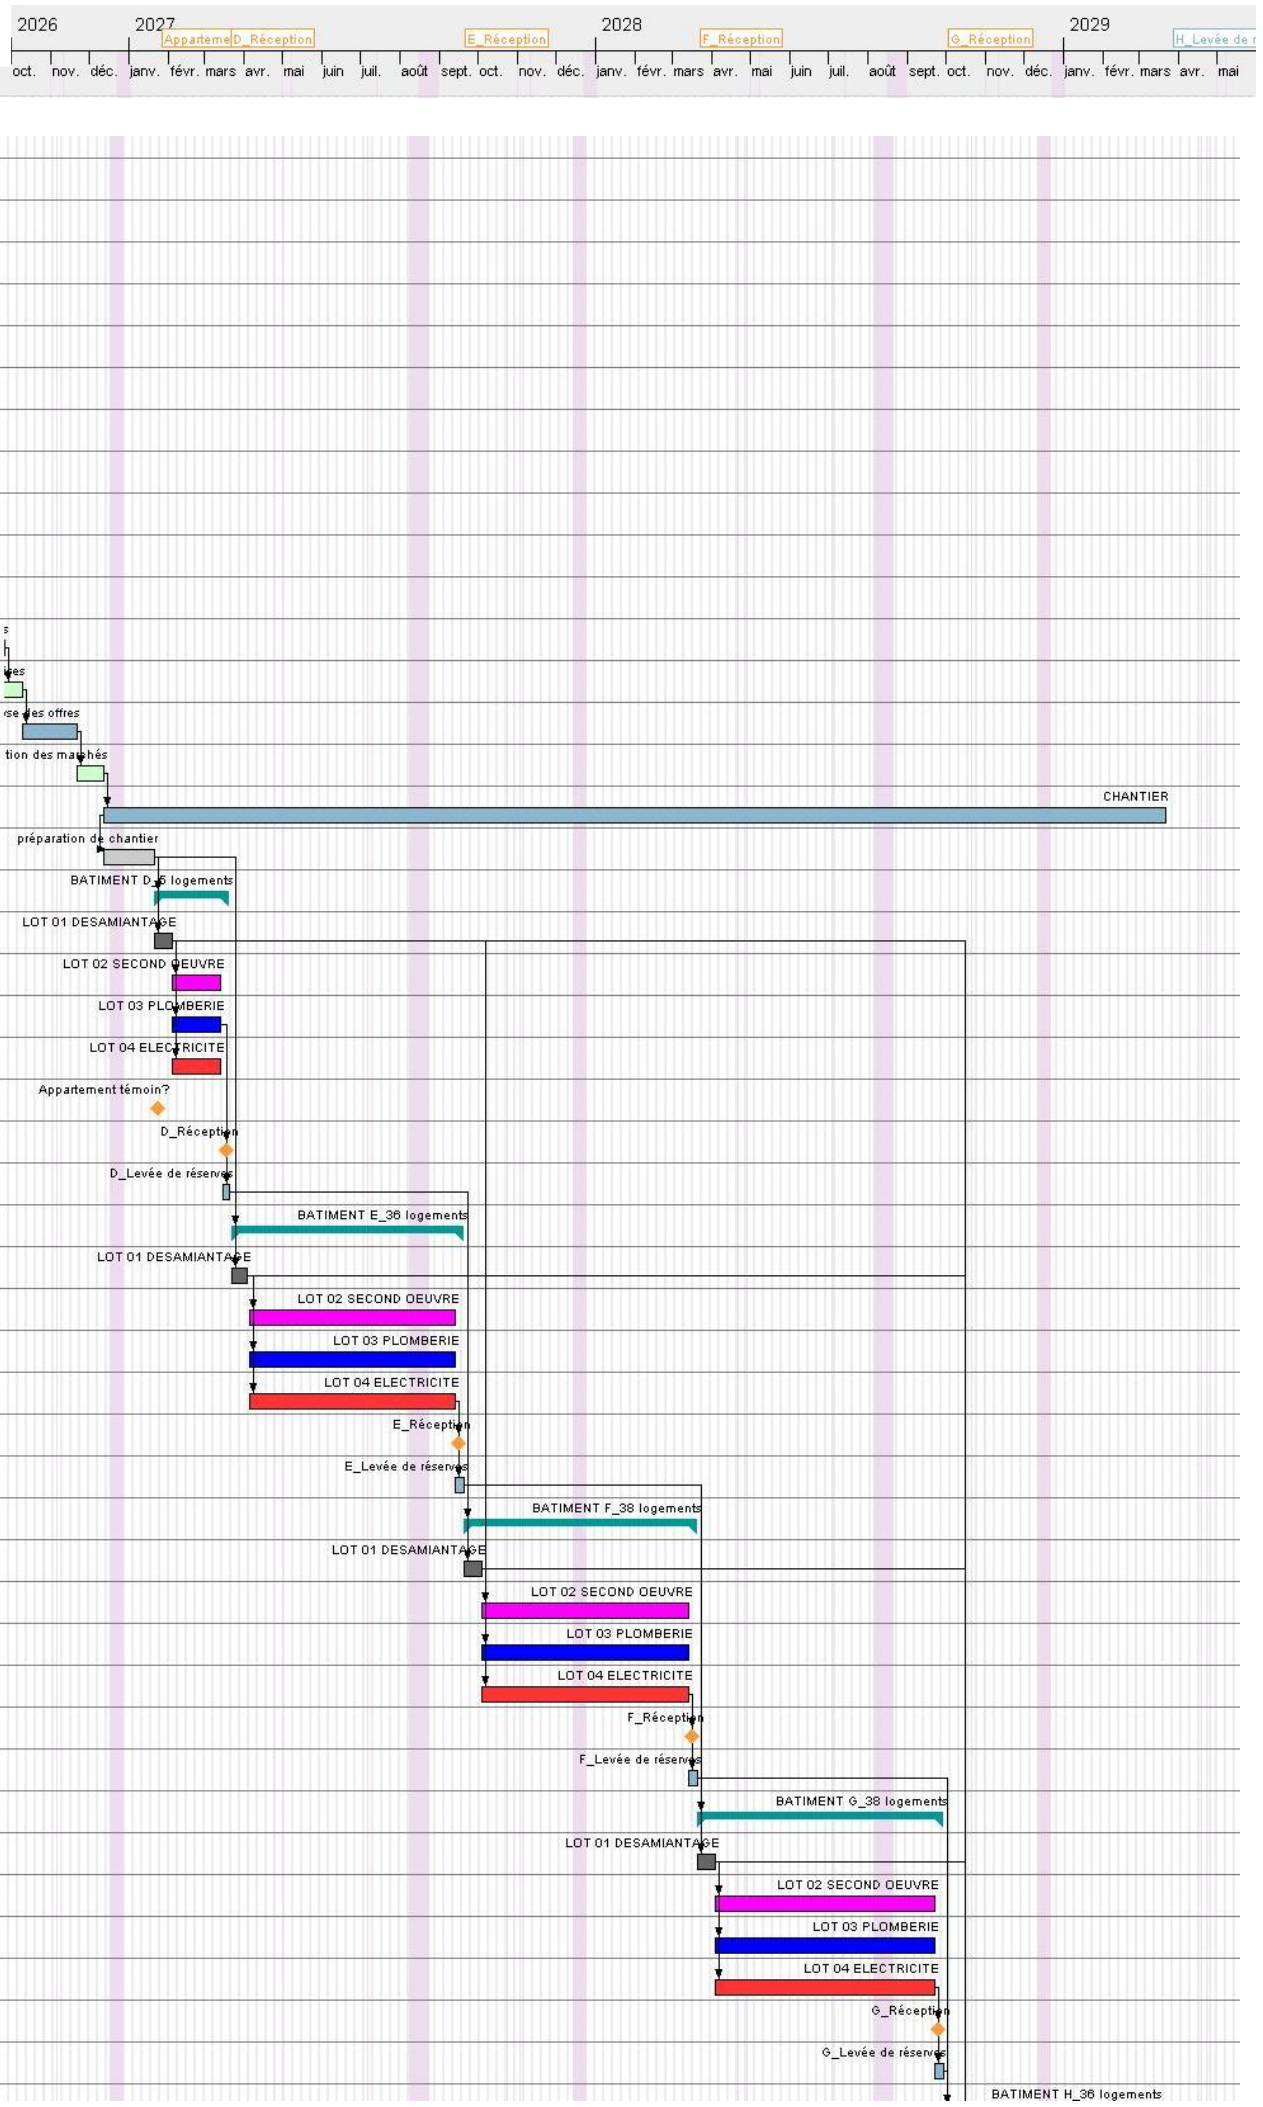

L. AYDOSTIAN ARCHITECTE

SARL d'Architecture à associé unique
2, rue de la Thibaudière - 69007 LYON
T. 04 37 70 93 35 - agence@laydostian.com
www.laydostian.com
Siret 503 406 746 00027/ APE 7111Z

Planning général prévisionnel des travaux


Réhabilitation des pièces d'eau de la caserne Combe à Roanne, Loire

08/09/2026

Planning détaillé type _ 5 logements

Bâtiment D


Durée	Nom	Date de début	Date de fin
28	Allée_5 logements	25/01/2027	03/03/2027
1	LOT 03_Consignation des réseaux	25/01/2027	25/01/2027
10	LOT 01_Dépose des baignoires et évacua...	26/01/2027	08/02/2027
5	LOT 01_Dépose des sanitaires	26/01/2027	01/02/2027
1	LOT 01_Dépose des meubles cuisine et évier	26/01/2027	26/01/2027
3	LOT 03_Dépose des colonnes	27/01/2027	29/01/2027
5	LOT 03_Intervention dans logements	01/02/2027	05/02/2027
5	LOT 04_Electricité réseaux	08/02/2027	12/02/2027
12	LOT 02_Placo doublage et supports	08/02/2027	23/02/2027
6	LOT 02_Carrelage Faïence	08/02/2027	15/02/2027
5	LOT 02_Peinture	16/02/2027	22/02/2027
1	LOT 02_Finitions	23/02/2027	23/02/2027
1	LOT 04_Electricité appareillage	24/02/2027	24/02/2027
4	LOT 03_Pose et raccordement des appareillages	24/02/2027	01/03/2027
2	LOT 03_Remise en route du réseau avec pure et désinfection	02/03/2027	03/03/2027

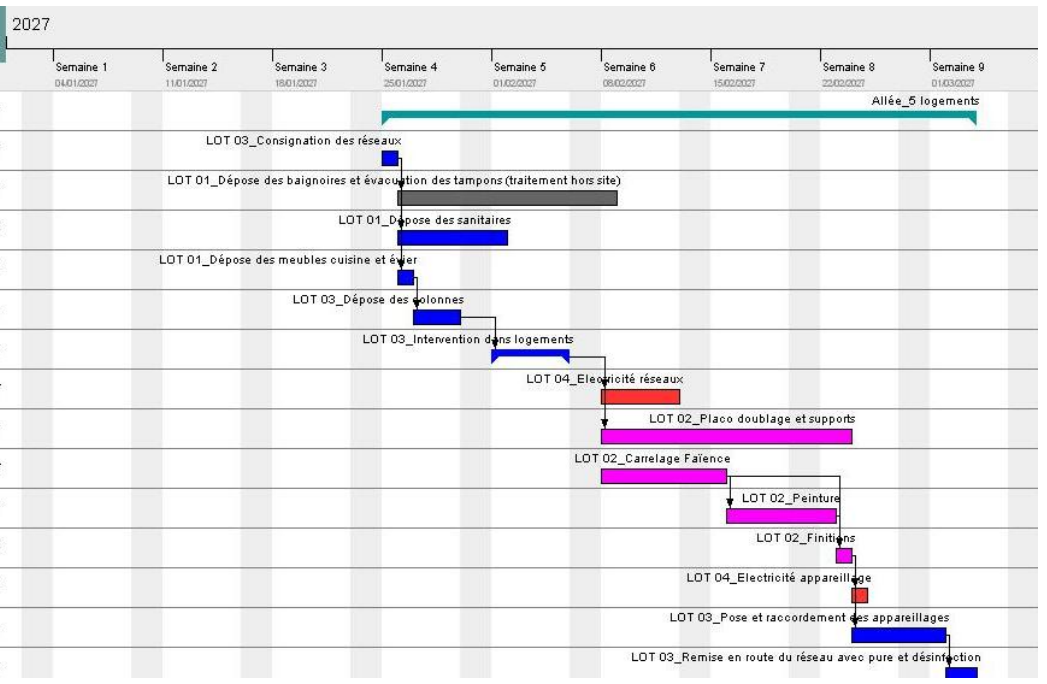

Planning détaillé type _ 10 logements

Allées E3a E3b / H3a H3b

Durée	Nom	Date de début	Date de fin
29	Allée_10 logements	25/01/2027	04/03/2027
1	LOT 03_Consignation des réseaux	25/01/2027	25/01/2027
10	LOT 01_Dépose des baignoires et évacua...	26/01/2027	08/02/2027
5	LOT 01_Dépose des sanitaires	26/01/2027	01/02/2027
2	LOT 01_Dépose des meubles cuisine et évier	26/01/2027	27/01/2027
3	LOT 03_Dépose des colonnes	28/01/2027	01/02/2027
5	LOT 03_Intervention dans logements	02/02/2027	08/02/2027
1	Préparation des attentes et alimentations	02/02/2027	02/02/2027
2	Reprise des évacuations et raccordements	03/02/2027	04/02/2027
2	Réalisation réseaux	05/02/2027	08/02/2027
5	LOT 04_Electricité réseaux	09/02/2027	15/02/2027
12	LOT 02_Placo doublage et supports	09/02/2027	24/02/2027
6	LOT 02_Carrelage Faïence	09/02/2027	16/02/2027
5	LOT 02_Peinture	17/02/2027	23/02/2027
1	LOT 02_Finitions	24/02/2027	24/02/2027
1	LOT 04_Electricité appareillage	25/02/2027	25/02/2027
4	LOT 03_Pose et raccordement des appareillages	25/02/2027	02/03/2027
2	LOT 03_Remise en route du réseau avec pure et désinfection	03/03/2027	04/03/2027

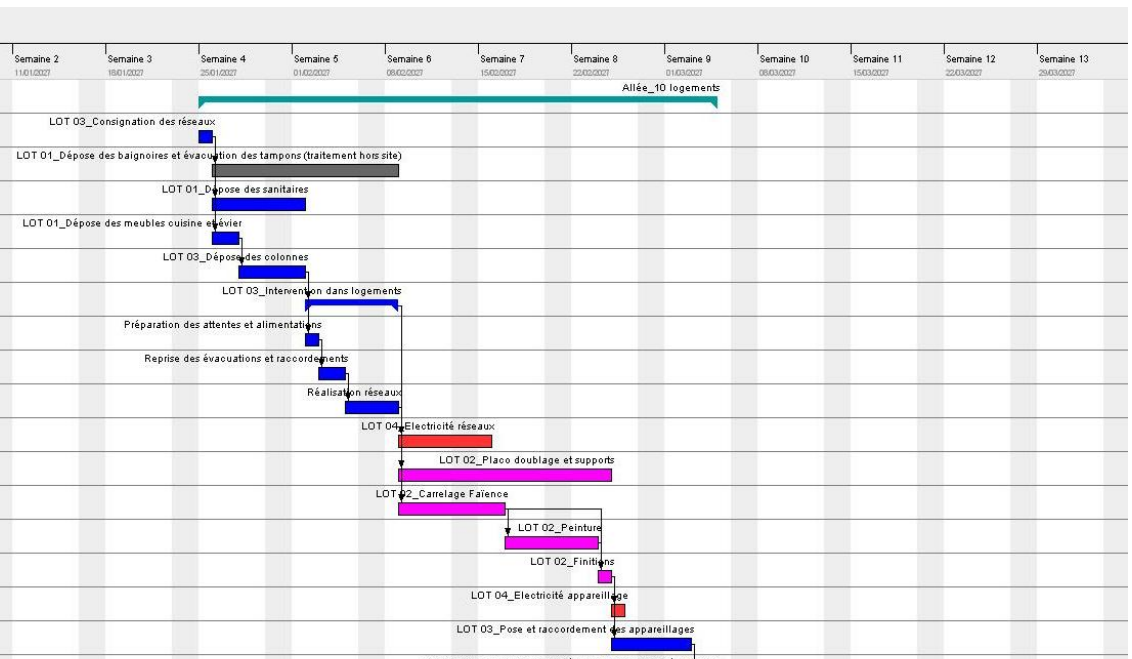

L. AYDOSTIAN ARCHITECTE — BETEG Bureau d'Etudes Techniques

L. AYDOSTIAN ARCHITECTE

SARL d'Architecture à associé unique
2, rue de la Thibaudière - 69007 LYON
T. 04 37 70 93 35 - agence@laydostian.com
www.laydostian.com
Siret 503 406 746 00027/ APE 7111Z

Planning général prévisionnel des travaux


Réhabilitation des pièces d'eau de la caserne Combe à Roanne, Loire

08/09/2026

Planning détaillé type _ 12 logements

Allées E1a E1b / F1a F1b F3a F3b / G1a G1b G3a G3b / H1a H1b /


Durée	Nom	Date de début	Date de fin
34	Allée_12 logements	25/01/2027	11/03/2027
1	LOT 03_Consignation des réseaux	25/01/2027	25/01/2027
10	LOT 01_Dépose des baignoires et évacua...	26/01/2027	08/02/2027
6	LOT 01_Dépose des sanitaires	26/01/2027	02/02/2027
2	LOT 01_Dépose des meubles cuisine et évier	26/01/2027	27/01/2027
5	LOT 03_Dépose des colonnes	28/01/2027	03/02/2027
5	LOT 03_Intervention dans logements	04/02/2027	10/02/2027
1	Préparation des attentes et alimentations	04/02/2027	04/02/2027
2	Reprise des évacuations et raccordements	05/02/2027	08/02/2027
2	Réalisation réseaux	09/02/2027	10/02/2027
7	LOT 04_Electricité réseaux	11/02/2027	19/02/2027
14	LOT 02_Placo doublage et supports	11/02/2027	02/03/2027
7	LOT 02_Carrelage Faïence	11/02/2027	19/02/2027
6	LOT 02_Peinture	22/02/2027	01/03/2027
1	LOT 02_Finitions	02/03/2027	02/03/2027
1	LOT 04_Electricité appareillage	03/03/2027	03/03/2027
5	LOT 03_Pose et raccordement des appareillages	03/03/2027	09/03/2027
2	LOT 03_Remise en route du réseau avec pure et désinfection	10/03/2027	11/03/2027

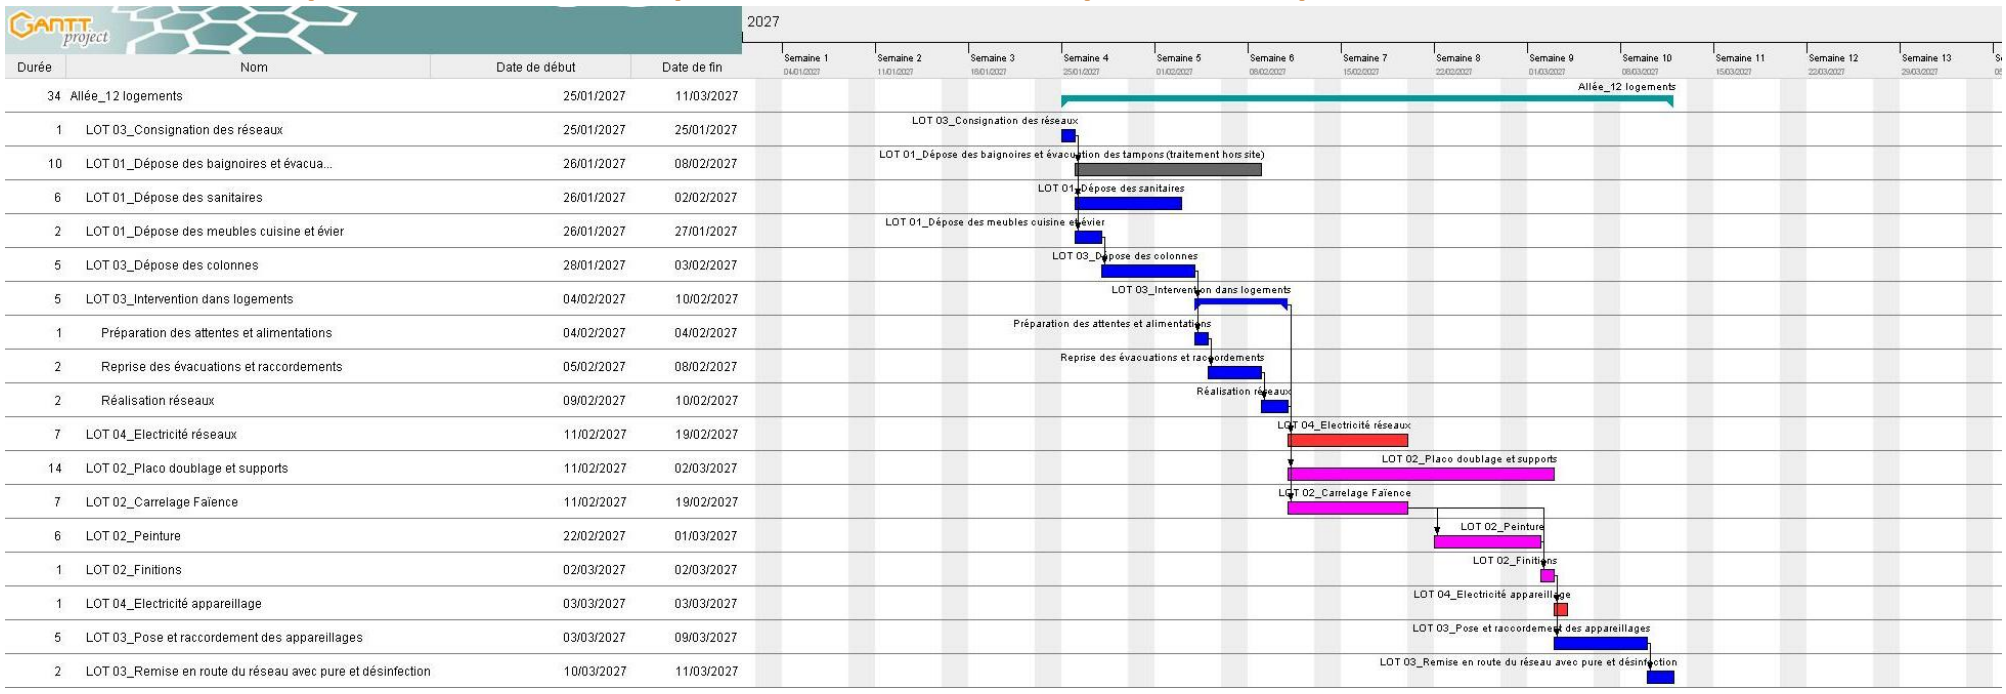

Planning détaillé type _ 14 logements

Allées E12a E2b / F2a F2b / G2a G2b / H2a H2b /

Durée	Nom	Date de début	Date de fin
40	Allée_14 logements	25/01/2027	19/03/2027
1	LOT 03_Consignation des réseaux	25/01/2027	25/01/2027
10	LOT 01_Dépose des baignoires et évacua...	26/01/2027	08/02/2027
5	LOT 01_Dépose des sanitaires	26/01/2027	01/02/2027
3	LOT 01_Dépose des meubles cuisine et évier	26/01/2027	28/01/2027
6	LOT 03_Dépose des colonnes	29/01/2027	05/02/2027
6	LOT 03_Intervention dans logements	08/02/2027	15/02/2027
1	Préparation des attentes et alimentations	08/02/2027	08/02/2027
3	Reprise des évacuations et raccordements	09/02/2027	11/02/2027
2	Réalisation réseaux	12/02/2027	15/02/2027
8	LOT 04_Electricité réseaux	16/02/2027	25/02/2027
16	LOT 02_Placo doublage et supports	16/02/2027	09/03/2027
8	LOT 02_Carrelage Faïence	16/02/2027	25/02/2027
7	LOT 02_Peinture	26/02/2027	08/03/2027
2	LOT 02_Finitions	09/03/2027	10/03/2027
2	LOT 04_Electricité appareillage	11/03/2027	12/03/2027
5	LOT 03_Pose et raccordement des appareillages	11/03/2027	17/03/2027
2	LOT 03_Remise en route du réseau avec pure et désinfection	18/03/2027	19/03/2027

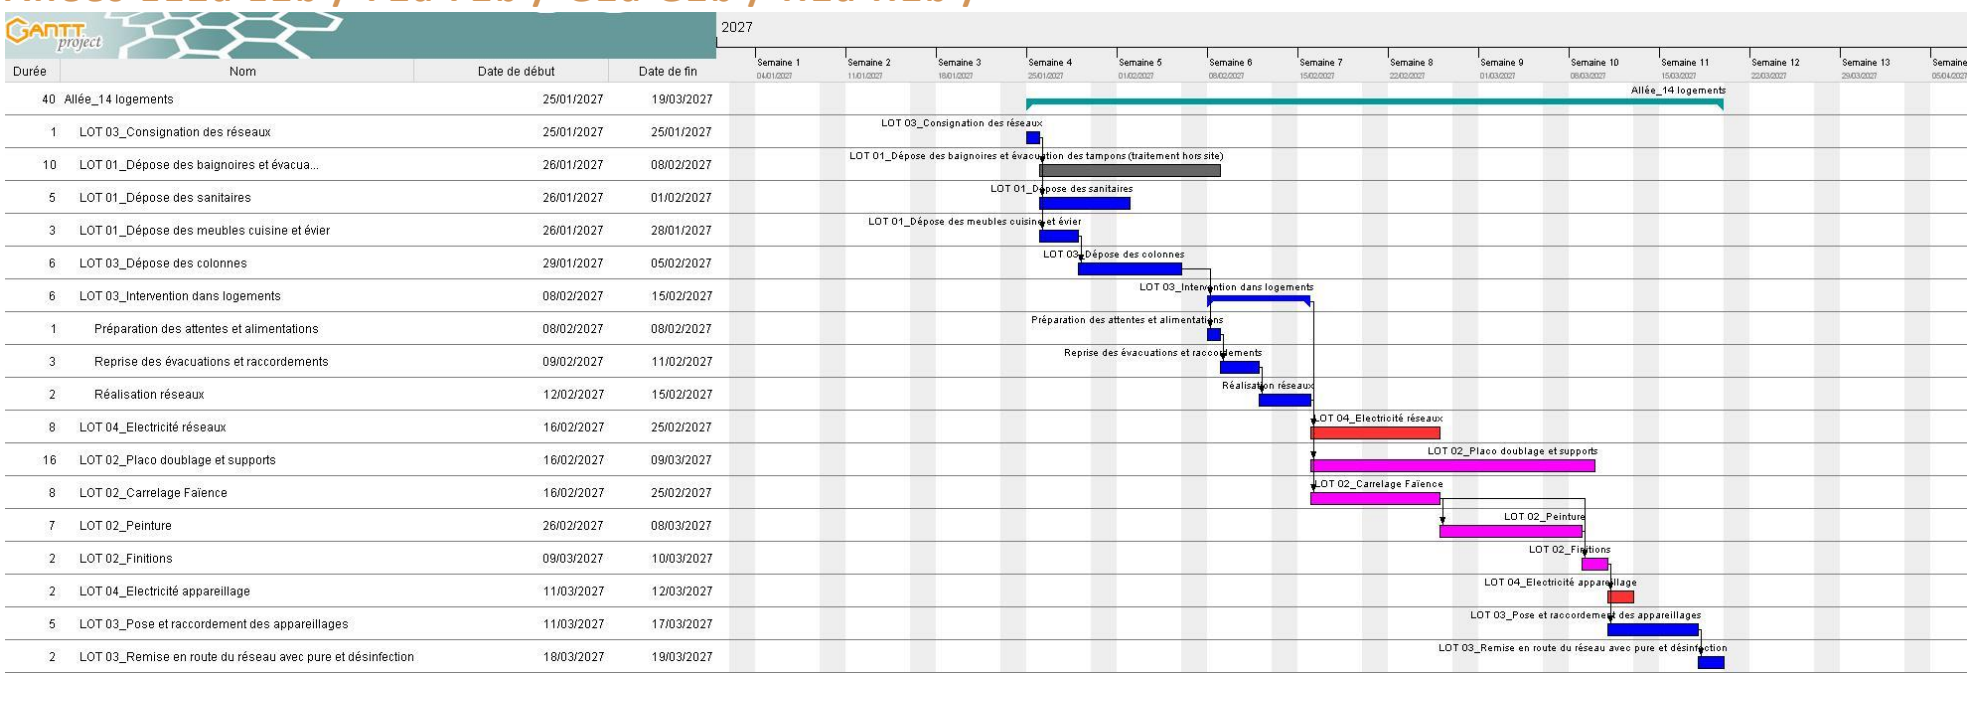

L. AYDOSTIAN ARCHITECTE


SARL d'Architecture à associé unique
2, rue de la Thibaudière - 69007 LYON
T. 04 37 70 93 35 - agence@laydostian.com
www.laydostian.com
Siret 503 406 746 00027/ APE 7111Z

Planning général prévisionnel des travaux

Réhabilitation des pièces d'eau de la caserne Combe à Roanne, Loire

08/09/2026

Identification des colonnes _ 153 logements

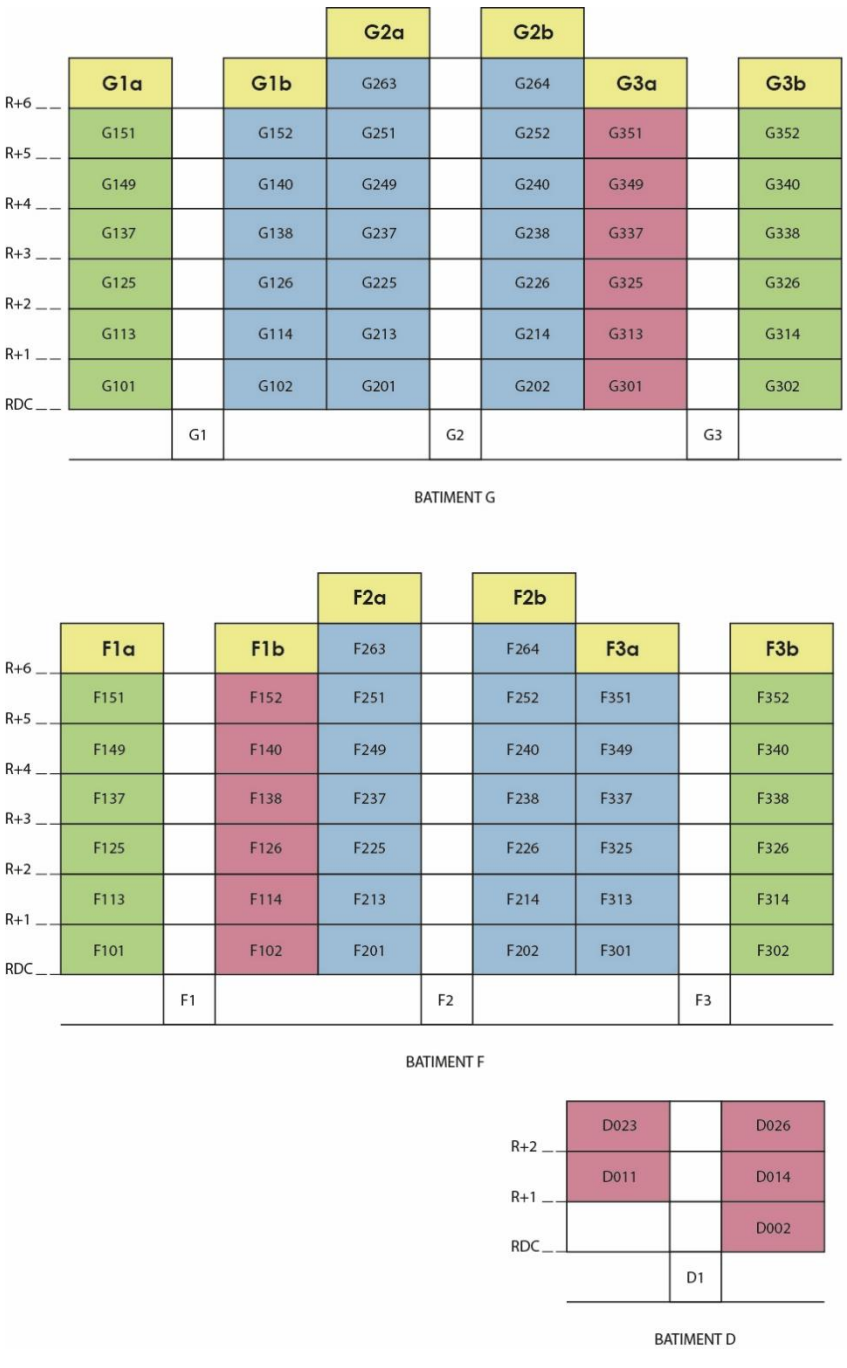

Nombre total de logements : 153

