BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
GEP MED
ZA Lenfant
405, rue Emilien Gautier
13290 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 23573599/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 31/10/2024

Référence au programme de travaux :
N°Contrat N° Q-1801741 - 0797386 réalisé le 02/07/2024 par Patrice FIORUCCI

DONNEUR D'ORDRE

Patrice FIORUCCI
228 RTE DE L AERODROME
DOMAINE ST PAUL STE AGROPARC
CS 40509
84914 AVIGNON CEDEX 9

SITE D'INTERVENTION

DOMAINE SAINT PAUL SITE AGROPARC228
228 ROUTE DE L AERODROME
84140 AVIGNON

Latitude : 43.917154 / Longitude : 4.882752



SYNTHESE DE CONCLUSION

AVEC AMIANTE repéré

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence
david sauvage	Diagnostiqueur	8037832

Signataire du rapport
david sauvage

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION **3**
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 4

2. CONCLUSIONS **5**
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante 5
2.2. Obligations réglementaires 6

3. INFORMATIONS GENERALES **7**
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 7
3.2. Parties prenantes 7

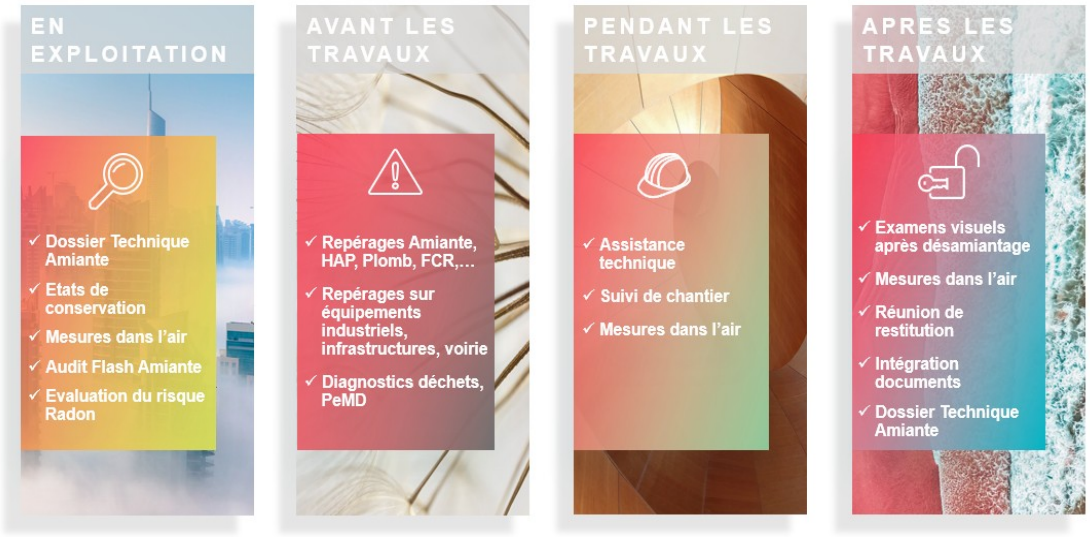
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE **7**
4.1. Références réglementaires 7

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE **8**
5.1. Date(s) de visite(s) 8
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 8
5.3. Conditions spécifiques 8
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 8

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **9**
6.1. Matériaux et produits repérés 9
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante 26

7. ANNEXES **27**
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 27
7.2. Photos prélèvements 29
7.3. Attestation d'assurance 40
7.4. Certificat de compétence 42
7.5. Croquis de repérage 43
7.6. Rapport d'analyse du laboratoire 46

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Les travaux concernent l'ensemble des niveaux (rdc, r+1, combles) Rénovation des bureaux (hors escalier) : sols, murs, plafonds, façades (ITE et fenêtres conservées), pose d'une climatisation. Rdc : cloisons conservées mais percement pour passage de câbles. R+1 : dépose des cloisons et de faux plafonds.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence, Colles de plinthe
04 - Plafonds et faux plafonds	
Faux plafonds	Plaques
Plafonds	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Ragréages, Revêtements de sols sportifs

1.3. Périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
35	Bâtiment 027 -> R+1 -> 16 - Circulation	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris
36	Bâtiment 027 -> R+1 -> 16 - Circulation	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris
35	Bâtiment 027 -> R+1 -> 26 - Bureau	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris
36	Bâtiment 027 -> R+1 -> 28 - Bureau	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris
36	Bâtiment 027 -> R+1 -> 29 - Bureau	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris
36	Bâtiment 027 -> R+1 -> 30 - Bureau	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris
36	Bâtiment 027 -> R+1 -> 31 - Bureau	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : DOMAINE SAINT PAUL SITE AGROPARC228
228 ROUTE DE L AERODROME
84140 AVIGNON

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
DOMAINE SAINT PAUL SITE AGROPARC228	Administrations, bureaux	ERP de la 3ème et la 4ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Patrice FIORUCCI	Donneur d'ordre	/	228 RTE DE L AERODROME 84914 AVIGNON CEDEX 9	0630658576
Patrice FIORUCCI	Accompagnateur	/	/	+33 6 30 65 85 76 - patrice.fiorucci@inrae.fr

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 26/09/2024 au 26/09/2024

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)

5.3. Conditions spécifiques

- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / Programme de travaux	Patrice FIORUCCI	02/07/2024	Contrat N° Q-1801741 - 0797386	/
Repérage amiante avant travaux / Diagnostic Amiante avant travaux	Qualiconsult	19/02/2018	480478	/
Fiche technique / Fiche récapitulative	Ac Environnement	04/02/2021	2101027_Domaine Saint Paul	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 027 -> RDC -> 02 - Hall	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Marron	15	P22* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 02 - Hall	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	15	P22* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 04 -WC handicapé	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	9	P9* N	/	AN	carrelage blanc	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 04 -WC handicapé	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	9	P9* N	/	AN	carrelage blanc	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 04 -WC handicapé	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	9	P10 N	/	AN	carrelage blanc	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 04 -WC handicapé	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	9	P10 N	/	AN	carrelage blanc	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 04 -WC handicapé	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc	10	P11* N	/	AN	plinthes blanches	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 04 -WC handicapé	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc	10	P12 N	/	AN	plinthes blanches	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 027 -> RDC -> 04 -WC handicapé	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	11	P13* N	/	AN	faïences vertes	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 04 -WC handicapé	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	11	P14 N	/	AN	faïences vertes	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 04 -WC handicapé	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	19	Idem P 30	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 04 -WC handicapé	Plafonds	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	20	Idem P 32	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 04 -WC handicapé	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Lissé	/	24	Idem P 39	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 05 - Bureau	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Lissé	Blanc	14	Idem P 20	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 05 - Bureau	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Bois	Beige	49	/	/	PN	parquet bois	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 05 - Bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Lissé	/	24	Idem P 39	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 06 - Bureau	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Lissé	Blanc	14	P20* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 06 - Bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Lissé	/	24	P39* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 06 - Bureau	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Bois	Beige	49	/	/	PN	parquet bois	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 07 - Bureau	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	19	P30* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 027 -> RDC -> 07 - Bureau	Plafonds	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	20	P32* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 07 - Bureau	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Bois	Beige	49	/	/	PN	parquet bois	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 07 - Bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Lissé	/	24	Idem P 39	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 08 - Circulation	Faux plafonds	Plaques	Carton	Blanc	17	P25* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 08 - Circulation	Faux plafonds	Plaques	Carton	Blanc	17	P26 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 08 - Circulation	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Rose	23	P37* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 08 - Circulation	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	23	P37* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 08 - Circulation	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	23	P37* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 08 - Circulation	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Marron	15	Idem P 22	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 08 - Circulation	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	15	Idem P 22	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 08 - Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Blanc	12	Idem P 15	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 09 - Bureau	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Blanc	13	P17* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 09 - Bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Blanc	12	P15* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 027 -> RDC -> 09 - Bureau	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Bois	Beige	49	/	S2	PN	parquet bois parquet bois	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 10 - Bureau	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Lissé	Blanc	14	P19 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 10 - Bureau	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Gris	16	P23* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 10 - Bureau	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	16	P23* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 10 - Bureau	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Gris	16	P24 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 10 - Bureau	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	16	P24 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 10 - Bureau	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Souple	Gris	21	P33* N	/	AN	lé plastique sous dalle plastique	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 10 - Bureau	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	21	P33* N	/	AN	lé plastique sous dalle plastique	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 10 - Bureau	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Souple	Gris	21	P34 N	/	AN	lé plastique sous dalle plastique	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 10 - Bureau	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	21	P34 N	/	AN	lé plastique sous dalle plastique	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 10 - Bureau	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	22	P35* N	/	AN	carrelage beige (sous lé plastique)	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 10 - Bureau	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	22	P35* N	/	AN	carrelage beige (sous lé plastique)	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 027 -> RDC -> 10 - Bureau	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	22	P36 N	/	AN	carrelage beige (sous lé plastique)	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 10 - Bureau	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	22	P36 N	/	AN	carrelage beige (sous lé plastique)	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 10 - Bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Lissé	/	24	Idem P 39	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 11 - Bureau	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Marron	15	P21 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 11 - Bureau	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	15	P21 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 11 - Bureau	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc	18	P27* N	/	AN	plinthes grises	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 11 - Bureau	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc	18	P28 N	/	AN	plinthes grises	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 11 - Bureau	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Blanc	13	Idem P 17	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 12 - Bureau	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	19	Idem P 30	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 12 - Bureau	Plafonds	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	20	Idem P 32	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 12 - Bureau	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Bois	Beige	49	/	/	PN	parquet bois	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 12 - Bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Blanc	12	Idem P 15	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 027 -> RDC -> 12 - Bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Lissé	/	24	Idem P 39	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 13 - Bureau	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	19	P29 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 13 - Bureau	Plafonds	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	20	P31 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 13 - Bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Lissé	/	24	P38 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 13 - Bureau	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Bois	Beige	49	/	/	PN	parquet bois	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 13 - Bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Blanc	12	Idem P 15	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 14 - Bureau	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	19	Idem P 30	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 14 - Bureau	Plafonds	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	20	Idem P 32	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 14 - Bureau	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Bois	Beige	49	/	/	PN	parquet bois	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 14 - Bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Blanc	12	Idem P 15	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 14 - Bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Lissé	/	24	Idem P 39	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 15 - Bureau	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Blanc	13	P18 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 027 -> RDC -> 15 - Bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Blanc	12	P16 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> RDC -> 15 - Bureau	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Bois	Beige	49	/	/	PN	parquet bois	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 16 - Circulation	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Orange	44	P68* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 16 - Circulation	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	44	P68* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 16 - Circulation	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Rouge	35	P58* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 16 - Circulation	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	35	P58* P	/	AN	/	***Oui***
Bâtiment 027 -> R+1 -> 16 - Circulation	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Orange	36	P59* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 16 - Circulation	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	36	P59* P	/	AN	/	***Oui***
Bâtiment 027 -> R+1 -> 16 - Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	29	P46* N	/	AN	plinthes marrons	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 16 - Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	29	P47 N	/	AN	plinthes marrons	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 16 - Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	/	39	P62* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 16 - Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	/	42	P66* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 16 - Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	/	42	P67 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 027 -> R+1 -> 16 - Circulation	Faux plafonds	Plaques	Carton	Blanc	26	Idem P 40	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 17 - Sanitaire	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	30	P48* N	/	AN	carrelage gris	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 17 - Sanitaire	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	30	P48* N	/	AN	carrelage gris	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 17 - Sanitaire	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	30	P49 N	/	AN	carrelage gris	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 17 - Sanitaire	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	30	P49 N	/	AN	carrelage gris	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 17 - Sanitaire	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	27	P42* N	/	AN	faïences gris/rouge	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 17 - Sanitaire	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	27	P43 N	/	AN	faïences gris/rouge	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 17 - Sanitaire	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	28	P44* N	/	AN	faïences grises	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 17 - Sanitaire	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	28	P45 N	/	AN	faïences grises	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 17 - Sanitaire	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	33	P54* N	/	AN	plinthes grises	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 17 - Sanitaire	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	33	P55 N	/	AN	plinthes grises	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 17 - Sanitaire	Faux plafonds	Plaques	Carton	Blanc	26	Idem P 40	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 027 -> R+1 -> 17 - Sanitaire	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	/	42	Idem P 66	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 18 - Dégagement	Faux plafonds	Plaques	Carton	Blanc	26	Idem P 40	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 18 - Dégagement	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Jaune	38	Idem P 61	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 18 - Dégagement	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	38	Idem P 61	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 18 - Dégagement	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	47	Idem P 74	/	AN	carrelage beige (sous dalle plastique)	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 18 - Dégagement	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	47	Idem P 74	/	AN	carrelage beige (sous dalle plastique)	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 18 - Dégagement	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	45	Idem P 70	/	AN	avec tapisserie	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 19 - Bureau	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Rouge	37	P60* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 19 - Bureau	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	37	P60* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 19 - Bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	45	P70* N	/	AN	avec tapisserie	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 19 - Bureau	Faux plafonds	Plaques	Carton	Blanc	26	Idem P 40	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 19 - Bureau	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Jaune	38	Idem P 61	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 19 - Bureau	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	38	Idem P 61	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 027 -> R+1 -> 20 - Bureau	Faux plafonds	Plaques	Carton	Blanc	26	Idem P 40	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 20 - Bureau	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Rouge	37	Idem P 60	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 20 - Bureau	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	37	Idem P 60	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 20 - Bureau	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Jaune	38	Idem P 61	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 20 - Bureau	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	38	Idem P 61	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 20 - Bureau	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	47	Idem P 74	/	AN	carrelage beige (sous dalle plastique)	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 20 - Bureau	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	47	Idem P 74	/	AN	carrelage beige (sous dalle plastique)	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 20 - Bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	45	Idem P 70	/	AN	avec tapisserie	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 21 - Bureau	Faux plafonds	Plaques	Carton	Blanc	26	Idem P 40	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 21 - Bureau	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Rouge	37	Idem P 60	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 21 - Bureau	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	37	Idem P 60	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 21 - Bureau	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Jaune	38	Idem P 61	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 21 - Bureau	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	38	Idem P 61	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 027 -> R+1 -> 21 - Bureau	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	47	Idem P 74	/	AN	carrelage beige (sous dalle plastique)	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 21 - Bureau	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	47	Idem P 74	/	AN	carrelage beige (sous dalle plastique)	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 21 - Bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	45	Idem P 70	/	AN	avec tapisserie	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 22 - Bureau	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Jaune	38	P61* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 22 - Bureau	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	38	P61* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 22 - Bureau	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	47	P74* N	/	AN	carrelage beige (sous dalle plastique)	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 22 - Bureau	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	47	P74* N	/	AN	carrelage beige (sous dalle plastique)	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 22 - Bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	45	P69 N	/	AN	avec tapisserie	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 22 - Bureau	Faux plafonds	Plaques	Carton	Blanc	26	Idem P 40	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 22 - Bureau	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Rouge	37	Idem P 60	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 22 - Bureau	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	37	Idem P 60	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 23 - Fax	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	48	P75* N	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 027 -> R+1 -> 23 - Fax	Faux plafonds	Plaques	Carton	Blanc	26	Idem P 40	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 23 - Fax	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Jaune	38	Idem P 61	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 23 - Fax	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	38	Idem P 61	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 23 - Fax	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	47	Idem P 74	/	AN	carrelage beige (sous dalle plastique)	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 23 - Fax	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	47	Idem P 74	/	AN	carrelage beige (sous dalle plastique)	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 23 - Fax	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	45	Idem P 70	/	AN	avec tapisserie	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 24 - Circulation	Faux plafonds	Plaques	Carton	Blanc	26	P40* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 24 - Circulation	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	47	P73 N	/	AN	carrelage beige (sous dalle plastique)	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 24 - Circulation	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	47	P73 N	/	AN	carrelage beige (sous dalle plastique)	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 24 - Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	48	P76 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 24 - Circulation	Plinthes	Peintures	/	/	43	/	S1	PN	plinthes pvc plinthes pvc noires	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 24 - Circulation	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Rouge	37	Idem P 60	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 027 -> R+1 -> 24 - Circulation	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	37	Idem P 60	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 24 - Circulation	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Jaune	38	Idem P 61	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 24 - Circulation	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	38	Idem P 61	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 25 - Bureau	Faux plafonds	Plaques	Carton	Blanc	26	Idem P 40	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 25 - Bureau	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Rouge	37	Idem P 60	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 25 - Bureau	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	37	Idem P 60	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 25 - Bureau	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Jaune	38	Idem P 61	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 25 - Bureau	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	38	Idem P 61	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 25 - Bureau	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	47	Idem P 74	/	AN	carrelage beige (sous dalle plastique)	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 25 - Bureau	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	47	Idem P 74	/	AN	carrelage beige (sous dalle plastique)	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 25 - Bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	45	Idem P 70	/	AN	avec tapisserie	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 26 - Bureau	Plafonds	Enduits projetés	Peint	Blanc	31	P50* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 26 - Bureau	Plafonds	Enduits projetés	Peint	Blanc	31	P51 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 027 -> R+1 -> 26 - Bureau	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Gris	41	P65* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 26 - Bureau	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	41	P65* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 26 - Bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	/	34	P56* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 26 - Bureau	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Bois	Beige	49	/	/	PN	parquet bois	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 26 - Bureau	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Rouge	35	Idem P 58	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 26 - Bureau	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	35	Idem P 58	/	AN	/	*Oui*
Bâtiment 027 -> R+1 -> 26 - Bureau	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	29	Idem P 46	/	AN	plinthes marrons	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 27 - Bureau	Faux plafonds	Plaques	Plaque de plâtre	Blanc	40	P64* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 27 - Bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	/	34	P57 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 27 - Bureau	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Bois	Beige	49	/	/	PN	parquet bois	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 27 - Bureau	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	29	Idem P 46	/	AN	plinthes marrons	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 28 - Bureau	Faux plafonds	Plaques	Carton	Blanc	26	Idem P 40	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 28 - Bureau	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Orange	36	Idem P 59	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 027 -> R+1 -> 28 - Bureau	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	36	Idem P 59	/	AN	/	*Oui*
Bâtiment 027 -> R+1 -> 28 - Bureau	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	29	Idem P 46	/	AN	plinthes marrons	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 28 - Bureau	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	/	39	Idem P 62	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 28 - Bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	/	42	Idem P 66	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 28 - Bureau	Plinthes	Peintures	/	/	43	/	/	PN	plinthes pvc	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 29 - Bureau	Faux plafonds	Plaques	Carton	Blanc	26	P41 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 29 - Bureau	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	/	39	P63 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 29 - Bureau	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Orange	36	Idem P 59	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 29 - Bureau	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	36	Idem P 59	/	AN	/	*Oui*
Bâtiment 027 -> R+1 -> 29 - Bureau	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	29	Idem P 46	/	AN	plinthes marrons	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 29 - Bureau	Plinthes	Peintures	/	/	43	/	/	PN	plinthes pvc	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 30 - Bureau	Faux plafonds	Plaques	Carton	Blanc	26	Idem P 40	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 30 - Bureau	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Orange	36	Idem P 59	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 027 -> R+1 -> 30 - Bureau	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	36	Idem P 59	/	AN	/	*Oui*
Bâtiment 027 -> R+1 -> 30 - Bureau	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	29	Idem P 46	/	AN	plinthes marrons	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 30 - Bureau	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	/	39	Idem P 62	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 30 - Bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	/	42	Idem P 66	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 30 - Bureau	Plinthes	Peintures	/	/	43	/	/	PN	plinthes pvc	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 31 - Bureau	Faux plafonds	Plaques	Carton	Blanc	26	Idem P 40	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 31 - Bureau	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Orange	36	Idem P 59	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 31 - Bureau	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	36	Idem P 59	/	AN	/	*Oui*
Bâtiment 027 -> R+1 -> 31 - Bureau	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Gris	29	Idem P 46	/	AN	plinthes marrons	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 31 - Bureau	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	/	39	Idem P 62	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 31 - Bureau	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	/	42	Idem P 66	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> 31 - Bureau	Plinthes	Peintures	/	/	43	/	/	PN	plinthes pvc	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 027 -> R+1 -> Combles	Eléments sous toiture	Isolants fibreux en sous toiture	Laine de verre	Jaune	32	P52* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> R+1 -> Combles	Eléments sous toiture	Isolants fibreux en sous toiture	Laine de verre	Jaune	32	P53 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Peint	Beige	46	P71* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 027 -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Peint	Beige	46	P72 N	/	AN	/	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
35	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	30 m²
36	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	50 m²

7. ANNEXES

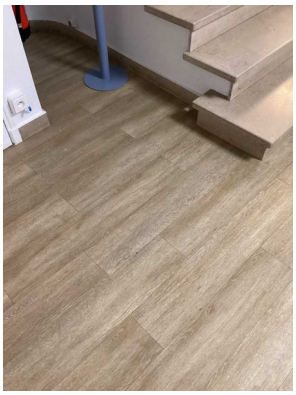
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

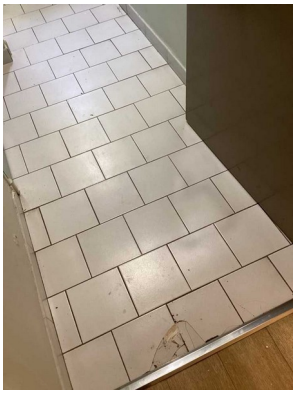
Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Bâtiment 027	/
Bâtiment 027 -> RDC	/
Bâtiment 027 -> RDC -> 02 - Hall	/
Bâtiment 027 -> RDC -> 03 - Stockage	/
Bâtiment 027 -> RDC -> 04 -WC handicapé	/
Bâtiment 027 -> RDC -> 05 - Bureau	/
Bâtiment 027 -> RDC -> 06 - Bureau	/
Bâtiment 027 -> RDC -> 07 - Bureau	/
Bâtiment 027 -> RDC -> 08 - Circulation	/
Bâtiment 027 -> RDC -> 09 - Bureau	/
Bâtiment 027 -> RDC -> 10 - Bureau	/
Bâtiment 027 -> RDC -> 11 - Bureau	/
Bâtiment 027 -> RDC -> 12 - Bureau	/
Bâtiment 027 -> RDC -> 13 - Bureau	/
Bâtiment 027 -> RDC -> 14 - Bureau	/
Bâtiment 027 -> RDC -> 15 - Bureau	/
Bâtiment 027 -> RDC -> SAS Rdc - SDAR	/
Bâtiment 027 -> R+1	/
Bâtiment 027 -> R+1 -> 16 - Circulation	/
Bâtiment 027 -> R+1 -> 17 - Sanitaire	/
Bâtiment 027 -> R+1 -> 18 - Dégagement	/
Bâtiment 027 -> R+1 -> 19 - Bureau	/
Bâtiment 027 -> R+1 -> 20 - Bureau	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Bâtiment 027 -> R+1 -> 21 - Bureau	/
Bâtiment 027 -> R+1 -> 22 - Bureau	/
Bâtiment 027 -> R+1 -> 23 - Fax	/
Bâtiment 027 -> R+1 -> 24 - Circulation	/
Bâtiment 027 -> R+1 -> 25 - Bureau	/
Bâtiment 027 -> R+1 -> 26 - Bureau	/
Bâtiment 027 -> R+1 -> 27 - Bureau	/
Bâtiment 027 -> R+1 -> 28 - Bureau	/
Bâtiment 027 -> R+1 -> 29 - Bureau	/
Bâtiment 027 -> R+1 -> 30 - Bureau	/
Bâtiment 027 -> R+1 -> 31 - Bureau	/
Bâtiment 027 -> R+1 -> Combles	/
Bâtiment 027 -> Façades	/

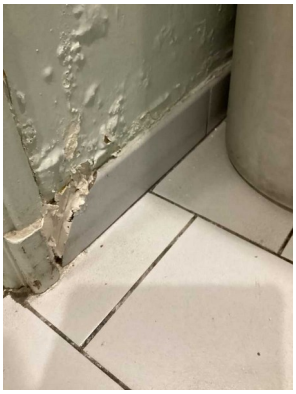
7.2. Photos prélèvements

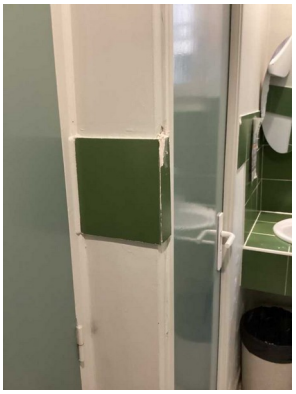
P22	ZPSO 15
Bâtiment 027 -> RDC -> 02 - Hall	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses	

P9	ZPSO 9
Bâtiment 027 -> RDC -> 04 -WC handicapé	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage | Ragréages	


P10	ZPSO 9
Bâtiment 027 -> RDC -> 04 -WC handicapé	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage | Ragréages	

P11	ZPSO 10
Bâtiment 027 -> RDC -> 04 -WC handicapé	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	


P12	ZPSO 10
Bâtiment 027 -> RDC -> 04 -WC handicapé	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	


P13	ZPSO 11
Bâtiment 027 -> RDC -> 04 -WC handicapé	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

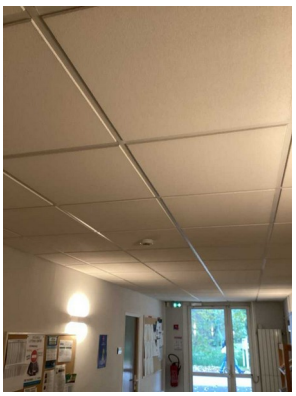
P14	ZPSO 11
Bâtiment 027 -> RDC -> 04 -WC handicapé	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P20	ZPSO 14
Bâtiment 027 -> RDC -> 06 - Bureau	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

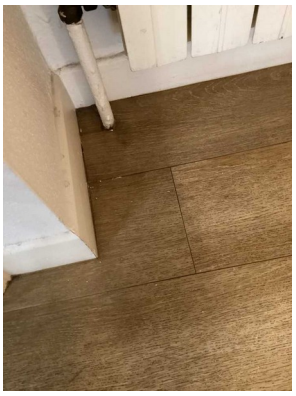
P39	ZPSO 24
Bâtiment 027 -> RDC -> 06 - Bureau	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

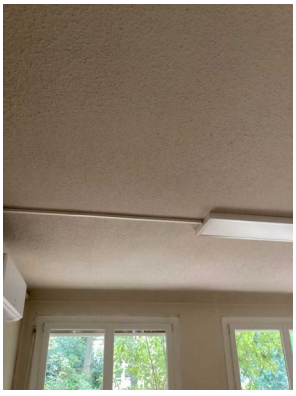
P30	ZPSO 19
Bâtiment 027 -> RDC -> 07 - Bureau	
	
Plafonds -> Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

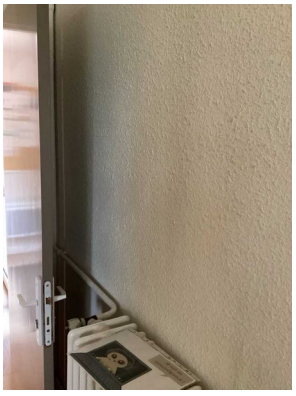
P32	ZPSO 20
Bâtiment 027 -> RDC -> 07 - Bureau	
	
Plafonds -> Bandes calicot	


P25	ZPSO 17
Bâtiment 027 -> RDC -> 08 - Circulation	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P26	ZPSO 17
Bâtiment 027 -> RDC -> 08 - Circulation	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

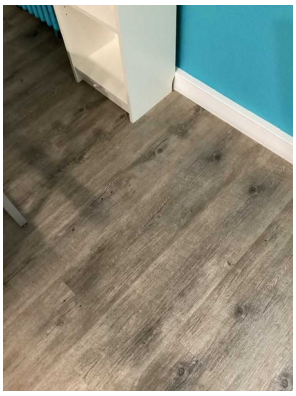
P37	ZPSO 23
Bâtiment 027 -> RDC -> 08 - Circulation	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses | Ragréages	

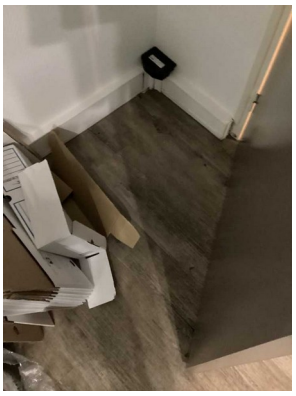
P17	ZPSO 13
Bâtiment 027 -> RDC -> 09 - Bureau	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

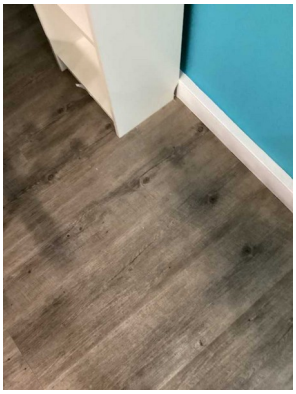
P15	ZPSO 12
Bâtiment 027 -> RDC -> 09 - Bureau	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P19	ZPSO 14
Bâtiment 027 -> RDC -> 10 - Bureau	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P23	ZPSO 16
Bâtiment 027 -> RDC -> 10 - Bureau	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses	

P24	ZPSO 16
Bâtiment 027 -> RDC -> 10 - Bureau	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses	

P33	ZPSO 21
Bâtiment 027 -> RDC -> 10 - Bureau	
	
Revêtements de sol -> Revêtements de sols sportifs | Colles non bitumineuses	

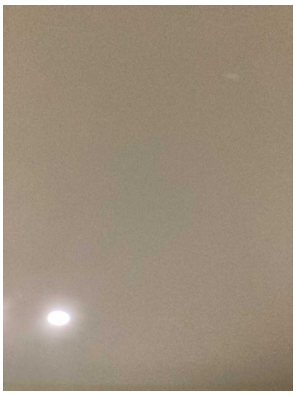
P34	ZPSO 21
Bâtiment 027 -> RDC -> 10 - Bureau	
	
Revêtements de sol -> Revêtements de sols sportifs | Colles non bitumineuses	


P21	ZPSO 15
Bâtiment 027 -> RDC -> 11 - Bureau	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses	


P27	ZPSO 18
Bâtiment 027 -> RDC -> 11 - Bureau	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P28	ZPSO 18
Bâtiment 027 -> RDC -> 11 - Bureau	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

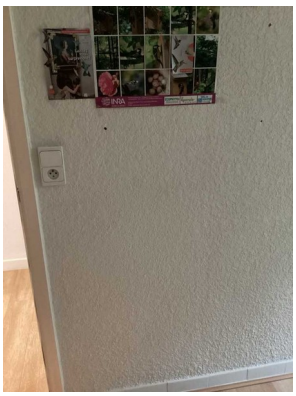
Copyright BUREAU VERITAS

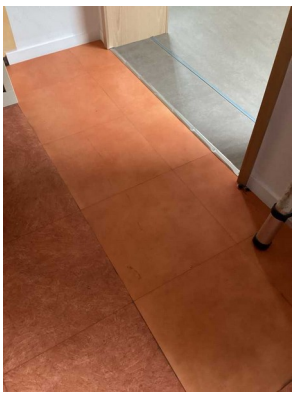
P29	ZPSO 19
Bâtiment 027 -> RDC -> 13 - Bureau	
	
Plafonds -> Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

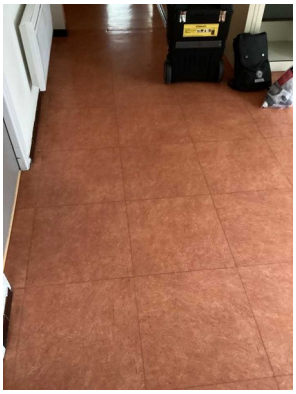
P31	ZPSO 20
Bâtiment 027 -> RDC -> 13 - Bureau	
	
Plafonds -> Bandes calicot	

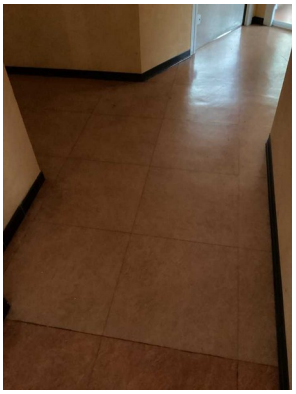
P38	ZPSO 24
Bâtiment 027 -> RDC -> 13 - Bureau	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

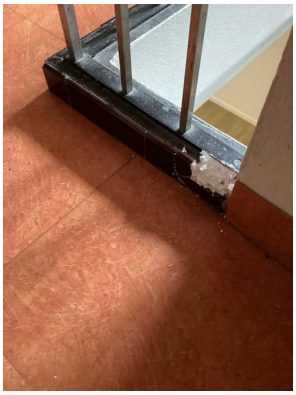
P18	ZPSO 13
Bâtiment 027 -> RDC -> 15 - Bureau	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

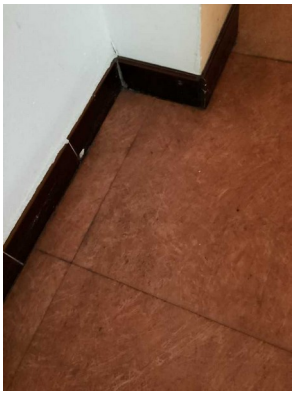
P16	ZPSO 12
Bâtiment 027 -> RDC -> 15 - Bureau	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

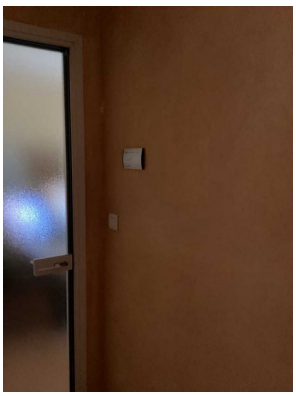
P68	ZPSO 44
Bâtiment 027 -> R+1 -> 16 - Circulation	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses	

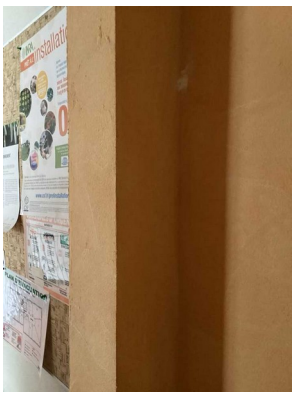
P58	ZPSO 35
Bâtiment 027 -> R+1 -> 16 - Circulation	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

P59	ZPSO 36
Bâtiment 027 -> R+1 -> 16 - Circulation	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

P46	ZPSO 29
Bâtiment 027 -> R+1 -> 16 - Circulation	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P47	ZPSO 29
Bâtiment 027 -> R+1 -> 16 - Circulation	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P62	ZPSO 39
Bâtiment 027 -> R+1 -> 16 - Circulation	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P66	ZPSO 42
Bâtiment 027 -> R+1 -> 16 - Circulation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P67	ZPSO 42

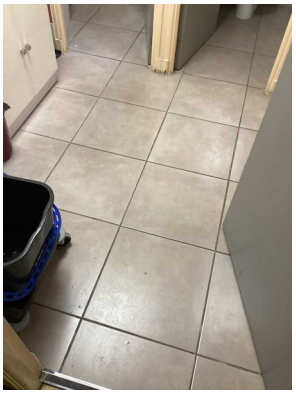
Bâtiment 027 -> R+1 -> 16 - Circulation



Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés

P48	ZPSO 30

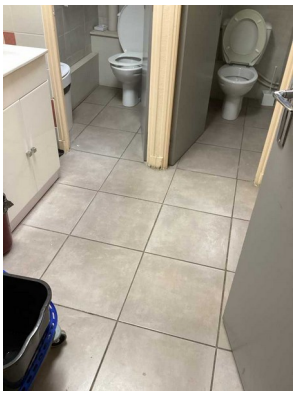
Bâtiment 027 -> R+1 -> 17 - Sanitaire



Revêtements de sol -> Colles de carrelage | Ragréages

P49	ZPSO 30

Bâtiment 027 -> R+1 -> 17 - Sanitaire



Revêtements de sol -> Colles de carrelage | Ragréages

P42	ZPSO 27

Bâtiment 027 -> R+1 -> 17 - Sanitaire



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence

P43	ZPSO 27

Bâtiment 027 -> R+1 -> 17 - Sanitaire



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence

P44	ZPSO 28

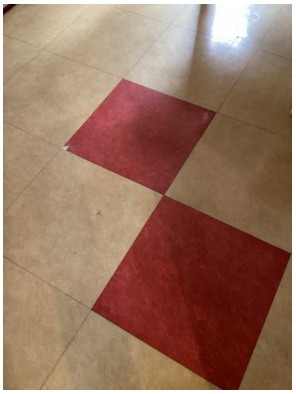
Bâtiment 027 -> R+1 -> 17 - Sanitaire

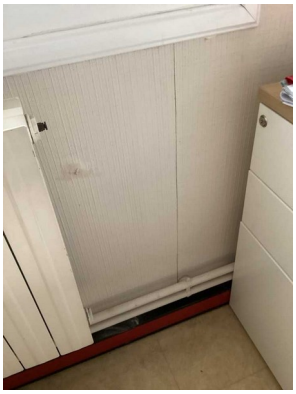


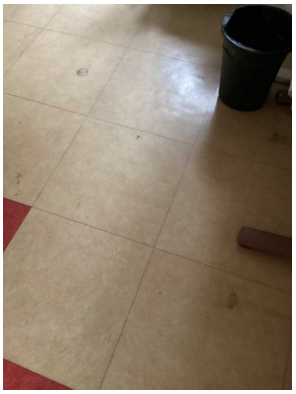
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence

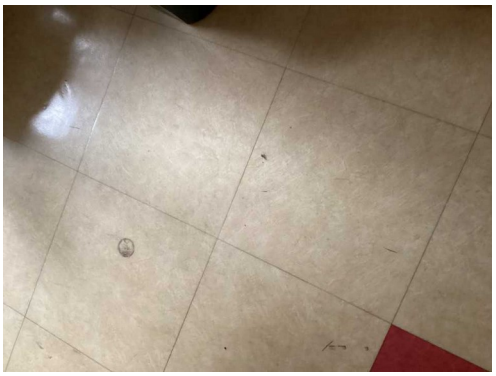
Copyright BUREAU VERITAS

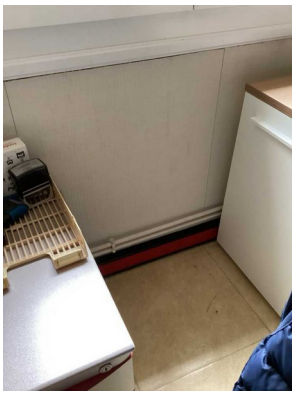
P45	ZPSO 28
Bâtiment 027 -> R+1 -> 17 - Sanitaire	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

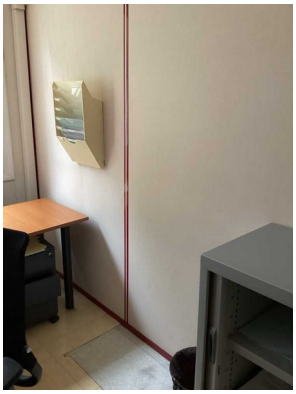
P60	ZPSO 37
Bâtiment 027 -> R+1 -> 19 - Bureau	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses	

P70	ZPSO 45
Bâtiment 027 -> R+1 -> 19 - Bureau	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P61	ZPSO 38
Bâtiment 027 -> R+1 -> 22 - Bureau	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses	

P74	ZPSO 47
Bâtiment 027 -> R+1 -> 22 - Bureau	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage | Ragréages	

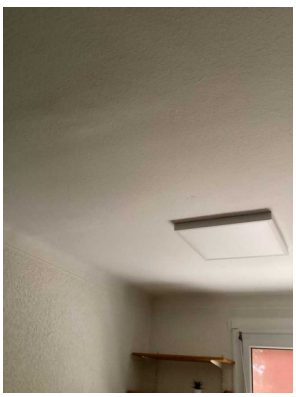
P69	ZPSO 45
Bâtiment 027 -> R+1 -> 22 - Bureau	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

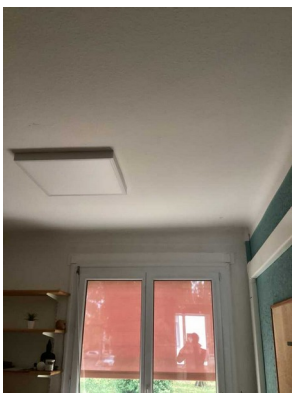
P75	ZPSO 48
Bâtiment 027 -> R+1 -> 23 - Fax	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

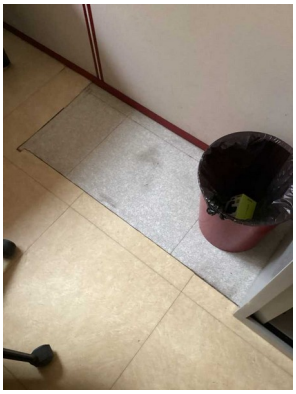
P40	ZPSO 26
Bâtiment 027 -> R+1 -> 24 - Circulation	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

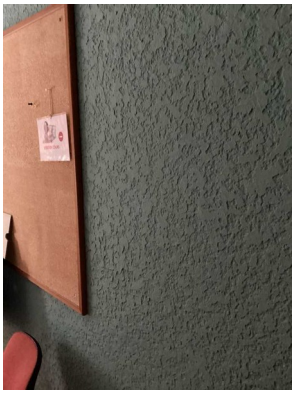
P73	ZPSO 47
Bâtiment 027 -> R+1 -> 24 - Circulation	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage | Ragréages	

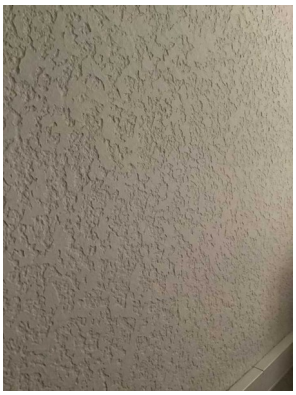
P76	ZPSO 48
Bâtiment 027 -> R+1 -> 24 - Circulation	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

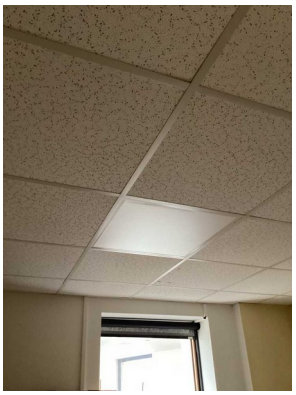
P50	ZPSO 31
Bâtiment 027 -> R+1 -> 26 - Bureau	
	
Plafonds -> Enduits projetés (Liste B)	

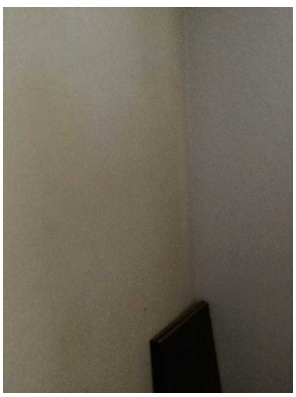
P51	ZPSO 31
Bâtiment 027 -> R+1 -> 26 - Bureau	
	
Plafonds -> Enduits projetés (Liste B)	

P65	ZPSO 41
Bâtiment 027 -> R+1 -> 26 - Bureau	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses	

P56	ZPSO 34
Bâtiment 027 -> R+1 -> 26 - Bureau	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P57	ZPSO 34
Bâtiment 027 -> R+1 -> 27 - Bureau	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P41	ZPSO 26
Bâtiment 027 -> R+1 -> 29 - Bureau	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P63	ZPSO 39
Bâtiment 027 -> R+1 -> 29 - Bureau	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P71	ZPSO 46
Bâtiment 027 -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P72	ZPSO 46
Bâtiment 027 -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

7.3. Attestation d'assurance

MSIG
Europe

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG,** Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) **Diagnostic amiante**
- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulage,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
  Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) **Autres diagnostics**
- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voieries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
  - Location
  - Cession immobilière

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

- ERP
- Neuf

- Mise à jour du DPE,
- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic mérule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic mérule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
  - En cas de location / vente
  - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public.

3) **Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.**

4) **Conseil en performance énergétique.**

5) **Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.**

6) **Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.**

7) **Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.**

8) Concernant l'utilisation des appareils à plomb contenant des sources ionisantes l'Assureur note et précise que les garanties du contrat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.

9) **Laboratoire** il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris les échantillons d'amiante) et de prélèvements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont acquises notamment lors :

   - De missions d'analyse d'échantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux équipements du bâtiment ou aux équipements et process.

   - Des missions de prélèvement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques à ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 à zéro heure au 31/12/2024 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 5 janvier 2024

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire – 75009 Paris
Tél : 01 40 67 42 42 – Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 00097 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

7.4. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification

Certificat attribué à

David SAUVAGE

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Électricité	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	17/11/2020	16/11/2027
Amiante avec mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	08/09/2020	07/09/2027
Termites metropole	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	27/01/2020	26/01/2027
Gaz	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	08/09/2020	14/06/2027
Amiante sans mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	08/09/2020	07/09/2027

Date : 01/10/2024
Numéro du certificat : **8037832**

Samuel DUPREU - Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus. Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. Cliquez ici pour vérifier la validité de ce certificat.
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

BUREAU VERITAS

7.5. Croquis de repérage

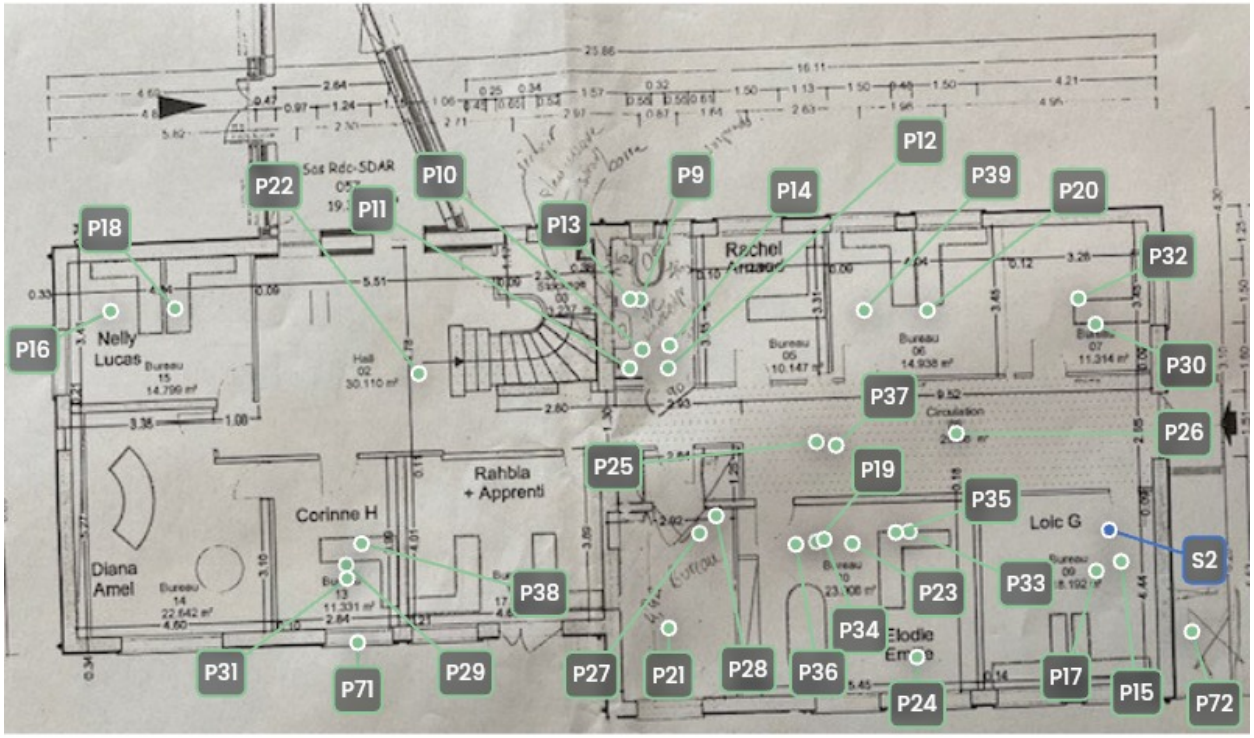
PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOMAINE SAINT PAUL SITE AGROPARC228 228 ROUTE DE L AERODROME 84140 AVIGNON	
Localisation Bâtiment 027 > RDC	Date visite	Du 26/09/2024 au 26/09/2024
	Auteur	david sauvage
	N° dossier	23573599/S1/1
	Planche	1 / 2
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

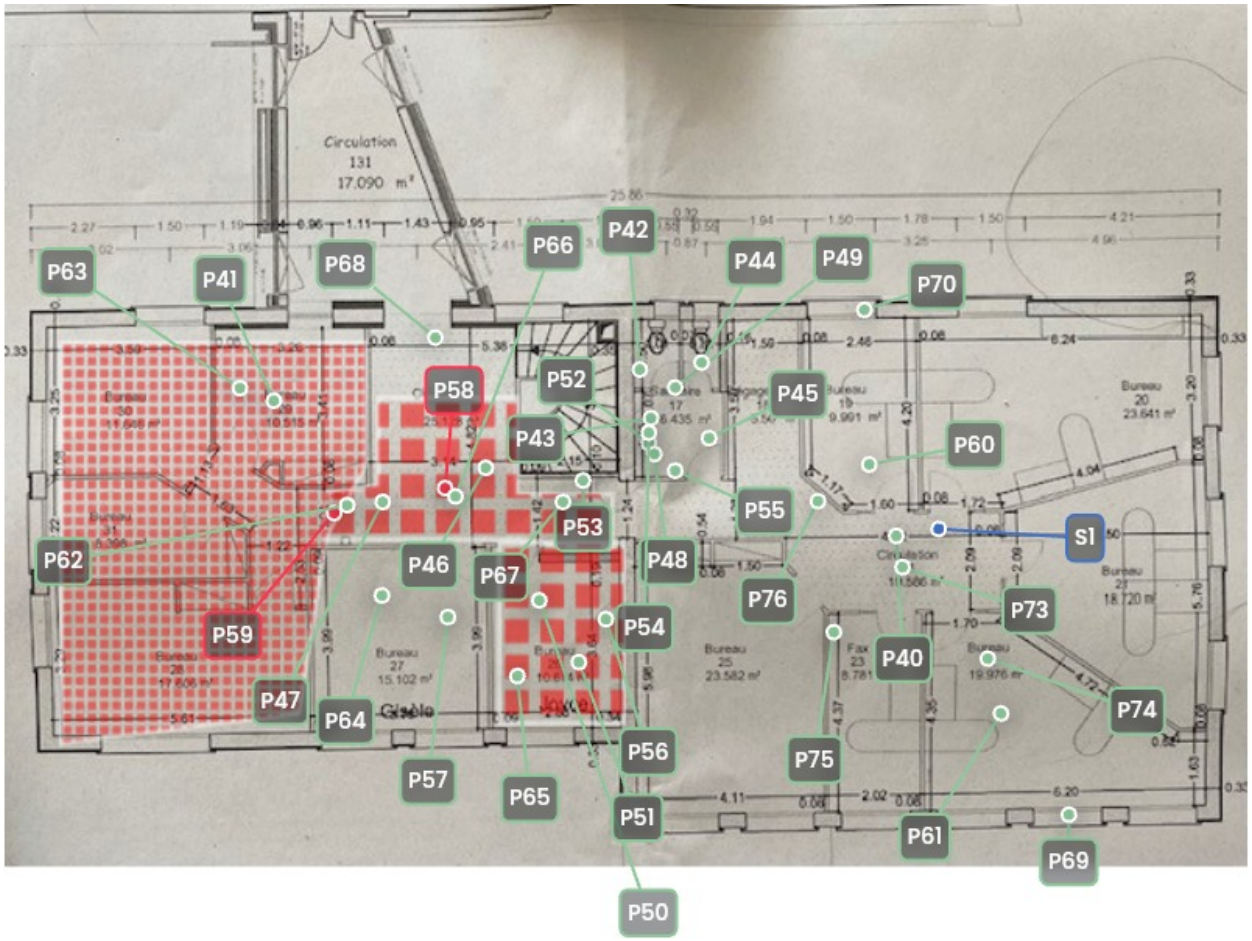
La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOMAINE SAINT PAUL SITE AGROPARC228 228 ROUTE DE L AERODROME 84140 AVIGNON	
Localisation Bâtiment 027 > R+1	Date visite	Du 26/09/2024 au 26/09/2024
	Auteur	david sauvage
	N° dossier	23573599/S1/1
	Planche	2 / 2
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- Colles non bitumineuses
- Colles non bitumineuses



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur David SAUVAGE
ZA Lenfant
405 Rue Emilien Gautier - Les Milles
13290 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-053703-01 | Date d'émission de rapport : 22/10/2024 7:31 |
Dossier N° : 24KE027819 | Date de réception : 15/10/2024 | Date d'analyse : 18/10/2024
Référence dossier Client:1510797386/23573599/S1/1/9_23573599/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	BV3KN0932 Réf. Prel : P 9 Bâtiment 027 - RDC - 04 -WC handicapé/Revêtements de sol - (Dur/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau (poudreux) (blanc) + (gris)	**MET** * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	BV3KN0933 Réf. Prel : P1 0 Bâtiment 027 - RDC - 04 -WC handicapé/Revêtements de sol - (Dur/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau (poudreux) (blanc) + (gris)	**MET** * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	BV3KN0934 Réf. Prel : P1 1 Bâtiment 027 - RDC - 04 -WC handicapé/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
004	BV3KN0935 Réf. Prel : P1 2 Bâtiment 027 - RDC - 04 -WC handicapé/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-053703-01 Date d'émission de rapport : 22/10/2024 7:31
Dossier N° : 24KE027819 Date de réception : 15/10/2024 Date d'analyse : 18/10/2024
Référence dossier Client:1510797386/23573599/S1/1/9_23573599/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	BV3KN0936 Réf. Prel : P1 3 Bâtiment 027 - RDC - 04 -WC handicapé/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau dur de type joint ciment (blanc)	**MET** * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	BV3KN0937 Réf. Prel : P1 4 Bâtiment 027 - RDC - 04 -WC handicapé/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	**MET** * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007	BV3KN0938 Réf. Prel : P1 5 Bâtiment 027 - RDC - 09 - Bureau/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Peint/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (fibreux) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-053703-01 Date d'émission de rapport : 22/10/2024 7:31
Dossier N° : 24KE027819 Date de réception : 15/10/2024 Date d'analyse : 18/10/2024
Référence dossier Client:1510797386/23573599/S1/1/9_23573599/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	BV3KN0939 Réf. Prel : P1 6 Bâtiment 027 - RDC - 15 - Bureau/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Peint/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (fibreux) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009	BV3KN0940 Réf. Prel : P1 7 Bâtiment 027 - RDC - 09 - Bureau/Plafonds - (Granuleux/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (fibreux)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010	BV3KN0941 Réf. Prel : P1 8 Bâtiment 027 - RDC - 15 - Bureau/Plafonds - (Granuleux/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (fibreux)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
011	BV3KN0942 Réf. Prel : P1 9 Bâtiment 027 - RDC - 10 - Bureau/Plafonds - (Lissé/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
012	BV3KN0943 Réf. Prel : P2 0 Bâtiment 027 - RDC - 06 - Bureau/Plafonds - (Lissé/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-053703-01 Date d'émission de rapport : 22/10/2024 7:31
Dossier N° : 24KE027819 Date de réception : 15/10/2024 Date d'analyse : 18/10/2024
Référence dossier Client:1510797386/23573599/S1/1/9_23573599/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	BV3KN0944 Réf. Prel : P2 1 Bâtiment 027 - RDC - 11 - Bureau/Revêtements de sol - (Plastique/Marron)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) + (gris)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014	BV3KN0945 Réf. Prel : P2 2 Bâtiment 027 - RDC - 02 - Hall/Revêtements de sol - (Plastique/Marron)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) + (gris)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (gris)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
015	BV3KN0946 Réf. Prel : P2 3 Bâtiment 027 - RDC - 10 - Bureau/Revêtements de sol - (Plastique/Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) + (gris)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
016	BV3KN0947 Réf. Prel : P2 4 Bâtiment 027 - RDC - 10 - Bureau/Revêtements de sol - (Plastique/Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) + (gris)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
017	BV3KN0948 Réf. Prel : P2 5 Bâtiment 027 - RDC - 08 - Circulation/Faux plafonds - (Carton/Blanc)	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (gris)	**MET** * / RDV8	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-053703-01 Date d'émission de rapport : 22/10/2024 7:31
Dossier N° : 24KE027819 Date de réception : 15/10/2024 Date d'analyse : 18/10/2024
Référence dossier Client:1510797386/23573599/S1/1/9_23573599/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	BV3KN0949 Réf. Prel : P2 6 Bâtiment 027 - RDC - 08 - Circulation/Faux plafonds - (Carton/Blanc)	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (gris)	**MET** * / RDV8	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
019	BV3KN0950 Réf. Prel : P2 7 Bâtiment 027 - RDC - 11 - Bureau/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) + (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) + (gris) ; matériau (beige)	**MET** * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
020	BV3KN0951 Réf. Prel : P2 8 Bâtiment 027 - RDC - 11 - Bureau/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau de type peinture (gris) + (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) + (jaune) ; matériau (beige)	**MET** * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
021	BV3KN0952 Réf. Prel : P2 9 Bâtiment 027 - RDC - 13 - Bureau/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
022	BV3KN0953 Réf. Prel : P3 0 Bâtiment 027 - RDC - 07 - Bureau/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-053703-01 Date d'émission de rapport : 22/10/2024 7:31
Dossier N° : 24KE027819 Date de réception : 15/10/2024 Date d'analyse : 18/10/2024
Référence dossier Client:1510797386/23573599/S1/1/9_23573599/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	BV3KN0954 Réf. Prel : P3 1 Bâtiment 027 - RDC - 13 - Bureau/Plafonds - (Papier, Plâtre/Blanc)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** * / SET9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / SET9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
024	BV3KN0955 Réf. Prel : P3 2 Bâtiment 027 - RDC - 07 - Bureau/Plafonds - (Papier, Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	**MET** * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** * / SET9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / SET9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-053703-01 Date d'émission de rapport : 22/10/2024 7:31 Page7/19
Dossier N° : 24KE027819 Date de réception : 15/10/2024 Date d'analyse : 18/10/2024
Référence dossier Client:1510797386/23573599/S1/1/9_23573599/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	BV3KN0956 Réf. Prel : P3 3 Bâtiment 027 - RDC - 10 - Bureau/Revêtements de sol - (Souple/Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	**MET** * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
026	BV3KN0957 Réf. Prel : P3 4 Bâtiment 027 - RDC - 10 - Bureau/Revêtements de sol - (Souple/Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	**MET** * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau (gris) (clair)	**MET** * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
027	BV3KN0958 Réf. Prel : P3 5 Bâtiment 027 - RDC - 10 - Bureau/Revêtements de sol - (Dur/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) + (jaune) ; matériau (poudreux) (blanc)	**MET** * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
028	BV3KN0959 Réf. Prel : P3 6 Bâtiment 027 - RDC - 10 - Bureau/Revêtements de sol - (Dur/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) + (jaune) ; matériau (poudreux) (blanc)	**MET** * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-053703-01 | Date d'émission de rapport : 22/10/2024 7:31 | Page8/19
Dossier N° : 24KE027819 | Date de réception : 15/10/2024 | Date d'analyse : 18/10/2024
Référence dossier Client:1510797386/23573599/S1/1/9_23573599/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	BV3KN0960 Réf. Prel : P3 7 Bâtiment 027 - RDC - 08 - Circulation/Revêtements de sol - (Cassant/Rose)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
030	BV3KN0961 Réf. Prel : P3 8 Bâtiment 027 - RDC - 13 - Bureau/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Lissé/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (fibreux) ; matériau de type peinture (gris) + (violet) ; matériau (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
031	BV3KN0962 Réf. Prel : P3 9 Bâtiment 027 - RDC - 06 - Bureau/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Lissé/)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / SET9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-053703-01 Date d'émission de rapport : 22/10/2024 7:31
Dossier N° : 24KE027819 Date de réception : 15/10/2024 Date d'analyse : 18/10/2024
Référence dossier Client:1510797386/23573599/S1/1/9_23573599/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	BV3KN0963 Réf. Prel : P4 0 Bâtiment 027 - R+1 - 24 - Circulation/Faux plafonds - (Carton/Blanc)	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (gris)	**MET** * / RDV8	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
033	BV3KN0964 Réf. Prel : P4 1 Bâtiment 027 - R+1 - 29 - Bureau/Faux plafonds - (Carton/Blanc)	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (beige)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
034 (1)	BV3KN0965 Réf. Prel : P4 2 Bâtiment 027 - R+1 - 17 - Sanitaire/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) (fibreux)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
035	BV3KN0966 Réf. Prel : P4 3 Bâtiment 027 - R+1 - 17 - Sanitaire/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) + (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) (fibreux)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (blanc)(i)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-053703-01 Date d'émission de rapport : 22/10/2024 7:31
Dossier N° : 24KE027819 Date de réception : 15/10/2024 Date d'analyse : 18/10/2024
Référence dossier Client:1510797386/23573599/S1/1/9_23573599/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036	BV3KN0967 Réf. Prel : P4 4 Bâtiment 027 - R+1 - 17 - Sanitaire/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) (fibreux) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
037 (2)	BV3KN0968 Réf. Prel : P4 5 Bâtiment 027 - R+1 - 17 - Sanitaire/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (blanc)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
038	BV3KN0969 Réf. Prel : P4 6 Bâtiment 027 - R+1 - 16 - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris)	Matériau dur (blanc) ; matériau dur (gris)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
039	BV3KN0970 Réf. Prel : P4 7 Bâtiment 027 - R+1 - 16 - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris)	Matériau de type peinture (noir) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (de différentes couleurs)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-053703-01 Date d'émission de rapport : 22/10/2024 7:31
Dossier N° : 24KE027819 Date de réception : 15/10/2024 Date d'analyse : 18/10/2024
Référence dossier Client:1510797386/23573599/S1/1/9_23573599/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	BV3KN0971 Réf. Prel : P4 8 Bâtiment 027 - R+1 - 17 - Sanitaire/Revêtements de sol - (Dur/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (poudreux) (beige)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
041	BV3KN0972 Réf. Prel : P4 9 Bâtiment 027 - R+1 - 17 - Sanitaire/Revêtements de sol - (Dur/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau (poudreux) (beige)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
042	BV3KN0973 Réf. Prel : P5 0 Bâtiment 027 - R+1 - 26 - Bureau/Plafonds - (Peint/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** * / K6PM	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
043	BV3KN0974 Réf. Prel : P5 1 Bâtiment 027 - R+1 - 26 - Bureau/Plafonds - (Peint/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
044	BV3KN0975 Réf. Prel : P5 2 Bâtiment 027 - R+1 - Combles/Eléments sous toiture - (Laine de verre/Jaune)	Matériau de type maillage de fibres (beige)	**MOLP** * / BHY2	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-053703-01 Date d'émission de rapport : 22/10/2024 7:31
Dossier N° : 24KE027819 Date de réception : 15/10/2024 Date d'analyse : 18/10/2024
Référence dossier Client:1510797386/23573599/S1/1/9_23573599/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045	BV3KN0976 Réf. Prel : P5 3 Bâtiment 027 - R+1 - Combles/Eléments sous toiture - (Laine de verre/Jaune)	Matériau (fibreux) (beige)	**MOLP** * / K6PM	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
046	BV3KN0977 Réf. Prel : P5 4 Bâtiment 027 - R+1 - 17 - Sanitaire/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
047	BV3KN0978 Réf. Prel : P5 5 Bâtiment 027 - R+1 - 17 - Sanitaire/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) + (gris)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (blanc)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
048	BV3KN0979 Réf. Prel : P5 6 Bâtiment 027 - R+1 - 26 - Bureau/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Peint/)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (fibreux) (blanc)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-053703-01 | Date d'émission de rapport : 22/10/2024 7:31 | Page13/19
Dossier N° : 24KE027819 | Date de réception : 15/10/2024 | Date d'analyse : 18/10/2024
Référence dossier Client:1510797386/23573599/S1/1/9_23573599/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049	BV3KN0980 Réf. Prel : P5 7 Bâtiment 027 - R+1 - 27 - Bureau/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Peint/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (blanc)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
050	BV3KN0981 Réf. Prel : P5 8 Bâtiment 027 - R+1 - 16 - Circulation/Revêtements de sol - (Plastique/Rouge)	Matériau souple de type revêtement de sol (rouge)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(ii)	**MET** * / RDV8	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
051	BV3KN0982 Réf. Prel : P5 9 Bâtiment 027 - R+1 - 16 - Circulation/Revêtements de sol - (Plastique/Orange)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-053703-01 Date d'émission de rapport : 22/10/2024 7:31
Dossier N° : 24KE027819 Date de réception : 15/10/2024 Date d'analyse : 18/10/2024
Référence dossier Client:1510797386/23573599/S1/1/9_23573599/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
052 (3)	BV3KN0983 Réf. Prel : P6 0 Bâtiment 027 - R+1 - 19 - Bureau/Revêtements de sol - (Plastique/Rouge)	Matériau souple de type revêtement de sol (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige)	**MET** * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
053	BV3KN0984 Réf. Prel : P6 1 Bâtiment 027 - R+1 - 22 - Bureau/Revêtements de sol - (Plastique/Jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau (poudreux) (gris)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
054	BV3KN0985 Réf. Prel : P6 2 Bâtiment 027 - R+1 - 16 - Circulation/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/)	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / K6PM	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-053703-01 | Date d'émission de rapport : 22/10/2024 7:31 | Page15/19
Dossier N° : 24KE027819 | Date de réception : 15/10/2024 | Date d'analyse : 18/10/2024
Référence dossier Client:1510797386/23573599/S1/1/9_23573599/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055	BV3KN0986 Réf. Prel : P6 3 Bâtiment 027 - R+1 - 29 - Bureau/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/)	Matériau de type peinture (blanc) + (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / K6PM	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
056	BV3KN0987 Réf. Prel : P6 4 Bâtiment 027 - R+1 - 27 - Bureau/Faux plafonds - (Plaque de plâtre/Blanc)	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune) + (blanc)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
057	BV3KN0988 Réf. Prel : P6 5 Bâtiment 027 - R+1 - 26 - Bureau/Revêtements de sol - (Plastique/Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (clair)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
058	BV3KN0989 Réf. Prel : P6 6 Bâtiment 027 - R+1 - 16 - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Peint/)	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-053703-01 Date d'émission de rapport : 22/10/2024 7:31
Dossier N° : 24KE027819 Date de réception : 15/10/2024 Date d'analyse : 18/10/2024
Référence dossier Client:1510797386/23573599/S1/1/9_23573599/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
059	BV3KN0990 Réf. Prel : P6 7 Bâtiment 027 - R+1 - 16 - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Peint/)	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs) (fibreux)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
060	BV3KN0991 Réf. Prel : P6 8 Bâtiment 027 - R+1 - 16 - Circulation/Revêtements de sol - (Plastique/Orange)	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)(ii)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
061	BV3KN0992 Réf. Prel : P6 9 Bâtiment 027 - R+1 - 22 - Bureau/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/)	Matériau (blanc) + (jaune) (poudreux)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
062	BV3KN0993 Réf. Prel : P7 0 Bâtiment 027 - R+1 - 19 - Bureau/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/)	Matériau (blanc) + (gris) (poudreux)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-053703-01 | Date d'émission de rapport : 22/10/2024 7:31 | Page17/19
Dossier N° : 24KE027819 | Date de réception : 15/10/2024 | Date d'analyse : 18/10/2024
Référence dossier Client:1510797386/23573599/S1/1/9_23573599/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
063	BV3KN0994 Réf. Prel : P7 1 Bâtiment 027 - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Peint/Beige)	Matériau semi-dur (blanc) (poudreux)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
064	BV3KN0995 Réf. Prel : P7 2 Bâtiment 027 - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Peint/Beige)	Matériau semi-dur (blanc) (poudreux)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
065 (4)	BV3KN0996 Réf. Prel : P7 3 Bâtiment 027 - R+1 - 24 - Circulation/Revêtements de sol - (Dur/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) + (jaune) ; matériau (poudreux) (blanc)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
066	BV3KN0997 Réf. Prel : P7 4 Bâtiment 027 - R+1 - 22 - Bureau/Revêtements de sol - (Dur/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) + (jaune) ; matériau (poudreux) (blanc) + (gris)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) + (jaune) en traces	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
067	BV3KN0998 Réf. Prel : P7 5 Bâtiment 027 - R+1 - 23 - Fax/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) + (beige)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-053703-01 | Date d'émission de rapport : 22/10/2024 7:31 | Page18/19
Dossier N° : 24KE027819 | Date de réception : 15/10/2024 | Date d'analyse : 18/10/2024
Référence dossier Client:1510797386/23573599/S1/1/9_23573599/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / SET9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
068	BV3KN0999 Réf. Prel : P7 6 Bâtiment 027 - R+1 - 24 - Circulation/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / SET9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) Un matériau de type matériau blanc est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(2) Un matériau de type peinture beige fibreuse est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(3) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(4) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-053703-01 | Date d'émission de rapport : 22/10/2024 7:31 | Page19/19
Dossier N° : 24KE027819 | Date de réception : 15/10/2024 | Date d'analyse : 18/10/2024
Référence dossier Client:1510797386/23573599/S1/1/9_23573599/1/2

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Katherine Murcia Valencia
Tech. Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS
