Chevalier Diag
Diagnostic, Conseil
Agents CMR et Polluants

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : 26-MIN-40-D1
Date du repérage : 08/04/2026

Références réglementaires et normatives	
Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.
Norme d'aide à la méthodologie	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité	
Adresse	Rue :..... GORRÉ MENEZ ASCENSEUR AYR27 Code postal, ville : ..... 29470 LOPERHET
Périmètre de repérage :	Description des travaux : Remplacement complet de l'ascenseur Supports diagnostiqués : Machinerie : Garniture de frein, Sol, Mur, Plafond 5ème étage – Palier : Sol, Mur 3ème étage – Palier : Sol, Mur 1er étage - Gaine d'ascenseur : Porte palière 1er étage – Palier : Sol, Mur Rez de chaussée – Entrée : Sol, Plinthe Rez de chaussée - Gaine d'ascenseur : Porte palière, Mur, Sol, Cabine 2ème / 4ème étage - Palier : Sol, Mur
Fonction principale du bâtiment : Année de construction :	..... Autre ..... <1997

Le propriétaire et le donneur d'ordre	
Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom :..... MINISTÈRE CHARGÉ DES TRANSPORTS Adresse : ..... DGAC/SIR-OUEST 37 ROUTE DU RADAR DE BRETAGNE 29470 LOPERHET
Le donneur d'ordre	Nom et prénom :..... MINISTÈRE CHARGÉ DES TRANSPORTS - Mr LEMAIRE Philippe Adresse : ..... DGAC/SIR-OUEST 37 ROUTE DU RADAR DE BRETAGNE 29470 LOPERHET

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ---------- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	CHASSAGNE Morgane	Opérateur de repérage	ABCIDIA CERTIFICATION Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse	Obtention : 26/10/2020 Échéance : 25/10/2027 N° de certification : 23-2298

Raison sociale de l'entreprise : **CHEVALIER DIAG** (Numéro SIRET : **913 414 728 00042)**
Adresse : **14 RUE DE FOUGERES, 35460 SAINT-BRICE-EN-COGLES**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA France IARD**
Numéro de police et date de validité : **11002336104 - 01/01/2027**

Le rapport de repérage
Date d'émission du rapport de repérage : 27/04/2026,
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 21 pages

Conclusion amiante :

Dans le cadre de mission décrit en tête de rapport, il a été repéré :

- **des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire :**
  - Garniture de frein (Machinerie) (Echantillon 1)
  - Revêtement bitumineux noir sur la porte palière (1er étage - Gaine d'ascenseur) (Echantillon 9)
  - Revêtement bitumineux noir sur la porte palière (Rez de chaussée - Gaine d'ascenseur) (Echantillon 14)
  - Revêtement bitumineux noir sur la cabine (Rez de chaussée - Gaine d'ascenseur) (Echantillon 17)

Sommaire

1 Les conclusions
2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses
3 La mission de repérage
3.1 L'objet de la mission
3.2 Le cadre de la mission
3.2.1 L'intitulé de la mission
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
3.2.3 L'objectif de la mission
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
3.2.5 Le périmètre de repérage effectif
4 Conditions de réalisation du repérage
4.1 Bilan de l'analyse documentaire
4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
4.4 Plan et procédures de prélèvements
5 Résultats détaillés du repérage
Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, conséquences réglementaires
6 Signatures
7 Annexes

1. – Les conclusions

Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise :..... LRPE
Adresse :..... 64 RUE DU VAL DE SAIRE 50100 CHERBOURG EN COTENTIN
Numéro de l'accréditation Cofrac : ..... 1-6395 / SIREN 823165741

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.»
Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Le programme de travaux

Le programme de travaux est défini par le donneur d'ordre selon l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié

3.2.4 Le programme de repérage

Le programme de repérage est défini par l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié et de son annexe 1.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
	Fenêtres de toit, lanternaux, verrières
2 - Parois verticales extérieures et Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
	Éléments associés aux façades
3 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
4 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
	Suspentes et contrevents
5 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols
6 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Portes et cloisons palières
	parois des équipements
	Matériels en machinerie
8 - Équipements divers et accessoires	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	fusibles à broche
	canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
9 - Fondations et soubassements	Étanchéité des murs enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées
	Conduits et fourreaux
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs

3.2.5 *Le périmètre de repérage effectif*

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Programme détaillé des travaux :
Remplacement complet de l'ascenseur

Descriptif des pièces visitées
Machinerie,
5ème étage - Palier,
3ème étage - Palier,
1er étage - Gaine d'ascenseur,
1er étage - Palier,
Rez de chaussée - Entrée,
Rez de chaussée - Gaine d'ascenseur,
2ème / 4ème étage - Palier

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations : Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 08/04/2026

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017 et de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X



4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Résultats détaillés du repérage

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de l'amiante


Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
Machinerie	Identifiant: 1 Description: Garniture de frein	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
1er étage - Gaine d'ascenseur	Identifiant: 9 Description: Revêtement bitumineux noir	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
Rez de chaussée - Gaine d'ascenseur	Identifiant: 14 Description: Revêtement bitumineux noir	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: 17 Description: Revêtement bitumineux noir	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

6. – Signatures

Nota : *Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par* ***ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse***

Fait à **SAINT-BRICE-EN-COGLES**, le **27/04/2026**

Par : CHASSAGNE Morgane



Signature du représentant :

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 26-MIN-40-D1

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

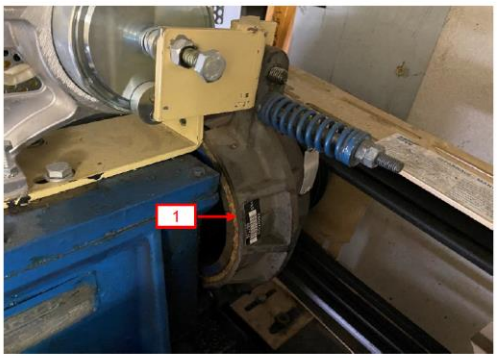
7.2 Rapports d'essais

7.3 Conséquences réglementaires et recommandations

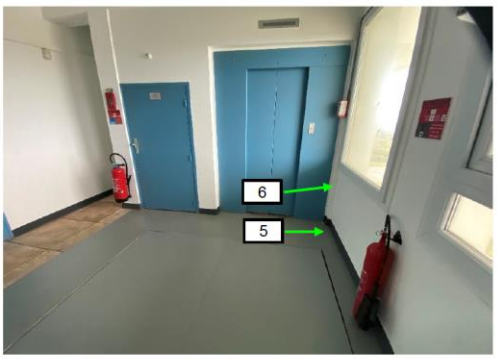
7.4 Documents annexés au présent rapport

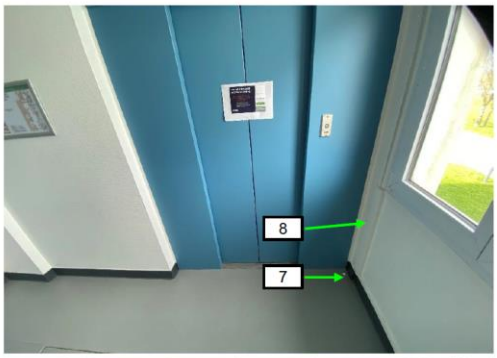
7.1 - Annexe - Schéma de repérage

PHOTOS DE LOCALISATIONS

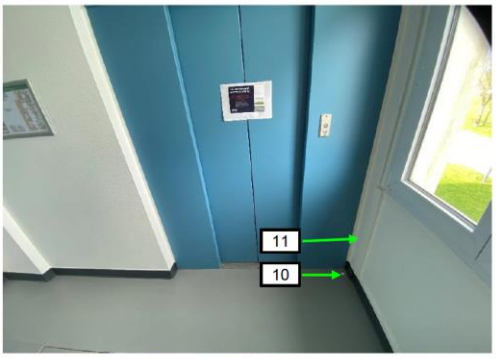








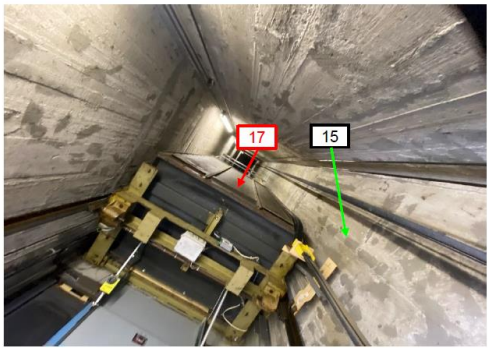


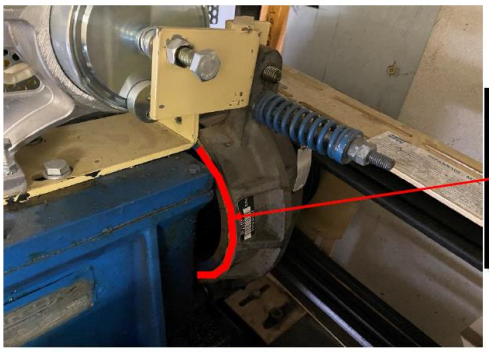



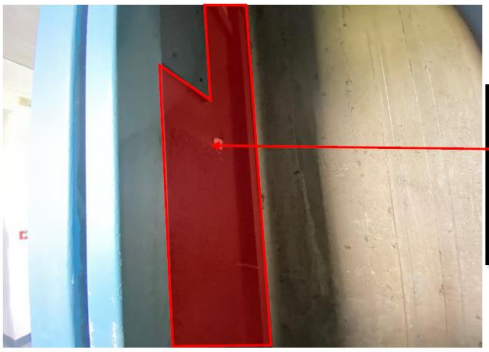


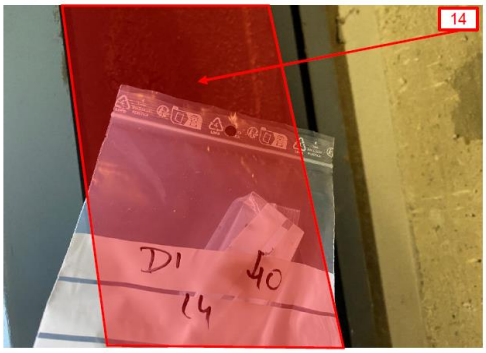











Photos

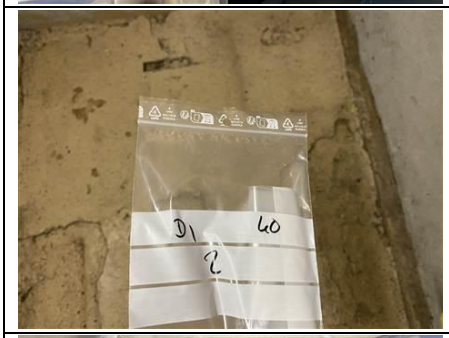
	Photo n° PhA001 Localisation : Machinerie Description : Garniture de frein Localisation sur croquis : 1 Amiante : Chrysotile
	Photo n° PhA002 Localisation : Machinerie Ouvrage : Sol Description : Béton gris Localisation sur croquis : 2 Amiante : Non détecté
	Photo n° PhA003 Localisation : Machinerie Ouvrage : Mur Description : Enduit gris + béton gris Localisation sur croquis : 3 Amiante : Non détecté

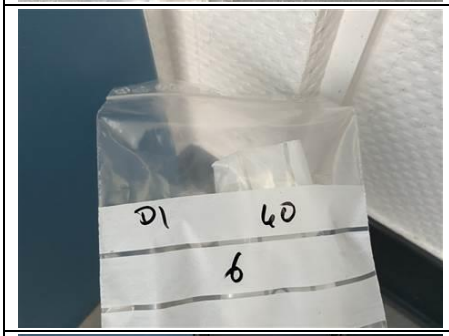
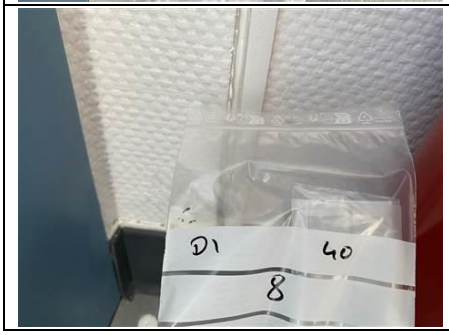
	Photo n° PhA004 Localisation : Machinerie Ouvrage : Plafond Description : Enduit gris + béton gris Localisation sur croquis : 4 Amiante : Non détecté
	Photo n° PhA005 Localisation : 5ème étage - Palier Ouvrage : Sol Description : Revêtement de sol souple + colle + ragréage gris Localisation sur croquis : 5 Amiante : Non détecté
	Photo n° PhA006 Localisation : 5ème étage - Palier Ouvrage : Mur porteur Description : Toile de fibres tissées peinte + enduit blanc + béton gris Localisation sur croquis : 6 Amiante : Non détecté
	Photo n° PhA007 Localisation : 3ème étage - Palier Ouvrage : Sol Description : Revêtement de sol souple + colle + ragréage gris Localisation sur croquis : 7 Amiante : Non détecté
	Photo n° PhA008 Localisation : 3ème étage - Palier Ouvrage : Mur porteur Description : Toile de fibres tissées peinte + enduit blanc + béton gris Localisation sur croquis : 8 Amiante : Non détecté


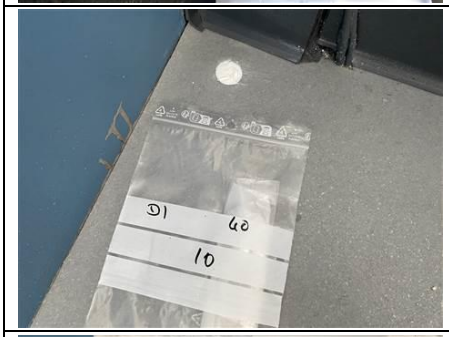
	Photo n° PhA009 Localisation : 1er étage - Gaine d'ascenseur Ouvrage : Porte palière Description : Revêtement bitumineux noir Localisation sur croquis : 9 Amiante : Chrysotile
	Photo n° PhA010 Localisation : 1er étage - Palier Ouvrage : Sol Description : Revêtement de sol souple + colle + ragérage gris Localisation sur croquis : 10 Amiante : Non détecté
	Photo n° PhA011 Localisation : 1er étage - Palier Ouvrage : Mur porteur Description : Toile de fibres tissées peinte + enduit blanc + béton gris Localisation sur croquis : 11 Amiante : Non détecté
	Photo n° PhA012 Localisation : Rez de chaussée - Entrée Ouvrage : Sol Description : Colle grise de carrelage + ragréage gris Localisation sur croquis : 12 Amiante : Non détecté
	Photo n° PhA013 Localisation : Rez de chaussée - Entrée Ouvrage : Mur Description : Colle de plinthe Localisation sur croquis : 13 Amiante : Non détecté

	Photo n° PhA014 Localisation : Rez de chaussée - Gaine d'ascenseur Ouvrage : Porte palière Description : Revêtement bitumineux noir Localisation sur croquis : 14 Amiante : Chrysotile
	Photo n° PhA015 Localisation : Rez de chaussée - Gaine d'ascenseur Ouvrage : Mur Description : Enduit gris + béton gris Localisation sur croquis : 15 Amiante : Non détecté
	Photo n° PhA016 Localisation : Rez de chaussée - Gaine d'ascenseur Ouvrage : Sol Description : Enduit gris + béton gris Localisation sur croquis : 16 Amiante : Non détecté
	Photo n° PhA017 Localisation : Rez de chaussée - Gaine d'ascenseur Ouvrage : Cabine Description : Revêtement bitumineux noir Localisation sur croquis : 17 Amiante : Chrysotile
	Photo n° PhA018 Localisation : 2ème / 4ème étage - Palier Ouvrage : Sol Description : Identique aux prélèvements n° 5 & 7 Localisation sur croquis : ZPSO* 1 Amiante : Absence * Zone Présentant une Similitude d'Ouvrage

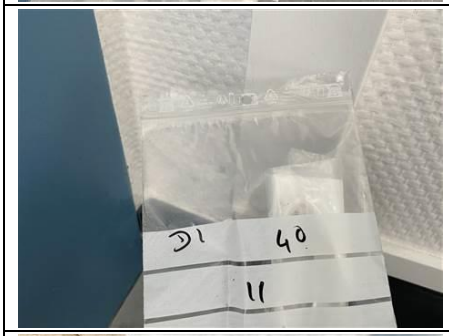

Photo n° PhA019
Localisation : 2ème / 4ème étage - Palier
Ouvrage : Mur porteur
Description : Identique aux prélèvements n° 6 & 8
Localisation sur croquis : ZPSO* 2
Amiante : Absence
* Zone Présentant une Similitude d'Ouvrage

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Copie des rapports d'essais :

LRPE
laboratoire de recherche
des polluants de l'environnement

cofrac ACCRÉDITATION N°1-6395 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR ESSAIS

Les essais couverts par l'accréditation COFRAC sont identifiés par le symbole ♣

RAPPORT D'ESSAI N°2026-M-1892 EN DATE DU 22/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRÉLÈVEMENT DE MATÉRIAU

CLIENT	PRÉLÈVEMENT
Nom* : CHEVALIER DIAG BZH **Adresse* :** 11 rue Lavoisier 56530 QUEVEN	**Adresse* :** GORRÉ MENEZ ASCENSEUR AYR27 29470 LOPERHET **Date de réception :** 11/04/2026

Réf. Dossier Client* : 26-MIN-40-D1 ECH 1 A 17

Analyse :

N° Échantillon	Informations client				Échantillon		Préparation		Analyse				Résultat	Commentaires
	Réf. Client*	Localisation*	Composant construction*	Description client*	♣Description LRPE	♣Apte à la prépa.	♣Type	♣Nb	♣Date d'analyse	♣Méthode	♣Nb de supports**	♣Analyste		
2026-18900	1	Machinerie	-	Garniture de frein	Matériau fibreux marron	OUI	-	1	14/04/2026	MOLP	2	ERI	DÉTECTÉ - Chrysotile	-
2026-18901	2	Machinerie	Sol	Béton gris	Matériau dur gris	OUI	Acide	1	14/04/2026	META	2	ALA	NON DÉTECTÉ - x	-
2026-18902	3	Machinerie	Mur	Enduit gris + béton gris	Matériau pulvérulent gris	OUI	Acide	1	14/04/2026	META	2	ALA	NON DÉTECTÉ - x	-
2026-18903	4	Machinerie	Plafond	Enduit gris + béton gris	Matériau pulvérulent gris	OUI	Acide	1	14/04/2026	META	2	ALA	NON DÉTECTÉ - x	-
2026-18904 A	5	5ème étage - Palier	Sol	Revêtement de sol souple + colle + ragréage gris	Revêtement souple gris	OUI	Acétone	1	14/04/2026	META	2	ALA	NON DÉTECTÉ - x	-
2026-18904 B	5	5ème étage - Palier	Sol	Revêtement de sol souple + colle + ragréage gris	Colle souple jaune + réagréage dur gris	OUI	Acide	1	14/04/2026	META	2	ALA	NON DÉTECTÉ - x	-
2026-18905	6	5ème étage - Palier	Mur porteur	Toile de fibres tissées peinte + enduit blanc + béton gris	Matériau pulvérulent gris + toile de fibre blanc	OUI	Acide	1	22/04/2026	META	2	CVO	NON DÉTECTÉ - x	Couches indissociables - échantillon pollué par une autre couche de l'éch.
2026-18906 A	7	3ème étage - Palier	Sol	Revêtement de sol souple + colle + ragréage gris	Revêtement souple gris	OUI	Acétone	1	22/04/2026	META	2	CVO	NON DÉTECTÉ - x	-
2026-18906 B	7	3ème étage - Palier	Sol	Revêtement de sol souple + colle + ragréage gris	Colle souple jaune + réagréage dur gris	OUI	Acide	1	22/04/2026	META	2	CVO	NON DÉTECTÉ - x	-
2026-18907	8	3ème étage - Palier	Mur porteur	Toile de fibres tissées peinte + enduit blanc + béton gris	Matériau pulvérulent gris + toile de fibre blanc	OUI	Acide	1	22/04/2026	META	2	CVO	NON DÉTECTÉ - x	Couches indissociables - échantillon pollué par une autre couche de l'éch.

♣ Méthode de préparation de l'échantillon :
Effectuée de manière à être représentative de l'échantillon.
Observation à la loupe binoculaire/Traitement chimique/Broyage manuel/Dépôt sur support d'observation selon MO-METH 03.
♣ Méthode d'analyse :
Analyse par Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon la norme NF ISO 22262-1 (parties pertinentes) et l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié.
Analyse par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) selon la norme NF X 43-050 (parties pertinentes) et l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié.
Sont prises en compte toutes les fibres d'amiante dont le rapport longueur sur largeur est supérieur à 3 et la longueur est supérieure à 0,5 µm.

OBSERVATIONS
Pas d'observation.

Revu et approuvé par : Lory LE NEPVEU - Analyste
Date : 22/04/2026

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse. *Informations fournies par le client non couvertes par l'accréditation. **Les supports correspondent aux lames ou grilles observées en microscopie.
Le laboratoire s'exonère de la qualité du prélèvement et de toute responsabilité concernant les informations fournies par le client.

MOLP : aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection (pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 µm).
META : aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
La limite de détection de l'amiante est de 0,1% en masse par couche ou dans la limite de 3 couches indissociables.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, la marque d'accréditation COFRAC figurant en en-tête ne peut être reproduite qu'avec le logo du LRPE et conformément aux règles générales d'utilisation de la marque COFRAC (GEN REF 11). L'usage par le client de la marque d'accréditation COFRAC est interdit.

LRPE
laboratoire de recherche
des polluants de l'environnement

cofrac ESSAIS ACCRÉDITATION N°1-6395 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Les essais couverts par l'accréditation COFRAC sont identifiés par le symbole ♣

RAPPORT D'ESSAI N°2026-M-1892 EN DATE DU 22/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRÉLÈVEMENT DE MATÉRIAU

CLIENT	PRÉLÈVEMENT
Nom* : CHEVALIER DIAG BZH **Adresse* :** 11 rue Lavoisier 56530 QUEVEN	**Adresse* :** GORRÉ MENEZ ASCENSEUR AYR27 29470 LOPERHET **Date de réception :** 11/04/2026

Réf. Dossier Client* : 26-MIN-40-D1 ECH 1 A 17

Analyse :

N° Échantillon	Informations client				Échantillon		Préparation		Analyse				Résultat	Commentaires
	Réf. Client*	Localisation*	Composant construction*	Description client*	♣Description LRPE	♣Apte à la prépa.	♣Type	♣Nb	♣Date d'analyse	♣Méthode	♣Nb de supports**	♣Analyste		
2026-18908	9	1er étage - Gaine d'ascenseur	Porte palière	Revêtement bitumineux noir	Revêtement bitumineux noir	OUI	Chloroforme	1	22/04/2026	META	2	ALA	DÉTECTÉ - Chrysotile	-
2026-18909 A	10	1er étage - Palier	Sol	Revêtement de sol souple + colle + ragéage gris	Revêtement souple gris	OUI	Acétone	1	22/04/2026	META	2	CVO	NON DÉTECTÉ - x	-
2026-18909 B	10	1er étage - Palier	Sol	Revêtement de sol souple + colle + ragéage gris	Colle souple jaune + réagréage dur gris	OUI	Acide	1	22/04/2026	META	2	CVO	NON DÉTECTÉ - x	-
2026-18910	11	1er étage - Palier	Mur porteur	Toile de fibres tissées peinte + enduit blanc + béton gris	Matériau pulvérulent gris + toile de fibre blanc	OUI	Acide	1	22/04/2026	META	2	CVO	NON DÉTECTÉ - x	Couches indissociables - échantillon pollué par une autre couche de l'éch.
2026-18911	12	Rez de chaussée - Entrée	Sol	Colle grise de carrelage + ragréage gris	Matériau pulvérulent gris	OUI	Acide	1	22/04/2026	META	2	CVO	NON DÉTECTÉ - x	-
2026-18912	13	Rez de chaussée - Entrée	Mur	Colle de plinthe	Matériau dur blanc	OUI	Acide	1	22/04/2026	META	2	CVO	NON DÉTECTÉ - x	-
2026-18913	14	Rez de chaussée - Gaine d'ascenseur	Porte palière	Revêtement bitumineux noir	Revêtement bitumineux noir	OUI	Chloroforme	1	21/04/2026	META	2	CVO	DÉTECTÉ - Chrysotile	-
2026-18914	15	Rez de chaussée - Gaine d'ascenseur	Mur	Enduit gris + béton gris	Matériau pulvérulent gris	OUI	Acide	1	22/04/2026	META	2	CVO	NON DÉTECTÉ - x	-
2026-18915	16	Rez de chaussée - Gaine d'ascenseur	Sol	Enduit gris + béton gris	Matériau pulvérulent gris	OUI	Acide	1	22/04/2026	META	2	CVO	NON DÉTECTÉ - x	-
2026-18916	17	Rez de chaussée - Gaine d'ascenseur	Cabine	Revêtement bitumineux noir	Revêtement bitumineux noir	OUI	Chloroforme	1	21/04/2026	META	2	CVO	DÉTECTÉ - Chrysotile	-

♣ Méthode de préparation de l'échantillon :
Effectuée de manière à être représentative de l'échantillon.
Observation à la loupe binoculaire/Traitement chimique/Broyage manuel/Dépôt sur support d'observation selon MO-METH 03.
♣ Méthode d'analyse :
Analyse par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon la norme NF ISO 22262-1 (parties pertinentes) et l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié.
Analyse par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) selon la norme NF X 43-050 (parties pertinentes) et l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié.
Sont prises en compte toutes les fibres d'amiante dont le rapport longueur sur largeur est supérieur à 3 et la longueur est supérieure à 0,5 µm.

OBSERVATIONS
Pas d'observation.

Revu et approuvé par : Lory LE NEPVEU - Analyste

Date : 22/04/2026



Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse. *Informations fournies par le client non couvertes par l'accréditation. **Les supports correspondent aux lames ou grilles observées en microscopie.
Le laboratoire s'exonère de la qualité du prélèvement et de toute responsabilité concernant les informations fournies par le client.

MOLP : aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection (pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 µm).
META : aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
La limite de détection de l'amiante est de 0,1% en masse par couche ou dans la limite de 3 couches indissociables.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, la marque d'accréditation COFRAC figurant en en-tête ne peut être reproduite qu'avec le logo du LRPE et conformément aux règles générales d'utilisation de la marque COFRAC (GEN REF 11). L'usage par le client de la marque d'accréditation COFRAC est interdit.

LRPE
laboratoire de recherche
des polluants de l'environnement

cofrac ESSAIS ACCRÉDITATION N°1-6395 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Les essais couverts par l'accréditation COFRAC sont identifiés par le symbole ♣

RAPPORT D'ESSAI N°2026-M-1892 EN DATE DU 22/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRÉLÈVEMENT DE MATÉRIAU

CLIENT	PRÉLÈVEMENT
Nom* : CHEVALIER DIAG BZH **Adresse* :** 11 rue Lavoisier 56530 QUEVEN	**Adresse* :** GORRÉ MENEZ ASCENSEUR AYR27 29470 LOPERHET **Date de réception :** 11/04/2026

Réf. Dossier Client* : 26-MIN-40-D1 ECH 1 A 17

Analyse :

N° Échantillon	Informations client				Échantillon		Préparation		Analyse				Résultat	Commentaires
	Réf. Client*	Localisation*	Composant construction*	Description client*	♣Description LRPE	♣Apte à la prépa.	♣Type	♣Nb	♣Date d'analyse	♣Méthode	♣Nb de supports**	♣Analyste		

♣ Méthode de préparation de l'échantillon :
Effectuée de manière à être représentative de l'échantillon.
Observation à la loupe binoculaire/Traitement chimique/Broyage manuel/Dépôt sur support d'observation selon MO-METH 03.
♣ Méthode d'analyse :
Analyse par Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon la norme NF ISO 22262-1 (parties pertinentes) et l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié.
Analyse par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) selon la norme NF X 43-050 (parties pertinentes) et l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié.
Sont prises en compte toutes les fibres d'amiante dont le rapport longueur sur largeur est supérieur à 3 et la longueur est supérieure à 0,5 µm.

OBSERVATIONS
Pas d'observation.

Revu et approuvé par : Lory LE NEPVEU - Analyste

Date : 22/04/2026



Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse. *Informations fournies par le client non couvertes par l'accréditation. **Les supports correspondent aux lames ou grilles observées en microscopie.
Le laboratoire s'exonère de la qualité du prélèvement et de toute responsabilité concernant les informations fournies par le client.

MOLP : aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection (pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 µm).
META : aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
La limite de détection de l'amiante est de 0,1% en masse par couche ou dans la limite de 3 couches indissociables.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, la marque d'accréditation COFRAC figurant en en-tête ne peut être reproduite qu'avec le logo du LRPE et conformément aux règles générales d'utilisation de la marque COFRAC (GEN REF 11). L'usage par le client de la marque d'accréditation COFRAC est interdit.

7.3 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.
Le marquage des matériaux et produits contenant de l'amiante doit être réalisé par le donneur d'ordre conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129.

3. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité
Plate frome Trackdechets :
Trackdéchets est obligatoire pour tous les acteurs concernés par la traçabilité des déchets dangereux et de l'amiante.Cette plateforme numérique gratuite permet de dématérialiser la traçabilité des déchets dangereux. Elle permet de faire circuler les BSD (Bordereaux de Suivi de Déchets) et les BSDA (Bordereau de suivi des déchets d'amiante) en toute sécurité, à toutes les étapes du parcours du déchet.

7.4 - Annexe - Autres documents

Votre Assurance
▸ RCE PRESTATAIRES

Assurance et Banque

ATTESTATION

CHEVALIER DIAG BRETAGNE
11 RUE LAVOISIER
56530 QUEVEN FR

COURTIER
DURAND ASSURANCES
8 RUE MAGENTA
53120 GORRON
Tél : 02 43 30 45 98
Fax : 02 43 30 45 98
Email :
CABINET.DURAND.COURTAGE@GMAIL.COM
Portefeuille : 0201386584

Vos références :
Contrat n° 11002336104
Client n° 0762343120

AXA France IARD, atteste que :

CHEVALIER DIAG BRETAGNE
11 RUE LAVOISIER
56530 QUEVEN

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 11002336104** ayant pris effet le **22/07/2022** garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

- ***DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS***

- Constat de risque d'exposition au plomb
- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Information sur la présence d'un risque de mérule

A titre accessoire :

- LOI CARREZ
- MESURE DU RADON
- DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX OU DEMOLITION
- DIAGNOSTIC DE CONFORMITE AUX NORMES DE SURFACE ET D'HABITABILITE
- PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE PERMEABILITE A L'AIR

1D052620260112

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/3

- VERIFICATION DE LA CONFORMITE DE LA NOUVELLE REGLEMENTATION TERHMIQUE RT 2012
- DIAGNOSTIC SUR FIBRE CERAMIQUE REFRACTAIRE
- DIAGNOSTIC SUR HYDROCARBURE AROMATIQUE POLYCYCLIQUE
- DIAGNOSTIC DE DECHETS ISSUS DE LA DEMOLITION à l'exclusion des métaux lourds.

1/ En cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation :

2/ En cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des risques naturels, miniers et technologiques prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 131-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'information sur la présence d'un risque de mérule prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

En complément de l'article 1.1 des Conditions générales, ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux diagnostics techniques.
La garantie du contrat est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré lorsqu'il réalise à titre accessoire ces mêmes constats et diagnostics en dehors de la constitution du dossier technique.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2026** au **01/01/2027** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

MONTANT DES GARANTIES

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	**9.000.000** € par année d'assurance
Dont :	
• **Dommages corporels**	**9.000.000** € par année d'assurance
• **Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus**	**1.200.000** € par année d'assurance
• **Dommages immatériels non consécutifs**	**150.000** € par année d'assurance
• **Dommages aux biens confiés**	**150.000** € par sinistre
Autres garanties :	
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	**2.000.000** € par année d'assurance dont **1.000.000** € par sinistre
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	**500.000** € par année d'assurance dont **300.000** € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) **:**	
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont :	**1.000.000** € par année d'assurance
Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	**100.000** € par année d'assurance
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	**20.000** € par litige

Fait à PARIS le 12 janvier 2026
Pour la société :

Saint Rémy les chevreuse, le 30/03/2026

La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA à

Morgane CHASSAGNE

Sous le Numéro **23-2298**

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

☑	**AMIANTE AVEC MENTION**	Prise d'effet : 26/10/2020	Validité : 25/10/2027
	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite		
☑	**DPE SANS MENTION**	Prise d'effet : 04/11/2020	Validité : 03/11/2027
	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, modifié par l'arrêté du 16 juin 2025		
☑	**AMIANTE SANS MENTION**	Prise d'effet : 26/10/2020	Validité : 25/10/2027
	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite		
☑	**ELECTRICITE**	Prise d'effet : 04/11/2020	Validité : 03/11/2027
	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite		
☑	**GAZ**	Prise d'effet : 08/10/2020	Validité : 07/10/2027
	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite		
☑	**PLOMB SANS MENTION**	Prise d'effet : 08/10/2020	Validité : 07/10/2027
	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite		

Accréditation
N° 4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance.
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

Signature :

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés
