Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux

Articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issus du décret 2017-899 du 9 mai 2017 – Norme NF X46-102 novembre 2020



Numéro de rapport	**54759-103348 A**
Propriétaire	**VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE UTI DES BOUCLES DE LA SEINE 23 ILE DE LA LOGE 78380 BOUGIVAL**
Donneur d'ordre	**VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE UTI DES BOUCLES DE LA SEINE 23 ILE DE LA LOGE 78380 BOUGIVAL**
Nom et adresse du site	**Bardeur d'Andrésy Ile Peygrand-Barrage d'Andrésy 78260 ACHERES**
Date de la commande	**27/05/2022**
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	**07/06/2022**
Date d'émission du rapport de repérage	**20/06/2022**
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	**Voir descriptif du programme de travaux Page 4**

Signataire du rapport

Signature et Visa



ADIAG
30 rue des Malines
91090 LISSES
Siret : 483 336 319 00155
Tél : 01 83 63 96 93 - lisses@adiag.apave.com

Opérateur de repérage :
BLEUZEN Jimmy
ADIAG

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et avec l'accord écrit de son signataire.

➢ **Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante :**

Elément	Etage	Zone	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Critère de décision	Référence ZPSO/CPSM
Bardeur	Extérieur		Eléments de translation n°1 - IPN VERT	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P003)	
			Tête d'ancrage gauche	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P001)	
			Tête d'ancrage droite	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P002)	
			Eléments de translation n°1 - Roues	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P005)	
			Eléments de translation n°1 - Tuyauteries	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	
			Eléments de translation n°1 - Garde-corps	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P006)	
			Eléments de translation n°1 - IPN BLEU	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	
			Eléments de translation n°1 - Passage de cables éléctriques	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P008)	
			Eléments de translation n°1 - Tableau électrique	Plastique - Peinture	Résultat d'analyse (P012)	
			Eléments de translation n°2 - Mécanisme de translation	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P013)	
			Socle	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P014)	
Cabine	Extérieur		Fixation	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P010)	
			Porte	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P009)	
			Fenêtre	Joints - Vitrier	Résultat d'analyse (P011)	

Commentaires :
Néant

Légende :
ZPSO : Zone présentant des similitudes d'ouvrage
CPSM : Couche présentant des similitudes de matériaux

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT 1
CONCLUSIONS 1
DESCRIPTION DE LA MISSION 4
OBJET DE LA MISSION : 4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : 4
IDENTIFICATION COMPLETE DU SITE CONCERNE : 4
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE : 4
PROGRAMME DETAILLE DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE 4
PERIMETRE DU REPERAGE : ELEMENTS ET PARTIES D'ELEMENTS CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : 5
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 5
RESULTATS DU REPERAGE - LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES 6
ANNEXE - TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES D'AMIANTE 7
ANNEXE : FICHES DESCRIPTIVES DES ELEMENTS ET COMPOSANTS REPERES 8
ANNEXE : PLANS / CROQUIS 15
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE 21
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE 27
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE 28

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers.	
Référence de l'ordre de mission : **54759-103348**	Référence du donneur d'ordre : **Bardeur Andrésy**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire du site :	**VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE**		
Adresse du propriétaire :	**UTI DES BOUCLES DE LA SEINE 23 ILE DE LA LOGE 78380 BOUGIVAL**		
Représenté par :			
Donneur d'ordre :	**VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE**		
Accompagnateur :	M. Bertrand CHAVANEL		
Opérateur ayant réalisé le repérage :	**BLEUZEN Jimmy**		
N° de certification de l'opérateur :	**C019-SE04-2018**	Organisme : **Wi.Cert**	
Nom et adresse de l'entreprise :	**ADIAG - 6/8 rue de la Closerie - 91090 LISSES**		
N° de Siret :	**48333631900221**		
RCP-compagnie-n° de police :	**AXA IARD - RC 5271124804**		

1.3 Identification complète du site concerné :

Dénomination :	**Bardeur Andrésy**
Adresse complète :	**Ile Peygrand-Barrage d'Andrésy 78260 ACHERES**
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le site concerné :	

1.4 Identification du laboratoire :

Nom :	**Eurofins Analyse pour le Bâtiment Nord**	N° d'accréditation :	**1-1593**
Adresse complète :	**557 route de Noyelles PA du Pommier 62110 HÉNIN-BEAUMONT**		

2 Programme détaillé de Travaux du donneur d'ordre

Programme détaillé de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, éléments et parties d'éléments à inspecter :

Changement du bardeur et de ses équipements

2.1 Périmètre du repérage : éléments et parties d'éléments concernés (zone d'intervention) :

➢ **Liste des éléments / Parties d'éléments visités**

Eléments et parties d'éléments
Bardeur
Cabine

➢ **Liste des <u>éléments non accessibles</u> :**

Néant

➢ **Liste des <u>parties d'éléments non accessibles</u> :**

Néant

➢ **Liste des <u>parties d'éléments non accessibles</u> :**
(Impossibilité technique d'effectuer un prélèvement et/ou un sondage)

Néant

3 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers., susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de travaux.
Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers, objet des travaux.
Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.
Procédures de prélèvement :
Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.
Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique ou contre-indication) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.
L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche descriptive des équipements et composants en annexe.
L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.
Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.
Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.
Avertissements :
Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.
Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », … dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

➢ **Ecarts, adjonctions ou suppression par rapport à la norme NF X 42-102 et justification de cet écart :**

Sans objet

➢ **Dates et nature des visites sur site :**

Date	Objet

➢ **Analyse documentaire :**

Aucun documents remis.

➢ **Rapports précédemment réalisés :**

Néant

Information relative aux conditions spécifique du repérage :
Néant

4 Résultats du repérage - Liste des matériaux et produits repérés

➢ **Matériaux et produits contenant de l'amiante :**

Aucun matériaux et produits contenant de l'amiante a été repéré

➢ **Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante :**

Elément	Etage	Zone	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Critère de décision	Référence ZPSO/CPSM
Bardeur	Extérieur		Eléments de translation n°1 - IPN VERT	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P003)	
			Tête d'ancrage gauche	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P001)	
			Tête d'ancrage droite	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P002)	
			Eléments de translation n°1 - Roues	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P005)	
			Eléments de translation n°1 - Tuyauteries	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	
			Eléments de translation n°1 - Garde-corps	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P006)	
			Eléments de translation n°1 - IPN BLEU	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	
			Eléments de translation n°1 - Passage de cables éléctriques	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P008)	
			Eléments de translation n°1 - Tableau électrique	Plastique - Peinture	Résultat d'analyse (P012)	

Elément	Etage	Zone	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Critère de décision	Référence ZPSO/CPSM
			Eléments de translation n°2 - Mécanisme de translation	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P013)	
			Socle	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P014)	
Cabine	Extérieur		Fixation	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P010)	
			Porte	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P009)	
			Fenêtre	Joints - Vitrier	Résultat d'analyse (P011)	

Légende :
ZPSO : Zone présentant des similitudes d'ouvrage
CPSM : Couche présentant des similitudes de matériaux

ANNEXE - Tableau estimatif des quantités d'amiante

Néant

ANNEXE : Fiches descriptives des éléments et composants repérés

PRELEVEMENT : P001		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 54759-103348	**Elément – Ouvrage** Extérieur - Bardeur - Tête d'ancrage gauche
Nom de l'opérateur BLEUZEN Jimmy	**Date de prélèvement** 07/06/2022	**Partie d'ouvrage** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n :**	
Métal / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 54759-103348	**Elément – Ouvrage** Extérieur - Bardeur - Tête d'ancrage droite
Nom de l'opérateur BLEUZEN Jimmy	**Date de prélèvement** 07/06/2022	**Partie d'ouvrage** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n :**	
Métal / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 54759-103348	**Elément – Ouvrage** Extérieur - Bardeur - Eléments de translation n°1
Nom de l'opérateur BLEUZEN Jimmy	**Date de prélèvement** 07/06/2022	**Partie d'ouvrage** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 54759-103348	**Elément – Ouvrage** Extérieur - Bardeur - Eléments de translation n°1
Nom de l'opérateur BLEUZEN Jimmy	**Date de prélèvement** 07/06/2022	**Partie d'ouvrage** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 54759-103348	**Elément – Ouvrage** Extérieur - Bardeur - Eléments de translation n°1
Nom de l'opérateur BLEUZEN Jimmy	**Date de prélèvement** 07/06/2022	**Partie d'ouvrage** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n :**	
Métal / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 54759-103348	**Elément – Ouvrage** Extérieur - Bardeur - Eléments de translation n°1
Nom de l'opérateur BLEUZEN Jimmy	**Date de prélèvement** 07/06/2022	**Partie d'ouvrage** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n :**	
Métal / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 54759-103348	**Elément – Ouvrage** Extérieur - Bardeur - Eléments de translation n°1
Nom de l'opérateur BLEUZEN Jimmy	**Date de prélèvement** 07/06/2022	**Partie d'ouvrage** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n :**	
Métal / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 54759-103348	**Elément – Ouvrage** Extérieur - Bardeur - Eléments de translation n°1
Nom de l'opérateur BLEUZEN Jimmy	**Date de prélèvement** 07/06/2022	**Partie d'ouvrage** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n :**	
Métal / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 54759-103348	**Elément – Ouvrage** Extérieur - Cabine - Porte
Nom de l'opérateur BLEUZEN Jimmy	**Date de prélèvement** 07/06/2022	**Partie d'ouvrage** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 54759-103348	**Elément – Ouvrage** Extérieur - Cabine - Fixation
Nom de l'opérateur BLEUZEN Jimmy	**Date de prélèvement** 07/06/2022	**Partie d'ouvrage** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 54759-103348	**Elément – Ouvrage** Extérieur - Cabine - Fenêtre
Nom de l'opérateur BLEUZEN Jimmy	**Date de prélèvement** 07/06/2022	**Partie d'ouvrage** Joints - Vitrier
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n :**	
Métal / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur de type joint (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 54759-103348	**Elément – Ouvrage** Extérieur - Bardeur - Eléments de translation n°1
Nom de l'opérateur BLEUZEN Jimmy	**Date de prélèvement** 07/06/2022	**Partie d'ouvrage** Plastique - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n :**	
Métal / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées

ADIAG - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES
SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

PRELEVEMENT : P013		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 54759-103348	**Elément – Ouvrage** Extérieur - Bardeur - Eléments de translation n°2
Nom de l'opérateur BLEUZEN Jimmy	**Date de prélèvement** 07/06/2022	**Partie d'ouvrage** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n :**	
Métal / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 54759-103348	**Elément – Ouvrage** Extérieur - Bardeur - Socle
Nom de l'opérateur BLEUZEN Jimmy	**Date de prélèvement** 07/06/2022	**Partie d'ouvrage** Béton - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n :**	
Béton / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

ADIAG - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES
SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

ANNEXE : Plans / Croquis

ADIAG - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES
SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Croquis N°1	N° planche : 1/5	N° dossier : 54759-103348	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT	Version : 0	Adresse : Bardeur Andrésy 78570 ANDRESY	
Intervenant : BLEUZEN Jimmy	Date : 20/06/2022		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : Têtes d'ancrages



Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Croquis N°2	N° planche : 2/5	N° dossier : 54759-103348	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT	Version : 0	Adresse : Bardeur Andrésy 78570 ANDRESY	
Intervenant : BLEUZEN Jimmy	Date : 20/06/2022		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : Bardeur

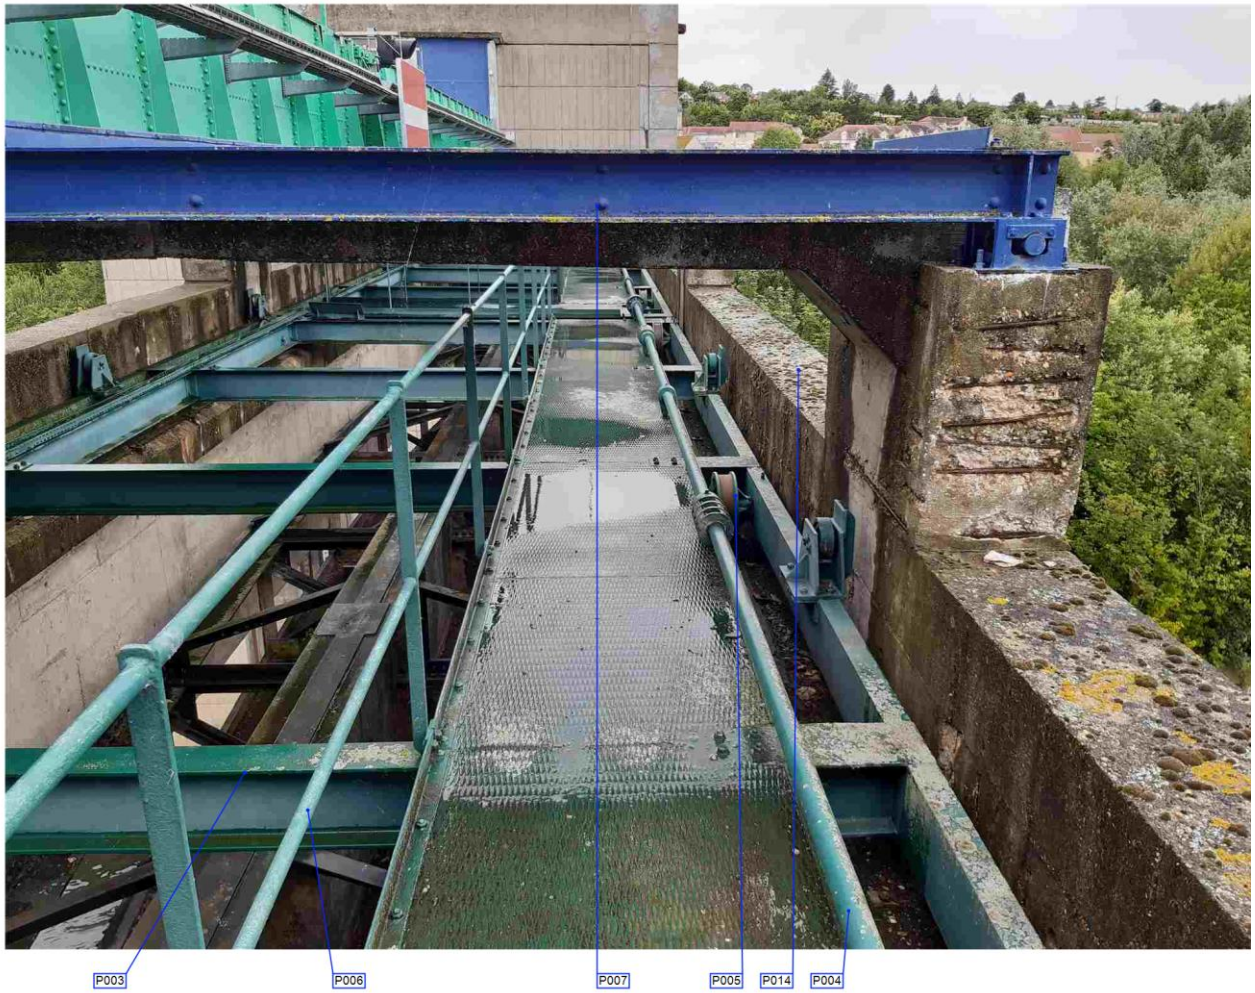



Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Croquis N°3	N° planche : 3/5	N° dossier : 54759-103348	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT	Version : 0	Adresse : Bardeur Andrésy 78570 ANDRESY	
Intervenant : BLEUZEN Jimmy	Date : 20/06/2022		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : Cabine



Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Croquis N°4	N° planche : 4/5	N° dossier : 54759-103348	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT	Version : 0	Adresse : Bardeur Andrésy 78570 ANDRESY	
Intervenant : BLEUZEN Jimmy	Date : 20/06/2022		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : Coffret électrique

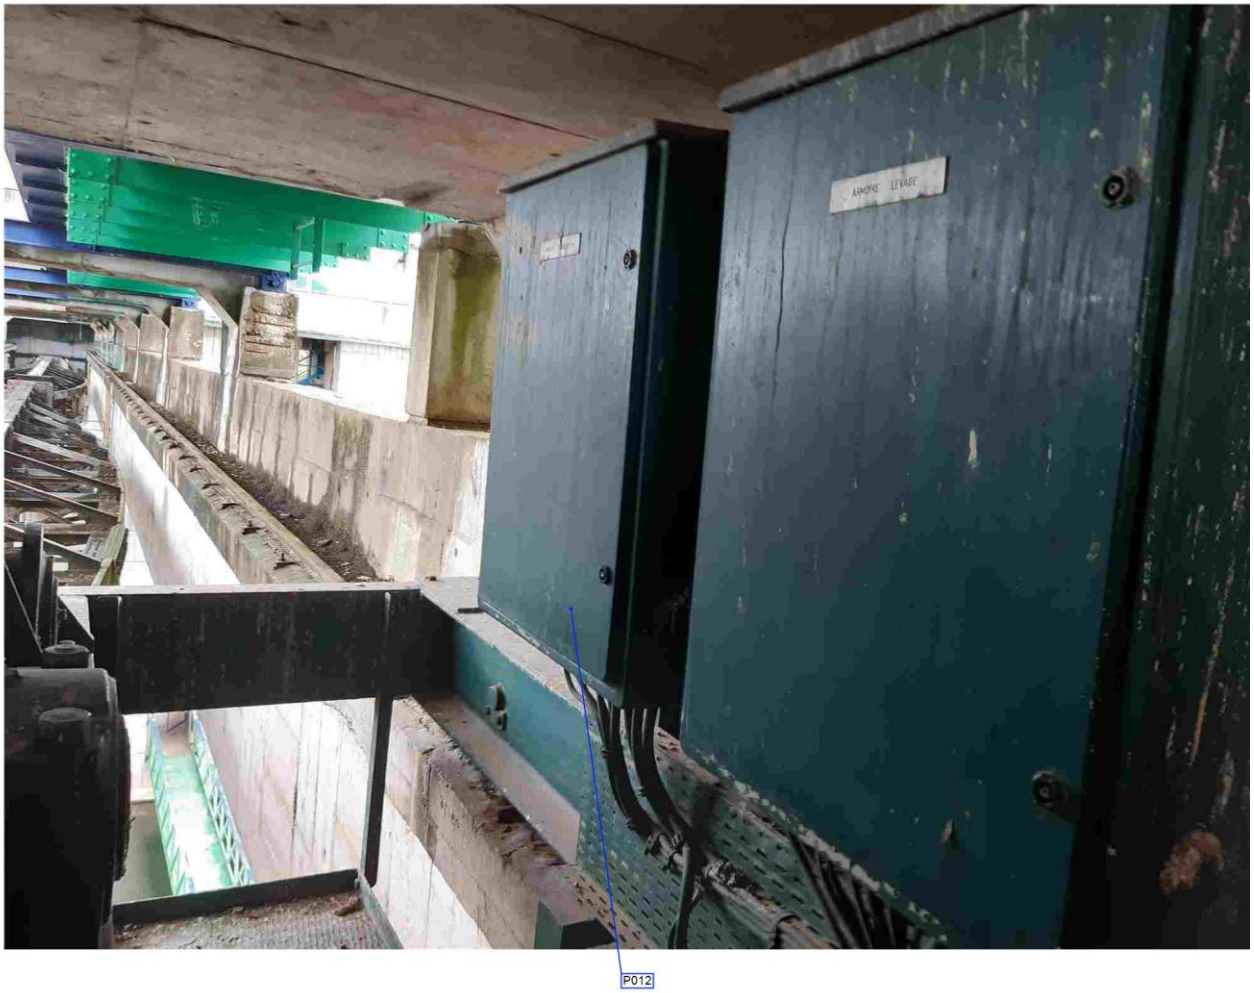

ADIAG - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES
SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Croquis N°5	N° planche : 5/5	N° dossier : 54759-103348	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT	Version : 0	Adresse : Bardeur Andrésy 78570 ANDRESY	
Intervenant : BLEUZEN Jimmy	Date : 20/06/2022		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : Mécanisme bardeur



ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV_00720220600834559

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

ADIAG SAS
Monsieur Jimmy BLEUZEN
6/8 Rue de la Closerie
91090 LISSES

Notre référence : AR-22-HB-042165-01

Numéro de dossier : 22N021411
Référence de dossier :
54759-103348 A - Bardeur Andrésy 78570 ANDRESY - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 22N021411-001 - Référence *P001-Extérieur - Bardeur - - Tête d'ancrage gauche - Métal - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22N021411-002 - Référence *P002-Extérieur - Bardeur - - Tête d'ancrage droite - Métal - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22N021411-003 - Référence *P003-Extérieur - Bardeur - - Eléments de translation n°1 - Métal - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22N021411-004 - Référence *P004-Extérieur - Bardeur - - Eléments de translation n°1 - Métal - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22N021411-005 - Référence *P005-Extérieur - Bardeur - - Eléments de translation n°1 - Métal - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22N021411-006 - Référence *P006-Extérieur - Bardeur - - Eléments de translation n°1 - Métal - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 HENIN BEAUMONT
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 22N021411-007 - Référence *P007-Extérieur - Bardeur - - Eléments de translation n°1 - Métal - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22N021411-008 - Référence *P008-Extérieur - Bardeur - - Eléments de translation n°1 - Métal - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22N021411-009 - Référence *P009-Extérieur - Cabine - - Porte - Métal - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22N021411-010 - Référence *P010-Extérieur - Cabine - - Fixation - Métal - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22N021411-011 - Référence *P011-Extérieur - Cabine - - Fenêtre - Joints - Vitrier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22N021411-012 - Référence *P012-Extérieur - Bardeur - - Eléments de translation n°1 - Plastique - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22N021411-013 - Référence *P013-Extérieur - Bardeur - - Eléments de translation n°2 - Métal - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22N021411-014 - Référence *P014-Extérieur - Bardeur - - Socle - Béton - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 HENIN BEAUMONT
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT NORD SAS
Réception résultat
557 Route de Noyelles
PA du Pommier
62110 Hénin Beaumont

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-051870-01 — Date d'émission de rapport : 16/06/2022 6:40 — Page1/4
Référence laboratoire N° : 22EK052097 — Référence de suivi du dossier N° : 22N021411
Reçu au laboratoire le : 14/06/2022 — Date de réception :13/06/2022
Date d'analyse : 15/06/2022
Référence dossier Client:22N021411 - 54759-103348 A - Bardeur Andrésy 78570 ANDRESY - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	22N021411-001 - P001-Extérieur - Bardeur - - Tête d''ancrage gauche - Métal - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (noir)	**MET** / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	22N021411-002 - P002-Extérieur - Bardeur - - Tête d''ancrage droite - Métal - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (noir)	**MET** / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	22N021411-003 - P003-Extérieur - Bardeur - - Eléments de translation n°1 - Métal - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (vert)	**MET** / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	22N021411-004 - P004-Extérieur - Bardeur - - Eléments de translation n°1 - Métal - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (vert)	**MET** / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	22N021411-005 - P005-Extérieur - Bardeur - - Eléments de translation n°1 - Métal - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur (noir)	**MET** / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-051870-01 — Date d'émission de rapport : 16/06/2022 6:40 — Page2/4
Référence laboratoire N° : 22EK052097 — Référence de suivi du dossier N° : 22N021411
Reçu au laboratoire le : 14/06/2022 — Date de réception :13/06/2022
Date d'analyse : 15/06/2022
Référence dossier Client:22N021411 - 54759-103348 A - Bardeur Andrésy 78570 ANDRESY - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	22N021411-006 - P006-Extérieur - Bardeur - - Eléments de translation n°1 - Métal - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (vert)	**MET** / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	22N021411-007 - P007-Extérieur - Bardeur - - Eléments de translation n°1 - Métal - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu)	**MET** / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	22N021411-008 - P008-Extérieur - Bardeur - - Eléments de translation n°1 - Métal - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (vert)	**MET** / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	22N021411-009 - P009-Extérieur - Cabine - - Porte - Métal - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (vert)	**MET** / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	22N021411-010 - P010-Extérieur - Cabine - - Fixation - Métal - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (vert)	**MET** / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	22N021411-011 - P011-Extérieur - Cabine - - Fenêtre - Joints - Vitrier	Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur de type joint (gris)	**MET** / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-051870-01 — Date d'émission de rapport : 16/06/2022 6:40 — Page3/4
Référence laboratoire N° : 22EK052097 — Référence de suivi du dossier N° : 22N021411
Reçu au laboratoire le : 14/06/2022 — Date de réception :13/06/2022
Date d'analyse : 15/06/2022
Référence dossier Client:22N021411 - 54759-103348 A - Bardeur Andrésy 78570 ANDRESY - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	22N021411-012 - P012-Extérieur - Bardeur - - Eléments de translation n°1 - Plastique - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (vert)	**MET** / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	22N021411-013 - P013-Extérieur - Bardeur - - Eléments de translation n°2 - Métal - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (vert)	**MET** / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	22N021411-014 - P014-Extérieur - Bardeur - - Socle - Béton - Peinture	Matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, P-PS-SOP3368 : version 7

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-051870-01 | Date d'émission de rapport : 16/06/2022 6:40 | Page4/4
Référence laboratoire N° : 22EK052097 | Référence de suivi du dossier N° : 22N021411
Reçu au laboratoire le : 14/06/2022 | Date de réception :13/06/2022
Date d'analyse : 15/06/2022
Référence dossier Client:22N021411 - 54759-103348 A - Bardeur Andrésy 78570 ANDRESY - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.
NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/.
NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).
NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Pedro Lousada
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

ANNEXE : Certificat de compétence

Numéro d'accréditation
4-0598
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

WI.CERT
« CERTIFICATION DE COMPETENCES
«Version 06»

Décerné à : **BLEUZEN Jimmy** Sous le numéro : **C019-SE04-2018**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	Du 04/07/2018 Au 02/07/2023
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 04/07/2018 Au 13/05/2023
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 04/07/2018 Au 13/05/2023
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 04/07/2018 Au 13/05/2023
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 04/07/2018 Au 13/05/2023
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)	Du 22/07/2020 Au 13/05/2023
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 04/07/2018 Au 02/05/2023
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis;
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 25 mars 2019.

Délivré à Thionville, le 22/07/2020
Par WI.CERT
Responsable de certification

WI.CERT
16 RUE DE VILLARS
57100 THIONVILLE

WI.Cert - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-competences.com;
SARL au capital de 7500 Euros – RCS de Thionville – *Code APE / NAF*, 7120B N°SIRET 82885893600010

ANNEXE : Attestation d'assurance

Contrat RC n° 10800807204 1/2

AXA France IARD
DIRECTION ENTREPRISES
Production R.C. – Grands Comptes
Télécopie 01.57 65 07 90

ATTESTATION

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cedex, atteste par la présente que l'assuré :

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale **APAVE DEVELOPPEMENT et de sa filiale ADIAG SA**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° **10800807204**, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces métiers,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :
- **des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation**
- **des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)**
- **des activités de classification et certification de navires et unités offshore.**

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Contrat RC n° 10800807204 2/2

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus *Sans pouvoir excéder pour :*	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada *sous-limités :* c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	5 000 000 € par année d'assurance 1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

***Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2022 au 31/12/2022** inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre le 30/12/2021
Par délégation
POUR L'ASSUREUR :



AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Fin du rapport
