Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux

Articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issus du décret 2017-899 du 9 mai 2017 – Norme NF X46-102 novembre 2020



Numéro de rapport	**48836-115628 A**
Propriétaire	**VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE DT BS SUBDIVISION DE SURESNES 5 BIS RUE EDOUARD NIEUPORT 92150 SURESNES**
Donneur d'ordre	**VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE DT BS SUBDIVISION DE SURESNES 5 BIS RUE EDOUARD NIEUPORT 92150 SURESNES**
Nom et adresse du site	**1 écluse 78380 BOUGIVAL Coordonnées GPS : /**
Date de la commande	**18/01/2022**
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	**25/10/2022**
Date d'émission du rapport de repérage	**27/10/2022**
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	

Signataire du rapport

Signature et Visa



apave
Apave Diagnostics
6/8, rue des Draperies
91090 LISSES
Tél. : 33 (0)1 83 63 96 93
lisses@adiag.apave.com
SIRET 483 336 319 00221

Opérateur de repérage :
BLEUZEN Jimmy
Apave Diagnostics

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et avec l'accord écrit de son signataire.

➢ **Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante :**

Elément	Etage	Zone	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Critère de décision	Référence ZPSO/CPSM
Ecluse	Bougival		Echelle de SAS n°1	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P002)	
			Echelle de SAS n°2	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	
			Croix d'amarrage n°1	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P001)	
			Croix d'amarrage n°2	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P003)	
Ecluse	Chatou		Croix d'amarrage n°1	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	
			Croix d'amarrage n°2	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P006)	
			Echelle de SAS n°1	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P005)	
			Echelle de SAS n°2	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P008)	

Commentaires :
Néant

Légende :
ZPSO : Zone présentant des similitudes d'ouvrage
CPSM : Couche présentant des similitudes de matériaux

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES
SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT 1
CONCLUSIONS 1
DESCRIPTION DE LA MISSION 4
OBJET DE LA MISSION : 4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : 4
IDENTIFICATION COMPLETE DU SITE CONCERNE : 4
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE : 4
PROGRAMME DETAILLE DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE 4
PERIMETRE DU REPERAGE : ELEMENTS ET PARTIES D'ELEMENTS CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : 4
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 5
RESULTATS DU REPERAGE - LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES 6
ANNEXE - TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES D'AMIANTE 6
ANNEXE : FICHES DESCRIPTIVES DES ELEMENTS ET COMPOSANTS REPERES 7
ANNEXE : PLANS / CROQUIS 11
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE 16
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE 24
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE 25

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES
SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers.	
Référence de l'ordre de mission : **48836-115628**	Référence du donneur d'ordre : **1911F016B BOUGIVAL**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire du site :	**VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE**		
Adresse du propriétaire :	**DT BS SUBDIVISION DE SURESNES 5 BIS RUE EDOUARD NIEUPORT 92150 SURESNES**		
Représenté par :			
Donneur d'ordre :	**VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE**		
Accompagnateur :	**Aucun**		
Opérateur ayant réalisé le repérage :	**BLEUZEN Jimmy**		
N° de certification de l'opérateur :	**C2018-SE04-019**	Organisme : **WE-CERT**	
Nom et adresse de l'entreprise :	**Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 LISSES**		
N° de Siret :	**48333631900221**		
RCP-compagnie-n° de police :	**AXA IARD - RC 5271124804**		

1.3 Identification complète du site concerné :

Dénomination :	
Adresse complète :	**1 écluse - 78380 BOUGIVAL**
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le site concerné :	

1.4 Identification du laboratoire :

Nom :	**Eurofins Analyse pour le Bâtiment Nord**	N° d'accréditation :	**1-1593**
Adresse complète :	**557 route de Noyelles PA du Pommier 62110 HÉNIN-BEAUMONT**		

2 Programme détaillé de Travaux du donneur d'ordre

Programme détaillé de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, éléments et parties d'éléments à inspecter :

Travaux sur les échelles de sas et croix d'amarrage

2.1 Périmètre du repérage : éléments et parties d'éléments concernés (zone d'intervention) :

➢ **Liste des éléments / Parties d'éléments visités**

Eléments et parties d'éléments
Ecluse
Ecluse

➢ **Liste des éléments non accessibles :**

Néant

- **Liste des <u>parties d'éléments non accessibles</u> :**

Néant

- **Liste des <u>parties d'éléments non accessibles</u> :**
  (Impossibilité technique d'effectuer un prélèvement et/ou un sondage)

Néant

3 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers., susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de travaux.
Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers, objet des travaux.
Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.
Procédures de prélèvement :
Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.
Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique ou contre-indication) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.
L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche descriptive des équipements et composants en annexe.
L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.
Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.
Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.
Avertissements :
Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.
Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », … dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

- **Ecarts, adjonctions ou suppression par rapport à la norme NF X 42-102 et justification de cet écart :**

Sans objet

➢ **Dates et nature des visites sur site :**

Date	Objet

➢ **Analyse documentaire :**

Aucun documents remis.

➢ **Rapports précédemment réalisés :**

Néant

Information relative aux conditions spécifique du repérage :
Néant

4 Résultats du repérage - Liste des matériaux et produits repérés

➢ **Matériaux et produits contenant de l'amiante :**

Aucun matériaux et produits contenant de l'amiante a été repéré

➢ **Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante :**

Elément	Etage	Zone	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Critère de décision	Référence ZPSO/CPSM
Ecluse	Bougival		Echelle de SAS n°1	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P002)	
			Echelle de SAS n°2	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	
			Croix d'amarrage n°1	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P001)	
			Croix d'amarrage n°2	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P003)	
Ecluse	Chatou		Croix d'amarrage n°1	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	
			Croix d'amarrage n°2	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P006)	
			Echelle de SAS n°1	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P005)	
			Echelle de SAS n°2	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P008)	

Légende :
ZPSO : Zone présentant des similitudes d'ouvrage
CPSM : Couche présentant des similitudes de matériaux

ANNEXE - Tableau estimatif des quantités d'amiante

Néant

ANNEXE : Fiches descriptives des éléments et composants repérés

PRELEVEMENT : P001		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 48836-115628	**Elément – Ouvrage** Bougival - Ecluse - Croix d'amarrage n°1
Nom de l'opérateur BLEUZEN Jimmy	**Date de prélèvement** 25/10/2022	**Partie d'ouvrage** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n :**	
Métal / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 48836-115628	**Elément – Ouvrage** Bougival - Ecluse - Echelle de SAS n°1
Nom de l'opérateur BLEUZEN Jimmy	**Date de prélèvement** 25/10/2022	**Partie d'ouvrage** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n :**	
Métal / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 48836-115628	**Elément – Ouvrage** Bougival - Ecluse - Croix d'amarrage n°2
Nom de l'opérateur BLEUZEN Jimmy	**Date de prélèvement** 25/10/2022	**Partie d'ouvrage** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P004		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 48836-115628	**Elément – Ouvrage** Bougival - Ecluse - Echelle de SAS n°2
Nom de l'opérateur BLEUZEN Jimmy	**Date de prélèvement** 25/10/2022	**Partie d'ouvrage** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + mousse végétale en vrac avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005
Emplacement :

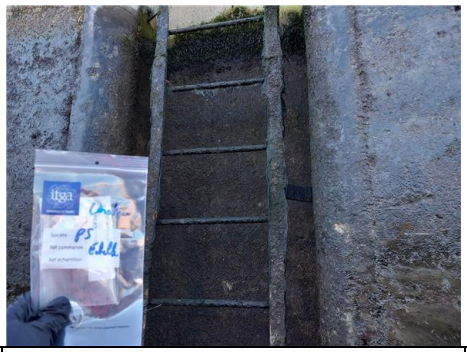

Nom du client	Numéro de dossier	Elément – Ouvrage
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	48836-115628	Chatou - Ecluse - Echelle de SAS n°1
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie d'ouvrage**
BLEUZEN Jimmy	25/10/2022	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Elément – Ouvrage
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	48836-115628	Chatou - Ecluse - Croix d'amarrage n°2
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie d'ouvrage**
BLEUZEN Jimmy	25/10/2022	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Elément – Ouvrage
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	48836-115628	Chatou - Ecluse - Croix d'amarrage n°1
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie d'ouvrage**
BLEUZEN Jimmy	25/10/2022	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Elément – Ouvrage
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	48836-115628	Chatou - Ecluse - Echelle de SAS n°2
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie d'ouvrage**
BLEUZEN Jimmy	25/10/2022	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE : Plans / Croquis

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES
SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Croquis N°1	N° planche : 1/4	N° dossier : 48836-115628	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT	Version : 0	Adresse : 1 écluse 78380 BOUGIVAL	
Intervenant : BLEUZEN Jimmy	Date : 27/10/2022		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : Croix d'ammarrage Bougival



Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Croquis N°2	N° planche : 2/4	N° dossier : 48836-115628	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT	Version : 0	Adresse : 1 écluse 78380 BOUGIVAL	
Intervenant : BLEUZEN Jimmy	Date : 27/10/2022		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : Croix d'ammarrage Chatou

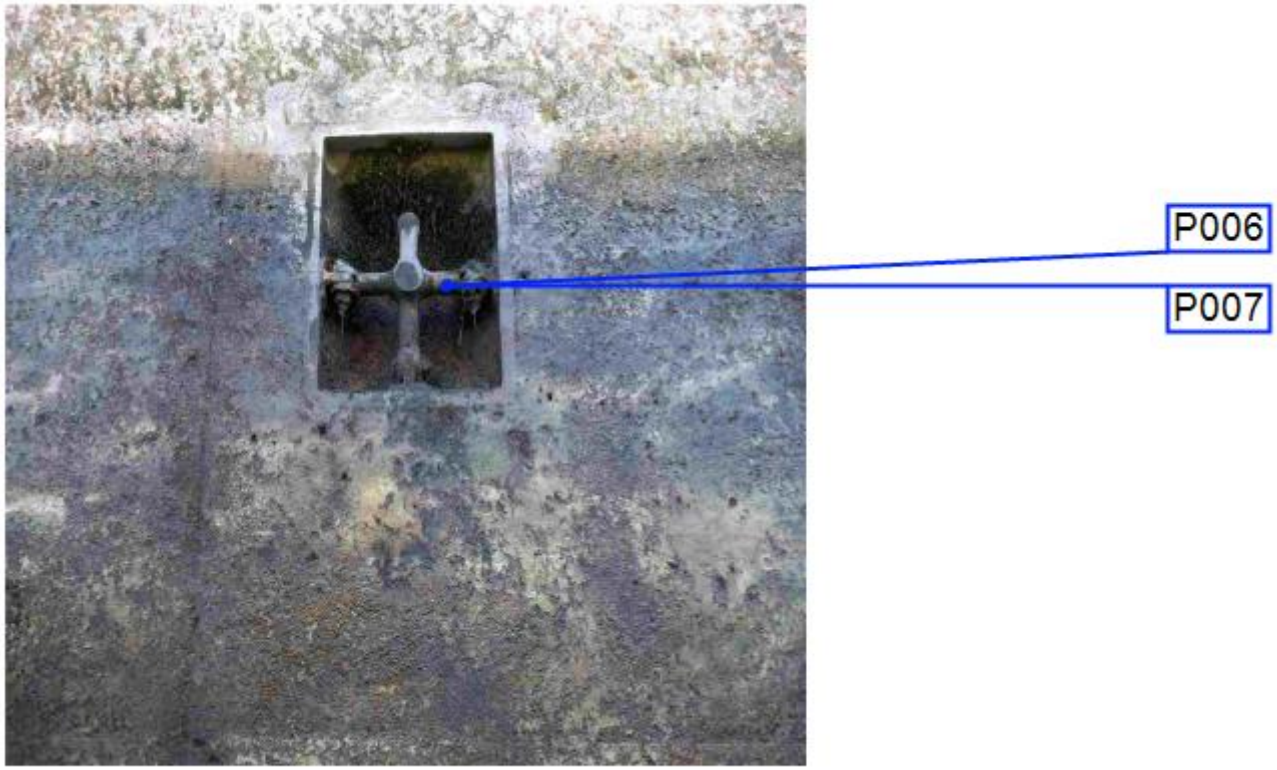


Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante			
Titre : Croquis N°3	N° planche : 3/4	N° dossier : 48836-115628	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT	Version : 0	Adresse : 1 écluse 78380 BOUGIVAL	
Intervenant : BLEUZEN Jimmy	Date : 27/10/2022		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : Echelle de SAS Bougival



Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante			
Titre : Croquis N°4	N° planche : 4/4	N° dossier : 48836-115628	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT	Version : 0	Adresse : 1 écluse 78380 BOUGIVAL	
Intervenant : BLEUZEN Jimmy	Date : 27/10/2022		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : Echelle de SAS Chatou



ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

E.20232988.0.PDF

itga
Innovateur en fiabilité
Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr
aFEL Made in France

Accréditation n° 1-5970
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142210-30112 EN DATE DU 03/11/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT QUENTIN EN YVELINES
M. BLEUZEN
Agence de Saint Quentin en Yvelines 6/8, rue de la Closerie
91090 Lisses

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1422-28982
Echantillon ITGA : IT142210-30112
Reçu au laboratoire le : 31/10/2022

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	48836-115628--835--1538--604-202150296
Dossier client	VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - 1 écluse - 78380 - BOUGIVAL
Echantillon	P001 - Métal - Peinture - Bougival - Ecluse - - Croix d'amarrage n°1
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples en vrac	META (A) le 03/11/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : ABK (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mickael FRANCIUS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 23 Page 1 / 1

E.20232989.0.PDF

itga
Innovateur en fiabilité
Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr
aFEL Made in France

Accréditation n° 1-5970
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142210-30113 EN DATE DU 03/11/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT QUENTIN EN YVELINES
M. BLEUZEN
Agence de Saint Quentin en Yvelines 6/8, rue de la Closerie
91090 Lisses

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1422-28982
Echantillon ITGA : IT142210-30113
Reçu au laboratoire le : 31/10/2022

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	48836-115628--835--1538--604-202150296
Dossier client	VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - 1 écluse - 78380 - BOUGIVAL
Echantillon	P002 - Métal - Peinture - Bougival - Ecluse - - Echelle de SAS n°1

Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples en vrac	META (A) le 03/11/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AMH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mickael FRANCIUS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

E.20232990.0.PDF

itga
Innovateur en fiabilité
Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr
aFEL Made in France

Accréditation n° 1-5970
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142210-30114 EN DATE DU 03/11/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT QUENTIN EN YVELINES
M. BLEUZEN
Agence de Saint Quentin en Yvelines 6/8, rue de la Closerie
91090 Lisses

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1422-28982
Echantillon ITGA : IT142210-30114
Reçu au laboratoire le : 31/10/2022

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	48836-115628--835--1538--604-202150296
Dossier client	VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - 1 écluse - 78380 - BOUGIVAL
Echantillon	P003 - Métal - Peinture - Bougival - Ecluse - - Croix d'amarrage n°2
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples en vrac	META (A) le 03/11/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : ABK (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mickael FRANCIUS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

E.20232991.0.PDF

itga
Innovateur en fiabilité
Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr
aFEL Made in France

Accréditation n° 1-5970
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142210-30115 EN DATE DU 03/11/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT QUENTIN EN YVELINES
M. BLEUZEN
Agence de Saint Quentin en Yvelines 6/8, rue de la Closerie
91090 Lisses

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1422-28982
Echantillon ITGA : IT142210-30115
Reçu au laboratoire le : 31/10/2022

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	48836-115628--835--1538--604-202150296
Dossier client	VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - 1 écluse - 78380 - BOUGIVAL
Echantillon	P004 - Métal - Peinture - Bougival - Ecluse - - Echelle de SAS n°2
Description ITGA	Peinture en vrac / **Mousse végétale en vrac avec poussières**

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture en vrac non séparable + Mousse végétale en vrac avec poussières	META (A) le 03/11/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distinguées par D. (2) Analyste : AMH (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mickael FRANCIUS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

E.20232992.0.PDF

itga
Innovateur en fiabilité
Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr
aFEL Made in France

Accréditation n° 1-5970
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142210-30116 EN DATE DU 03/11/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT QUENTIN EN YVELINES
M. BLEUZEN
Agence de Saint Quentin en Yvelines 6/8, rue de la Closerie
91090 Lisses

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1422-28982
Echantillon ITGA : IT142210-30116
Reçu au laboratoire le : 31/10/2022

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	48836-115628--835--1538--604-202150296
Dossier client	VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - 1 écluse - 78380 - BOUGIVAL
Echantillon	P005 - Métal - Peinture - Chatou - Ecluse - - Echelle de SAS n°1
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples en vrac	META (A) le 03/11/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AMH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mickael FRANCIUS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

E.20232993.0.PDF

itga
Innovateur en fiabilité
Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr
aFEL Made in France

Accréditation n° 1-5970
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142210-30117 EN DATE DU 03/11/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT QUENTIN EN YVELINES
M. BLEUZEN
Agence de Saint Quentin en Yvelines 6/8, rue de la Closerie
91090 Lisses

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1422-28982
Echantillon ITGA : IT142210-30117
Reçu au laboratoire le : 31/10/2022

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	48836-115628--835--1538--604-202150296
Dossier client	VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - 1 écluse - 78380 - BOUGIVAL
Echantillon	P006 - Métal - Peinture - Chatou - Ecluse - - Croix d'amarrage n°2
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples en vrac	META (A) le 03/11/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AMH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mickael FRANCIUS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 23

Page 1 / 1

E.20232994.0.PDF

itga
Innovateur en fiabilité
Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr
aFEL Made in France

Accréditation n° 1-5970
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142210-30118 EN DATE DU 03/11/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT QUENTIN EN YVELINES
M. BLEUZEN
Agence de Saint Quentin en Yvelines 6/8, rue de la Closerie
91090 Lisses

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1422-28982
Echantillon ITGA : IT142210-30118
Reçu au laboratoire le : 31/10/2022

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	48836-115628--835--1538--604-202150296
Dossier client	VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - 1 écluse - 78380 - BOUGIVAL
Echantillon	P007 - Métal - Peinture - Chatou - Ecluse - - Croix d'amarrage n°1
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples en vrac	META (A) le 03/11/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AMH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mickael FRANCIUS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

E.20232995.0.PDF

itga
Innovateur en fiabilité
Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr
aFEL Made in France

Accréditation n° 1-5970
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT142210-30119 EN DATE DU 03/11/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - SAINT QUENTIN EN YVELINES
M. BLEUZEN
Agence de Saint Quentin en Yvelines 6/8, rue de la Closerie
91090 Lisses

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1422-28982
Echantillon ITGA : IT142210-30119
Reçu au laboratoire le : 31/10/2022

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	48836-115628--835--1538--604-202150296
Dossier client	VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - 1 écluse - 78380 - BOUGIVAL
Echantillon	P008 - Métal - Peinture - Chatou - Ecluse - - Echelle de SAS n°2
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples en vrac	META (A) le 03/11/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : FAF (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mickael FRANCIUS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

ANNEXE : Certificat de compétence

Numéro d'accréditation
4-0634
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

WE-CERT
CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

«Version 01»

Décerné à : **BLEUZEN Jimmy** Sous le numéro : **C2018-SE04-019**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE **(SANS MENTION)**	**Du 15/09/2022 Au 29/06/2029**
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE **(MENTION)**	**Du 15/09/2022 Au 29/06/2029**
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	**Du 15/09/2022 Au 13/05/2023**
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	**Du 15/09/2022 Au 13/05/2023**
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	**Du 15/09/2022 Au 13/05/2023**
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS **(SANS MENTION)**	**Du 15/09/2022 Au 13/05/2023**
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS **(MENTION)**	**Du 15/09/2022 Au 13/05/2023**
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	**Du 15/09/2022 Au 02/07/2023**
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	**X**

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Délivré à Thionville, le 15/09/2022
Par WE-CERT
Mme. Julie HOFFMANN - Responsable de certification

WE-CERT "Qualit'compétences" - 16 rue de Villars, 57 100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-competences.com;
SAS au capital de 7500 Euros – RCS de Thionville – Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 88851995600021

ANNEXE : Attestation d'assurance

Contrat RC n° 10800807204 1/2

AXA France IARD
DIRECTION ENTREPRISES
Production R.C. – Grands Comptes
Télécopie 01.57 65 07 90

ATTESTATION

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cedex, atteste par la présente que l'assuré :

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale APAVE DEVELOPPEMENT et de sa filiale APAVE Diagnostics

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800807204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

§ inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
§ bâtiment et génie civil
§ essais, mesures et métrologie
§ laboratoires d'analyses (non médicales)
§ conseils
§ formation
§ certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces métiers,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :
§ des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
§ des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
§ des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Contrat RC n° 10800807204 2/2

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Responsabilité Civile Exploitation/Après Livraison/ Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 EUR par année d'assurance
a) Les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 EUR par année d'assurance
b) Les atteintes à l'environnement accidentelles sur site des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 EUR par année d'assurance
c) Tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/Canada Sous-limités :	5 000 000 EUR par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA/CANADA	1 000 000 EUR par année d'assurance
d) Tous dommages causés par l'amiante et le plomb*	2 500 000 EUR par année d'assurance

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre le 12/10/2022
Par délégation
POUR L'ASSUREUR :

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Fin du rapport
