Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

BOUGIVAL-ILE DE LA LOGE

Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	**80112-160063 A**
Propriétaire	**VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE**
Donneur d'ordre	**VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE**
Adresse de l'immeuble	**BARRAGE** **ILE DE LA LOGE** **78380 BOUGIVAL**
Type de bien	**Bâtiment**
Date de la commande	**09/07/2024**
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	**17/07/2024**
Date d'émission du rapport de repérage	**29/07/2024**
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	**Voir descriptif travaux**

Signataire du rapport

Signature et Visa



apave
Apave Diagnostics
84, rue Charles Michels
93200 SAINT-DENIS
Tél. : 33 (0)1 80 89 45 10
saintdenis@adiag.apave.com
SIRET 4483 336 319 00205

Opérateur de repérage :
DEMEURE Yannick
Apave Diagnostics
Le **29/07/2024**

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Commentaires :

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence des locataires et du mobilier, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante. Les investigations ne pourront être réalisées qu'après évacuation des locaux.

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

➢ **Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage	Conduit de fluide	Fibres-ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P018)	**Z018**
		Conduit de fluide	Fibres-ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P033)	**Z033**
		Batardeau	Métal + peinture gris - Peinture	Résultat d'analyse (P035)	**Z035**

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT 1
CONCLUSIONS 1
DESCRIPTION DE LA MISSION 4
OBJET DE LA MISSION : 4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : 4
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : 4
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE : 4
PROGRAMME DE TRAVAUX 4
PROGRAMME DE REPERAGE 5
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 7
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE 7
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020 7
ANALYSE DOCUMENTAIRE : 8
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES 8
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 8
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : 8
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES 8
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE 10
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 11
ANNEXE : PLANS / CROQUIS 37
ANNEXE : ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE 50
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE 56
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE 65
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE 66

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **80112-160063**	Référence du donneur d'ordre : **BOUGIVAL-ILE DE LA LOGE**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	**VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE**	
Adresse du propriétaire :	**DT BS SUBDIVISION DE SURESNES 5 BIS RUE EDOUARD NIEUPORT 92150 SURESNES**	
Représenté par :	**M. LAUNAY**	
Donneur d'ordre :	**VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE**	
Accompagnateur :	**Aucun**	
Opérateur ayant réalisé le repérage :	**Monsieur DEMEURE Yannick**	
N° de certification de l'opérateur :	**DTI3547**	Organisme : **Dekra Certification**
Nom et adresse de l'entreprise :	**Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 SAINT-DENIS CEDEX**	
N° de Siret :	**48333631900205**	
RCP compagnie n° de police :	**AXA IARD - 10800807204**	

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	**BARRAGE**
Adresse complète :	**ILE DE LA LOGE - 78380 BOUGIVAL**
Référence Cadastrale :	**Non communiqué(e)**

Date du permis de construire : **Non communiquée**	Date de la construction : **Antérieur au 1er 1997**
Bâtiment : **BARRAGE**	Etage : **Intérieur + Extérieur**
Escalier : **Sans objet**	Porte : **Sans objet**
Fonction principale du bâtiment : **Bâtiment**	N° de lot : **Non communiquée**

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné : **Aucun**

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse :	**Agence ITGA St Grégoire Bât K**
Adresse du laboratoire :	**Parc d'affaires - Bât. K Espace Performance 35768 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX**
Numéro d'accréditation :	**1-5970**

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

Aucun programme des travaux n'a été fourni, le jour de la visite
Les prélèvements nous ont étaient demandé sur certains produits et mâtériaux dans le local poste de commande, sous tablier du pont passerelle et rive droite Pass N°3 à la demande du donneur d'ordre le jour de la visite

3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Plaques ondulés et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
	Plaques en matériaux bitumineux
	Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment
	Ardoises en fibro ciment
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation
	Conduits d'eaux pluviales
	Garnissage des joints de dilatation
	Joints de dilatation
	Couvre-joints
	Tresses d'étanchéité à l'air
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.)
	Jonctions bitumineuses
	Solins en fibre ciment
	Colle des solins en fibre ciment
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie
	Isolants fibreux en sous toiture
	Flocages, enduits projetés
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés…), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés…)
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux…)
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
2 - Parois verticales extérieures et Façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage
	Ardoises composites hors fibro ciment
	Ardoises en fibro ciment
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses
	Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures)
	Peintures des bardages métalliques
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés
	Carton-amiante
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs
	Revêtements plastiques épais (RPE)
	Peintures sur béton
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire
	Garnissage des joints de dilatation
	Joints de dilatation
	Couvre-joints
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)
	Peintures décoratives
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)
	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
3 - Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Enduits de ragréage, débullage, lissage
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu
	Fourreaux (carton, fibres-ciment…)
Poteaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich…), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Flocages
	Plots de colle fixant les cloisons au mur
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, …)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite
	Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)
	Revêtements bitumineux
	Peintures intumescentes
4 - Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Panneaux collés vissés ou cloués
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)
	Bandes calicot

	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes…)
	Résines
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes…)
	Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, …)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Pare vapeur
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Protections en plâtre
	Peintures intumescentes
5 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	Dalles de sol
	Nez de marche
	Dalles moquettes avec entre couche noire
	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples
	Colles bitumineuses
	Colles non bitumineuses
	Moquette
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Peintures de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Revêtements de sols sportifs
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Enduit de cuvelage
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
6 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas…)
	Matelas
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Rubans adhésifs
	Mastics
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Volets coupe-feu y compris ossature
	Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Joints d'étanchéité des trappes
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques…)
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Isolants
	Colles
	Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits…
	Tresses
	Joints plats
8 - Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
	Bourres
	Tresses
	Calorifugeages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
9 - Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voiries	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures…)

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.
Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.
Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :
Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.
Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.
L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.
Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.
Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :
Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.
Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », … dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
17/07/2024	REPERAGES AMIANTE AVANT TRAVAUX

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

4.3 Analyse Documentaire :

Néant

4.4 Rapports précédemment réalisés

Néant

5 Résultats détaillés du repérage

5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

➢ **Liste des locaux / Parties d'immeuble visités**

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Local poste de Commande	Barrage
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage
Rive droite Pass N°3	Barrage

➢ **Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :**

Néant

➢ **Liste des éléments non inspectés :**

Néant

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
Local poste de Commande	Barrage	Plancher	Dalle ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P001)	Z001	**Non**	
		Murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P002)	Z002	**Non**	
		Plafond	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P003)	Z003	**Non**	
		Support Maintien de Poulie	Métal + peinture rouge - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	Z004	**Non**	
		Roue de Poulie	Métal + peinture jaune - Peinture	Résultat d'analyse (P005)	Z005	**Non**	
		Support de câble	Métal + peinture bleu - Peinture	Résultat d'analyse (P006)	Z006	**Non**	
		Porte - Dormant intérieur	Métal + peinture verte - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	Z007	**Non**	
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage	Murs	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P009)	Z009	**Non**	
		Plafond	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P010)	Z010	**Non**	
		Plancher	Dalle ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P008)	Z008	**Non**	
		Plafond	Revêtement bitumineux - Revêtement bitumineux	Résultat d'analyse (P011)	Z011	**Non**	
		Garde-corps	Métal + peinture noir - Peinture	Résultat d'analyse (P012)	Z012	**Non**	
		Support Poulie	Métal + peinture bleu - Peinture	Résultat d'analyse (P013)	Z013	**Non**	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
		Support Roue de Poulie	Métal + peinture jaune - Peinture	Résultat d'analyse (P014)	Z014	**Non**	
		Roue de Poulie	Métal + peinture jaune - Peinture	Résultat d'analyse (P015)	Z015	**Non**	
		Poutre IPM	Métal + peinture bleu - Peinture	Résultat d'analyse (P016)	Z016	**Non**	
		Support de Câble	Métal + peinture bleu foncé - Peinture	Résultat d'analyse (P017)	Z017	**Non**	
		Conduit de fluide	Fibres-ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P018)	Z018	**Oui**	6 u
		Support Poulie de Câble	Métal + peinture rouge - Peinture	Résultat d'analyse (P019)	Z019	**Non**	
		Roue de Poulie câble	Métal + peinture jaune - Peinture	Résultat d'analyse (P020)	Z020	**Non**	
		Ensemble support Poulie levage	Métal + peinture jaune - Peinture	Résultat d'analyse (P021)	Z021	**Non**	
		Conduit intermédiaire chariot Levage	Métal + peinture rouge - Peinture	Résultat d'analyse (P022)	Z022	**Non**	
		Support Conduit intermédiaire câble	Métal + peinture rouge - Peinture	Résultat d'analyse (P023)	Z023	**Non**	
		Support Poulie Guidage 1	Métal + peinture bleu - Peinture	Résultat d'analyse (P024)	Z024	**Non**	
		Support Poulie Guidage 2	Métal + peinture rouge - Peinture	Résultat d'analyse (P025)	Z025	**Non**	
		Roue Poulie Guidage	Métal + peinture jaune - Peinture	Résultat d'analyse (P026)	Z026	**Non**	
		Moteur Guidage	Métal + peinture grise - Peinture	Résultat d'analyse (P027)	Z027	**Non**	
		Support Moteur Guidage	Métal + peinture grise - Peinture	Résultat d'analyse (P028)	Z028	**Non**	
		Moteur Levage	Métal + peinture grise - Peinture	Résultat d'analyse (P029)	Z029	**Non**	
		Motoréducteur Levage	Métal + peinture grise - Peinture	Résultat d'analyse (P030)	Z030	**Non**	
		Support Moteur Levage	Métal + peinture grise - Peinture	Résultat d'analyse (P031)	Z031	**Non**	
		Manivelle Moteur Levage	Métal + peinture bleu - Peinture	Résultat d'analyse (P032)	Z032	**Non**	
		Conduit de fluide	Fibres-ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P033)	Z033	**Oui**	6 u
		Plafond	Enduit de rebouchage ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P034)	Z034	**Non**	
		Batardeau	Métal + peinture gris - Peinture	Résultat d'analyse (P035)	Z035	**Oui**	1 u
Rive droite Pass N°3	Barrage	Moteur Vanne	Métal + peinture grise - Peinture	Résultat d'analyse (P036)	Z036	**Non**	
		Frein Moteur Vanne	Métal + peinture grise - Peinture	Résultat d'analyse (P037)	Z037	**Non**	
		Moteur Réducteur	Métal + peinture verte - Peinture	Résultat d'analyse (P038)	Z038	**Non**	
		Plaques de Levage	Métal + peinture grise - Peinture	Résultat d'analyse (P040)	Z040	**Non**	
		Garde-corps	Métal + peinture grise - Peinture	Résultat d'analyse (P041)	Z041	**Non**	
		Echelle	Métal + peinture noir - Peinture	Résultat d'analyse (P042)	Z042	**Non**	
		Support moteur	Métal + peinture grise - Peinture	Résultat d'analyse (P039)	Z039	**Non**	

Commentaires :

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence des locataires et du mobilier, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante. Les investigations ne pourront être réalisées qu'après évacuation des locaux.

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Local poste de Commande - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Dalle ciment - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Dalle ciment / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Local poste de Commande - Murs - Murs
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Enduit ciment - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit ciment / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	Barrage - Local poste de Commande - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
DEMEURE Yannick	17/07/2024	Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit ciment / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Local poste de Commande - Support Maintien de Poulie - Mur
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Métal + peinture rouge - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Métal + peinture rouge / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Local poste de Commande - Roue de Poulie - Mur
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Métal + peinture jaune - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Métal + peinture jaune / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

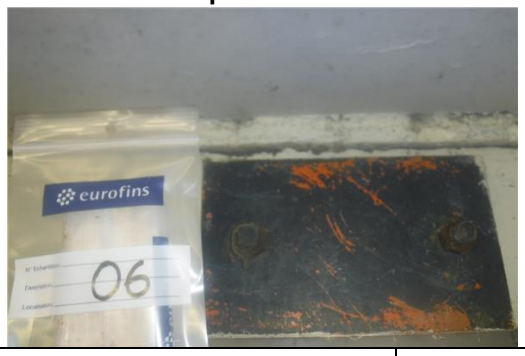PRELEVEMENT : P006		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Local poste de Commande - Support de câble - Mur
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Métal + peinture bleu - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Métal + peinture bleu / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Local poste de Commande - Porte - Mur
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Métal + peinture verte - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Métal + peinture verte / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
DEMEURE Yannick	17/07/2024	Dalle ciment - Non peint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	**Planche de croquis n° :**
Dalle ciment / Non peint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Matériau compact gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

PRELEVEMENT : P009		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Murs - Murs
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Enduit ciment - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit ciment / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Enduit ciment - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit ciment / Non peint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011

Emplacement :



Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Revêtement bitumineux - Revêtement bitumineux

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Revêtement bitumineux / Revêtement bitumineux	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Matériau souple noir avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Garde-corps - Toutes zones
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Métal + peinture noir - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Métal + peinture noir / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Support Poulie - Mur
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Métal + peinture bleu - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Métal + peinture bleu / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Support Roue de Poulie - Mur
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Métal + peinture jaune - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Métal + peinture jaune / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Roue de Poulie - Mur
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Métal + peinture jaune - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Métal + peinture jaune / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Poutre IPM - Plafond
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
DEMEURE Yannick	17/07/2024	Métal + peinture bleu - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal + peinture bleu / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Support de Câble - Toutes zones
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Métal + peinture bleu foncé - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal + peinture bleu foncé / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Conduit de fluide - Toutes zones
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Fibres-ciment - Non peint
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :4**
Fibres-ciment / Non peint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Fibrociment gris avec fibres visibles	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

PRELEVEMENT : P019		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Support Poulie de Câble - Toutes zones
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Métal + peinture rouge - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Métal + peinture rouge / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Roue de Poulie câble - Toutes zones
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Métal + peinture jaune - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Métal + peinture jaune / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021

Emplacement :




Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Ensemble support Poulie levage - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
DEMEURE Yannick	17/07/2024	Métal + peinture jaune - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal + peinture jaune / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

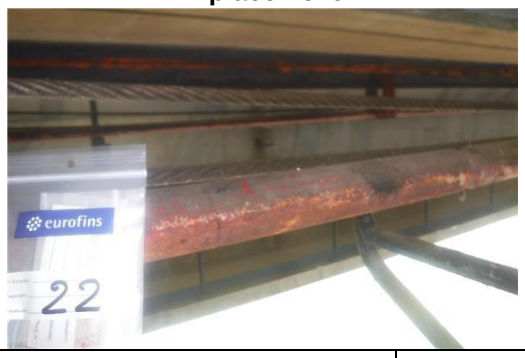PRELEVEMENT : P022		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Conduit intermédiaire chariot Levage - Toutes zones
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Métal + peinture rouge - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Métal + peinture rouge / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Support Conduit intermédiaire câble - Toutes zones
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Métal + peinture rouge - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Métal + peinture rouge / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

PRELEVEMENT : P024		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Support Poulie Guidage 1 - Plafond
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Métal + peinture bleu - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Métal + peinture bleu / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Support Poulie Guidage 2 - Plafond
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Métal + peinture rouge - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Métal + peinture rouge / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Roue Poulie Guidage - Plafond
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
DEMEURE Yannick	17/07/2024	Métal + peinture jaune - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal + peinture jaune / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Moteur Guidage - Toutes zones
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Métal + peinture grise - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal + peinture grise / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Support Moteur Guidage - Toutes zones
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Métal + peinture grise - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal + peinture grise / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

PRELEVEMENT : P029		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Moteur Levage - Toutes zones
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Métal + peinture grise - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Métal + peinture grise / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Motoréducteur Levage - Toutes zones
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Métal + peinture grise - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Métal + peinture grise / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Support Moteur Levage - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
DEMEURE Yannick	17/07/2024	Métal + peinture grise - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal + peinture grise / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Manivelle Moteur Levage - Toutes zones
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Métal + peinture bleu - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Métal + peinture bleu / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Conduit de fluide - Toutes zones
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Fibres-ciment - Non peint
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :8**	
Fibres-ciment / Non peint		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P034		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Enduit de rebouchage ciment - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit de rebouchage ciment / Non peint		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit gris	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Batardeau - Toutes zones
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Métal + peinture gris - Peinture
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :9**	
Métal + peinture gris / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P036

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	Barrage - Rive droite Pass N°3 - Moteur Vanne - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
DEMEURE Yannick	17/07/2024	Métal + peinture grise - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal + peinture grise / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

PRELEVEMENT : P037

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	Barrage - Rive droite Pass N°3 - Frein Moteur Vanne - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
DEMEURE Yannick	17/07/2024	Métal + peinture grise - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Métal + peinture grise / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	Barrage - Rive droite Pass N°3 - Moteur Réducteur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
DEMEURE Yannick	17/07/2024	Métal + peinture verte - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Métal + peinture verte / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Rive droite Pass N°3 - Support moteur - Toutes zones
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Métal + peinture grise - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Métal + peinture grise / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Rive droite Pass N°3 - Plaques de Levage - Sol
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Métal + peinture grise - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Métal + peinture grise / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	Barrage - Rive droite Pass N°3 - Garde-corps - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
DEMEURE Yannick	17/07/2024	Métal + peinture grise - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal + peinture grise / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 80112-160063 BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 78	**Pièce ou local – Composant** Barrage - Rive droite Pass N°3 - Echelle - Toutes zones
Nom de l'opérateur DEMEURE Yannick	**Date de prélèvement** 17/07/2024	**Partie de composant** Métal + peinture noir - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal + peinture noir / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

ANNEXE : Plans / Croquis

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Local poste de commande	N° planche : 1/12	N° dossier : 80112-160063	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT	Version : 0	Adresse : BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 BOUGIVAL	
Intervenant : DEMEURE Yannick	Date : 29/07/2024		
Origine du plan : Diagnostiqueur			
Commentaire :		Localisation : Barrage Ile de la	Lieu / Zone : Barrage

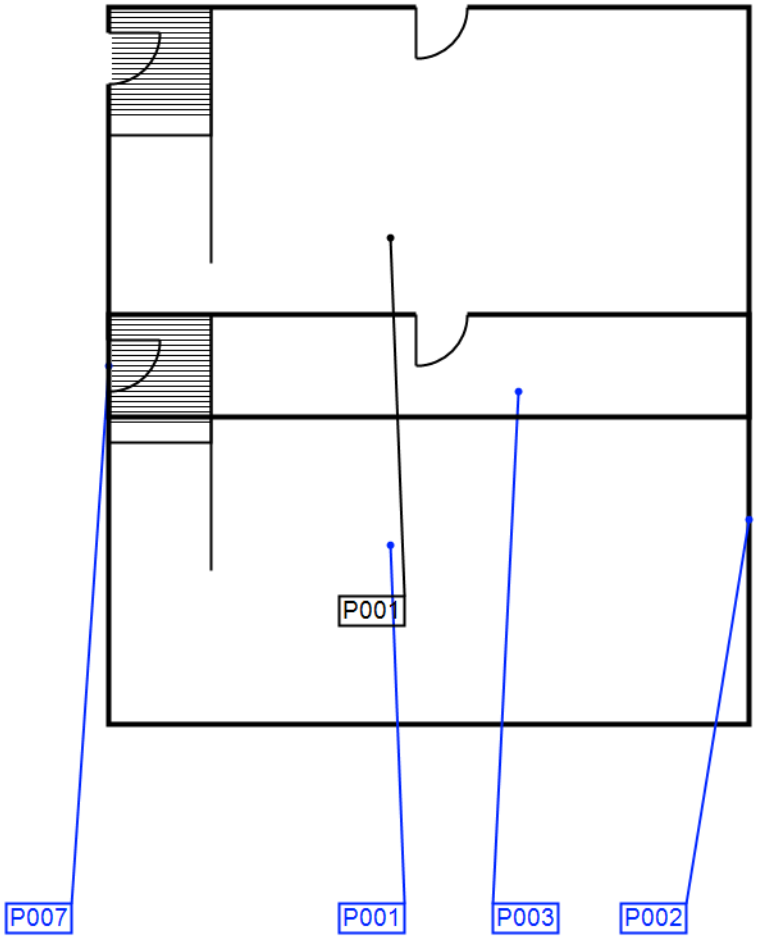


Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Local poste de commande	N° planche : 2/12	N° dossier : 80112-160063	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT	Version : 0	Adresse : BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 BOUGIVAL	
Intervenant : DEMEURE Yannick	Date : 29/07/2024		
Origine du plan : Diagnostiqueur			
Commentaire :		Localisation : Barrage Ile de la	Lieu / Zone : Barrage



Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Pont Passerelle	N° planche : 3/12	N° dossier : 80112-160063	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT	Version : 0	Adresse : BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 BOUGIVAL	
Intervenant : DEMEURE Yannick	Date : 29/07/2024		
Origine du plan : Diagnostiqueur			
Commentaire :		Localisation : Barrage Ile de la	Lieu / Zone : Barrage



Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Pont Passerelle	N° planche : 4/12	N° dossier : 80112-160063	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT	Version : 0	Adresse : BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 BOUGIVAL	
Intervenant : DEMEURE Yannick	Date : 29/07/2024		
Origine du plan : Diagnostiqueur			
Commentaire :		Localisation : Barrage Ile de la	Lieu / Zone : Barrage

Légende :

Conduit de fluide contenant de l'amiante

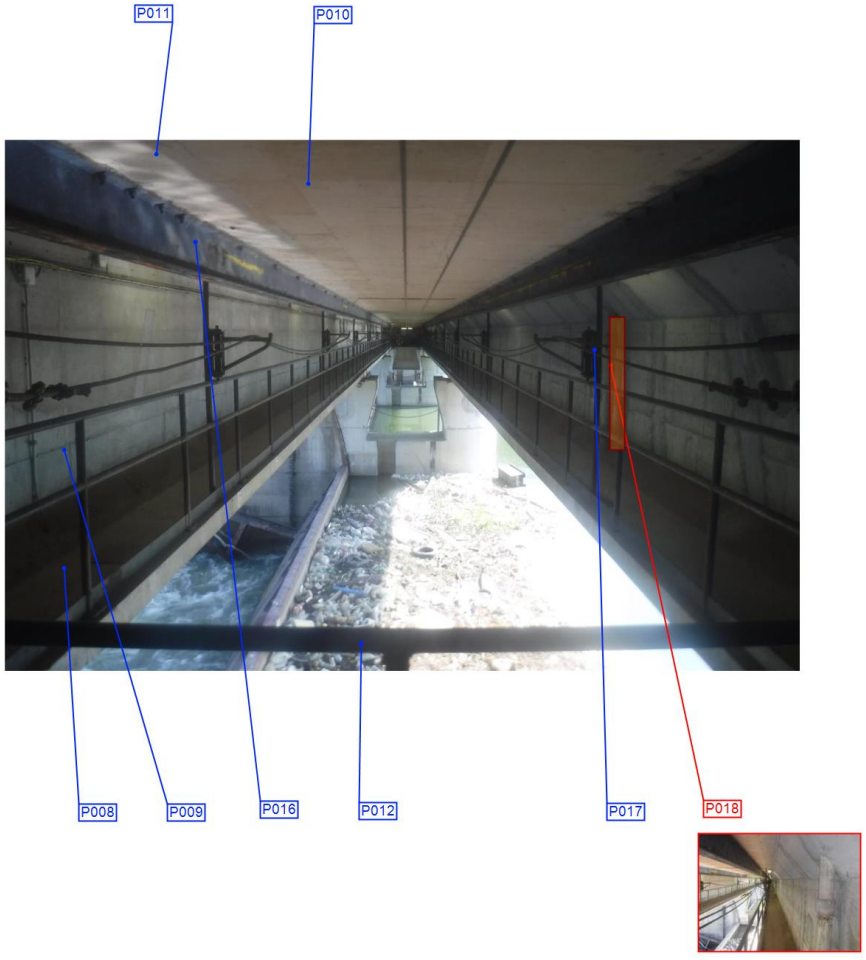


Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Pont Passerelle	N° planche : 5/12	N° dossier : 80112-160063	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT	Version : 0	Adresse : BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 BOUGIVAL	
Intervenant : DEMEURE Yannick	Date : 29/07/2024		
Origine du plan : Diagnostiqueur			
Commentaire :		Localisation : Barrage Ile de la	Lieu / Zone : Barrage



Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Pont Passerelle	N° planche : 6/12	N° dossier : 80112-160063	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT	Version : 0	Adresse : BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 BOUGIVAL	
Intervenant : DEMEURE Yannick	Date : 29/07/2024		
Origine du plan : Diagnostiqueur			
Commentaire :		Localisation : Barrage Ile de la	Lieu / Zone : Barrage



Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Pont Passerelle	N° planche : 7/12	N° dossier : 80112-160063	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT	Version : 0	Adresse : BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 BOUGIVAL	
Intervenant : DEMEURE Yannick	Date : 29/07/2024		
Origine du plan : Diagnostiqueur			
Commentaire :		Localisation : Barrage Ile de la	Lieu / Zone : Barrage

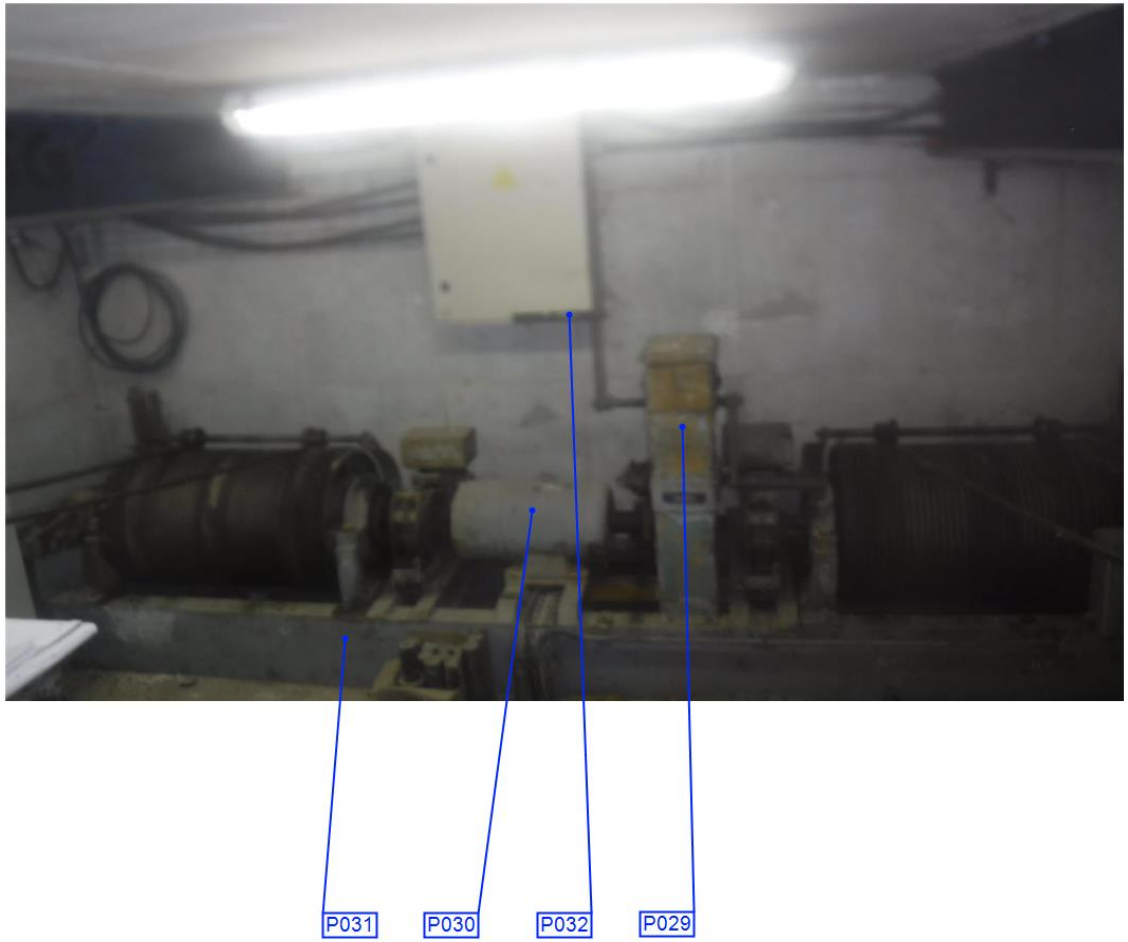


Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Pont Passerelle	N° planche : 8/12	N° dossier : 80112-160063	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT	Version : 0	Adresse : BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 BOUGIVAL	
Intervenant : DEMEURE Yannick	Date : 29/07/2024		
Origine du plan : Diagnostiqueur			
Commentaire :		Localisation : Barrage Ile de la	Lieu / Zone : Barrage

Légende :

Conduit de fluide contenant de l'amiante



Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Pont Passerelle	N° planche : 9/12	N° dossier : 80112-160063	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT	Version : 0	Adresse : BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 BOUGIVAL	
Intervenant : DEMEURE Yannick	Date : 29/07/2024		
Origine du plan : Diagnostiqueur			
Commentaire :		Localisation : Barrage Ile de la	Lieu / Zone : Barrage

Légende :

Batardeau métal peinture noire contenant de l'amiante



Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Rive Droite Pass N°3	N° planche : 10/12	N° dossier : 80112-160063	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT	Version : 0	Adresse : BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 BOUGIVAL	
Intervenant : DEMEURE Yannick	Date : 29/07/2024		
Origine du plan : Diagnostiqueur			
Commentaire :		Localisation : Barrage Ile de la	Lieu / Zone : Barrage

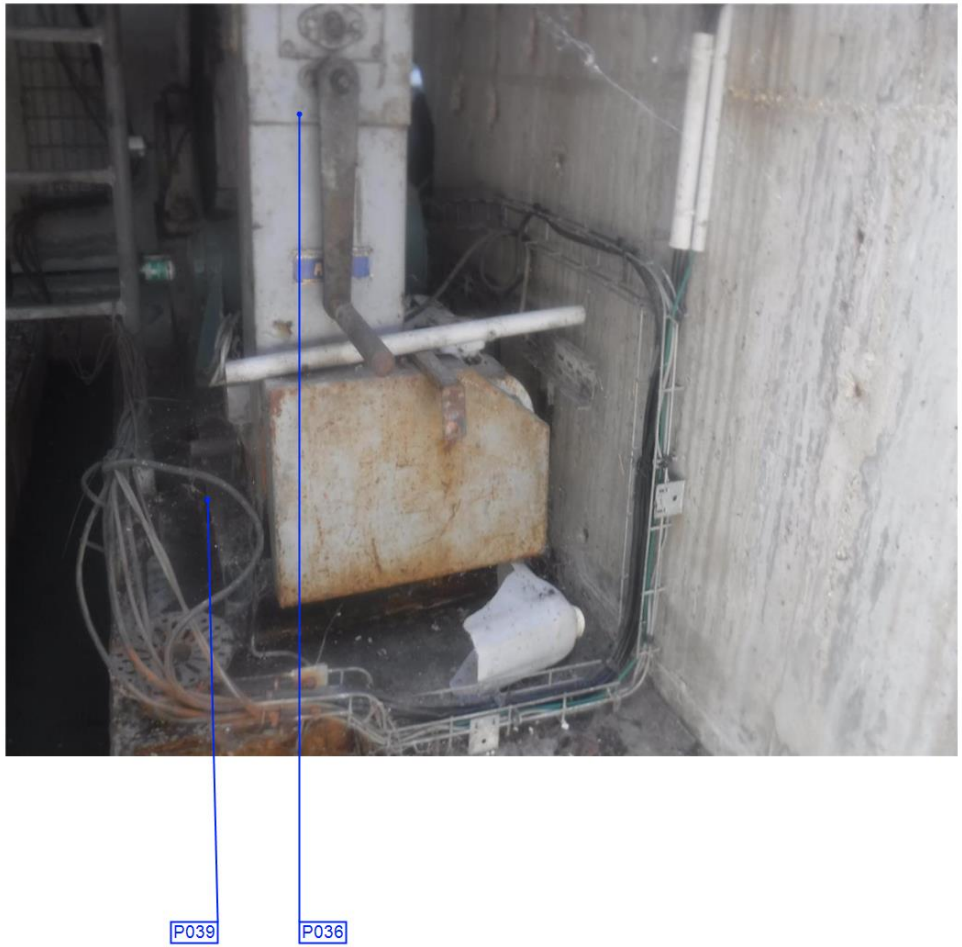


Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Rive Droite Pass N°3	N° planche : 11/12	N° dossier : 80112-160063	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT	Version : 0	Adresse : BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 BOUGIVAL	
Intervenant : DEMEURE Yannick	Date : 29/07/2024		
Origine du plan : Diagnostiqueur			
Commentaire :		Localisation : Barrage Ile de la	Lieu / Zone : Barrage

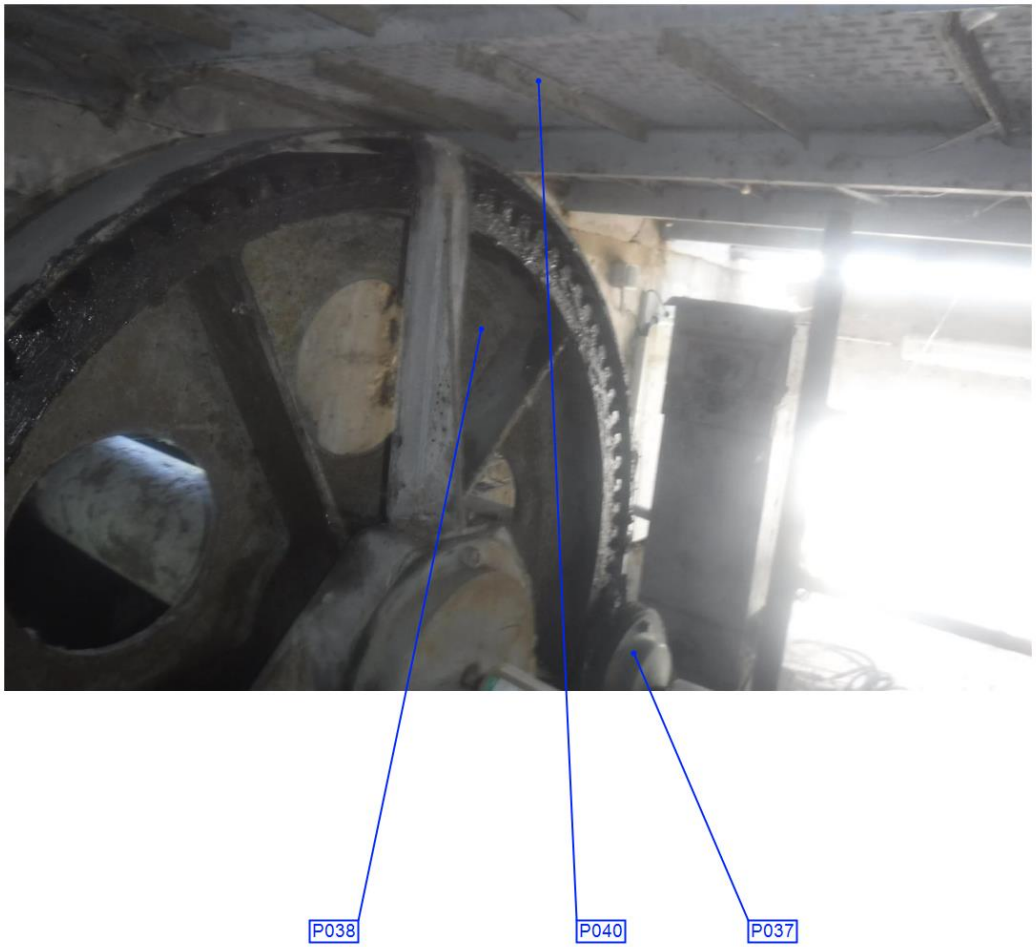


Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Rive Droite Pass N°3	N° planche : 12/12	N° dossier : 80112-160063	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT	Version : 0	Adresse : BARRAGE ILE DE LA LOGE 78380 BOUGIVAL	
Intervenant : DEMEURE Yannick	Date : 29/07/2024		
Origine du plan : Diagnostiqueur			
Commentaire :		Localisation : Barrage Ile de la	Lieu / Zone : Barrage



ANNEXE : Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrage

Z001 : Plancher Dalle ciment Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local poste de Commande	Barrage	Plancher	Dalle ciment - Peinture		P001	Non	

Z002 : Murs Enduit ciment Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local poste de Commande	Barrage	Murs	Enduit ciment - Peinture		P002	Non	

Z003 : Plafond Enduit ciment Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local poste de Commande	Barrage	Plafond	Enduit ciment - Peinture		P003	Non	

Z004 : Support Maintien de Poulie Métal + peinture rouge Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local poste de Commande	Barrage	Support Maintien de Poulie	Métal + peinture rouge - Peinture		P004	Non	

Z005 : Roue de Poulie Métal + peinture jaune Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local poste de Commande	Barrage	Roue de Poulie	Métal + peinture jaune - Peinture		P005	Non	

Z006 : Support de câble Métal + peinture bleu Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local poste de Commande	Barrage	Support de câble	Métal + peinture bleu - Peinture		P006	Non	

Z007 : Porte Dormant intérieur Métal + peinture verte Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local poste de Commande	Barrage	Porte - Dormant intérieur	Métal + peinture verte - Peinture		P007	Non	

Z008 : Plancher Dalle ciment Non peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage	Plancher	Dalle ciment - Non peint		P008	Non	

Z009 : Murs Enduit ciment Non peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage	Murs	Enduit ciment - Non peint		P009	Non	

Z010 : Plafond Enduit ciment Non peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage	Plafond	Enduit ciment - Non peint		P010	Non	

Z011 : Plafond Revêtement bitumineux Revêtement bitumineux (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage	Plafond	Revêtement bitumineux - Revêtement bitumineux		P011	Non	

Z012 : Garde-corps Métal + peinture noir Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage	Garde-corps	Métal + peinture noir - Peinture		P012	Non	

Z013 : Support Poulie Métal + peinture bleu Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage	Support Poulie	Métal + peinture bleu - Peinture		P013	Non	

Z014 : Support Roue de Poulie Métal + peinture jaune Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage	Support Roue de Poulie	Métal + peinture jaune - Peinture		P014	Non	

Z015 : Roue de Poulie Métal + peinture jaune Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage	Roue de Poulie	Métal + peinture jaune - Peinture		P015	Non	

Z016 : Poutre IPM Métal + peinture bleu Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage	Poutre IPM	Métal + peinture bleu - Peinture		P016	Non	

Z017 : Support de Câble Métal + peinture bleu foncé Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage	Support de Câble	Métal + peinture bleu foncé - Peinture		P017	Non	

Z018 : Conduit de fluide Fibres-ciment Non peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage	Conduit de fluide	Fibres-ciment - Non peint		P018	Oui	6 u

Z019 : Support Poulie de Câble Métal + peinture rouge Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage	Support Poulie de Câble	Métal + peinture rouge - Peinture		P019	Non	

Z020 : Roue de Poulie câble Métal + peinture jaune Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage	Roue de Poulie câble	Métal + peinture jaune - Peinture		P020	Non	

Z021 : Ensemble support Poulie levage Métal + peinture jaune Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage	Ensemble support Poulie levage	Métal + peinture jaune - Peinture		P021	Non	

Z022 : Conduit intermédiaire chariot Levage Métal + peinture rouge Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage	Conduit intermédiaire chariot Levage	Métal + peinture rouge - Peinture		P022	Non	

Z023 : Support Conduit intermédiaire câble Métal + peinture rouge Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage	Support Conduit intermédiaire câble	Métal + peinture rouge - Peinture		P023	Non	

Z024 : Support Poulie Guidage 1 Métal + peinture bleu Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage	Support Poulie Guidage 1	Métal + peinture bleu - Peinture		P024	Non	

Z025 : Support Poulie Guidage 2 Métal + peinture rouge Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage	Support Poulie Guidage 2	Métal + peinture rouge - Peinture		P025	Non	

Z026 : Roue Poulie Guidage Métal + peinture jaune Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage	Roue Poulie Guidage	Métal + peinture jaune - Peinture		P026	Non	

Z027 : Moteur Guidage Métal + peinture grise Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage	Moteur Guidage	Métal + peinture grise - Peinture		P027	Non	

Z028 : Support Moteur Guidage Métal + peinture grise Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage	Support Moteur Guidage	Métal + peinture grise - Peinture		P028	Non	

Z029 : Moteur Levage Métal + peinture grise Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage	Moteur Levage	Métal + peinture grise - Peinture		P029	Non	

Z030 : Motoréducteur Levage Métal + peinture grise Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage	Motoréducteur Levage	Métal + peinture grise - Peinture		P030	Non	

Z031 : Support Moteur Levage Métal + peinture grise Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage	Support Moteur Levage	Métal + peinture grise - Peinture		P031	Non	

Z032 : Manivelle Moteur Levage Métal + peinture bleu Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage	Manivelle Moteur Levage	Métal + peinture bleu - Peinture		P032	Non	

Z033 : Conduit de fluide Fibres-ciment Non peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage	Conduit de fluide	Fibres-ciment - Non peint		P033	Oui	6 u

Z034 : Plafond Enduit de rebouchage ciment Non peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage	Plafond	Enduit de rebouchage ciment - Non peint		P034	Non	

Z035 : Batardeau Métal + peinture gris Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous tablier du Pont Passerelle	Barrage	Batardeau	Métal + peinture gris - Peinture		P035	Oui	1 u

Z036 : Moteur Vanne Métal + peinture grise Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Rive droite Pass N°3	Barrage	Moteur Vanne	Métal + peinture grise - Peinture		P036	Non	

Z037 : Frein Moteur Vanne Métal + peinture grise Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Rive droite Pass N°3	Barrage	Frein Moteur Vanne	Métal + peinture grise - Peinture		P037	Non	

Z038 : Moteur Réducteur Métal + peinture verte Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Rive droite Pass N°3	Barrage	Moteur Réducteur	Métal + peinture verte - Peinture		P038	Non	

Z039 : Support moteur Métal + peinture grise Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Rive droite Pass N°3	Barrage	Support moteur	Métal + peinture grise - Peinture		P039	Non	

Z040 : Plaques de Levage Métal + peinture grise Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Rive droite Pass N°3	Barrage	Plaques de Levage	Métal + peinture grise - Peinture		P040	Non	

Z041 : Garde-corps Métal + peinture grise Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Rive droite Pass N°3	Barrage	Garde-corps	Métal + peinture grise - Peinture		P041	Non	

Z042 : Echelle Métal + peinture noir Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Rive droite Pass N°3	Barrage	Echelle	Métal + peinture noir - Peinture		P042	Non	

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

S.3231870.0

44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.79.52.80
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1761

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-14329 EN DATE DU 26/07/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : APAVE DIAGNOSTICS - SAINT-DENIS 84 Rue Charles Michels - BAT IRIS 93200 Saint-Denis	Réf. Commande ITGA : IT1424-14329 Réf. Commande Client : 80112-160063--1655--2512--960-133651921

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/07/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P001 - Dalle ciment - Peinture - Barrage - Local poste de Commande - Sol - Plancher		Réf échantillon ITGA : IT142407-20870 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 26/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P002 - Enduit ciment - Peinture - Barrage - Local poste de Commande - Murs - Murs		Réf échantillon ITGA : IT142407-20871 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 26/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17 Page 1/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-14329 EN DATE DU 26/07/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT142407-20872	
Réf échantillon client : P003 - Enduit ciment - Peinture - Barrage - Local poste de Commande - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
• Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 26/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT142407-20873	
Réf échantillon client : P004 - Métal + peinture rouge - Peinture - Barrage - Local poste de Commande - Mur - Support Maintien de Poulie		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 26/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT142407-20874	
Réf échantillon client : P005 - Métal + peinture jaune - Peinture - Barrage - Local poste de Commande - Mur - Roue de Poulie		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 26/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT142407-20875	
Réf échantillon client : P006 - Métal + peinture bleu - Peinture - Barrage - Local poste de Commande - Mur - Support de câble		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 26/07/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGD (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT142407-20876	
Réf échantillon client : P007 - Métal + peinture verte - Peinture - Barrage - Local poste de Commande - Mur - Porte		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 26/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-14329 EN DATE DU 26/07/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P008 - Dalle ciment - Non peint - Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Sol - Plancher		Réf échantillon ITGA : IT142407-20877 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
‣ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 26/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P009 - Enduit ciment - Non peint - Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Murs - Murs		Réf échantillon ITGA : IT142407-20878 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
‣ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 25/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P010 - Enduit ciment - Non peint - Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT142407-20879 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
‣ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 25/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P011 - Revêtement bitumineux - Revêtement bitumineux - Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT142407-20880 Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières	
‣ Matériau souple noir avec poussières	META (B) le 26/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ZEN
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P012 - Métal + peinture noir - Peinture - Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Toutes zones - Garde-corps		Réf échantillon ITGA : IT142407-20881 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
‣ Peintures multiples en vrac	META (A) le 25/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-14329 EN DATE DU 26/07/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P013 - Métal + peinture bleu - Peinture - Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Mur - Support Poulie		Réf échantillon ITGA : IT142407-20882 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 25/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P014 - Métal + peinture jaune - Peinture - Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Mur - Support Roue de Poulie		Réf échantillon ITGA : IT142407-20883 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 25/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P015 - Métal + peinture jaune - Peinture - Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Mur - Roue de Poulie		Réf échantillon ITGA : IT142407-20884 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 26/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P016 - Métal + peinture bleu - Peinture - Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Plafond - Poutre IPM		Réf échantillon ITGA : IT142407-20885 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 26/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P017 - Métal + peinture bleu foncé - Peinture - Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Toutes zones - Support de Câble		Réf échantillon ITGA : IT142407-20886 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 25/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-14329 EN DATE DU 26/07/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P018 - Fibres-ciment - Non peint - Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Toutes zones - Conduit de fluide		Réf échantillon ITGA : IT142407-20887 Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
‣ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 25/07/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : MOE
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P019 - Métal + peinture rouge - Peinture - Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Toutes zones - Support Poulie de Câble		Réf échantillon ITGA : IT142407-20888 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
‣ Peintures multiples en vrac	META (A) le 26/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P020 - Métal + peinture jaune - Peinture - Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Toutes zones - Roue de Poulie câble		Réf échantillon ITGA : IT142407-20889 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
‣ Peintures multiples en vrac	META (A) le 26/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P021 - Métal + peinture jaune - Peinture - Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Toutes zones - Ensemble support Poulie levage		Réf échantillon ITGA : IT142407-20890 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
‣ Peintures multiples en vrac	META (A) le 26/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P022 - Métal + peinture rouge - Peinture - Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Toutes zones - Conduit intermédiaire chariot Levage		Réf échantillon ITGA : IT142407-20891 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
‣ Peintures multiples en vrac	META (A) le 26/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-14329 EN DATE DU 26/07/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT142407-20892	
Réf échantillon client : P023 - Métal + peinture rouge - Peinture - Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Toutes zones - Support Conduit intermédiaire câble		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 26/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT142407-20893	
Réf échantillon client : P024 - Métal + peinture bleu - Peinture - Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Plafond - Support Poulie Guidage 1		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 26/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT142407-20894	
Réf échantillon client : P025 - Métal + peinture rouge - Peinture - Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Plafond - Support Poulie Guidage 2		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 25/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT142407-20895	
Réf échantillon client : P026 - Métal + peinture jaune - Peinture - Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Plafond - Roue Poulie Guidage		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 25/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT142407-20896	
Réf échantillon client : P027 - Métal + peinture grise - Peinture - Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Toutes zones - Moteur Guidage		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 26/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-14329 EN DATE DU 26/07/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P028 - Métal + peinture grise - Peinture - Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Toutes zones - Support Moteur Guidage		Réf échantillon ITGA : IT142407-20897 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 26/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P029 - Métal + peinture grise - Peinture - Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Toutes zones - Moteur Levage		Réf échantillon ITGA : IT142407-20898 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 26/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P030 - Métal + peinture grise - Peinture - Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Toutes zones - Motoreducteur Levage		Réf échantillon ITGA : IT142407-20899 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 26/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P031 - Métal + peinture grise - Peinture - Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Toutes zones - Support Moteur Levage		Réf échantillon ITGA : IT142407-20900 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 26/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P032 - Métal + peinture bleu - Peinture - Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Toutes zones - Manivelle Moteur Levage		Réf échantillon ITGA : IT142407-20901 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 26/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-14329 EN DATE DU 26/07/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT142407-20902	
Réf échantillon client : P033 - Fibres-ciment - Non peint - Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Toutes zones - Conduit de fluide		Description ITGA : Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles	
‣ Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles	MOLP le 25/07/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : MOE (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT142407-20903	
Réf échantillon client : P034 - Enduit de rebouchage ciment - Non peint - Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Plafond - Plafond		Description ITGA : Enduit gris	
‣ Enduit gris	META (A) le 26/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBL
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT142407-20904	
Réf échantillon client : P035 - Métal + peinture gris - Peinture - Barrage - Sous tablier du Pont Passerelle - Toutes zones - Batardeau		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
‣ Peintures multiples en vrac	META (A) le 26/07/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EIB (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT142407-20905	
Réf échantillon client : P036 - Métal + peinture grise - Peinture - Barrage - Rive droite Pass N°3 - Toutes zones - Moteur Vanne		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
‣ Peintures multiples en vrac	META (A) le 25/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT142407-20906	
Réf échantillon client : P037 - Métal + peinture grise - Peinture - Barrage - Rive droite Pass N°3 - Toutes zones - Frein Moteur Vanne		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
‣ Peintures multiples en vrac	META (A) le 25/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-14329 EN DATE DU 26/07/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT142407-20907	
Réf échantillon client : P038 - Métal + peinture verte - Peinture - Barrage - Rive droite Pass N°3 - Toutes zones - Moteur Réducteur		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
‣ Peintures multiples en vrac	META (A) le 25/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT142407-20908	
Réf échantillon client : P039 - Métal + peinture grise - Peinture - Barrage - Rive droite Pass N°3 - Toutes zones - Support moteur		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
‣ Peintures multiples en vrac	META (A) le 26/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EIB (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT142407-20909	
Réf échantillon client : P040 - Métal + peinture grise - Peinture - Barrage - Rive droite Pass N°3 - Sol - Plaques de Levage		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
‣ Peintures multiples en vrac	META (A) le 26/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EIB (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT142407-20910	
Réf échantillon client : P041 - Métal + peinture grise - Peinture - Barrage - Rive droite Pass N°3 - Toutes zones - Garde-corps		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
‣ Peintures multiples en vrac	META (A) le 26/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EIB (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + - ILE DE LA LOGE - 78380 - BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT142407-20911	
Réf échantillon client : P042 - Métal + peinture noir - Peinture - Barrage - Rive droite Pass N°3 - Toutes zones - Echelle		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
‣ Peintures multiples en vrac	META (A) le 26/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : EIB (3)


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Maxime BECK Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

ANNEXE : Certificat de compétence

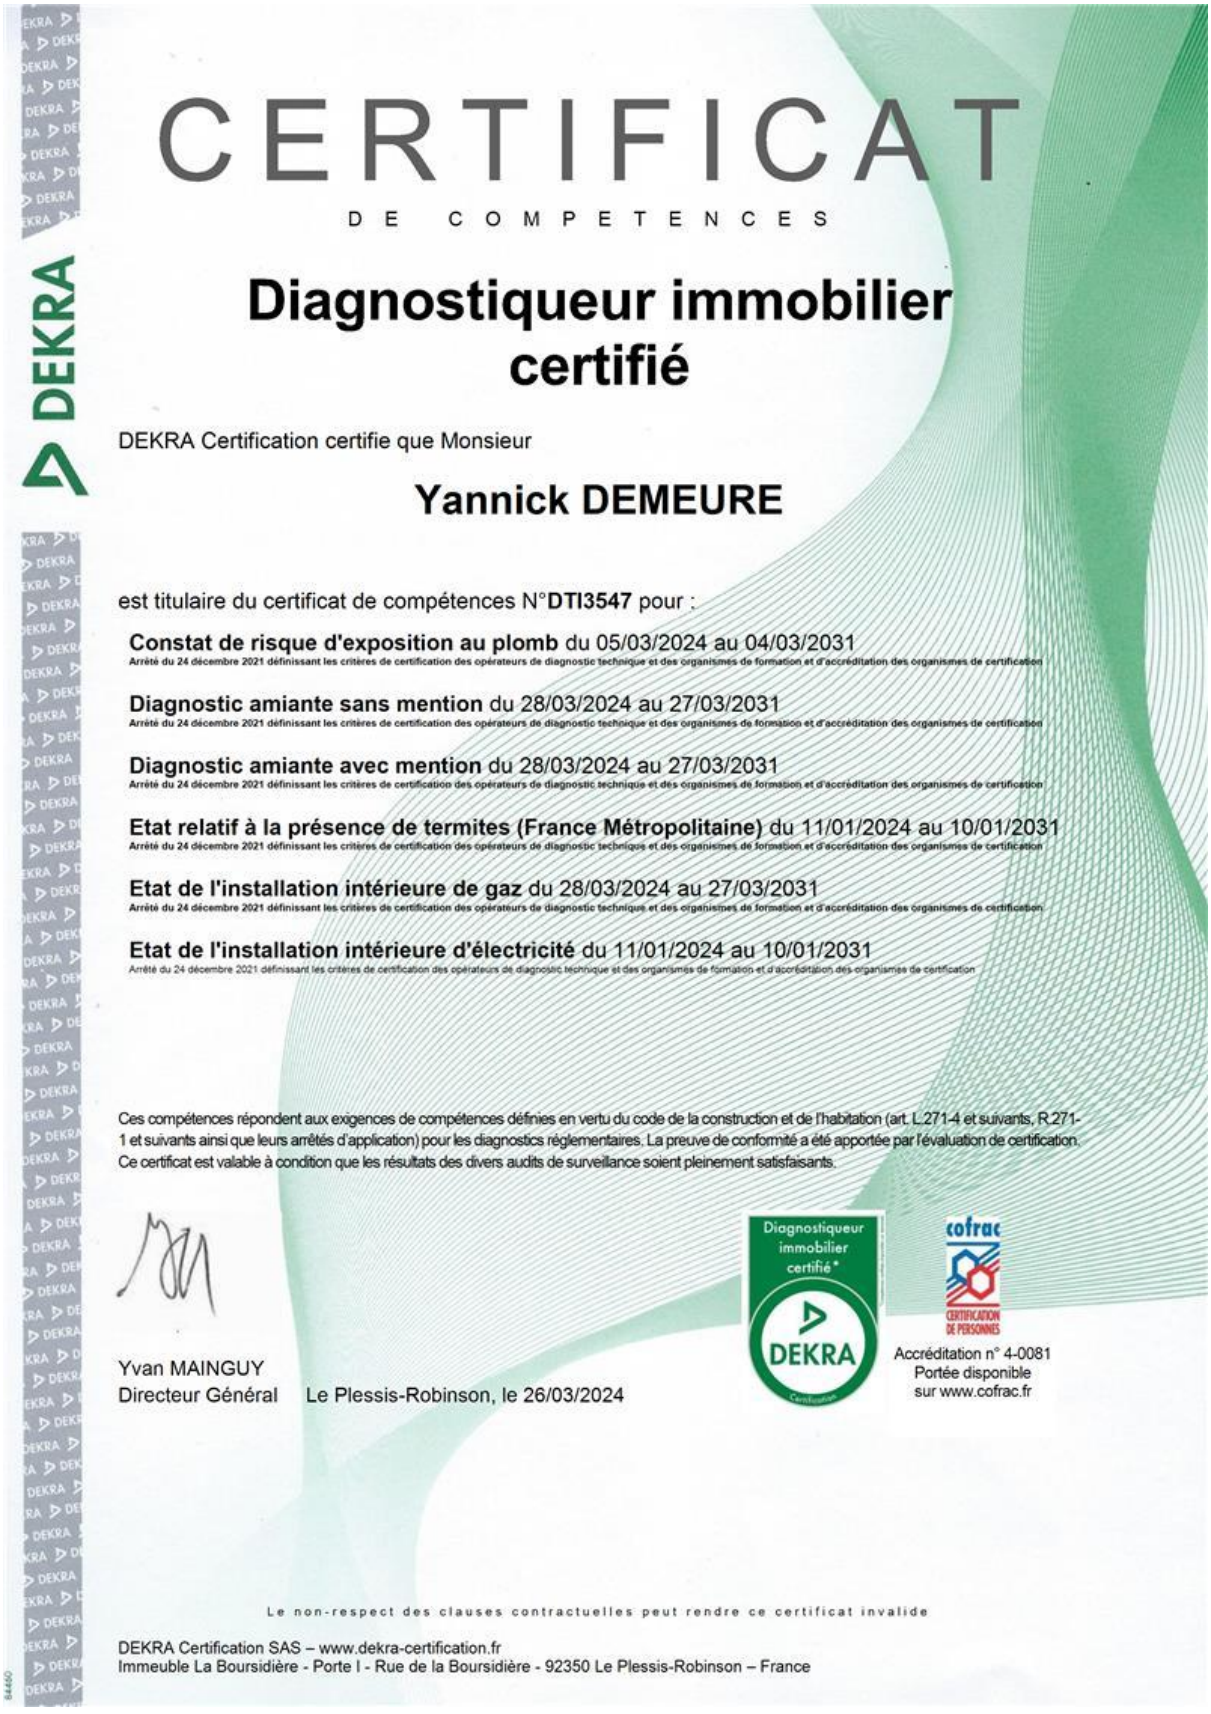

CERTIFICAT

DE COMPETENCES

Diagnostiqueur immobilier certifié

DEKRA Certification certifie que Monsieur

Yannick DEMEURE

est titulaire du certificat de compétences N°**DTI3547** pour :

Constat de risque d'exposition au plomb du 05/03/2024 au 04/03/2031
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Diagnostic amiante sans mention du 28/03/2024 au 27/03/2031
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Diagnostic amiante avec mention du 28/03/2024 au 27/03/2031
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Etat relatif à la présence de termites (France Métropolitaine) du 11/01/2024 au 10/01/2031
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Etat de l'installation intérieure de gaz du 28/03/2024 au 27/03/2031
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Etat de l'installation intérieure d'électricité du 11/01/2024 au 10/01/2031
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification.
Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

Yvan MAINGUY
Directeur Général

Le Plessis-Robinson, le 26/03/2024

Diagnostiqueur immobilier certifié * DEKRA Certification

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES
Accréditation n° 4-0081
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Le non-respect des clauses contractuelles peut rendre ce certificat invalide

DEKRA Certification SAS – www.dekra-certification.fr
Immeuble La Boursidière - Porte I - Rue de la Boursidière - 92350 Le Plessis-Robinson – France

ANNEXE : Attestation d'assurance

Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

03 89 61 64 64
08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE DIAGNOSTICS
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :
Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- **des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation**
- **des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)**
- **des activités de classification et certification de navires et unités offshore.**

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada sous-limités :	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il est précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2024 au 31/12/2024** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **10/01/2024**
Pour la société :
Mathieu GODART
Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Fin du rapport
