Dossier Technique Immobilier

Numéro de dossier : WARGNIER/IMO/11685
Date du repérage : 23/10/2024



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :
Département : ...**Seine-Saint-Denis**
Adresse :.....**173 Avenue Paul Vaillant - Couturier**
Commune : .....**93000 BOBIGNY**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Périmètre de repérage :
Délimité par la zone de travaux

Désignation du propriétaire

Désignation du client :
Nom et prénom : ... **MINISTÈRE DE LA JUSTICE - WARGNIER Quentin**
Adresse : ..... **1 quai de la Corse 75181 Paris CEDEX 04**

Objet de la mission :

☐ Dossier Technique Amiante	☐ Métrage (Loi Carrez)	☐ Etat des Installations électriques
☐ Constat amiante avant-vente	☐ Métrage (Loi Boutin)	☐ Diagnostic Technique (DTG)
☐ Dossier amiante Parties Privatives	☐ Exposition au plomb (CREP)	☐ Diagnostic énergétique
☑ Diag amiante avant travaux	☐ Exposition au plomb (DRIPP)	☐ Audit énergétique
☐ Diag amiante avant démolition	☐ Diag Assainissement	☐ Prêt à taux zéro
☐ Etat relatif à la présence de termites	☐ Sécurité piscines	☐ Ascenseur
☐ Etat parasitaire	☐ Etat des Installations gaz	☐ Etat des lieux (Loi Scellier)
☐ Etat des Risques et Pollutions	☐ Plomb dans l'eau	☐ Radon
☐ Etat des lieux	☐ Sécurité Incendie	☐ Accessibilité Handicapés
☐ Infiltrométrie	☐ Plomb APTVX	☐ Accessibilité Handicapés
☐ Amiante Examen Visuel APTVX	☐ Plomb avant travaux	☐ Performance numérique
☐ Amiante contrôle périodique	☐ Développement interne	☐ Déchets / PEMD
☐ Amiante Empoussièrement	☐ Home Inspection	☐ Climatisation
☐ Hôtel H	☐ Tantième de copropriété	☐ Contrôle périodique gaz
☐ Hôtel RT	☐ Risques Professionnels	☐ Contrôle périodique élec
☐ Hôtel C	☐ Contrôle levage	☐ RT 2012 Avant travaux
	☐ Logement décent	☐ RT 2012 Après travaux

Résumé de l'expertise n° WARGNIER/IMO/11685

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :
Adresse : ..... **173 Avenue Paul Vaillant - Couturier**
Commune : ..... **93000 BOBIGNY**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Périmètre de repérage : ... **Délimité par la zone de travaux**

	Prestations	Conclusion
	Amiante	Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : WARGNIER/IMO/11685
Date du repérage : 23/10/2024

Références réglementaires et normatives	
Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité	
Adresse	Rue : ..... **173 Avenue Paul Vaillant - Couturier** Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: Code postal, ville : . **93000 BOBIGNY**
Périmètre de repérage :	..... **Délimité par la zone de travaux**
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction :	..... **Tribunal judiciaire** ..... **Autres** **0**

Le propriétaire et le donneur d'ordre	
Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom **:** ... **MINISTÈRE DE LA JUSTICE - WARGNIER Quentin** Adresse : ..... **1 quai de la Corse** **75181 Paris CEDEX 04**
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : ... **MINISTÈRE DE LA JUSTICE - WARGNIER Quentin** Adresse : ..... **1 quai de la Corse** **75181 Paris CEDEX 04**

Le(s) signataire(s)				
	NOM Prénom	**Fonction**	**Organisme certification**	**Détail de la certification**
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ---------- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	DUMRUK Pascal	Opérateur de repérage	LA CERTIFICATION DE PERSONNES 25 Avenue Léonard de Vinci, Immeuble Europarc, 33600 PESSAC	Obtention : 21/03/2023 Échéance : 20/03/2030 N° de certification : 1572
Raison sociale de l'entreprise : **CEED DD DIAG** (Numéro SIRET : **79159359300035)** Adresse : **88 avenue des Ternes, 75017 PARIS** Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA** Numéro de police et date de validité : **10772085104 - 01/03/2025**				

Le rapport de repérage
Date d'émission du rapport de repérage : 23/10/2024, remis au propriétaire le 23/10/2024
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 78 pages

Sommaire

1 Les conclusions
2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses
3 La mission de repérage
3.1 L'objet de la mission
3.2 Le cadre de la mission
3.2.1 L'intitulé de la mission
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
3.2.3 L'objectif de la mission
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
4 Conditions de réalisation du repérage
4.1 Bilan de l'analyse documentaire
4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
4.4 Plan et procédures de prélèvements
5 Conclusion détaillée du repérage
5.1 Liste des produits et matériaux présentées par catégorie
5.2 Récapitulatif zone par zone
6 Signatures
7 Annexes

1. – Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante. (Détaillé en partie 5 du présent rapport)

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations approfondies sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... CEAPIC
Adresse : ..... 13 rue Louis Armand 95230 Soisy sous Montmorency
Numéro de l'accréditation Cofrac : 1-5571

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.»
Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

3.2.4 Le programme de repérage

Le programme de repérage est défini par l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié et de son annexe 1.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
	Fenêtres de toit, lanternaux, verrières
2 - Parois verticales extérieures et Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
	Éléments associés aux façades
3 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
4 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
	Suspentes et contrevents
5 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols
6 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Portes et cloisons palières
	parois des équipements
	Matériels en machinerie
8 - Équipements divers et accessoires	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	fusibles à broche
	canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
9 - Fondations et soubassements	Étanchéité des murs enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées
	Conduits et fourreaux
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 *Le périmètre de repérage*

Programme détaillé des travaux :
Néant

Descriptif des pièces visitées

Niveau parvis - Sanitaire,
Niveau parvis - Salle d'audience N°2,
Niveau parvis - Espace de confidentialité,
Niveau parvis - Salle d'audience N°9,
Niveau parvis - Salle d'audience N°5,
Niveau parvis - Salle d'audience N°6,
Niveau parvis - Instruction,
Niveau parvis - Circulation instruction,
Niveau parvis - Accueil instruction,
Niveau parvis - Salle d'assise N°2,
Niveau parvis - Tribunal d'enfant,
Niveau parvis - Escalier B,
Niveau pas perdu - Salle d'assise N°1,
Niveau pas perdu - Salle d'audience N°4,
Niveau pas perdu - Salle d'assise N°3,
Niveau pas perdu - Escalier régie,
Niveau parvis - Acceuil parvis,
Niveau parvis - Escalier C,
3ème étage - Salle d'audience N°8,
Extérieur parvis - Escalier

Localisation	Description
Néant	-

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :
Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 23/10/2024
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 23/10/2024
Heure d'arrivée : 06 h 00
Durée du repérage : 02 h 00
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Sans accompagnateur

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017 et de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Conclusion détaillée du repérage

5.1 Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités
Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

M020 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) | Description : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium).

Niveau : Niveau parvis

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Instruction	1	Identifiant :M020 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Instruction	P020	


M054 : Partie à inspecter : Joint d'assemblage briques | Description : Joint d'assemblage briques.

Niveau : Extérieur parvis

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier	1	Identifiant :M054 Description :Joint d'assemblage briques Résultat : Absence d'amiante	Oui Extérieur parvis - Escalier	P054	


M055 : Partie à inspecter : Joint d'assemblage briques | Description : Joint d'assemblage briques.

Niveau : Extérieur parvis

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier	1	Identifiant :M055 Description :Joint d'assemblage briques Résultat : Absence d'amiante	Oui Extérieur parvis - Escalier	P055	

M056 : Partie à inspecter : Joint d'assemblage | Description : Joint d'assemblage.

Niveau : Extérieur parvis


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier	1	Identifiant :M056 Description :Joint d'assemblage Résultat : Absence d'amiante	Oui Extérieur parvis - Escalier	P056	

M057 : Partie à inspecter : Joint d'assemblage briques | Description : Joint d'assemblage briques.					
Niveau : Extérieur parvis					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Escalier	1	Identifiant :M057 Description :Joint d'assemblage briques Résultat : Absence d'amiante	Oui Extérieur parvis - Escalier	P057	

M058 : Partie à inspecter : Béton | Description : Béton.					
Niveau : Extérieur parvis					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Escalier	1	Identifiant :M058 Description :Béton Résultat : Absence d'amiante	Oui Extérieur parvis - Escalier	P058	


3 - Parois verticales intérieures

M001 : Partie à inspecter : Joint d'assemblage | Description : Joint d'assemblage briques.					
Niveau : Niveau parvis					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Sanitaire	1	Identifiant :M001 Description :Joint d'assemblage briques Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Sanitaire	P001	

M002 : Partie à inspecter : Colle de faïence | Description : Colle de faïence.					
Niveau : Niveau parvis					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Sanitaire	1	Identifiant :M002 Description :Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Sanitaire	P002	

M003 : Partie à inspecter : Colle de plinthe | Description : Colle de plinthe.

Niveau : Niveau parvis

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire	1	Identifiant :M003 Description :Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Sanitaire	P003	


M005 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit à base de ciment.

Niveau : Niveau parvis

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire	1	Identifiant :M005 Description :Enduit à base de ciment Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Sanitaire	P005	

M008 : Partie à inspecter : Béton | Description : Béton.

Niveau : Niveau parvis


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Espace de confidentialité	1	Identifiant :M008 Description :Béton Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Espace de confidentialité	P008	

M011 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment | Description : Enduit à base de ciment lissé.

Niveau : Niveau parvis

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle d'audience N°9	1	Identifiant :M011 Description :Enduit à base de ciment lissé Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Salle d'audience N°9	P011	

M016 : Partie à inspecter : Joint d'assemblage | Description : Joint d'assemblage briques.					
Niveau : Niveau parvis					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Instruction	1	Identifiant :M016 Description :Joint d'assemblage briques Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Instruction	P016	


M021 : Partie à inspecter : Joint d'assemblage | Description : Joint d'assemblage.					
Niveau : Niveau parvis					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Circulation instruction	1	Identifiant :M021 Description :Joint d'assemblage Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Circulation instruction	P021	

M022 : Partie à inspecter : Béton mais courante | Description : Béton main courante.					
Niveau : Niveau parvis					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Circulation instruction	1	Identifiant :M022 Description :Béton main courante Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Circulation instruction	P022	

M023 : Partie à inspecter : Joint des portes | Description : Joint des portes.					
Niveau : Niveau parvis					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Circulation instruction	1	Identifiant :M023 Description :Joint des portes Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Circulation instruction	P023	

M025 : Partie à inspecter : Joint d'assemblage | Description : Joint d'assemblage brique.					
Niveau : Niveau parvis					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Accueil instruction	1	Identifiant :M025 Description :Joint d'assemblage brique Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Accueil instruction	P025	

M028 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment | Description : Enduit à base de ciment.					
Niveau : Niveau parvis					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Tribunal d'enfant	1	Identifiant :M028 Description :Enduit à base de ciment Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Tribunal d'enfant	P028	

M029 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment | Description : Enduit à base de ciment.					
Niveau : Niveau parvis					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Tribunal d'enfant	1	Identifiant :M029 Description :Enduit à base de ciment Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Tribunal d'enfant	P029	


M031 : Partie à inspecter : Joint d'assemblage | Description : Joint d'assemblage.					
Niveau : Niveau parvis					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Tribunal d'enfant	1	Identifiant :M031 Description :Joint d'assemblage Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Tribunal d'enfant	P031	


M032 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment | Description : Enduit à base de ciment.					
Niveau : Niveau parvis					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Tribunal d'enfant	1	Identifiant :M032 Description :Enduit à base de ciment Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Tribunal d'enfant	P032	

M035 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment | Description : Enduit à base de ciment.					
Niveau : Niveau parvis					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Escalier B	1	Identifiant :M035 Description :Enduit à base de ciment Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Escalier B	P035	


M045 : Partie à inspecter : Joint des portes | Description : Joint des portes.					
Niveau : Niveau parvis					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Acceuil parvis	1	Identifiant :M045 Description :Joint des portes Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Acceuil parvis	P045	

M048 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment | Description : Enduit à base de ciment.					
Niveau : Niveau parvis					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Escalier C	1	Identifiant :M048 Description :Enduit à base de ciment Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Escalier C	P048	

M051 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment | Description : Enduit à base de ciment.					
Niveau : 3ème étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle d'audience N°8	1	Identifiant :M051 Description :Enduit à base de ciment Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - Salle d'audience N°8	P051	


M053 : Partie à inspecter : Joint des portes | Description : Joint des portes.					
Niveau : 3ème étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle d'audience N°8	1	Identifiant :M053 Description :Joint des portes Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - Salle d'audience N°8	P053	

4 - Plafonds et faux plafonds


M018 : Partie à inspecter : Flocage | Description : Flocage.					
Niveau : Niveau parvis					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Instruction	1	Identifiant :M018 Description :Flocage Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Instruction	P018	


M036 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment | Description : Enduit à base de ciment.					
Niveau : Niveau parvis					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Escalier B	1	Identifiant :M036 Description :Enduit à base de ciment Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Escalier B	P036	


M049 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment | Description : Enduit à base de ciment.					
Niveau : Niveau parvis					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Escalier C	1	Identifiant :M049 Description :Enduit à base de ciment Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Escalier C	P049	


M052 : Partie à inspecter : Flocage | Description : Flocage.					
Niveau : 3ème étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle d'audience N°8	1	Identifiant :M052 Description :Flocage Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - Salle d'audience N°8	P052	


5 - Planchers et planchers techniques

M004 : Partie à inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.					
Niveau : Niveau parvis					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Sanitaire	1	Identifiant :M004 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Sanitaire	P004	

M006 : Partie à inspecter : Moquette | Description : Moquette.					
Niveau : Niveau parvis					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle d'audience N°2	1	Identifiant :M006 Description :Moquette Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Salle d'audience N°2	P006	

M007 : Partie à inspecter : Béton banc | Description : Béton banc.					
Niveau : Niveau parvis					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle d'audience N°2	1	Identifiant :M007 Description :Béton banc Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Salle d'audience N°2	P007	


M009 : Partie à inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.					
Niveau : Niveau parvis					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Espace de confidentialité	1	Identifiant :M009 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Espace de confidentialité	P009	

M010 : Partie à inspecter : Colle de linoléum | Description : Colle de linoléum.					
Niveau : Niveau parvis					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle d'audience N°9	1	Identifiant :M010 Description :Colle de linoléum Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Salle d'audience N°9	P010	

M012 : Partie à inspecter : Colle linoléum | Description : Colle linoléum.					
Niveau : Niveau parvis					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle d'audience N°5	1	Identifiant :M012 Description :Colle linoléum Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Salle d'audience N°5	P012	

M013 : Partie à inspecter : Appuie béton banc | Description : Appuie béton banc.

Niveau : Niveau parvis

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle d'audience N°5	1	Identifiant :M013 Description :Appuie béton banc Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Salle d'audience N°5	P013	


M014 : Partie à inspecter : Colle linoléum | Description : Colle linoléum.

Niveau : Niveau parvis

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle d'audience N°6	1	Identifiant :M014 Description :Colle linoléum Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Salle d'audience N°6	P014	

M015 : Partie à inspecter : Appuie béton banc | Description : Appuie béton banc.

Niveau : Niveau parvis

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle d'audience N°6	1	Identifiant :M015 Description :Appuie béton banc Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Salle d'audience N°6	P015	

M017 : Partie à inspecter : Sol béton | Description : Sol béton.

Niveau : Niveau parvis

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Instruction	1	Identifiant :M017 Description :Sol béton Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Instruction	P017	

M019 : Partie à inspecter : Colle linoléum | Description : Colle linoléum.

Niveau : Niveau parvis

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Instruction	1	Identifiant :M019 Description :Colle linoléum Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Instruction	P019	


M024 : Partie à inspecter : Colle linoléum | Description : Colle linoléum.

Niveau : Niveau parvis

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Accueil instruction	1	Identifiant :M024 Description :Colle linoléum Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Accueil instruction	P024	


M026 : Partie à inspecter : Colle linoléum | Description : Colle linoléum.

Niveau : Niveau parvis

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle d'assise N°2	1	Identifiant :M026 Description :Colle linoléum Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Salle d'assise N°2	P026	

M027 : Partie à inspecter : Nez de marche | Description : Nez de marche.

Niveau : Niveau parvis

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle d'assise N°2	1	Identifiant :M027 Description :Nez de marche Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Salle d'assise N°2	P027	

M030 : Partie à inspecter : Colle linoléum | Description : Colle linoléum.

Niveau : Niveau parvis

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Tribunal d'enfant	1	Identifiant :M030 Description :Colle linoléum Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Tribunal d'enfant	P030	


M033 : Partie à inspecter : Colle linoléum | Description : Colle linoléum.

Niveau : Niveau parvis

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier B	1	Identifiant :M033 Description :Colle linoléum Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Escalier B	P033	


M034 : Partie à inspecter : Nez de marche | Description : Nez de marche.


Niveau : Niveau parvis


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier B	1	Identifiant :M034 Description :Nez de marche Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Escalier B	P034	


M037 : Partie à inspecter : Colle linoléum | Description : Colle linoléum.

Niveau : Niveau pas perdu


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle d'assise N°1	1	Identifiant :M037 Description :Colle linoléum Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau pas perdu - Salle d'assise N°1	P037	

M038 : Partie à inspecter : Appuie béton banc | Description : Appuie béton banc.					
Niveau : Niveau pas perdu					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle d'assise N°1	1	Identifiant :M038 Description :Appuie béton banc Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau pas perdu - Salle d'assise N°1	P038	

M039 : Partie à inspecter : Colle linoléum | Description : Colle linoléum.					
Niveau : Niveau pas perdu					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle d'audience N°4	1	Identifiant :M039 Description :Colle linoléum Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau pas perdu - Salle d'audience N°4	P039	

M040 : Partie à inspecter : Nez de marche | Description : Nez de marche.					
Niveau : Niveau pas perdu					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle d'audience N°4	1	Identifiant :M040 Description :Nez de marche Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau pas perdu - Salle d'audience N°4	P040	

M041 : Partie à inspecter : Colle linoléum | Description : Colle linoléum.					
Niveau : Niveau pas perdu					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle d'assise N°3	1	Identifiant :M041 Description :Colle linoléum Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau pas perdu - Salle d'assise N°3	P041	


M042 : Partie à inspecter : Nez de marche | Description : Nez de marche.					
Niveau : Niveau pas perdu					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle d'assise N°3	1	Identifiant :M042 Description :Nez de marche Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau pas perdu - Salle d'assise N°3	P042	

M043 : Partie à inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.					
Niveau : Niveau pas perdu					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Escalier régie	1	Identifiant :M043 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau pas perdu - Escalier régie	P043	

M044 : Partie à inspecter : Sol béton | Description : Sol béton.					
Niveau : Niveau parvis					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Acceuil parvis	1	Identifiant :M044 Description :Sol béton Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Acceuil parvis	P044	

M046 : Partie à inspecter : Colle linoléum | Description : Colle linoléum.					
Niveau : Niveau parvis					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Escalier C	1	Identifiant :M046 Description :Colle linoléum Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Escalier C	P046	

M047 : Partie à inspecter : Nez de marche | Description : Nez de marche.					
Niveau : Niveau parvis					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Escalier C	1	Identifiant :M047 Description :Nez de marche Résultat : Absence d'amiante	Oui Niveau parvis - Escalier C	P047	

M050 : Partie à inspecter : Colle linoléum | Description : Colle linoléum.					
Niveau : 3ème étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle d'audience N°8	1	Identifiant :M050 Description :Colle linoléum Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - Salle d'audience N°8	P050	

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

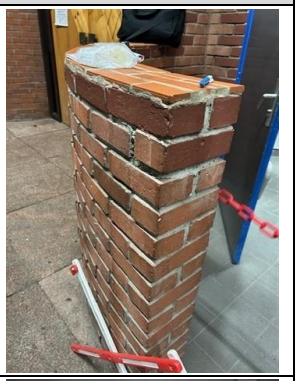
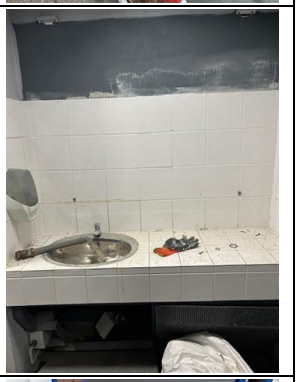
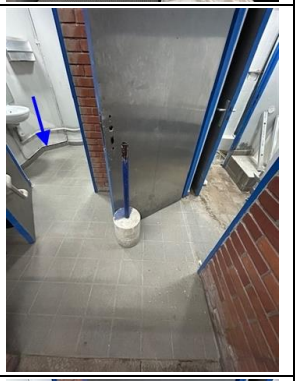
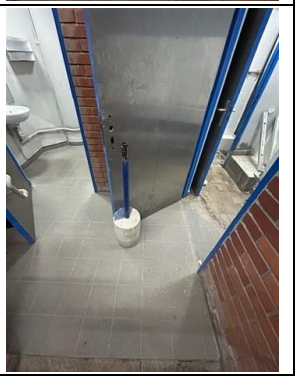
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

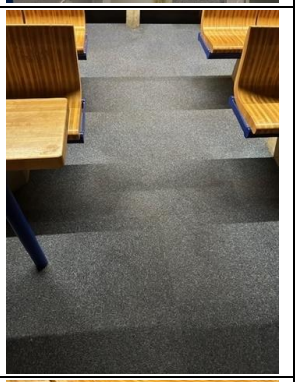
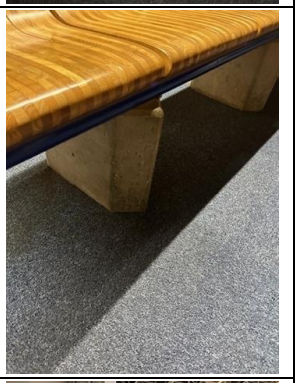
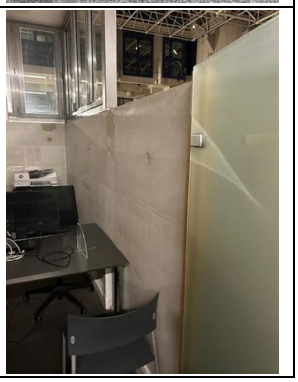
Sans objet

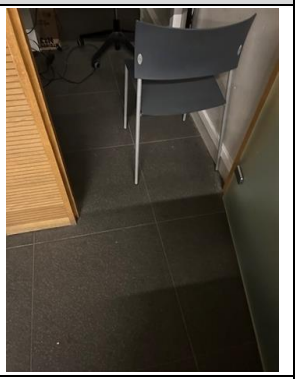
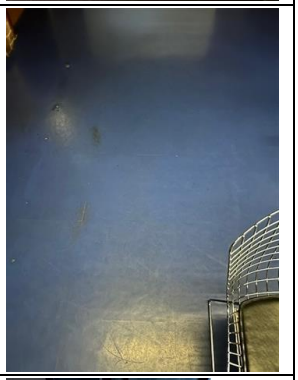
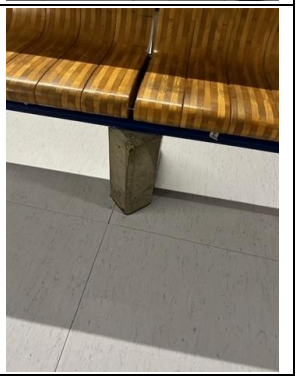
Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017

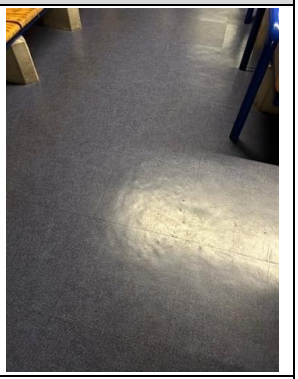
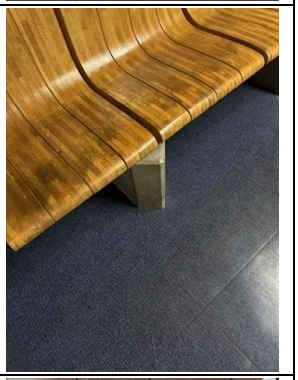
Sans objet

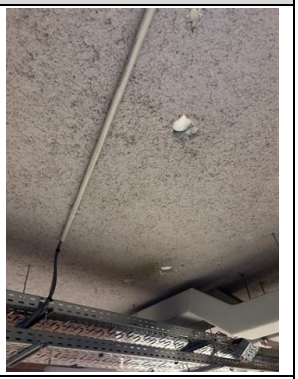
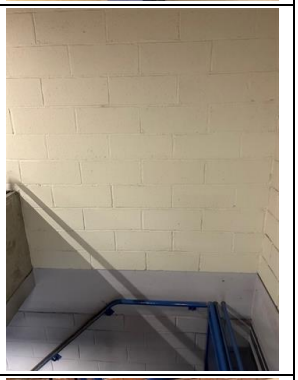
5.2 Récapitulatif zone par zone

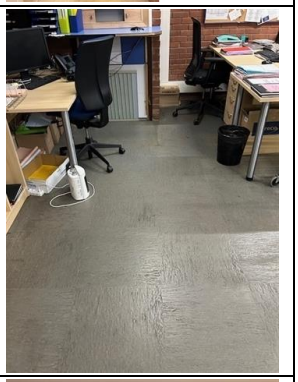
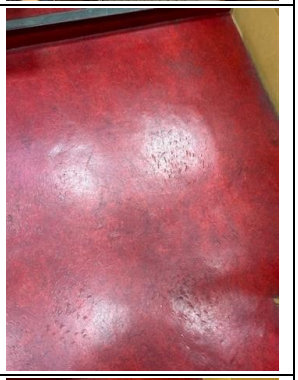
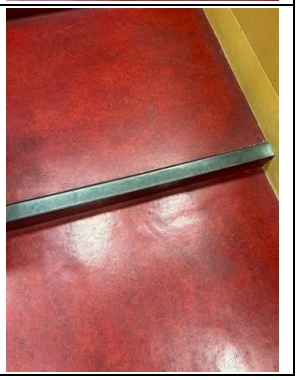
Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M001	Localisation : Niveau parvis - Sanitaire Echantillons : P001 Description : Joint d'assemblage briques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M002	Localisation : Niveau parvis - Sanitaire Echantillons : P002 Description : Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M003	Localisation : Niveau parvis - Sanitaire Echantillons : P003 Description : Colle de plinthe	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M004	Localisation : Niveau parvis - Sanitaire Echantillons : P004 Description : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

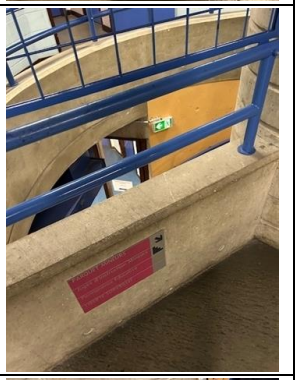
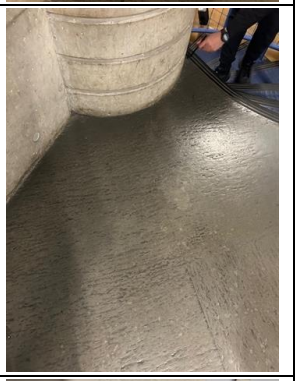
Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M005	Localisation : Niveau parvis - Sanitaire Echantillons : P005 Description : Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M006	Localisation : Niveau parvis - Salle d'audience N°2 Echantillons : P006 Description : Moquette	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M007	Localisation : Niveau parvis - Salle d'audience N°2 Echantillons : P007 Description : Béton banc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M008	Localisation : Niveau parvis - Espace de confidentialité Echantillons : P008 Description : Béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

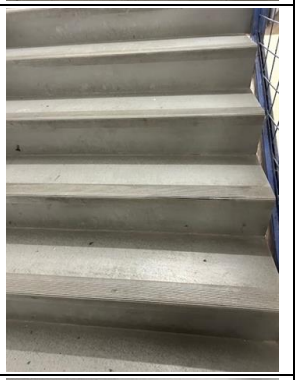
Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M009	Localisation : Niveau parvis - Espace de confidentialité Echantillons : P009 Description : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M010	Localisation : Niveau parvis - Salle d'audience N°9 Echantillons : P010 Description : Colle de linoléum	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M011	Localisation : Niveau parvis - Salle d'audience N°9 Echantillons : P011 Description : Enduit à base de ciment lissé	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M012	Localisation : Niveau parvis - Salle d'audience N°5 Echantillons : P012 Description : Colle linoléum	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M013	Localisation : Niveau parvis - Salle d'audience N°5 Echantillons : P013 Description : Appuie béton banc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

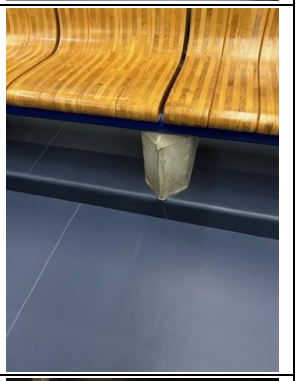
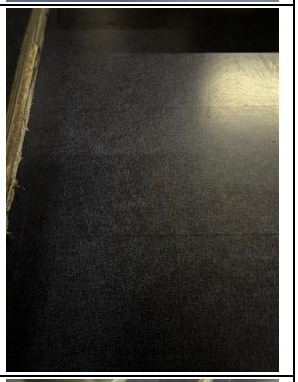
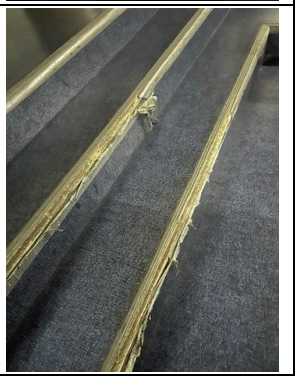
Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M014	Localisation : Niveau parvis - Salle d'audience N°6 Echantillons : P014 Description : Colle linoléum	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M015	Localisation : Niveau parvis - Salle d'audience N°6 Echantillons : P015 Description : Appuie béton banc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M016	Localisation : Niveau parvis - Instruction Echantillons : P016 Description : Joint d'assemblage briques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M017	Localisation : Niveau parvis - Instruction Echantillons : P017 Description : Sol béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

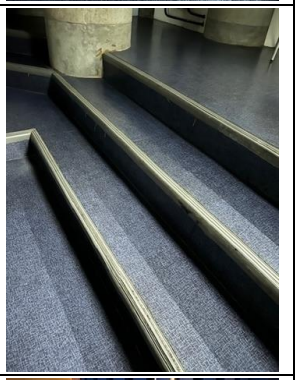
Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M018	Localisation : Niveau parvis - Instruction Echantillons : P018 Description : Flocage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M019	Localisation : Niveau parvis - Instruction Echantillons : P019 Description : Colle linoléum	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M020	Localisation : Niveau parvis - Instruction Echantillons : P020 Description : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M021	Localisation : Niveau parvis - Circulation instruction Echantillons : P021 Description : Joint d'assemblage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M022	Localisation : Niveau parvis - Circulation instruction Echantillons : P022 Description : Béton main courante	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M023	Localisation : Niveau parvis - Circulation instruction Echantillons : P023 Description : Joint des portes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M024	Localisation : Niveau parvis - Accueil instruction Echantillons : P024 Description : Colle linoléum	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M025	Localisation : Niveau parvis - Accueil instruction Echantillons : P025 Description : Joint d'assemblage brique	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M026	Localisation : Niveau parvis - Salle d'assise N°2 Echantillons : P026 Description : Colle linoléum	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M027	Localisation : Niveau parvis - Salle d'assise N°2 Echantillons : P027 Description : Nez de marche	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

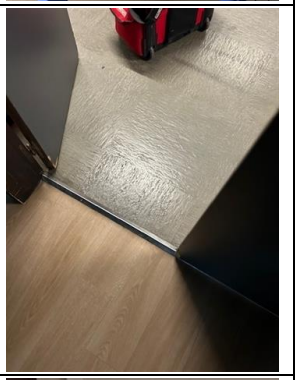
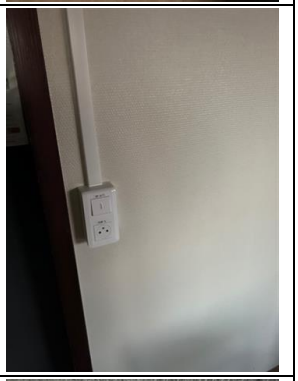
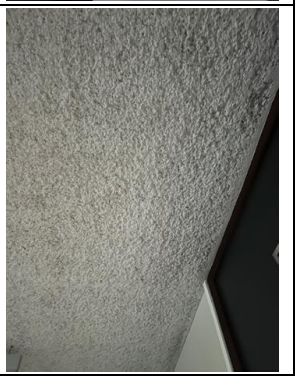
Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M028	Localisation : Niveau parvis - Tribunal d'enfant Echantillons : P028 Description : Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M029	Localisation : Niveau parvis - Tribunal d'enfant Echantillons : P029 Description : Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M030	Localisation : Niveau parvis - Tribunal d'enfant Echantillons : P030 Description : Colle linoléum	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M031	Localisation : Niveau parvis - Tribunal d'enfant Echantillons : P031 Description : Joint d'assemblage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M032	Localisation : Niveau parvis - Tribunal d'enfant Echantillons : P032 Description : Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

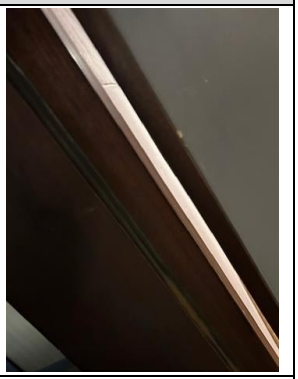
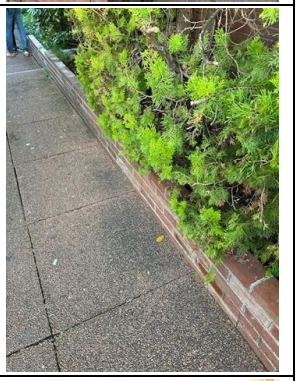
Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M033	Localisation : Niveau parvis - Escalier B Echantillons : P033 Description : Colle linoléum	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M034	Localisation : Niveau parvis - Escalier B Echantillons : P034 Description : Nez de marche	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M035	Localisation : Niveau parvis - Escalier B Echantillons : P035 Description : Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M036	Localisation : Niveau parvis - Escalier B Echantillons : P036 Description : Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M037	Localisation : Niveau pas perdu - Salle d'assise N°1 Echantillons : P037 Description : Colle linoléum	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M038	Localisation : Niveau pas perdu - Salle d'assise N°1 Echantillons : P038 Description : Appuie béton banc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M039	Localisation : Niveau pas perdu - Salle d'audience N°4 Echantillons : P039 Description : Colle linoléum	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M040	Localisation : Niveau pas perdu - Salle d'audience N°4 Echantillons : P040 Description : Nez de marche	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M041	Localisation : Niveau pas perdu - Salle d'assise N°3 Echantillons : P041 Description : Colle linoléum	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M042	Localisation : Niveau pas perdu - Salle d'assise N°3 Echantillons : P042 Description : Nez de marche	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M043	Localisation : Niveau pas perdu - Escalier régie Echantillons : P043 Description : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M044	Localisation : Niveau parvis - Acceuil parvis Echantillons : P044 Description : Sol béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M045	Localisation : Niveau parvis - Acceuil parvis Echantillons : P045 Description : Joint des portes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M046	Localisation : Niveau parvis - Escalier C Echantillons : P046 Description : Colle linoléum	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M047	Localisation : Niveau parvis - Escalier C Echantillons : P047 Description : Nez de marche	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M048	Localisation : Niveau parvis - Escalier C Echantillons : P048 Description : Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M049	Localisation : Niveau parvis - Escalier C Echantillons : P049 Description : Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M050	Localisation : 3ème étage - Salle d'audience N°8 Echantillons : P050 Description : Colle linoléum	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M051	Localisation : 3ème étage - Salle d'audience N°8 Echantillons : P051 Description : Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M052	Localisation : 3ème étage - Salle d'audience N°8 Echantillons : P052 Description : Flocage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M053	Localisation : 3ème étage - Salle d'audience N°8 Echantillons : P053 Description : Joint des portes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M054	Localisation : Extérieur parvis - Escalier Echantillons : P054 Description : Joint d'assemblage briques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M055	Localisation : Extérieur parvis - Escalier Echantillons : P055 Description : Joint d'assemblage briques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M056	Localisation : Extérieur parvis - Escalier Echantillons : P056 Description : Joint d'assemblage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M057	Localisation : Extérieur parvis - Escalier Echantillons : P057 Description : Joint d'assemblage briques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M058	Localisation : Extérieur parvis - Escalier Echantillons : P058 Description : Béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

6. – Signatures

*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **LA CERTIFICATION DE PERSONNES - 25 Avenue Léonard de Vinci, Immeuble Europarc, 33600 PESSAC (détail sur www.info-certif.fr)***

Fait à **BOBIGNY**, le **23/10/2024**

Par : DUMRUK Pascal

Signature du représentant :

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° WARGNIER/IMO/11685

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

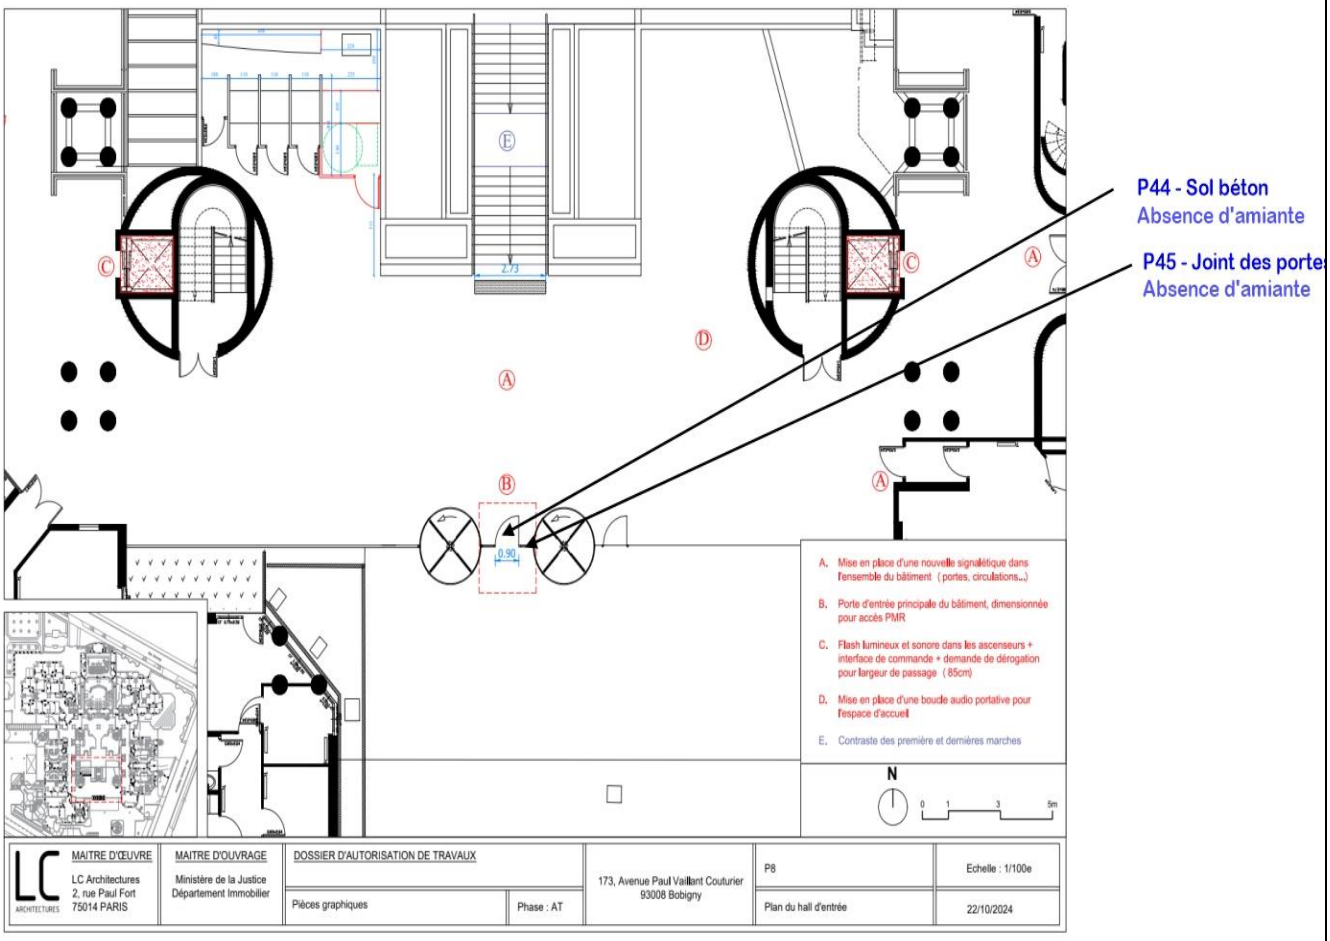
7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

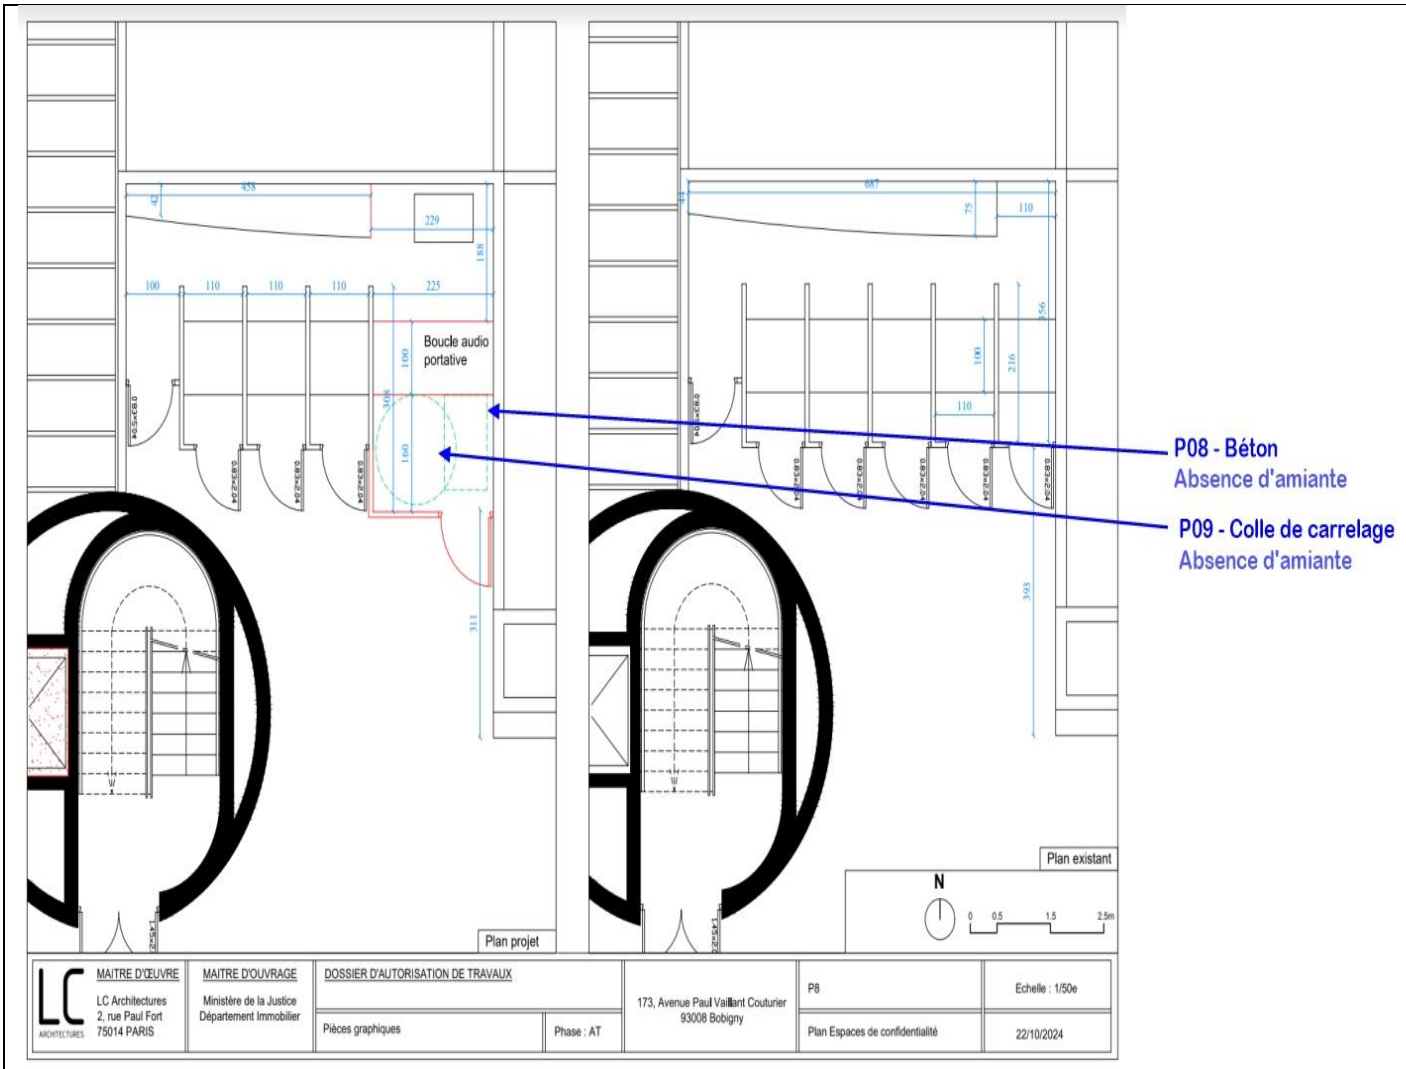
7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

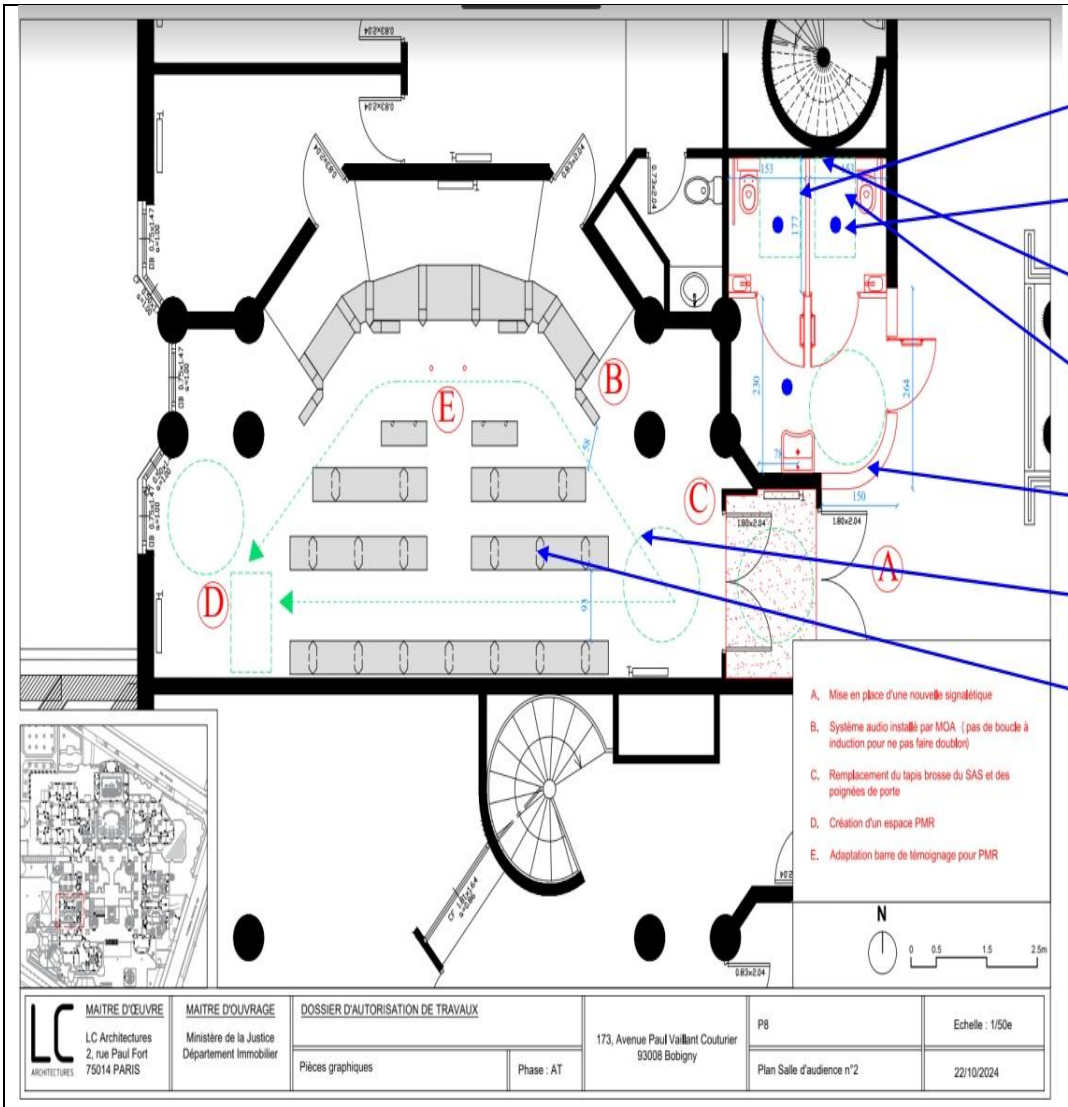
7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport

7.1 - Annexe - Schéma de repérage




Boucle audio portative
P08 - Béton
Absence d'amiante
P09 - Colle de carrelage
Absence d'amiante
Plan projet
Plan existant
N
0 0.5 1.5 2.5m
MAITRE D'ŒUVRE
LC Architectures
2, rue Paul Fort
75014 PARIS
MAITRE D'OUVRAGE
Ministère de la Justice
Département Immobilier
DOSSIER D'AUTORISATION DE TRAVAUX
Pièces graphiques
Phase : AT
173, Avenue Paul Vaillant Couturier
93008 Bobigny
P8
Plan Espaces de confidentialité
Echelle : 1/50e
22/10/2024



P05 - Enduit à base de ciment
Absence d'amiante

P04 - Colle de carrelage
Absence d'amiante

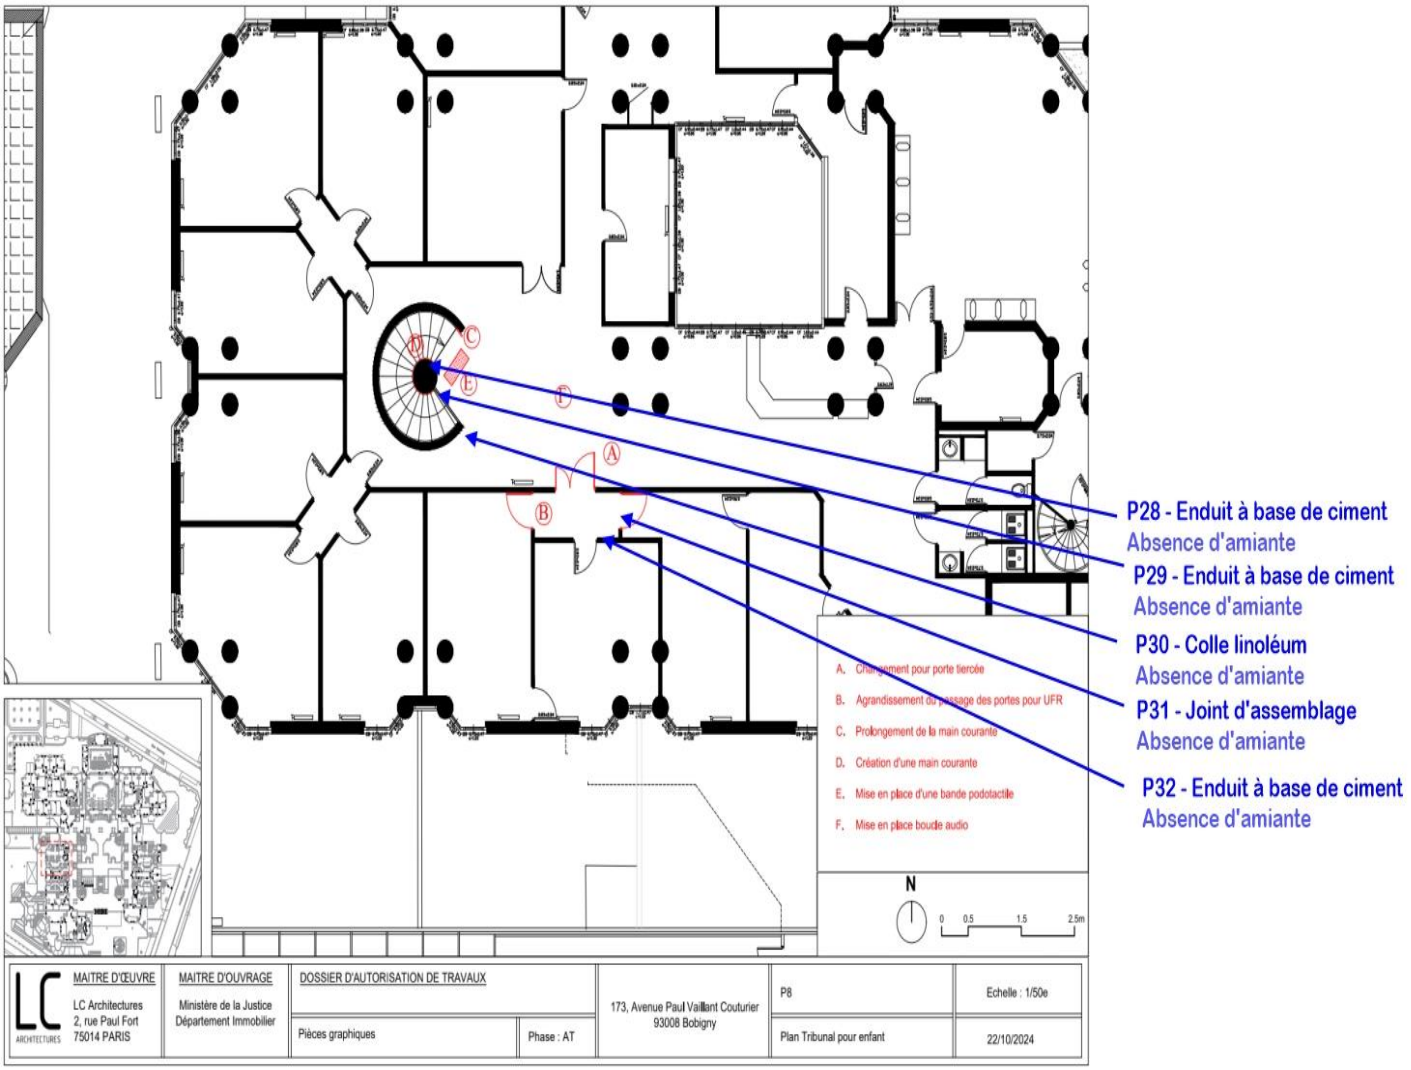
P03 - Colle de plinthe
Absence d'amiante

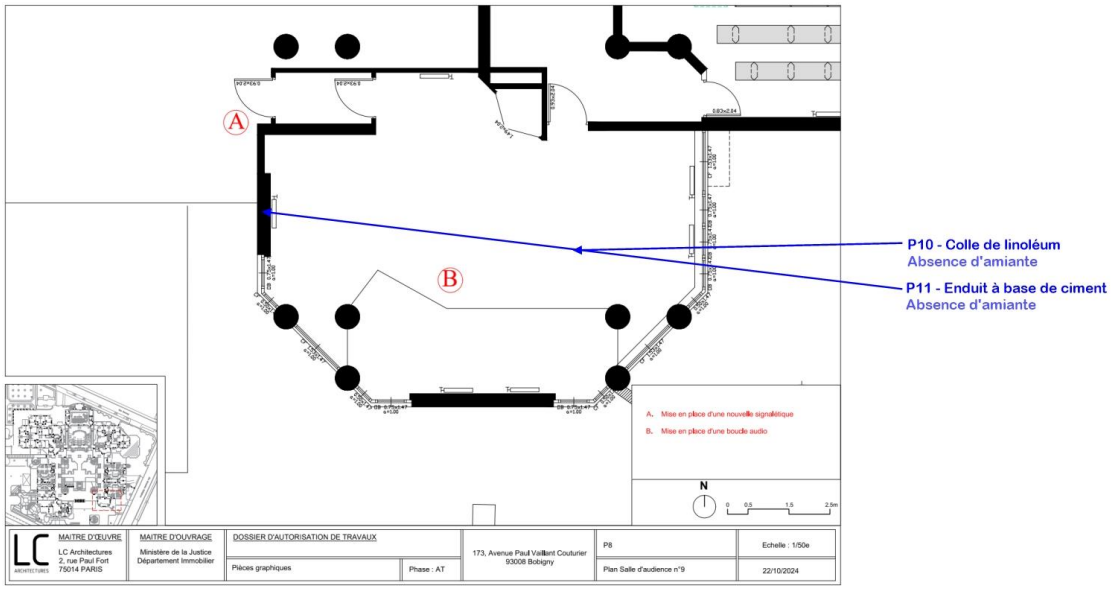
P02 - Colle de faïence
Absence d'amiante

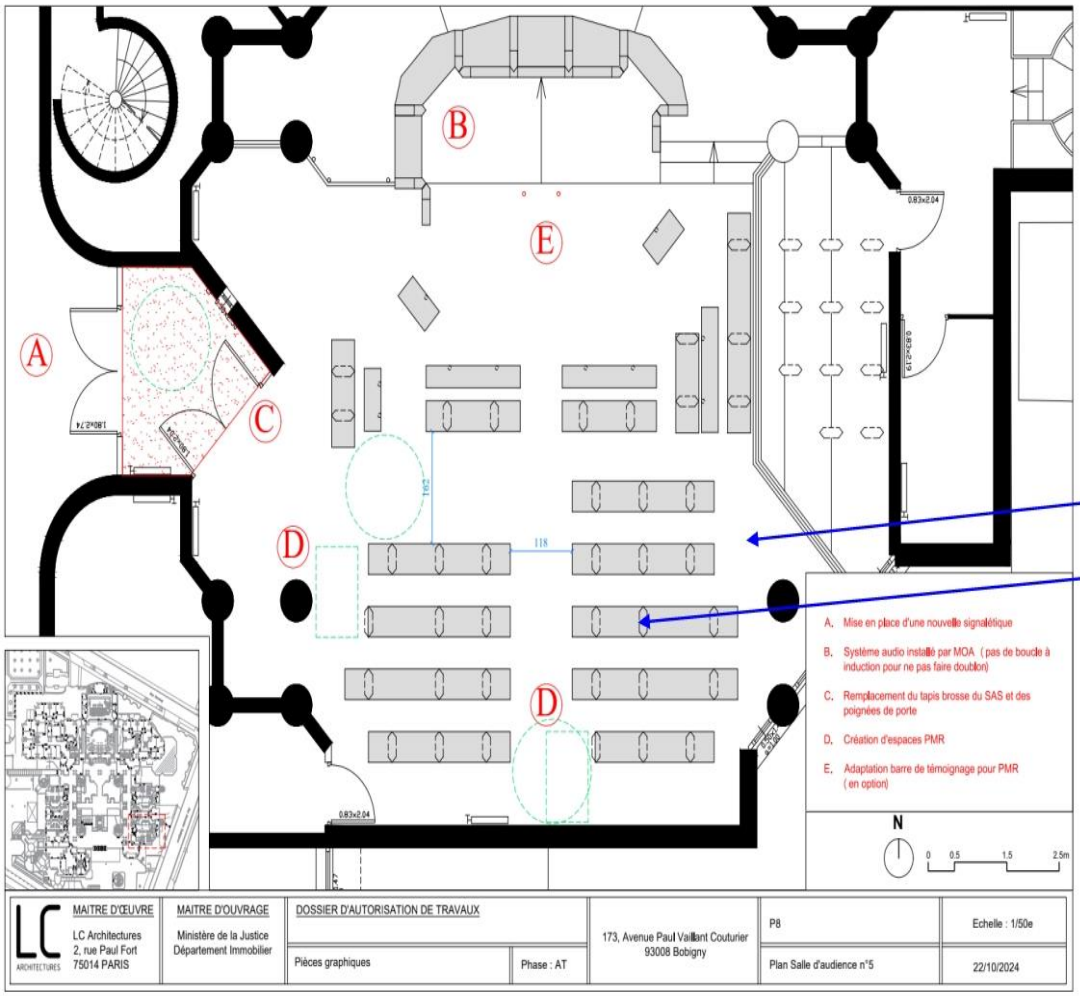
P01 - Joint d'assemblage briques
Absence d'amiante

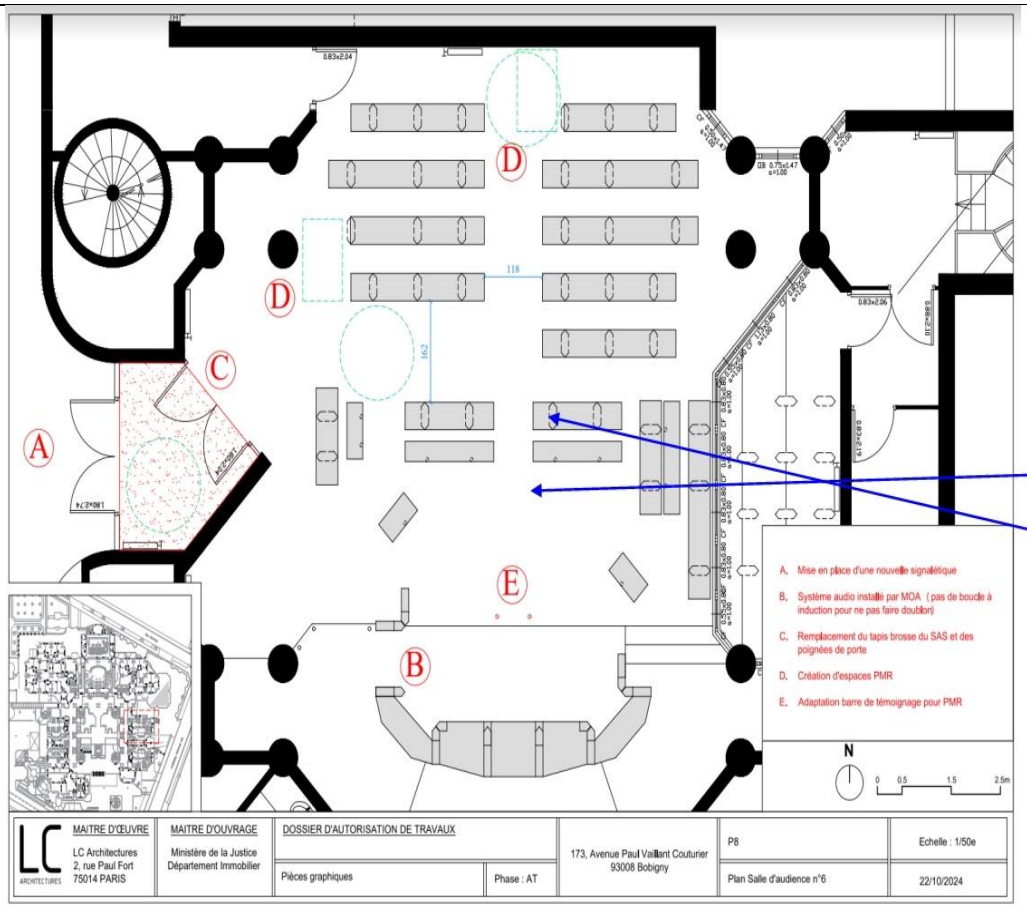
P06 - Moquette
Absence d'amiante

P07 - Béton banc
Absence d'amiante


P28 - Enduit à base de ciment
Absence d'amiante
P29 - Enduit à base de ciment
Absence d'amiante
P30 - Colle linoléum
Absence d'amiante
P31 - Joint d'assemblage
Absence d'amiante
P32 - Enduit à base de ciment
Absence d'amiante
A. Cheminement pour porte tiercée
B. Agrandissement du passage des portes pour UFR
C. Prolongement de la main courante
D. Création d'une main courante
E. Mise en place d'une bande podotactile
F. Mise en place boucle audio
N
0 0,5 1,5 2,5m
MAITRE D'ŒUVRE
LC Architectures
2, rue Paul Fort
75014 PARIS
MAITRE D'OUVRAGE
Ministère de la Justice
Département Immobilier
DOSSIER D'AUTORISATION DE TRAVAUX
Pièces graphiques
Phase : AT
173, Avenue Paul Vaillant Couturier
93008 Bobigny
P8
Plan Tribunal pour enfant
Echelle : 1/50e
22/10/2024

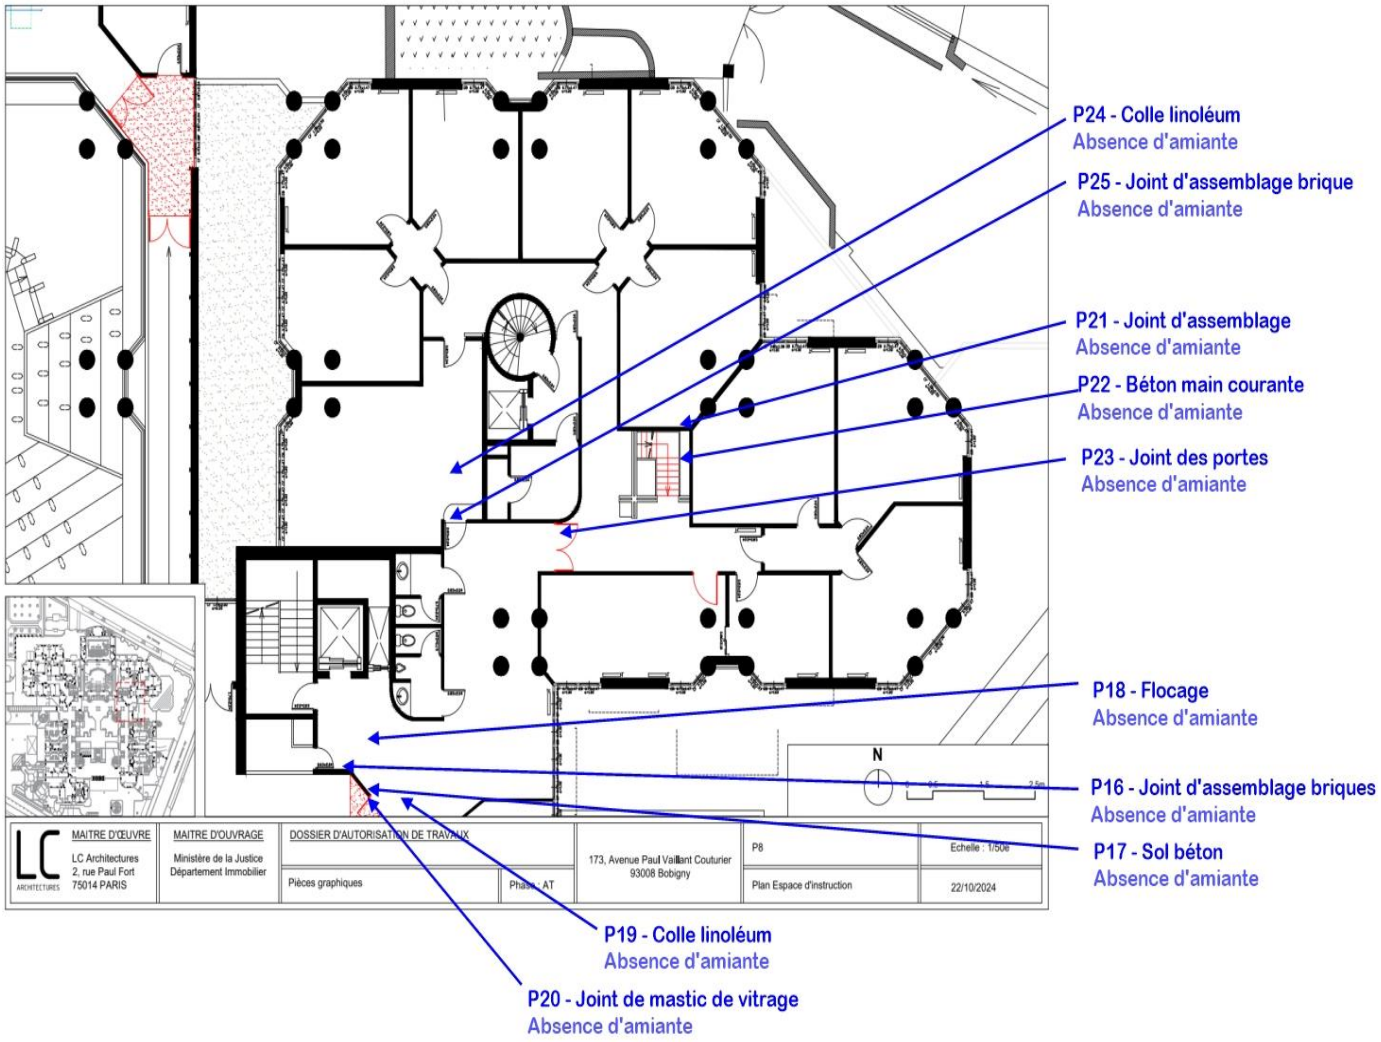

P10 - Colle de linoléum
Absence d'amiante
P11 - Enduit à base de ciment
Absence d'amiante
A. Mise en place d'une nouvelle signalétique
B. Mise en place d'une boucle audio
N
0 0,5 1,5 2,5m
MAITRE D'ŒUVRE
LC Architectures
2, rue Paul Fort
75014 PARIS
MAITRE D'OUVRAGE
Ministère de la Justice
Département Immobilier
DOSSIER D'AUTORISATION DE TRAVAUX
Pièces graphiques
Phase : AT
173, Avenue Paul Vaillant Couturier
93008 Bobigny
P8
Plan Salle d'audience n°9
Echelle : 1/50e
22/10/2024

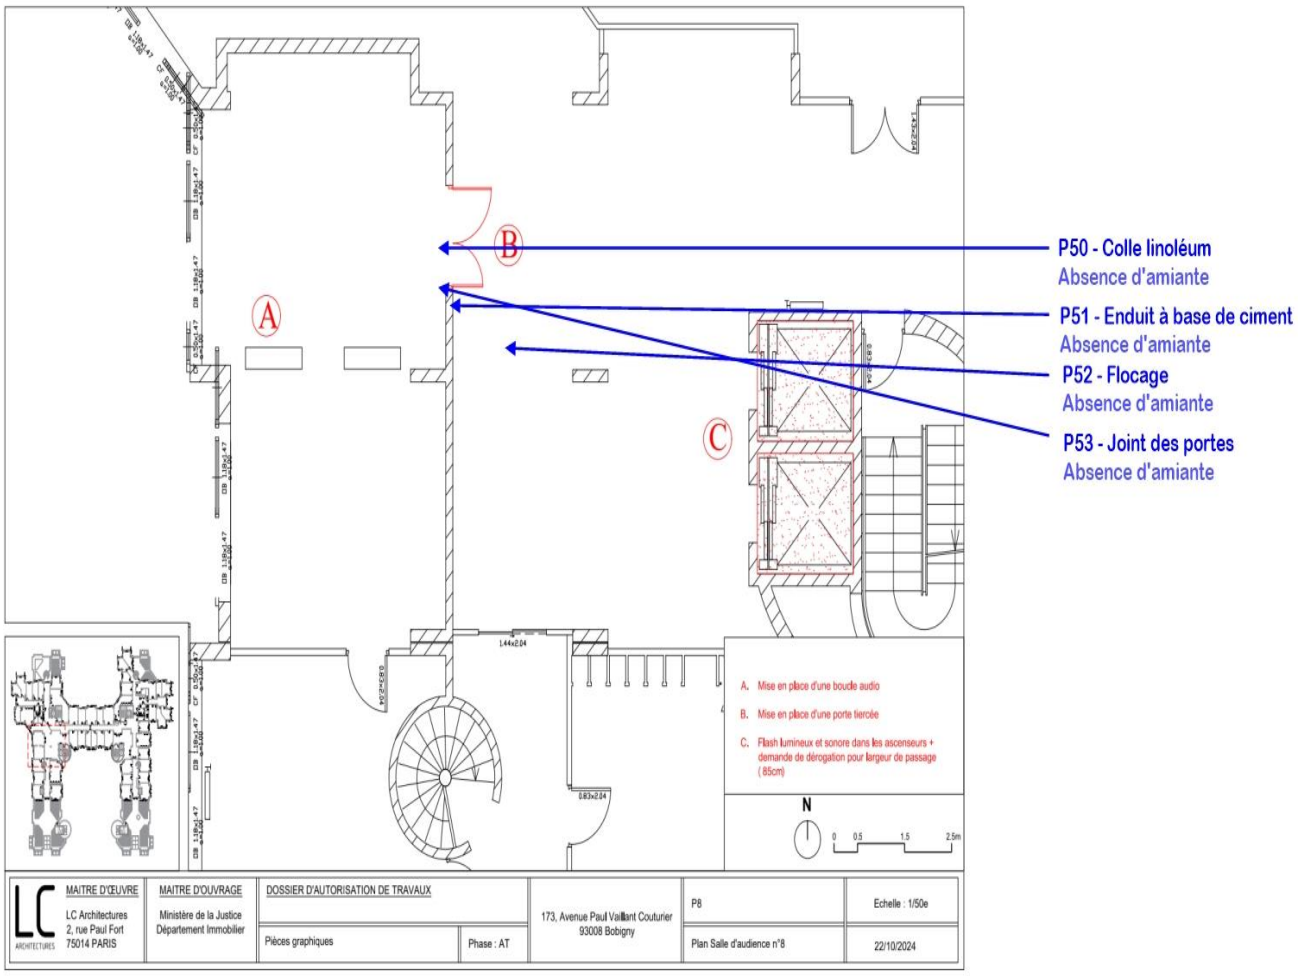

B
E
A
C
D
D
P12 - Colle linoléum
Absence d'amiante
P13 - Appuie béton banc
Absence d'amiante
A. Mise en place d'une nouvelle signalétique
B. Système audio installé par MOA (pas de boucle à induction pour ne pas faire doublon)
C. Remplacement du tapis brosse du SAS et des poignées de porte
D. Création d'espaces PMR
E. Adaptation barre de témoignage pour PMR (en option)
N
0 0.5 1.5 2.5m
MAITRE D'ŒUVRE
LC Architectures
2, rue Paul Fort
75014 PARIS
MAITRE D'OUVRAGE
Ministère de la Justice
Département Immobilier
DOSSIER D'AUTORISATION DE TRAVAUX
Pièces graphiques
Phase : AT
173, Avenue Paul Vaillant Couturier
93008 Bobigny
P8
Plan Salle d'audience n°5
Echelle : 1/50e
22/10/2024

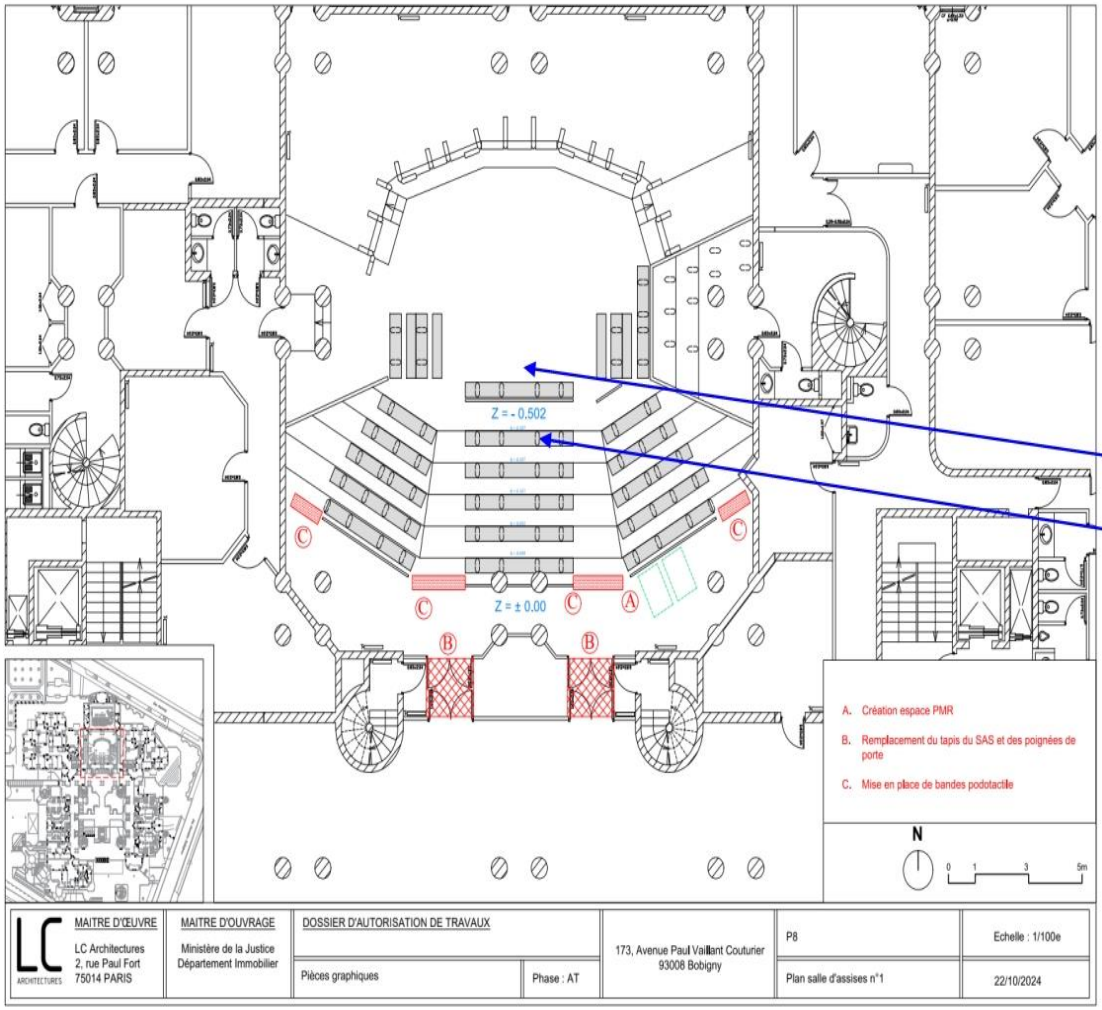


P14 - Colle linoléum
Absence d'amiante

P15 - Appuie béton banc
Absence d'amiante

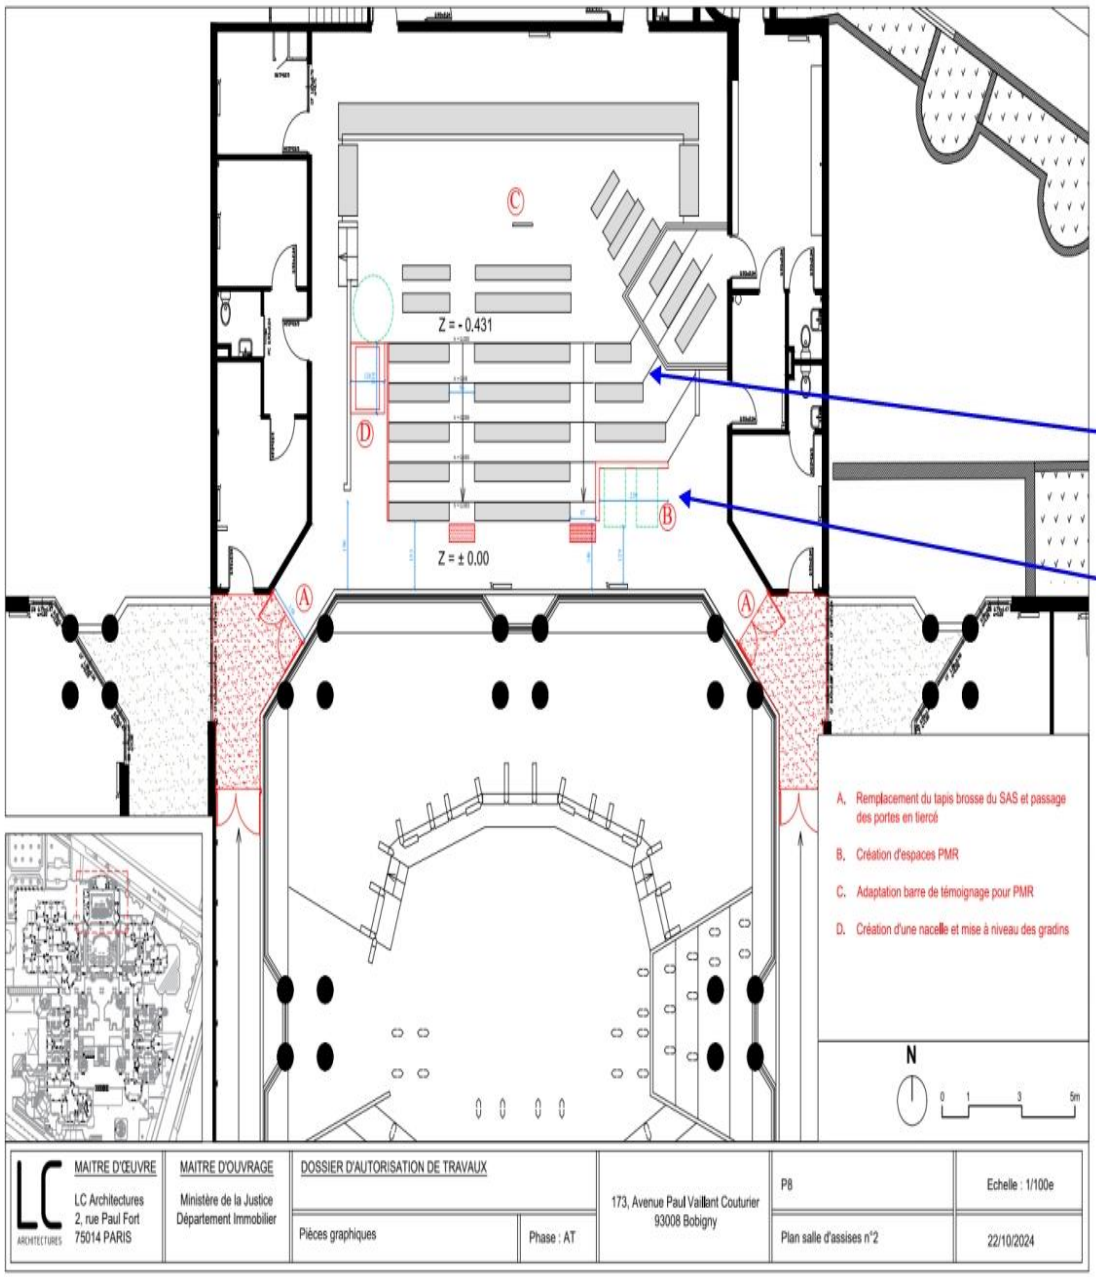

P24 - Colle linoléum
Absence d'amiante
P25 - Joint d'assemblage brique
Absence d'amiante
P21 - Joint d'assemblage
Absence d'amiante
P22 - Béton main courante
Absence d'amiante
P23 - Joint des portes
Absence d'amiante
P18 - Flocage
Absence d'amiante
P16 - Joint d'assemblage briques
Absence d'amiante
P17 - Sol béton
Absence d'amiante
P19 - Colle linoléum
Absence d'amiante
P20 - Joint de mastic de vitrage
Absence d'amiante
N
MAITRE D'ŒUVRE
LC Architectures
2, rue Paul Fort
75014 PARIS
MAITRE D'OUVRAGE
Ministère de la Justice
Département Immobilier
DOSSIER D'AUTORISATION DE TRAVAUX
Pièces graphiques
173, Avenue Paul Vaillant Couturier
93008 Bobigny
P8
Plan Espace d'instruction
Echelle : 1/50e
22/10/2024


P50 - Colle linoléum
Absence d'amiante
P51 - Enduit à base de ciment
Absence d'amiante
P52 - Flocage
Absence d'amiante
P53 - Joint des portes
Absence d'amiante
A
B
C
A. Mise en place d'une boucle audio
B. Mise en place d'une porte tiercée
C. Flash lumineux et sonore dans les ascenseurs + demande de dérogation pour largeur de passage (85cm)
N
0 0.5 1.5 2.5m
MAITRE D'ŒUVRE
LC Architectures
2, rue Paul Fort
75014 PARIS
MAITRE D'OUVRAGE
Ministère de la Justice
Département Immobilier
DOSSIER D'AUTORISATION DE TRAVAUX
Pièces graphiques
Phase : AT
173, Avenue Paul Vaillant Couturier
93008 Bobigny
P8
Plan Salle d'audience n°8
Echelle : 1/50e
22/10/2024



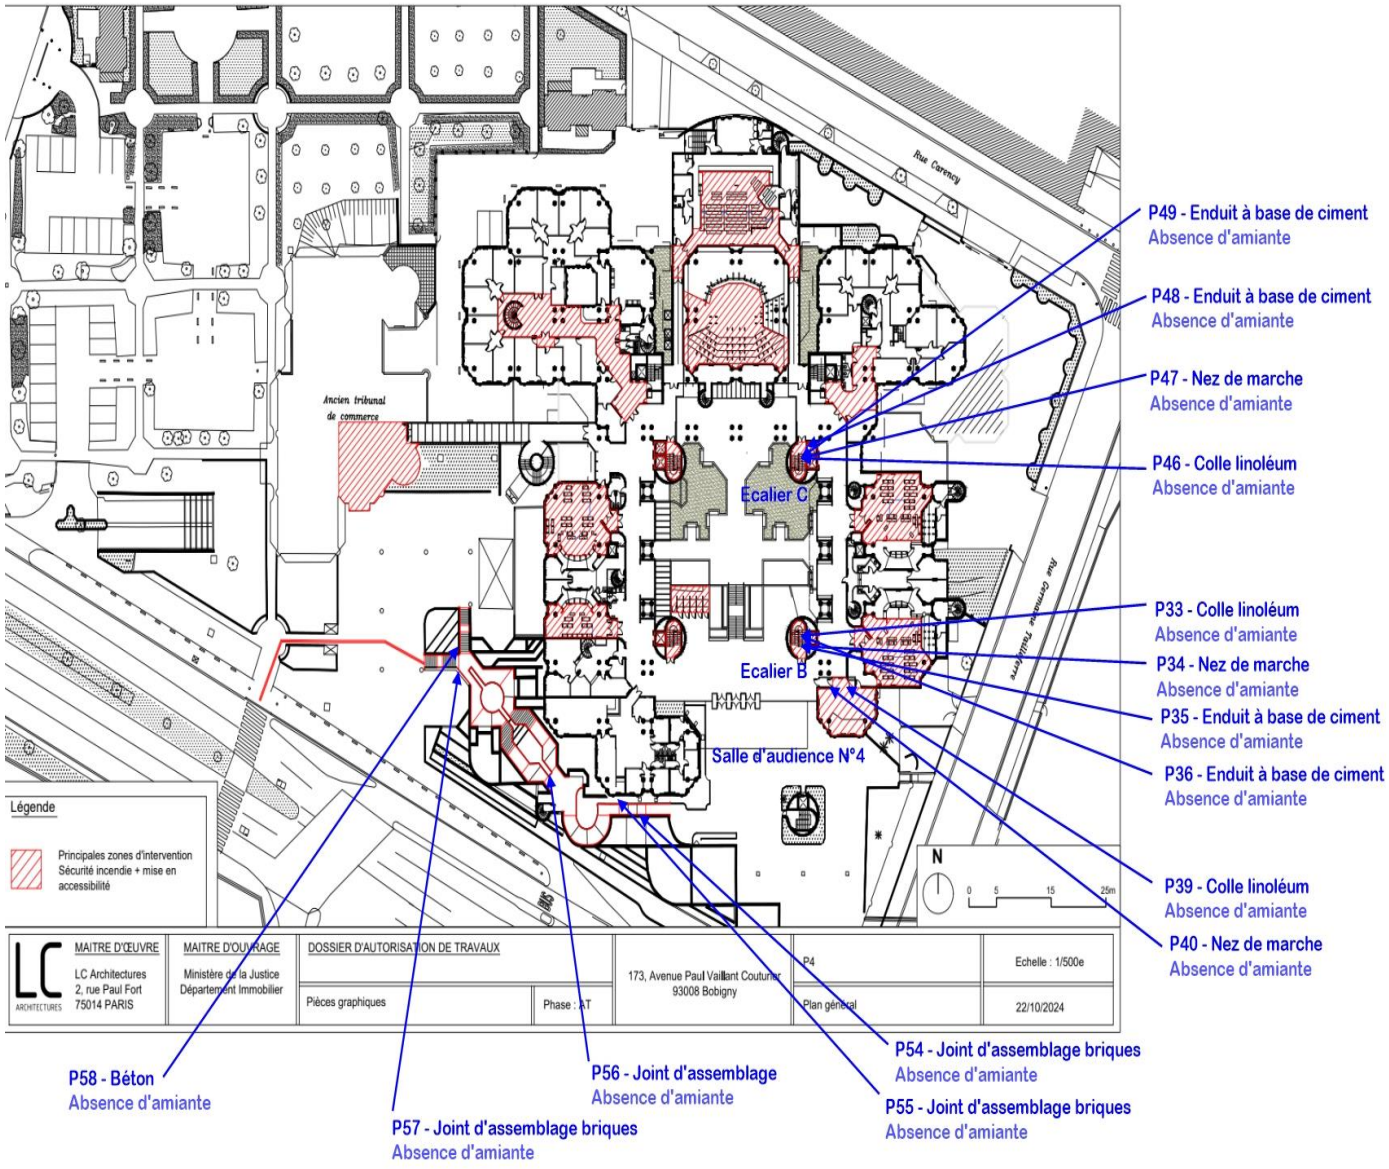
P37 - Colle linoléum
Absence d'amiante

P38 - Appuie béton banc
Absence d'amiante



P27 - Nez de marche
Absence d'amiante

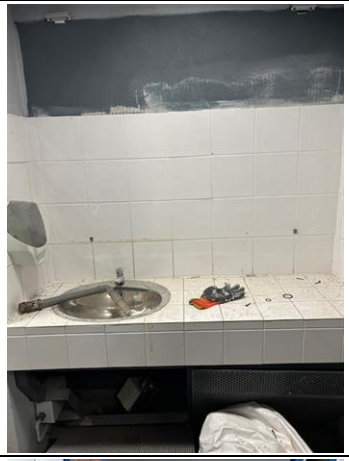
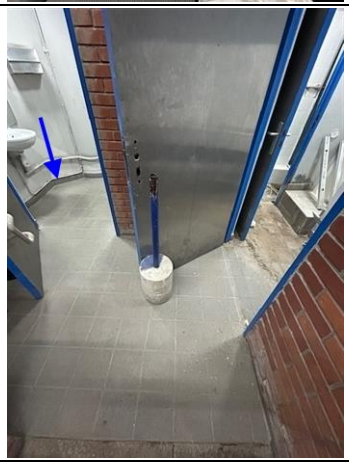
P26 - Colle linoléum
Absence d'amiante

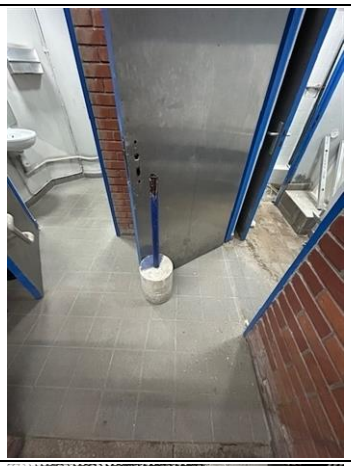
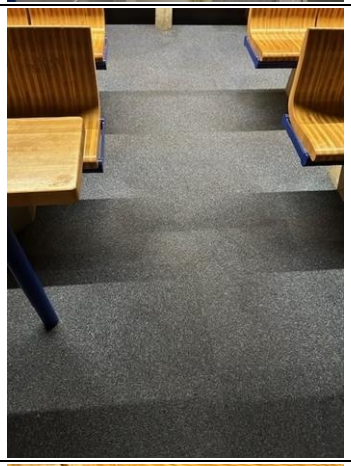


Légende

EN ROUGE : PRESENCE D'AMIANTE **EN BLEU : ABSENCE D'AMIANTE**	Nom du propriétaire **:** **MINISTÈRE DE LA JUSTICE - WARGNIER Quentin** Adresse du bien : **173 Avenue Paul Vaillant - Couturier 93000 BOBIGNY**

Photos

	Photo n° PhA001 Localisation : Niveau parvis - Sanitaire Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Joint d'assemblage Description : Joint d'assemblage briques Localisation sur croquis : M001
	Photo n° PhA002 Localisation : Niveau parvis - Sanitaire Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de faïence Description : Colle de faïence Localisation sur croquis : M002
	Photo n° PhA003 Localisation : Niveau parvis - Sanitaire Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de plinthe Description : Colle de plinthe Localisation sur croquis : M003

	Photo n° PhA004 Localisation : Niveau parvis - Sanitaire Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle de carrelage Description : Colle de carrelage Localisation sur croquis : M004
	Photo n° PhA005 Localisation : Niveau parvis - Sanitaire Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Description : Enduit à base de ciment Localisation sur croquis : M005
	Photo n° PhA006 Localisation : Niveau parvis - Salle d'audience N°2 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Moquette Description : Moquette Localisation sur croquis : M006
	Photo n° PhA007 Localisation : Niveau parvis - Salle d'audience N°2 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Béton banc Description : Béton banc Localisation sur croquis : M007

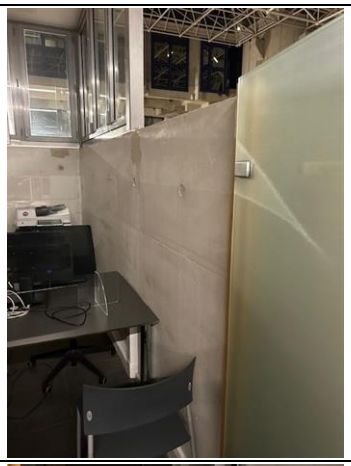
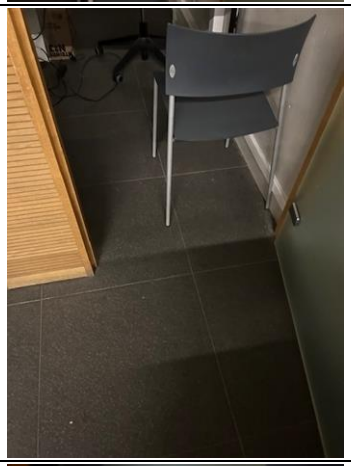
	Photo n° PhA008 Localisation : Niveau parvis - Espace de confidentialité Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Béton Description : Béton Localisation sur croquis : M008
	Photo n° PhA009 Localisation : Niveau parvis - Espace de confidentialité Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle de carrelage Description : Colle de carrelage Localisation sur croquis : M009
	Photo n° PhA010 Localisation : Niveau parvis - Salle d'audience N°9 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle de linoléum Description : Colle de linoléum Localisation sur croquis : M010
	Photo n° PhA011 Localisation : Niveau parvis - Salle d'audience N°9 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Enduit à base de ciment Description : Enduit à base de ciment lissé Localisation sur croquis : M011

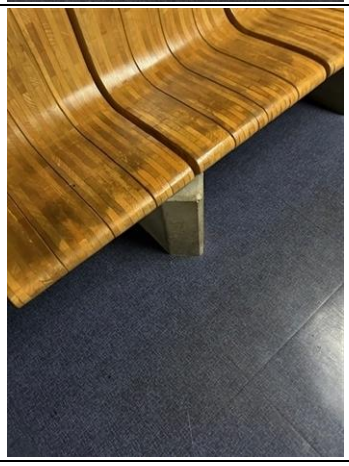
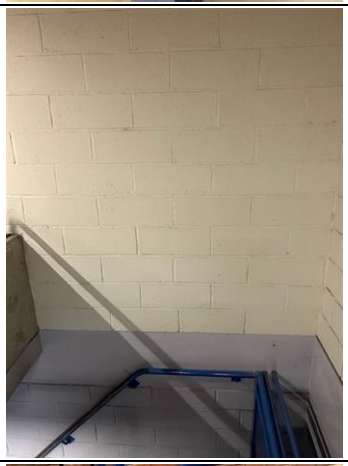
	Photo n° PhA012 Localisation : Niveau parvis - Salle d'audience N°5 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle linoléum Description : Colle linoléum Localisation sur croquis : M012
	Photo n° PhA013 Localisation : Niveau parvis - Salle d'audience N°5 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Appuie béton banc Description : Appuie béton banc Localisation sur croquis : M013
	Photo n° PhA014 Localisation : Niveau parvis - Salle d'audience N°6 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle linoléum Description : Colle linoléum Localisation sur croquis : M014
	Photo n° PhA015 Localisation : Niveau parvis - Salle d'audience N°6 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Appuie béton banc Description : Appuie béton banc Localisation sur croquis : M015

	Photo n° PhA016 Localisation : Niveau parvis - Instruction Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Joint d'assemblage Description : Joint d'assemblage briques Localisation sur croquis : M016
	Photo n° PhA017 Localisation : Niveau parvis - Instruction Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol béton Description : Sol béton Localisation sur croquis : M017
	Photo n° PhA018 Localisation : Niveau parvis - Instruction Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Flocage Description : Flocage Localisation sur croquis : M018
	Photo n° PhA019 Localisation : Niveau parvis - Instruction Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle linoléum Description : Colle linoléum Localisation sur croquis : M019

	Photo n° PhA020 Localisation : Niveau parvis - Instruction Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie d'ouvrage : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Description : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Localisation sur croquis : M020
	Photo n° PhA021 Localisation : Niveau parvis - Circulation instruction Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Joint d'assemblage Description : Joint d'assemblage Localisation sur croquis : M021
	Photo n° PhA022 Localisation : Niveau parvis - Circulation instruction Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Béton mais courante Description : Béton main courante Localisation sur croquis : M022
	Photo n° PhA023 Localisation : Niveau parvis - Circulation instruction Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques Partie d'ouvrage : Joint des portes Description : Joint des portes Localisation sur croquis : M023

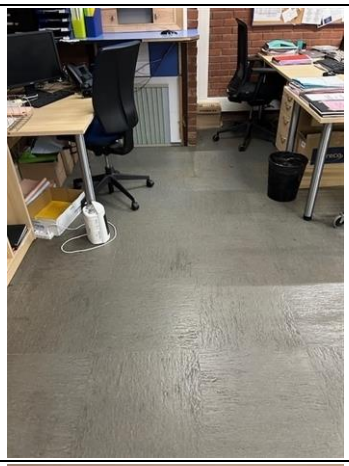
	Photo n° PhA024 Localisation : Niveau parvis - Accueil instruction Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle linoléum Description : Colle linoléum Localisation sur croquis : M024
	Photo n° PhA025 Localisation : Niveau parvis - Accueil instruction Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Joint d'assemblage Description : Joint d'assemblage brique Localisation sur croquis : M025
	Photo n° PhA026 Localisation : Niveau parvis - Salle d'assise N°2 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle linoléum Description : Colle linoléum Localisation sur croquis : M026
	Photo n° PhA027 Localisation : Niveau parvis - Salle d'assise N°2 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Nez de marche Description : Nez de marche Localisation sur croquis : M027

	Photo n° PhA028 Localisation : Niveau parvis - Tribunal d'enfant Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Enduit à base de ciment Description : Enduit à base de ciment Localisation sur croquis : M028
	Photo n° PhA029 Localisation : Niveau parvis - Tribunal d'enfant Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Enduit à base de ciment Description : Enduit à base de ciment Localisation sur croquis : M029
	Photo n° PhA030 Localisation : Niveau parvis - Tribunal d'enfant Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle linoléum Description : Colle linoléum Localisation sur croquis : M030
	Photo n° PhA031 Localisation : Niveau parvis - Tribunal d'enfant Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Joint d'assemblage Description : Joint d'assemblage Localisation sur croquis : M031

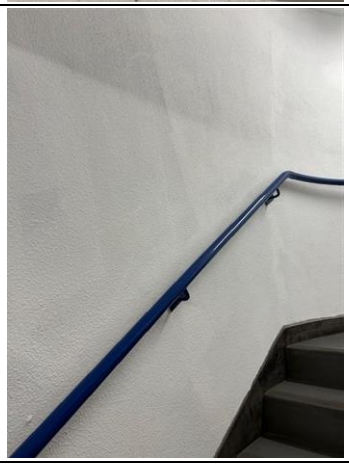
	Photo n° PhA032 Localisation : Niveau parvis - Tribunal d'enfant Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Enduit à base de ciment Description : Enduit à base de ciment Localisation sur croquis : M032
	Photo n° PhA033 Localisation : Niveau parvis - Escalier B Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle linoléum Description : Colle linoléum Localisation sur croquis : M033
	Photo n° PhA034 Localisation : Niveau parvis - Escalier B Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Nez de marche Description : Nez de marche Localisation sur croquis : M034
	Photo n° PhA035 Localisation : Niveau parvis - Escalier B Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Enduit à base de ciment Description : Enduit à base de ciment Localisation sur croquis : M035

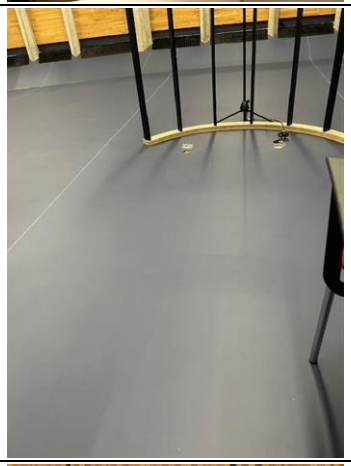
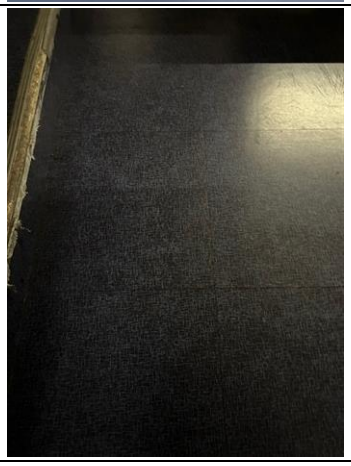
	Photo n° PhA036 Localisation : Niveau parvis - Escalier B Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Enduit à base de ciment Description : Enduit à base de ciment Localisation sur croquis : M036
	Photo n° PhA037 Localisation : Niveau pas perdu - Salle d'assise N°1 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle linoléum Description : Colle linoléum Localisation sur croquis : M037
	Photo n° PhA038 Localisation : Niveau pas perdu - Salle d'assise N°1 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Appuie béton banc Description : Appuie béton banc Localisation sur croquis : M038
	Photo n° PhA039 Localisation : Niveau pas perdu - Salle d'audience N°4 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle linoléum Description : Colle linoléum Localisation sur croquis : M039

	Photo n° PhA040 Localisation : Niveau pas perdu - Salle d'audience N°4 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Nez de marche Description : Nez de marche Localisation sur croquis : M040
	Photo n° PhA041 Localisation : Niveau pas perdu - Salle d'assise N°3 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle linoléum Description : Colle linoléum Localisation sur croquis : M041
	Photo n° PhA042 Localisation : Niveau pas perdu - Salle d'assise N°3 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Nez de marche Description : Nez de marche
	Photo n° PhA043 Localisation : Niveau pas perdu - Escalier régie Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle de carrelage Description : Colle de carrelage

	Photo n° PhA044 Localisation : Niveau parvis - Acceuil parvis Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sol béton Description : Sol béton Localisation sur croquis : M044
	Photo n° PhA045 Localisation : Niveau parvis - Acceuil parvis Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques Partie d'ouvrage : Joint des portes Description : Joint des portes Localisation sur croquis : M045
	Photo n° PhA046 Localisation : Niveau parvis - Escalier C Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle linoléum Description : Colle linoléum Localisation sur croquis : M046
	Photo n° PhA047 Localisation : Niveau parvis - Escalier C Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Nez de marche Description : Nez de marche Localisation sur croquis : M047

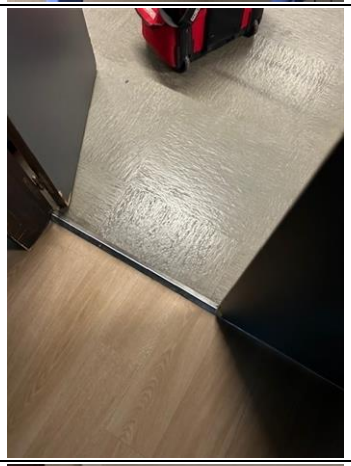
	Photo n° PhA048 Localisation : Niveau parvis - Escalier C Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Enduit à base de ciment Description : Enduit à base de ciment Localisation sur croquis : M048
	Photo n° PhA049 Localisation : Niveau parvis - Escalier C Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Enduit à base de ciment Description : Enduit à base de ciment Localisation sur croquis : M049
	Photo n° PhA050 Localisation : 3ème étage - Salle d'audience N°8 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle linoléum Description : Colle linoléum Localisation sur croquis : M050
	Photo n° PhA051 Localisation : 3ème étage - Salle d'audience N°8 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Enduit à base de ciment Description : Enduit à base de ciment Localisation sur croquis : M051

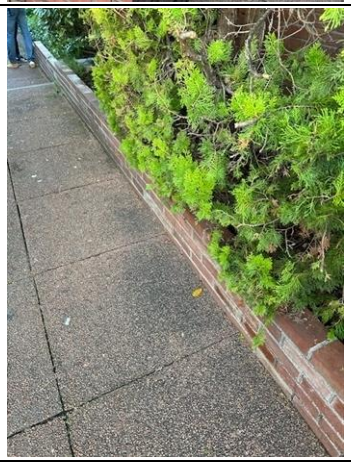









	Photo n° PhA052 Localisation : 3ème étage - Salle d'audience N°8 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Flocage Description : Flocage Localisation sur croquis : M052
	Photo n° PhA053 Localisation : 3ème étage - Salle d'audience N°8 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques Partie d'ouvrage : Joint des portes Description : Joint des portes Localisation sur croquis : M053
	Photo n° PhA054 Localisation : Extérieur parvis - Escalier Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich Partie d'ouvrage : Joint d'assemblage briques Description : Joint d'assemblage briques Localisation sur croquis : M054
	Photo n° PhA055 Localisation : Extérieur parvis - Escalier Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich Partie d'ouvrage : Joint d'assemblage briques Description : Joint d'assemblage briques Localisation sur croquis : M055




	Photo n° PhA056 Localisation : Extérieur parvis - Escalier Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich Partie d'ouvrage : Joint d'assemblage Description : Joint d'assemblage Localisation sur croquis : M056
	Photo n° PhA057 Localisation : Extérieur parvis - Escalier Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich Partie d'ouvrage : Joint d'assemblage briques Description : Joint d'assemblage briques Localisation sur croquis : M057
	Photo n° PhA058 Localisation : Extérieur parvis - Escalier Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich Partie d'ouvrage : Béton Description : Béton Localisation sur croquis : M058



7.2 - Annexe - Rapports d'essais




Identification des échantillons prélevés :



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M001-P001	Niveau parvis - Sanitaire	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint d'assemblage	Joint d'assemblage briques **Analyse à réaliser:** Non connu	
M002-P002	Niveau parvis - Sanitaire	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence **Analyse à réaliser:** Non connu	
M003-P003	Niveau parvis - Sanitaire	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Colle de plinthe **Analyse à réaliser:** Non connu	
M004-P004	Niveau parvis - Sanitaire	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage **Analyse à réaliser:** Non connu	
M005-P005	Niveau parvis - Sanitaire	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment **Analyse à réaliser:** Non connu	




Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M006-P006	Niveau parvis - Salle d'audience N°2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Moquette	Moquette **Analyse à réaliser:** Non connu	
M007-P007	Niveau parvis - Salle d'audience N°2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Béton banc	Béton banc **Analyse à réaliser:** Non connu	
M008-P008	Niveau parvis - Espace de confidentialité	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Béton	Béton **Analyse à réaliser:** Non connu	
M009-P009	Niveau parvis - Espace de confidentialité	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage **Analyse à réaliser:** Non connu	
M010-P010	Niveau parvis - Salle d'audience N°9	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de linoléum	Colle de linoléum **Analyse à réaliser:** Non connu	
M011-P011	Niveau parvis - Salle d'audience N°9	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment	Enduit à base de ciment lissé **Analyse à réaliser:** Non connu	



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M012-P012	Niveau parvis - Salle d'audience N°5	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle linoléum	Colle linoléum **Analyse à réaliser:** Non connu	
M013-P013	Niveau parvis - Salle d'audience N°5	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Appuie béton banc	Appuie béton banc **Analyse à réaliser:** Non connu	
M014-P014	Niveau parvis - Salle d'audience N°6	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle linoléum	Colle linoléum **Analyse à réaliser:** Non connu	
M015-P015	Niveau parvis - Salle d'audience N°6	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Appuie béton banc	Appuie béton banc **Analyse à réaliser:** Non connu	
M016-P016	Niveau parvis - Instruction	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint d'assemblage	Joint d'assemblage briques **Analyse à réaliser:** Non connu	
M017-P017	Niveau parvis - Instruction	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol béton	Sol béton **Analyse à réaliser:** Non connu	




Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M018-P018	Niveau parvis - Instruction	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Flocage	Flocage **Analyse à réaliser:** Non connu	
M019-P019	Niveau parvis - Instruction	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle linoléum	Colle linoléum **Analyse à réaliser:** Non connu	
M020-P020	Niveau parvis - Instruction	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) **Analyse à réaliser:** Non connu	
M021-P021	Niveau parvis - Circulation instruction	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint d'assemblage	Joint d'assemblage **Analyse à réaliser:** Non connu	
M022-P022	Niveau parvis - Circulation instruction	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Béton mais courante	Béton main courante **Analyse à réaliser:** Non connu	
M023-P023	Niveau parvis - Circulation instruction	3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joint des portes	Joint des portes **Analyse à réaliser:** Non connu	


Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M024-P024	Niveau parvis - Accueil instruction	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle linoléum	Colle linoléum **Analyse à réaliser:** Non connu	
M025-P025	Niveau parvis - Accueil instruction	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint d'assemblage	Joint d'assemblage brique **Analyse à réaliser:** Non connu	
M026-P026	Niveau parvis - Salle d'assise N°2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle linoléum	Colle linoléum **Analyse à réaliser:** Non connu	
M027-P027	Niveau parvis - Salle d'assise N°2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Nez de marche	Nez de marche **Analyse à réaliser:** Non connu	
M028-P028	Niveau parvis - Tribunal d'enfant	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment	Enduit à base de ciment **Analyse à réaliser:** Non connu	
M029-P029	Niveau parvis - Tribunal d'enfant	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment	Enduit à base de ciment **Analyse à réaliser:** Non connu	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M030-P030	Niveau parvis - Tribunal d'enfant	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle linoléum	Colle linoléum **Analyse à réaliser:** Non connu	
M031-P031	Niveau parvis - Tribunal d'enfant	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint d'assemblage	Joint d'assemblage **Analyse à réaliser:** Non connu	
M032-P032	Niveau parvis - Tribunal d'enfant	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment	Enduit à base de ciment **Analyse à réaliser:** Non connu	
M033-P033	Niveau parvis - Escalier B	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle linoléum	Colle linoléum **Analyse à réaliser:** Non connu	
M034-P034	Niveau parvis - Escalier B	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Nez de marche	Nez de marche **Analyse à réaliser:** Non connu	
M035-P035	Niveau parvis - Escalier B	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment	Enduit à base de ciment **Analyse à réaliser:** Non connu	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M036-P036	Niveau parvis - Escalier B	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment	Enduit à base de ciment **Analyse à réaliser:** Non connu	
M037-P037	Niveau pas perdu - Salle d'assise N°1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle linoléum	Colle linoléum **Analyse à réaliser:** Non connu	
M038-P038	Niveau pas perdu - Salle d'assise N°1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Appuie béton banc	Appuie béton banc **Analyse à réaliser:** Non connu	
M039-P039	Niveau pas perdu - Salle d'audience N°4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle linoléum	Colle linoléum **Analyse à réaliser:** Non connu	
M040-P040	Niveau pas perdu - Salle d'audience N°4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Nez de marche	Nez de marche **Analyse à réaliser:** Non connu	
M041-P041	Niveau pas perdu - Salle d'assise N°3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle linoléum	Colle linoléum **Analyse à réaliser:** Non connu	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M042-P042	Niveau pas perdu - Salle d'assise N°3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Nez de marche	Nez de marche **Analyse à réaliser:** Non connu	
M043-P043	Niveau pas perdu - Escalier régie	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage **Analyse à réaliser:** Non connu	
M044-P044	Niveau parvis - Acceuil parvis	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol béton	Sol béton **Commentaires prélèvement:** Solbéton **Analyse à réaliser:** Non connu	
M045-P045	Niveau parvis - Acceuil parvis	3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joint des portes	Joint des portes **Analyse à réaliser:** Non connu	
M046-P046	Niveau parvis - Escalier C	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle linoléum	Colle linoléum **Analyse à réaliser:** Non connu	
M047-P047	Niveau parvis - Escalier C	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Nez de marche	Nez de marche **Analyse à réaliser:** Non connu	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M048-P048	Niveau parvis - Escalier C	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment	Enduit à base de ciment **Analyse à réaliser:** Non connu	
M049-P049	Niveau parvis - Escalier C	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment	Enduit à base de ciment **Analyse à réaliser:** Non connu	
M050-P050	3ème étage - Salle d'audience N°8	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle linoléum	Colle linoléum **Analyse à réaliser:** Non connu	
M051-P051	3ème étage - Salle d'audience N°8	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment	Enduit à base de ciment **Analyse à réaliser:** Non connu	
M052-P052	3ème étage - Salle d'audience N°8	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Flocage	Flocage **Analyse à réaliser:** Non connu	
M053-P053	3ème étage - Salle d'audience N°8	3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joint des portes	Joint des portes **Analyse à réaliser:** Non connu	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M054-P054	Extérieur parvis - Escalier	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Joint d'assemblage briques	Joint d'assemblage briques **Analyse à réaliser:** Non connu	
M055-P055	Extérieur parvis - Escalier	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Joint d'assemblage briques	Joint d'assemblage briques **Analyse à réaliser:** Non connu	
M056-P056	Extérieur parvis - Escalier	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Joint d'assemblage	Joint d'assemblage **Analyse à réaliser:** Non connu	
M057-P057	Extérieur parvis - Escalier	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Joint d'assemblage briques	Joint d'assemblage briques **Analyse à réaliser:** Non connu	
M058-P058	Extérieur parvis - Escalier	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Béton	Béton **Analyse à réaliser:** Non connu	

Copie des rapports d'essais :

LABORATOIRE CEAPIC AFEL

Détection et identification de l'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés

cofrac ESSAIS

Accréditation N° 1-5571
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Rapport d'essai : D24-19634 V0

Donneur d'ordre	CEED DD DIAG 88 avenue des Ternes 75017 Paris

Réf Affaire	WARGNIER/IMO/11685
Réf Dossier	WARGNIER/IMO/11685

Date de réception	25-10-2024
Date d'analyse	30-10-2024

Tout échantillon ayant un résultat rendu est considéré au préalable comme échantillon apte à être analysé. Toute non-conformité éventuelle détectée à la réception des échantillons est notifiée sur l'accusé de réception. Toute non-conformité éventuelle du descriptif client et/ou à la quantité d'échantillon est notifiée dans le rapport sous forme de réserves. L'analyse peut être effectuée selon les deux techniques MOLP et/ou META. Dans le cas d'essais non concluants par la technique MOLP, des essais complémentaires par META doivent être mis en œuvre par le laboratoire.

Technique MOLP : *L'analyse qualitative d'amiante par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) est réalisée selon la norme HSG 248 (Appendice 2), cette technique ne permet de détecter que des fibres optiquement observables de diamètre supérieur ou égal à 0.2µm. La limite de détection garantie par le laboratoire est 0,1% en masse pour tout résultat conclu par MOLP et uniquement pour les fibres optiquement observables. Dans le cas d'une analyse négative « Amiante non détecté » par cette méthode, la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de 0.1% de fibres d'amiante optiquement observables. Pour les produits et matériaux dans lesquels l'amiante a été ajouté délibérément et qui sont constitués exclusivement de fibres, deux analyses au MOLP doivent être effectuées pour conclure un résultat négatif, une Analyse complémentaire en META peut être effectuée en cas de doute ou d'information précisant un risque de contamination.*

Préparation META : *Pour les produits et matériaux dans lesquels l'amiante a été ajouté délibérément, au moins une préparation pour analyse META est effectuée par couche dissociable. Les composants décrits simultanément dans le même descriptif de couche n'ont pas pu être séparés physiquement lors de la préparation, ils sont considérés techniquement indissociables, leur préparation est effectué avec des quantités équivalentes. Les préparations sont effectuées selon la méthode interne du laboratoire.*

Analyse META : *L'analyse qualitative d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) est effectuée conformément aux parties utiles de la norme NFX 43-050 pour les produits et matériaux dans lesquels l'amiante a été ajouté délibérément. La limite de détection garantie par le laboratoire est de 0,1% en masse pour les couches ou les composants analysés individuellement et pour les couches indissociables préparées avec quantités équivalentes. Dans le cas d'une analyse négative « Amiante non détecté » par cette méthode, la couche ou le composant peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. L'analyse par META des produits et matériaux dans lesquels l'amiante a été ajouté délibérément doit être effectuée sur 2 grilles issues de la préparation de la couche ou composant pour conclure à l'absence d'amiante dans la couche ou composant.*

Le rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole (*) sont couverts par l'accréditation du (des) laboratoire(s) les ayant réalisés. Les prélèvements réalisés par le client sont sous sa tutelle, les données client (référence dossier et référence échantillon) sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.

Légende :
Nb E : Nombre d'essai
Nb S : Nombre de supports (lames MOLP ou grilles META)

Tr : Traitement
BS : Broyage au solvant
BH : Broyage à l'humide
AC : Attaque chimique

Document de référence :
Arrêté matériaux du 1er octobre 2019
HSG 248 Appendice 2
NF X43-050 Parties utiles
PT 008 et PT 011

Analystes	Validation	Date et lieu	Historique du rapport
META : YAH, OUJ	Yasmine HAMAIDI	Soisy, le 30/10/2024	V0 : Rapport d'essai initial

Détection et identification de l'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés

Rapport d'essai : D24-19634 V0

Données client			Données laboratoire (*)					
Réf éch	Description	Localisation	Réf éch	Descriptif couche	Tr	Technique, Nb E, Nb S	Résultat	Obs
M001-P001	Joint d'assemblage briques	Niveau parvis - Sanitaire	D24-19634-001	C1 : Joint Cimenteux Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M002-P002	Colle de faïence	Niveau parvis - Sanitaire	D24-19634-002	C1 : Colle Cimenteux Gris clair	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
				C2 : Matériau Plâtreux Blanc C3 : Peinture, , Gris clair	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
				C4 : Carrelage/Faïence (no prép) Dur Blanc	/	/, /, /	/	Oui
M003-P003	Colle de plinthe	Niveau parvis - Sanitaire	D24-19634-003	C1 : Colle Cimenteux Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
				C2 : Carrelage/Faïence (no prép) Dur Gris foncé, Noir	/	/, /, /	/	Oui
M004-P004	Colle de carrelage	Niveau parvis - Sanitaire	D24-19634-004	C1 : Colle Cimenteux Gris clair, Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
				C2 : Carrelage/Faïence (no prép) Dur Gris foncé, Noir	/	/, /, /	/	Oui
M005-P005	Enduit base de ciment	Niveau parvis - Sanitaire	D24-19634-005	C1 : Enduit peint Cimenteux Gris clair, Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M006-P006	Moquette	Niveau parvis - Salle d'audience N°2	D24-19634-006	C1 : Ragréage Cimenteux Marron, Gris foncé C2 : Colle, Souple, Marron	BS	META, 2, 4	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
M007-P007	Béton blanc	Niveau parvis - Salle d'audience N°2	D24-19634-007	C1 : Matériau Cimenteux Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M008-P008	Béton	Niveau parvis - Espace de confidentialité	D24-19634-008	C1 : Matériau Dur, Cimenteux Gris clair, Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/

M009-P009	Colle de carrelage	Niveau parvis - Espace de confidentialité	D24-19634-009	C1 : Colle Cimenteux Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
				C2 : Carrelage/Faïence (no prép) Dur Noir	/	/, /, /	/	Oui
M010-P010	Colle de lénolium	Niveau parvis - Salle d'audience N°9	D24-19634-010	C1 : Ragréage Cimenteux Marron, Gris foncé C2 : Colle, Souple, Marron	BS	META, 2, 4	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
M011-P011	Enduit base de ciment lissé	Niveau parvis - Salle d'audience N°9	D24-19634-011	C1 : Enduit peint Plâtreux Blanc, Jaune	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M012-P012	Colle linoléum	Niveau parvis - Salle d'audience N°5	D24-19634-012	C1 : Ragréage Cimenteux Gris foncé C2 : Colle, Souple, Translucide	BS	META, 2, 4	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
				C3 : Colle Souple Translucide C4 : Dalle, Souple, Bleu(e)	BS	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
M013-P013	Appuie béton blanc	Niveau parvis - Salle d'audience N°5	D24-19634-013	C1 : Matériau Cimenteux Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
M014-P014	Colle linoléum	Niveau parvis - Salle d'audience N°6	D24-19634-014	C1 : Colle Souple Marron C2 : Dalle, Souple, Bleu(e), Gris foncé	BS	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
M015-P015	Appuie béton blanc	Niveau parvis - Salle d'audience N°6	D24-19634-015	C1 : Béton Cimenteux Gris clair, Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M016-P016	Joint d'assemblage briques	Niveau parvis - Instruction	D24-19634-016	C1 : Joint Cimenteux, Fibreux Gris clair, Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
M017-P017	Sol béton	Niveau parvis - Instruction	D24-19634-017	C1 : Béton Cimenteux Gris clair, Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M018-P018	Flocage	Niveau parvis - Instruction	D24-19634-018	C1 : Flocage Fibreux Gris clair	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M019-P019	Colle linoléum	Niveau parvis - Instruction	D24-19634-019	C1 : Ragréage Cimenteux Gris foncé C2 : Colle, Souple, Marron	BS	META, 2, 4	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
				C3 : Colle Souple Marron C4 : Dalle, Souple, Marron	BS	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
M020-P020	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Niveau parvis - Instruction	D24-19634-020	C1 : Mastic Souple Noir	BS	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M021-P021	Joint d'assemblage	Niveau parvis - Circulation instruction	D24-19634-021	C1 : Joint Cimenteux Gris clair, Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/

M022-P022	Béton main courante	Niveau parvis - Circulation instruction	D24-19634-022	C1 : Matériau Cimenteux Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
M023-P023	Joint des portes	Niveau parvis - Circulation instruction	D24-19634-023	C1 : Joint Souple Bleu(e), Gris foncé	BS	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M024-P024	Colle linoléum	Niveau parvis - Accueil instruction	D24-19634-024	C1 : Ragréage Cimenteux Marron, Gris foncé C2 : Colle, Souple, Marron	BS	META, 2, 4	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
				C3 : Colle Souple Marron C4 : Matériau, Souple, Gris foncé	BS	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
M025-P025	Joint d'assemblage briques	Niveau parvis - Accueil instruction	D24-19634-025	C1 : Joint Cimenteux Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M026-P026	Colle linoléum	Niveau parvis - Salle d'assise n°2	D24-19634-026	C1 : Dalle Souple Rouge	BS	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M027-P027	Nez de marche	Niveau parvis - Salle d'assise n°2	D24-19634-027	C1 : Dalle Thermoplastique Rouge	BS	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
				C2 : Matériau Fibreux Beige	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M028-P028	Enduit base de ciment	Niveau parvis - Tibunal d'enfant	D24-19634-028	C1 : Enduit peint Cimenteux Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
M029-P029	Enduit base de ciment	Niveau parvis - Tibunal d'enfant	D24-19634-029	C1 : Colle Souple Beige C2 : Matériau, Cimenteux, Gris foncé		META, 2, 4	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
M030-P030	Colle linoléum	Niveau parvis - Tibunal d'enfant	D24-19634-030	C1 : Enduit peint Cimenteux Gris clair	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
M031-P031	Joint d'assemblage	Niveau parvis - Tibunal d'enfant	D24-19634-031	C1 : Joint Dur Blanc, Gris clair	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
M032-P032	Enduit base de ciment	Niveau parvis - Tibunal d'enfant	D24-19634-032	C1 : Enduit peint Cimenteux Gris foncé C2 : Matériau, Fibreux, Beige	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
M033-P033	Colle linoléum	Niveau parvis - Escalier B	D24-19634-033	C1 : Colle Souple Gris clair	BS	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
				C2 : Ragréage Cimenteux Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M034-P034	Nez de marche	Niveau parvis - Escalier B	D24-19634-034	C1 : Dalle Souple Beige, Gris foncé	BS	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M035-P035	Enduit base de ciment	Niveau parvis - Escalier B	D24-19634-035	C1 : Enduit peint Cimenteux Beige	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M036-P036	Enduit base de ciment	Niveau parvis - Escalier B	D24-19634-036	C1 : Enduit peint Cimenteux Beige, Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M037-P037	Colle linoléum	Niveau pas perdu - Salle d'assise n°1	D24-19634-037	C1 : Dalle Souple Gris foncé C2 : Matériau, Fibreux, Beige	BS	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui

M038-P038	Appuie béton blanc	Niveau pas perdu - Salle d'assise n°1	D24-19634-038	C1 : Matériau Cimenteux Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M039-P039	Colle linoléum	Niveau pas perdu - Salle d'audience n°4	D24-19634-039	C1 : Dalle Souple Gris foncé	BS	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
				C2 : Matériau Cimenteux Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M040-P040	Nez de marche	Niveau pas perdu - Salle d'audience n°4	D24-19634-040	C1 : Colle Souple Beige C2 : Ragréage, Cimenteux, Gris foncé		META, 2, 4	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
M041-P041	Colle linoléum	Niveau pas perdu - Salle d'assise n°3	D24-19634-041	C1 : Dalle Souple Beige, Gris foncé	BS	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
				C2 : Matériau Cimenteux Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M042-P042	Nez de marche	Niveau pas perdu - Salle d'assise n°3	D24-19634-042	C1 : Dalle Souple Gris clair	BS	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
				C2 : Matériau Cimenteux Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M043-P043	Colle de carrelage	Niveau pas perdu - Escalier régie	D24-19634-043	C1 : Colle Cimenteux Gris clair	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
				C2 : Carrelage/Faïence (no prép) Dur Gris clair	/	/, /, /	/	Oui
M044-P044	Sol béton	Niveau parvis - Accueil parvis	D24-19634-044	C1 : Matériau Cimenteux Gris clair	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M045-P045	Joint des portes	Niveau parvis - Accueil parvis	D24-19634-045	C1 : Joint Souple Noir	BS	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
				C2 : Matériau Cimenteux Beige, Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M046-P046	Colle linoléum	Niveau parvis - Escalier C	D24-19634-046	C1 : Dalle Souple Gris foncé	BS	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
				C2 : Colle Souple Beige	BS	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
				C3 : Ragréage Cimenteux Gris clair	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M047-P047	Nez de marche	Niveau parvis - Escalier C	D24-19634-047	C1 : Dalle Souple Gris foncé	BS	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M048-P048	Enduit base ciment	Niveau parvis - Escalier C	D24-19634-048	C1 : Enduit peint Cimenteux Beige	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui
M049-P049	Enduit base ciment	Niveau parvis - Escalier C	D24-19634-049	C1 : Enduit peint Cimenteux Beige	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M050-P050	Colle linoléum	3ème étage - Salle d'audience n°8	D24-19634-050	C1 : Dalle Souple Beige, Marron	BS	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M051-P051	Enduit base de ciment	3ème étage - Salle d'audience n°8	D24-19634-051	C1 : Enduit peint Cimenteux Noir	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M052-P052	Flocage	3ème étage - Salle d'audience n°8	D24-19634-052	C1 : Matériau Souple Blanc	BS	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	Oui

M053-P053	Joint des portes	3ème étage - Salle d'audience n°8	D24-19634-053	C1 : Joint Souple Beige	BS	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M054-P054	Joint d'assemblage briques	Extérieur parvis - Escalier	D24-19634-054	C1 : Joint Souple Noir	BS	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M055-P055	Joint d'assemblage briques	Extérieur parvis - Escalier	D24-19634-055	C1 : Matériau Cimenteux Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M056-P056	Joint d'assemblage	Extérieur parvis - Escalier	D24-19634-056	C1 : Matériau Cimenteux Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M057-P057	Joint d'assemblage briques	Extérieur parvis - Escalier	D24-19634-057	C1 : Matériau Cimenteux Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
M058-P058	Béton	Extérieur parvis - Escalier	D24-19634-058	C1 : Matériau Cimenteux Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/

Réf éch.	Couche	Réserves ou Observations
D24-19634-002	C2 : Matériau Plâtreux Blanc C3 : Peinture, , Gris clair	Examen préalable : Prise d'essai ne permet pas de dissocier strictement les couches
	C4 : Carrelage/Faïence (no prép) Dur Blanc	Examen préalable : Incorporation d'amiante non connu dans ce matériau Non préparé - Incorporation d'amiante non connu dans ce matériau
D24-19634-003	C2 : Carrelage/Faïence (no prép) Dur Gris foncé, Noir	Examen préalable : Incorporation d'amiante non connu dans ce matériau Non préparé - Incorporation d'amiante non connu dans ce matériau
D24-19634-004	C2 : Carrelage/Faïence (no prép) Dur Gris foncé, Noir	Examen préalable : Incorporation d'amiante non connu dans ce matériau Non préparé - Incorporation d'amiante non connu dans ce matériau
D24-19634-006	C1 : Ragréage Cimenteux Marron, Gris foncé C2 : Colle, Souple, Marron	Examen préalable : Prise d'essai ne permet pas de dissocier strictement les couches
D24-19634-009	C1 : Colle Cimenteux Gris foncé	Examen préalable : Quantité de matière insuffisante pour une re-préparation en cas de besoin.
	C2 : Carrelage/Faïence (no prép) Dur Noir	Examen préalable : Incorporation d'amiante non connu dans ce matériau Non préparé - Incorporation d'amiante non connu dans ce matériau
D24-19634-010	C1 : Ragréage Cimenteux Marron, Gris foncé C2 : Colle, Souple, Marron	Examen préalable : Prise d'essai ne permet pas de dissocier strictement les couches
D24-19634-012	C1 : Ragréage Cimenteux Gris foncé C2 : Colle, Souple, Translucide	Examen préalable : Prise d'essai ne permet pas de dissocier strictement les couches
	C3 : Colle Souple Translucide C4 : Dalle, Souple, Bleu(e)	Examen préalable : Prise d'essai ne permet pas de dissocier strictement les couches
D24-19634-013	C1 : Matériau Cimenteux Gris foncé	Examen préalable : Quantité de matière insuffisante pour une re-préparation en cas de besoin.
D24-19634-014	C1 : Colle Souple Marron C2 : Dalle, Souple, Bleu(e), Gris foncé	Examen préalable : Prise d'essai ne permet pas de dissocier strictement les couches
D24-19634-016	C1 : Joint Cimenteux, Fibreux Gris clair, Gris foncé	Examen préalable : Quantité de matière insuffisante pour une re-préparation en cas de besoin.

D24-19634-019	C1 : Ragréage Cimenteux Gris foncé C2 : Colle, Souple, Marron	Examen préalable : Prise d'essai ne permet pas de dissocier strictement les couches
	C3 : Colle Souple Marron C4 : Dalle, Souple, Marron	Examen préalable : Prise d'essai ne permet pas de dissocier strictement les couches
D24-19634-022	C1 : Matériau Cimenteux Gris foncé	Examen préalable : Quantité de matière insuffisante pour une re-préparation en cas de besoin.
D24-19634-024	C1 : Ragréage Cimenteux Marron, Gris foncé C2 : Colle, Souple, Marron	Examen préalable : Prise d'essai ne permet pas de dissocier strictement les couches
	C3 : Colle Souple Marron C4 : Matériau, Souple, Gris foncé	Examen préalable : Prise d'essai ne permet pas de dissocier strictement les couches
D24-19634-028	C1 : Enduit peint Cimenteux Gris foncé	Examen préalable : Quantité de matière insuffisante pour une re-préparation en cas de besoin.
D24-19634-029	C1 : Colle Souple Beige C2 : Matériau, Cimenteux, Gris foncé	Examen préalable : Prise d'essai ne permet pas de dissocier strictement les couches La description faite par le client ne coïncide pas avec l'observation du matériau lors de l'examen préalable.
D24-19634-030	C1 : Enduit peint Cimenteux Gris clair	Examen préalable : La description faite par le client ne coïncide pas avec l'observation du matériau lors de l'examen préalable.
D24-19634-031	C1 : Joint Dur Blanc, Gris clair	Examen préalable : Quantité de matière insuffisante pour une re-préparation en cas de besoin.
D24-19634-032	C1 : Enduit peint Cimenteux Gris foncé C2 : Matériau, Fibreux, Beige	Examen préalable : Prise d'essai ne permet pas de dissocier strictement les couches
D24-19634-037	C1 : Dalle Souple Gris foncé C2 : Matériau, Fibreux, Beige	Examen préalable : Prise d'essai ne permet pas de dissocier strictement les couches
D24-19634-040	C1 : Colle Souple Beige C2 : Ragréage, Cimenteux, Gris foncé	Examen préalable : Prise d'essai ne permet pas de dissocier strictement les couches
D24-19634-043	C1 : Colle Cimenteux Gris clair	Examen préalable : Quantité de matière insuffisante pour une re-préparation en cas de besoin.
	C2 : Carrelage/Faïence (no prép) Dur Gris clair	Examen préalable : Incorporation d'amiante non connu dans ce matériau Non préparé - Incorporation d'amiante non connu dans ce matériau
D24-19634-048	C1 : Enduit peint Cimenteux Beige	Examen préalable : Quantité de matière insuffisante pour une re-préparation en cas de besoin.
D24-19634-052	C1 : Matériau Souple Blanc	Examen préalable : Quantité de matière insuffisante pour une re-préparation en cas de besoin.

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation	Identifiant + Description	Etat de conservation	Mesures d'ordre générales préconisées
Néant	-		

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entrainer à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entrainer à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entrainer rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :
- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc…) selon que les risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc…

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conservation et transmission de ce rapport (Article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019)

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :
Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.
Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.
Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.
Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :
I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.
II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
   a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
   b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
   a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
   c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
   d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.
   Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
   a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante.
   Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
   b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
   c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
   d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
   En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.6 - Annexe - Autres documents

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible

ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° **WARGNIER/IMO/11685** relatif à l'immeuble bâti visité situé au : 173 Avenue Paul Vaillant - Couturier 93000 BOBIGNY.

Je soussigné, **DUMRUK Pascal**, technicien diagnostiqueur pour la société **CEED DD DIAG** atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :


- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences :

Prestations	Nom du diagnostiqueur	Entreprise de certification	N° Certification	Echéance certif
Audit Energetique	DUMRUK Pascal	LA CERTIFICATION DE PERSONNES	1572	20/03/2030 (Date d'obtention : 21/03/2023)

- Avoir souscrit à une assurance (AXA n° 10772085104 valable jusqu'au 01/03/2025) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.
-

Fait à **BOBIGNY**, le **23/10/2024**

Signature de l'opérateur de diagnostics :



Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation
« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation
« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »

LCP CERTIFICATION DE PERSONNES

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N°1572

Monsieur DUMRUK Pascal

Amiante sans mention Selon arrêté du 24 Décembre 2021	**Amiante** Date d'effet : 21/03/2023 : - Date d'expiration : 20/03/2030
Amiante avec mention Selon arrêté du 24 Décembre 2021	**Missions spécifiques, bâtiments complexes** Date d'effet : 21/03/2023 : - Date d'expiration : 20/03/2030
DPE individuel Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Diagnostic de performances énergétiques** Date d'effet : 23/06/2023 : - Date d'expiration : 22/06/2030
DPE avec mention Selon arrêté du 24 décembre 2021	**DPE par immeuble, bâtiments à usage autre que d'habitation** Date d'effet : 23/06/2023 : - Date d'expiration : 22/06/2030
Electricité Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Etat de l'installation intérieure électricité** Date d'effet : 23/06/2023 : - Date d'expiration : 22/06/2030
Gaz Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Etat de l'installation intérieure gaz** Date d'effet : 23/06/2023 : - Date d'expiration : 22/06/2030
Plomb sans mention Selon arrêté du 24 Décembre 2021	**Constat du risque d'exposition au plomb** Date d'effet : 21/03/2023 : - Date d'expiration : 20/03/2030
Termites Métropole Selon arrêté du 24 Décembre 2021	**Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments** Date d'effet : 21/03/2023 : - Date d'expiration : 20/03/2030

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 23/06/2023, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – 33600 PESSAC
Salles d'examens : 71/73, rue Desnouettes – 75015 PARIS
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15000€ - SIRET : 80914919800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 - - Code APE : 7022 Z

Accréditation N° 4-0590
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Votre Assurance

▸ RCE PRESTATAIRES

Assurance et Banque

ATTESTATION

SARL D D DIAG
88 AVENUE DES TERNES
75017 PARIS FR

COURTIER

JAURES ASSURANCES
50 RUE JEAN JAURES
95400 ARNOUVILLE LES GONESSE
Tél : 01 39 86 63 67
Email : JAURESASSURANCES@GMAIL.COM
Portefeuille : 0201558984

Vos références :

Contrat n° 10772085104
Client n° 0690904320

AXA France IARD, atteste que :

SARL D D DIAG
88 AVENUE DES TERNES
75017 PARIS

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 10772085104** ayant pris effet le **05/04/2023** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber en cas de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux Tiers du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS
AUDIT ENERGETIQUE EN MAISON INDIVIDUELLE SELON Décret n° 2022-780 du 4 mai 2022

Etablissement des certificats de surface (Loi Carrez) prévu par la Loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 et son décret d'application n° 97-532 du 23 mai 1997 et par la loi Boutin du 27 03 2009 et son décret d'application.

Etablissement des états des lieux locatifs (des parties privatives) selon la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/03/2024** au **01/03/2025** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 6 mars 2024
Pour la société :

1D052620240306
