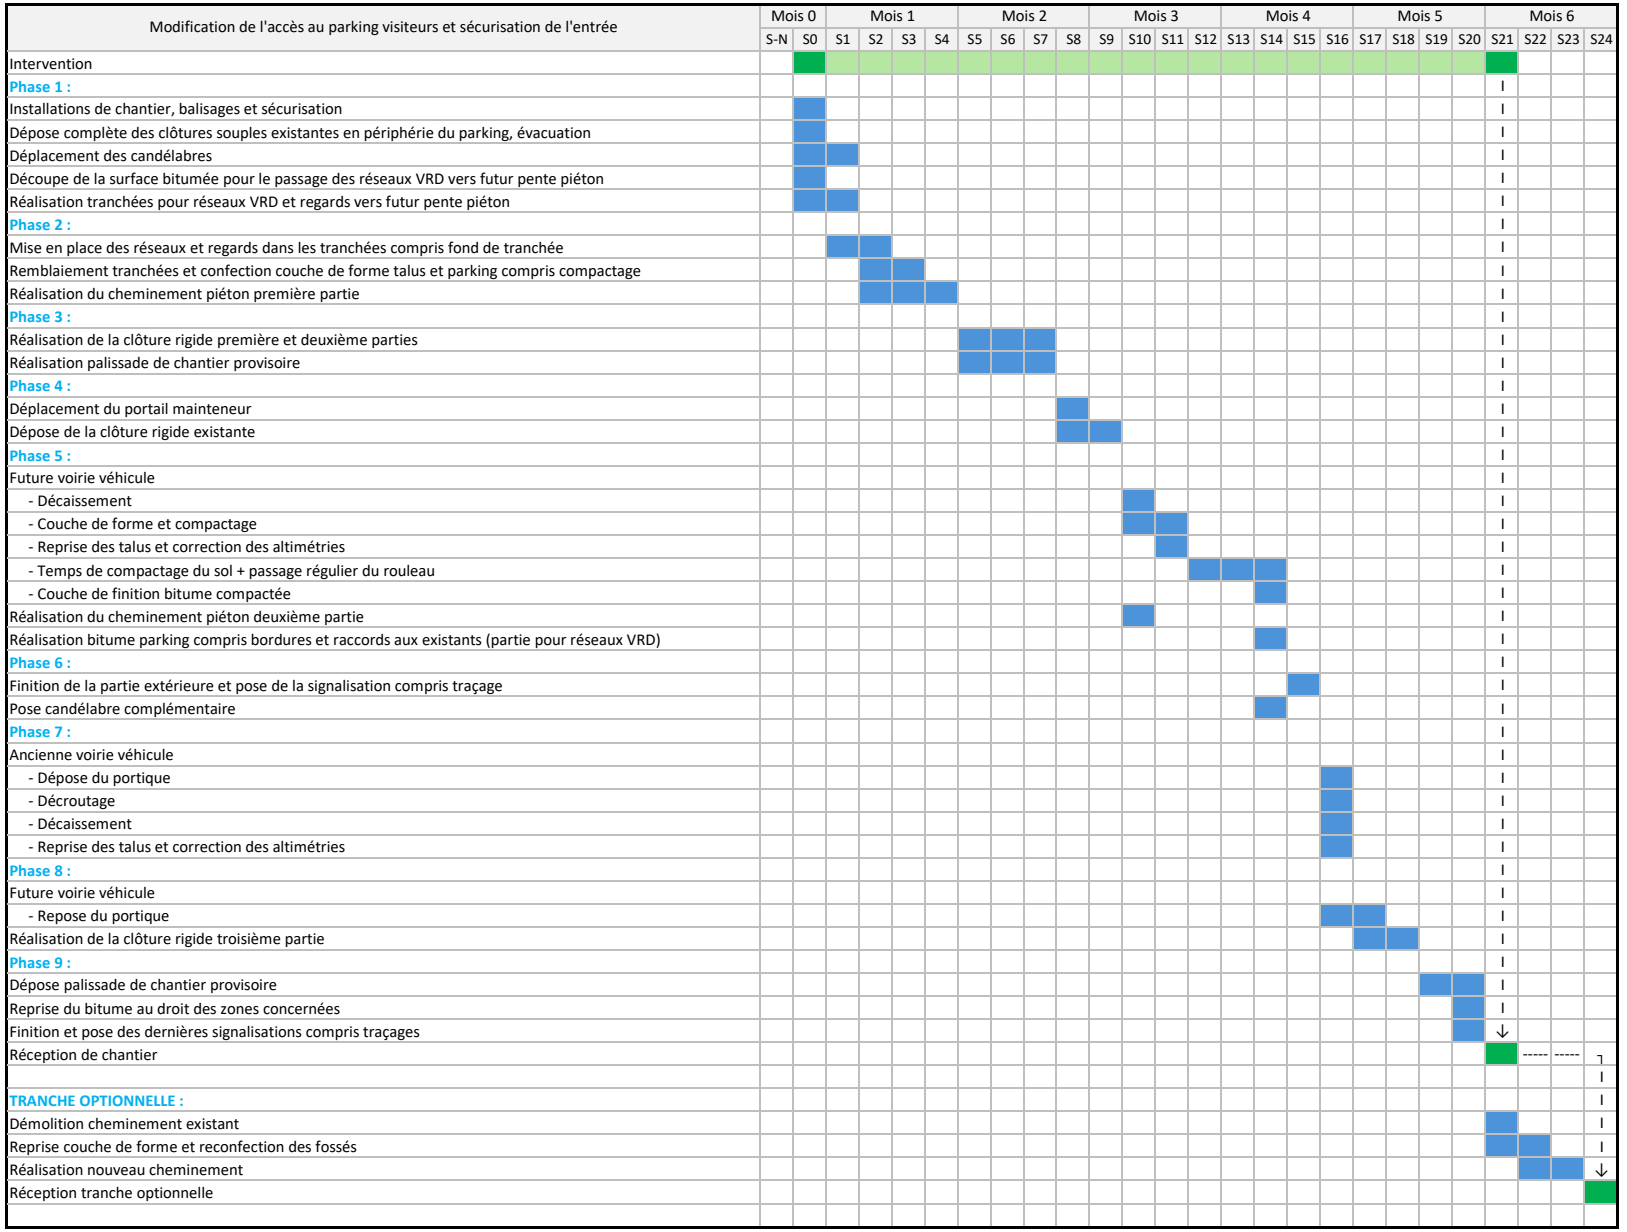

Modification de l'accès au parking visiteurs et sécurisation de l'entrée
Mois 0
Mois 1
Mois 2
Mois 3
Mois 4
Mois 5
Mois 6
S-N
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
Intervention
Phase 1 :
Installations de chantier, balisages et sécurisation
Dépose complète des clôtures souples existantes en périphérie du parking, évacuation
Déplacement des candélabres
Découpe de la surface bitumée pour le passage des réseaux VRD vers futur pente piéton
Réalisation tranchées pour réseaux VRD et regards vers futur pente piéton
Phase 2 :
Mise en place des réseaux et regards dans les tranchées compris fond de tranchée
Remblaiement tranchées et confection couche de forme talus et parking compris compactage
Réalisation du cheminement piéton première partie
Phase 3 :
Réalisation de la clôture rigide première et deuxième parties
Réalisation palissade de chantier provisoire
Phase 4 :
Déplacement du portail mainteneur
Dépose de la clôture rigide existante
Phase 5 :
Future voirie véhicule
- Décaissement
- Couche de forme et compactage
- Reprise des talus et correction des altimétries
- Temps de compactage du sol + passage régulier du rouleau
- Couche de finition bitume compactée
Réalisation du cheminement piéton deuxième partie
Réalisation bitume parking compris bordures et raccords aux existants (partie pour réseaux VRD)
Phase 6 :
Finition de la partie extérieure et pose de la signalisation compris traçage
Pose candélabre complémentaire
Phase 7 :
Ancienne voirie véhicule
- Dépose du portique
- Décroutage
- Décaissement
- Reprise des talus et correction des altimétries
Phase 8 :
Future voirie véhicule
- Repose du portique
Réalisation de la clôture rigide troisième partie
Phase 9 :
Dépose palissade de chantier provisoire
Reprise du bitume au droit des zones concernées
Finition et pose des dernières signalisations compris traçages
Réception de chantier
TRANCHE OPTIONNELLE :
Démolition cheminement existant
Reprise couche de forme et reconfection des fossés
Réalisation nouveau cheminement
Réception tranche optionnelle
