ENVIRONNEMENT

AGENCE INDRE ET LOIRE

116 rue Ronsard
37100 TOURS
Tel : 0246232600
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

UNIVERSITE D'ORLEANS
Avenue du Château de la Source - BP 6749
45100 ORLEANS

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW594195
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 12/03/2025
Reférence mandataire : R+2 Apt Droite - Administration des sciences

DÉSIGNATION DU BIEN

R+2 Apt Droite - Administration des sciences
UNIVERSITÉ D'ORLÉANS - 1 RUE DE CHARTRES
45100 ORLEANS

PROPRIÉTAIRE

UNIVERSITE D'ORLEANS
Avenue du Château de la Source - BP 6749
45100 ORLEANS

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Présence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Université d'ORLÉANS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : UNIVERSITÉ D'ORLÉANS - 1 RUE DE CHARTRES 45100 ORLEANS

Référence client : R+2 Apt Droite - Administration des sciences

Désignation : R+2 Apt Droite - Administration des sciences

Date de construction : Avant 1997

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
UNIVERSITE D'ORLEANS
Avenue du Château de la Source - BP 6749
45100 ORLEANS

Donneur d'ordre :
UNIVERSITE D'ORLEANS
Avenue du Château de la Source - BP 6749 45100 ORLEANS

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : BOUCHER ERIC

Accompagnateur : Mr ROGER Benoit (02.38.49.27.13)

Date de repérage 12/03/2025

Numéro attestation : 1315

Délivré le : 08/12/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCP – 25 Avenue Léonard de Vinci – 33600 PESSAC

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 18/03/2025

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 18/03/2025

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 1 (Chambre 1)	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 2 (Chambre 2)
R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 3 (Chambre 3)	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 4 (Cuisine)
R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 5 (Entrée)	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 6 (SDB)
R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 7 (Séjour)	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 8 (W.C)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Demande de DAT et PAT pour futurs réhabilitation de l'appartement N°201 situé au R+2 du bâtiment de l'Administration des sciences. Cela concerne l'ensemble du logement.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Les zones impactées par les travaux sont celles désignées dans le BT (citées ci-dessus) et prédéfinies par le Donneur d'Ordre, à savoir: Ensemble de l'appartement N°201 situé au R+2 du bâtiment de l'administration des Sciences

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Entrée) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (W.C)	
Plafond et faux-plafonds	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Entrée) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (W.C)	
Revêtement de mur	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Entrée) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (W.C)	
Revêtement de sol	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Entrée) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (W.C)	
Equipements divers et accessoires	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 6 (SDB)	
Conduits, canalisations et équipements	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 8 (W.C)	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucun

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.	Etat de conservation (hors règlementation)
Vol 8 (W.C)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P20	EP

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

- Des investigations approfondies concernant l'ensemble des installations électriques (câbles et équipements) n'ont pu être réalisées sans réception préalable d'un PV de consignation.

- Certains matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante peuvent être noyés dans les maçonneries (cales de ferraillage, conduits noyés, écarteurs de banche, etc.) sans qu'il soit possible d'en identifier la présence antérieurement à la démolition ou phases de travaux. Notre responsabilité ne saurait être recherchée en cas de présence de tels matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante découverts en cours de démolition.
Nous nous tenons toutefois à la disposition du donneur d'ordre pour compléter notre repérage ultérieurement, selon nos tarifs en vigueur..

- Les gaines, coffres, murs, cheminées, plafonds et cloisons en place ont été visités ponctuellement ; le repérage peut être complété si besoin au cours des travaux ou après dépose des éléments empêchant leur visite complète.

- En cas de découverte de Matériaux ou Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) non repérés dans ce présent rapport, lors de la phase de travaux, il conviendra de faire réaliser des sondages ou des prélèvements complémentaires ou de considérer ces éléments comme contenant de l'amiante.

- L'intégralité des réseaux enterrés n'ont pu être investigués dans le cadre du présent repérage. En effet, ces réseaux enterrés ne sont pas repérables sans moyens spécifiques (terrassement, caméra, etc.) non prévus au présent contrat. Des investigations complémentaires devront être réalisées ultérieurement une fois les moyens d'accès aux réseaux enterrés mis à disposition ou lors de la phase de travaux correspondant à leur mise à jour.

- Les plots de colle de plaque de plâtre n'ont pu être sondés du fait de l'importance des dégradations occasionnées pour l'accessibilité à ces éléments en milieu actif.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Parois verticales intérieures et enduits

2 - Plafond et faux-plafonds

3 - Revêtement de sol

4 - Revêtement de mur

5 - Conduits, canalisations et équipements

6 - Equipements divers et accessoires

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 7 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S15	Réalisation d'un sondage		S15 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureMatériaux en bois.	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 7 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S15	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S15		S15 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureMatériaux en bois.	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 7 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P9	Réalisation d'un prélevement	Donnant sur l'extérieur, pièces sèches.	002EW594195 n °9 - 1	P9	Papier peint / Enduit / Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Orange / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 3 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Donnant sur l'extérieur, pièces sèches.	002EW594195 n °9 - 1	P9	Papier peint / Enduit / Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Orange / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 2 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Donnant sur l'extérieur, pièces sèches.	002EW594195 n°9 - 1	P9	Papier peint / Enduit / Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Orange / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 1 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Donnant sur l'extérieur, pièces sèches.	002EW594195 n°9 - 1	P9	Papier peint / Enduit / Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Orange / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 3 (Chambre 3) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 1 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Donnant sur l'extérieur, pièces sèches.	002EW594195 n°9 - 1	P9	Papier peint / Enduit / Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Orange / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 7 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P10	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend, pièces sèches	002EW594195 n°10 - 1	P10	Papier peint / Enduit / Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 7 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Mur de refend, pièces sèches	002EW594195 n °10 - 1	P10	Papier peint / Enduit / Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 3 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Mur de refend, pièces sèches	002EW594195 n °10 - 1	P10	Papier peint / Enduit / Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 5 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Mur de refend, pièces sèches	002EW594195 n °10 - 1	P10	Papier peint / Enduit / Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 5 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Mur de refend, pièces sèches	002EW594195 n °10 - 1	P10	Papier peint / Enduit / Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 2 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Mur de refend, pièces sèches	002EW594195 n °10 - 1	P10	Papier peint / Enduit / Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 1 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Mur de refend, pièces sèches	002EW594195 n °10 - 1	P10	Papier peint / Enduit / Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 1 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Mur de refend, pièces sèches	002EW594195 n °10 - 1	P10	Papier peint / Enduit / Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 7 (Séjour) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 5 (Entrée) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 1 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S19 - S20 - S21 - S22 - S23 - S24 - S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Mur de refend, pièces sèches	002EW594195 n °10 - 1	P10	Papier peint / Enduit / Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 1 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P11	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW594195 n °11 - 1	P11	Peinture / Fibres / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Orange	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 2 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Cloisons séparative, pièces sèches.	002EW594195 n °11 - 1	P11	Peinture / Fibres / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Orange	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 4 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P12	Réalisation d'un prélevement	Donnant sur l'extérieur, pièces humides.	002EW594195 n °12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Donnant sur l'extérieur, pièces humides.	002EW594195 n °12 - 1	P12	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 4 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P13	Réalisation d'un prélevement	Mur de refend, pièces humides	002EW594195 n °13 - 1	P13	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 4 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Mur de refend, pièces humides	002EW594195 n °13 - 1	P13	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 8 (W.C)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Mur de refend, pièces humides	002EW594195 n °13 - 1	P13	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Mur de refend, pièces humides	002EW594195 n °13 - 1	P13	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 4 (Cuisine) - Vol 8 (W.C) - Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S28 - S29 - S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Mur de refend, pièces humides	002EW594195 n °13 - 1	P13	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 7 (Séjour)	Plafonds	Enduits plâtre	P14	Réalisation d'un prélevement	En sous-face de plancher béton, pièces sèches	002EW594195 n °14 - 1	P14	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 3 (Chambre 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	En sous-face de plancher béton, pièces sèches	002EW594195 n °14 - 1	P14	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 2 (Chambre 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	En sous-face de plancher béton, pièces sèches	002EW594195 n °14 - 1	P14	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 1 (Chambre 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	En sous-face de plancher béton, pièces sèches	002EW594195 n °14 - 1	P14	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 5 (Entrée)	Plafonds	Enduits plâtre	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	En sous-face de plancher béton, pièces sèches	002EW594195 n °14 - 1	P14	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 3 (Chambre 3) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 5 (Entrée)	Plafonds	Enduits plâtre	S31 - S32 - S33 - S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	En sous-face de plancher béton, pièces sèches	002EW594195 n °14 - 1	P14	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 4 (Cuisine)	Plafonds	Enduits plâtre	P15	Réalisation d'un prélevement	En sous-face de plancher béton, pièces humides	002EW594195 n °15 - 1	P15	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 8 (W.C)	Plafonds	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	En sous-face de plancher béton, pièces humides	002EW594195 n °15 - 1	P15	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 6 (SDB)	Plafonds	Enduits plâtre	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	En sous-face de plancher béton, pièces humides	002EW594195 n °15 - 1	P15	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 8 (W.C) - Vol 6 (SDB)	Plafonds	Enduits plâtre	S35 - S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	En sous-face de plancher béton, pièces humides	002EW594195 n °15 - 1	P15	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 7 (Séjour)	Plafonds	Colle de panneaux	P21	Réalisation d'un prélevement	Colle marron et colle blanche sous panneaux polystyrène 30/30	002EW594195 n °21 - 1	P21	Revêtement / Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Souple / Effritable / Effritable - Beige / Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Réalisation d'un prélevement	Colle grise sous carrelage beige 1/1	002EW594195 n °1 - 1	P1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Colle grise sous carrelage beige 1/1	002EW594195 n °1 - 1	P1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Colle grise sous carrelage beige 1/1	002EW594195 n °1 - 1	P1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 8 (W.C) - Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1 - S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Colle grise sous carrelage beige 1/1	002EW594195 n °1 - 1	P1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 5 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P3	Réalisation d'un prélevement	Lés plastique marron	002EW594195 n°3 - 1	P3 Phase 1	Revêtement - Souple - Marron	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Lés plastique marron	002EW594195 n°3 - 1	P3 Phase 1	Revêtement - Souple - Marron	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Lés plastique marron	002EW594195 n°3 - 1	P3 Phase 1	Revêtement - Souple - Marron	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Lés plastique marron	002EW594195 n°3 - 1	P3 Phase 1	Revêtement - Souple - Marron	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Lés plastique marron	002EW594195 n°3 - 1	P3 Phase 1	Revêtement - Souple - Marron	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 3 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Lés plastique marron	002EW594195 n°3 - 1	P3 Phase 1	Revêtement - Souple - Marron	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (W.C) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S4 - S5 - S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Lés plastique marron	002EW594195 n°3 - 1	P3 Phase 1	Revêtement - Souple - Marron	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 5 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P3	Réalisation d'un prélevement	Lés plastique marron	002EW594195 n°3 - 1	P3 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Lés plastique marron	002EW594195 n °3 - 1	P3 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Lés plastique marron	002EW594195 n °3 - 1	P3 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Lés plastique marron	002EW594195 n °3 - 1	P3 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Lés plastique marron	002EW594195 n °3 - 1	P3 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 3 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Lés plastique marron	002EW594195 n°3 - 1	P3 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (W.C) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S4 - S5 - S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Lés plastique marron	002EW594195 n°3 - 1	P3 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 5 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P4	Réalisation d'un prélevement	Lés plastique marbré beige/marron sous 1er revêtement existant.	002EW594195 n°4 - 1	P4	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Beige / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Lés plastique marbré beige/marron sous 1er revêtement existant.	002EW594195 n°4 - 1	P4	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Beige / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 5 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	P5	Réalisation d'un prélevement	Ragréage gris et ragréage marron sous 2ème revêtement.	002EW594195 n°5 - 1	P5	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Dur / Effritable - Gris / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Ragréage gris et ragréage marron sous 2ème revêtement.	002EW594195 n°5 - 1	P5	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Dur / Effritable - Gris / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P6	Réalisation d'un prélevement	Moquette fibreuse bleu/grise sous 1er revêtement existant.	002EW594195 n°6 - 1	P6	Moquette / Colle - Souple Fibreux / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Moquette fibreuse bleu/grise sous 1er revêtement existant.	002EW594195 n°6 - 1	P6	Moquette / Colle - Souple Fibreux / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 3 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Moquette fibreuse bleu/grise sous 1er revêtement existant.	002EW594195 n °6 - 1	P6	Moquette / Colle - Souple Fibreux / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S11 - S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Moquette fibreuse bleu/grise sous 1er revêtement existant.	002EW594195 n °6 - 1	P6	Moquette / Colle - Souple Fibreux / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P7	Réalisation d'un prélevement	Colle beige/jaune sous 2ème revêtement moquette	002EW594195 n °7 - 1	P7	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Orange	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Colle beige/jaune sous 2ème revêtement moquette	002EW594195 n °7 - 1	P7	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Orange	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 3 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Colle beige/jaune sous 2ème revêtement moquette	002EW594195 n °7 - 1	P7	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Orange	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S13 - S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Colle beige/jaune sous 2ème revêtement moquette	002EW594195 n °7 - 1	P7	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Orange	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P8	Réalisation d'un prélevement	Lés plastique rose avec colle jaune	002EW594195 n °8 - 1	P8	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Blanc Rose / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Nez de marche	P22	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment sur marche donnant accès à la terrasse.	002EW594195 n °22 - 1	P22	Colle / Mortier - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P2	Réalisation d'un prélevement	Colle grise sous plinthes en carrelage beige 1/1	002EW594195 n °2 - 1	P2	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 8 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Colle grise sous plinthes en carrelage beige 1/1	002EW594195 n °2 - 1	P2	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P16	Réalisation d'un prélevement	Colle jaune sous plinthes PVC grise peintes	002EW594195 n °16 - 1	P16	Matériau / Colle - Effritable / Souple - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 5 (Entrée)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Colle jaune sous plinthes PVC grise peintes	002EW594195 n °16 - 1	P16	Matériau / Colle - Effritable / Souple - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Colle jaune sous plinthes PVC grise peintes	002EW594195 n °16 - 1	P16	Matériau / Colle - Effritable / Souple - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Colle jaune sous plinthes PVC grise peintes	002EW594195 n °16 - 1	P16	Matériau / Colle - Effritable / Souple - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 3 (Chambre 3)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Colle jaune sous plinthes PVC grise peintes	002EW594195 n °16 - 1	P16	Matériau / Colle - Effritable / Souple - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 5 (Entrée) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S37 - S38 - S39 - S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Colle jaune sous plinthes PVC grise peintes	002EW594195 n °16 - 1	P16	Matériau / Colle - Effritable / Souple - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P17	Réalisation d'un prélevement	Colle blanche sous faïences blanche 15/15	002EW594195 n °17 - 1	P17	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Rose	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P18	Réalisation d'un prélevement	Colle blanche sous faïences blanche 15/15	002EW594195 n °18 - 1	P18	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 8 (W.C)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P20	Réalisation d'un prélevement	Conduits rectangulaire en entrée et sortie d'air direct.	002EW594195 n °20 - 1	P20	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse	EP
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 8 (W.C)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S42 (P20)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Conduits rectangulaire en entrée et sortie d'air direct.	002EW594195 n °20 - 1	P20	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse	EP

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 6 (SDB)	Baignoire	Colle de scellement	P19	Réalisation d'un prélevement	Plots de colle de scellement sur pieds de baignoire.	002EW594195 n °19 - 1	P19	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	Vol 6 (SDB)	Baignoire	Colle de scellement	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Plots de colle de scellement sur pieds de baignoire.	002EW594195 n °19 - 1	P19	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.


Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences							
P20	Conduit air	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Vol 8 (W.C) - Vol 8 (W.C)	1,75 m		,09 m²	2 unité(s)

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Plan de repérage - Actions menées
	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements

R+2-APPARTEMENT N°201 (DROITE)-BÂTIMENT ADMINISTRATION DES SCIENCES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW594195

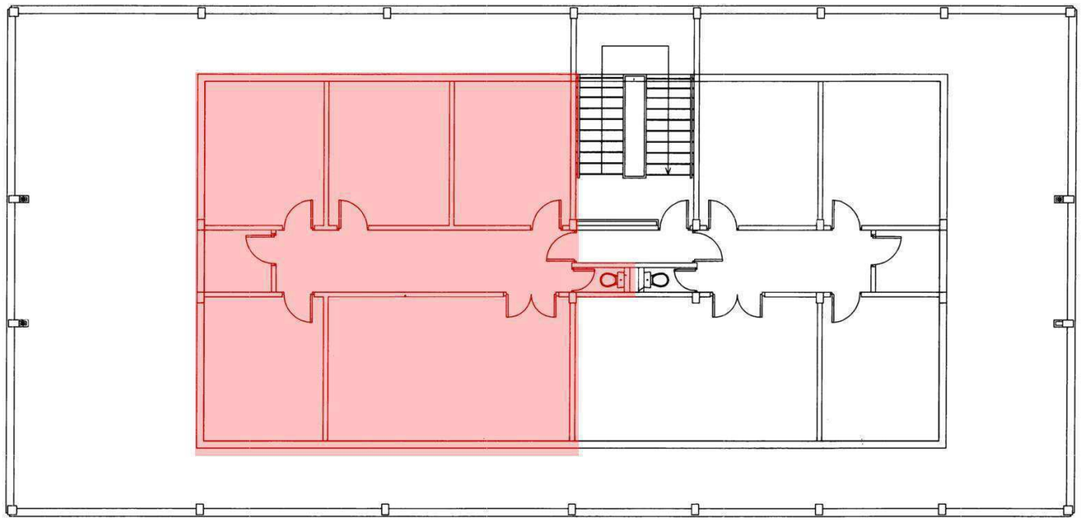


Légende	
	Périmètre dintervention 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
UNIVERSITÉ DORLÉANS - 1 RUE DE CHARTRES 45100 ORLEANS	R+2 Apt Droite - Administration des sciences	12/03/2025	BOUCHER ERIC

R+2-APPARTEMENT N°201 (DROITE)-BÂTIMENT ADMINISTRATION DES SCIENCES - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW594195

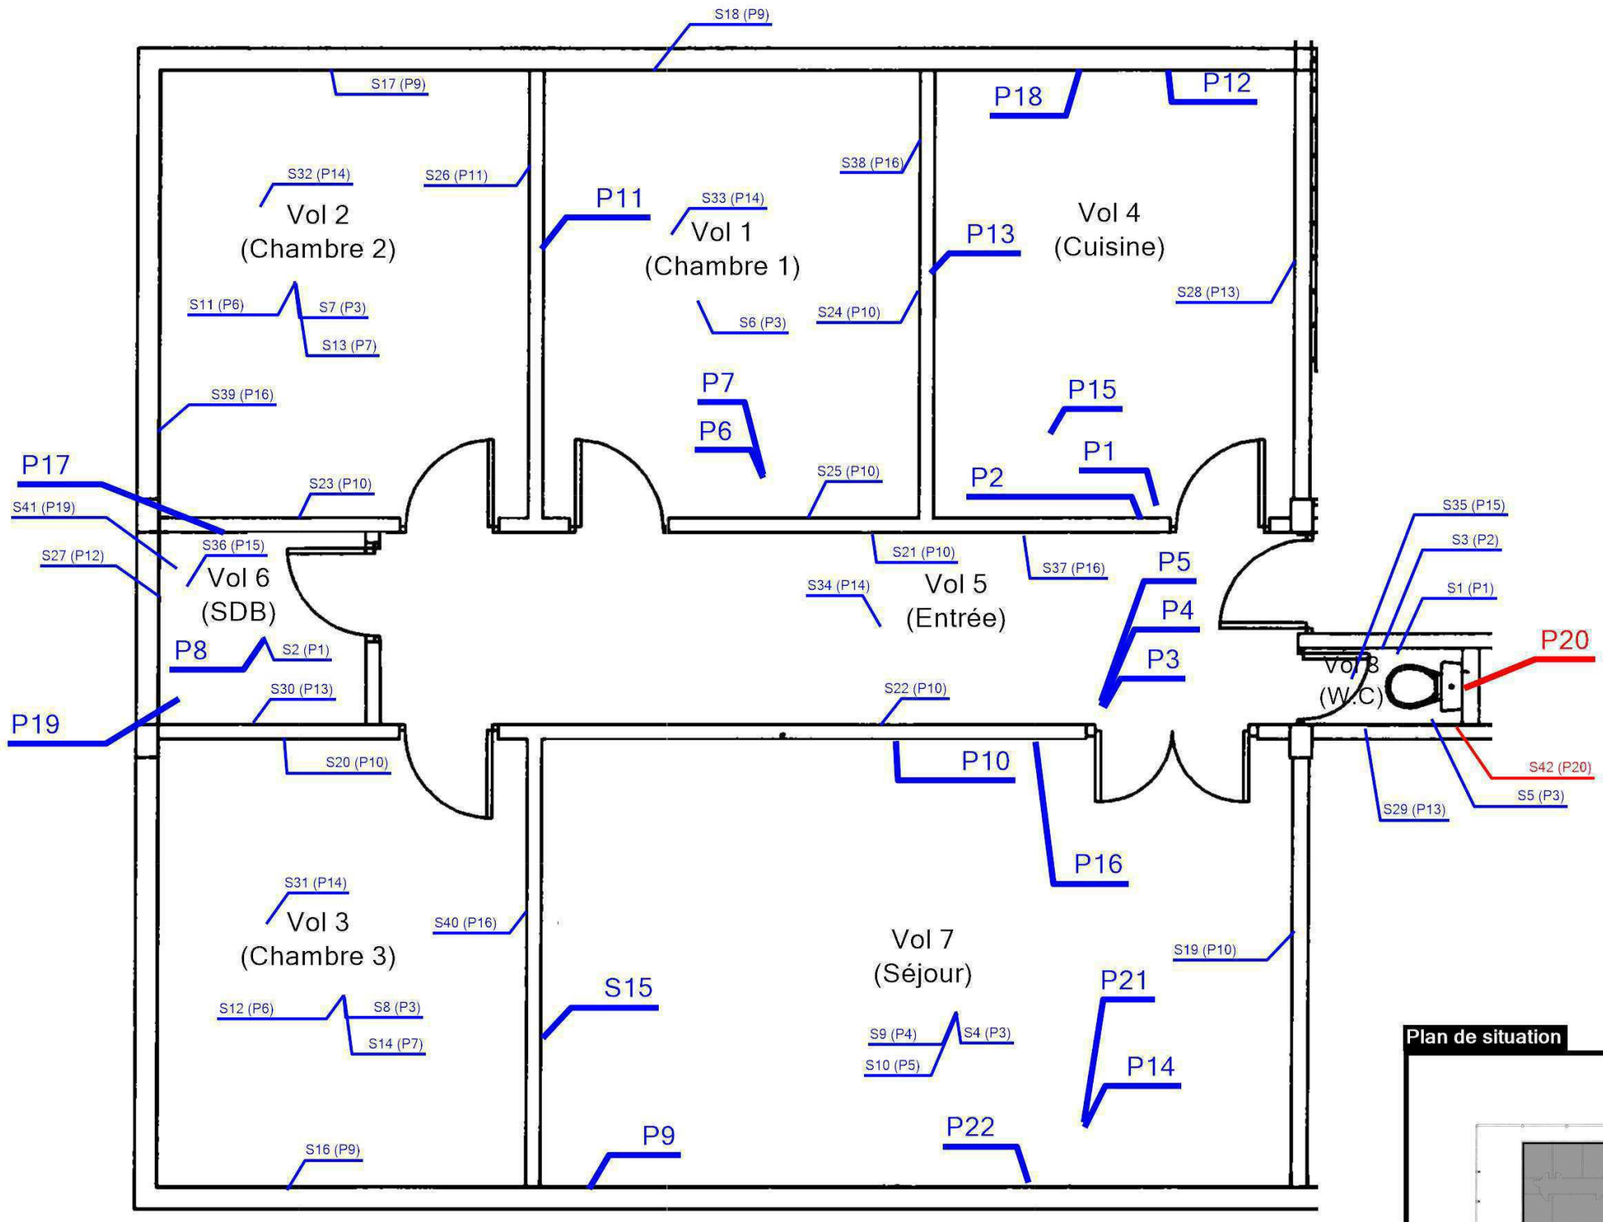

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
UNIVERSITÉ DORLÉANS - 1 RUE DE CHARTRES 45100 ORLEANS	R+2 Apt Droite - Administration des sciences	12/03/2025	BOUCHER ERIC

R+2-APPARTEMENT N°201 (DROITE)-BÂTIMENT ADMINISTRATION DES SCIENCES - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002EW594195

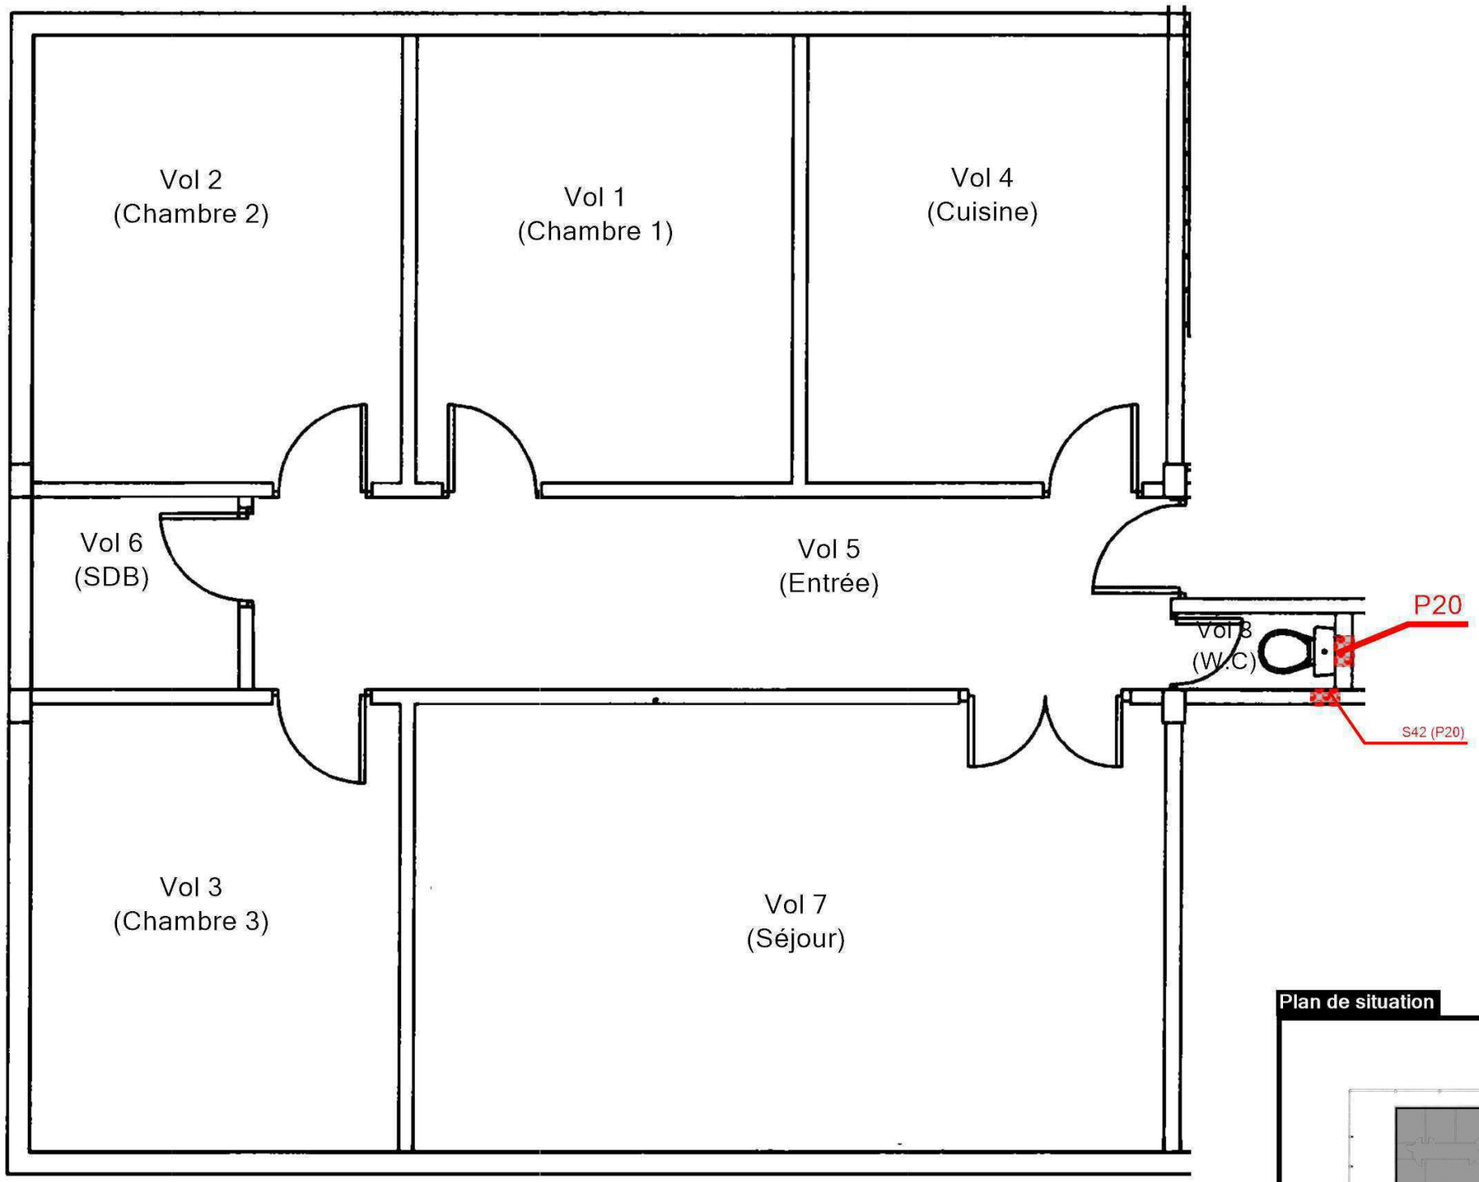

Légende

	P20 : Conduit en fibres-ciment


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
UNIVERSITÉ DORLÉANS - 1 RUE DE CHARTRES 45100 ORLEANS	R+2 Apt Droite - Administration des sciences	12/03/2025	BOUCHER ERIC

R+2-APPARTEMENT N°201 (DROITE)-BÂTIMENT ADMINISTRATION DES SCIENCES - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS


Référence:
002EW594195

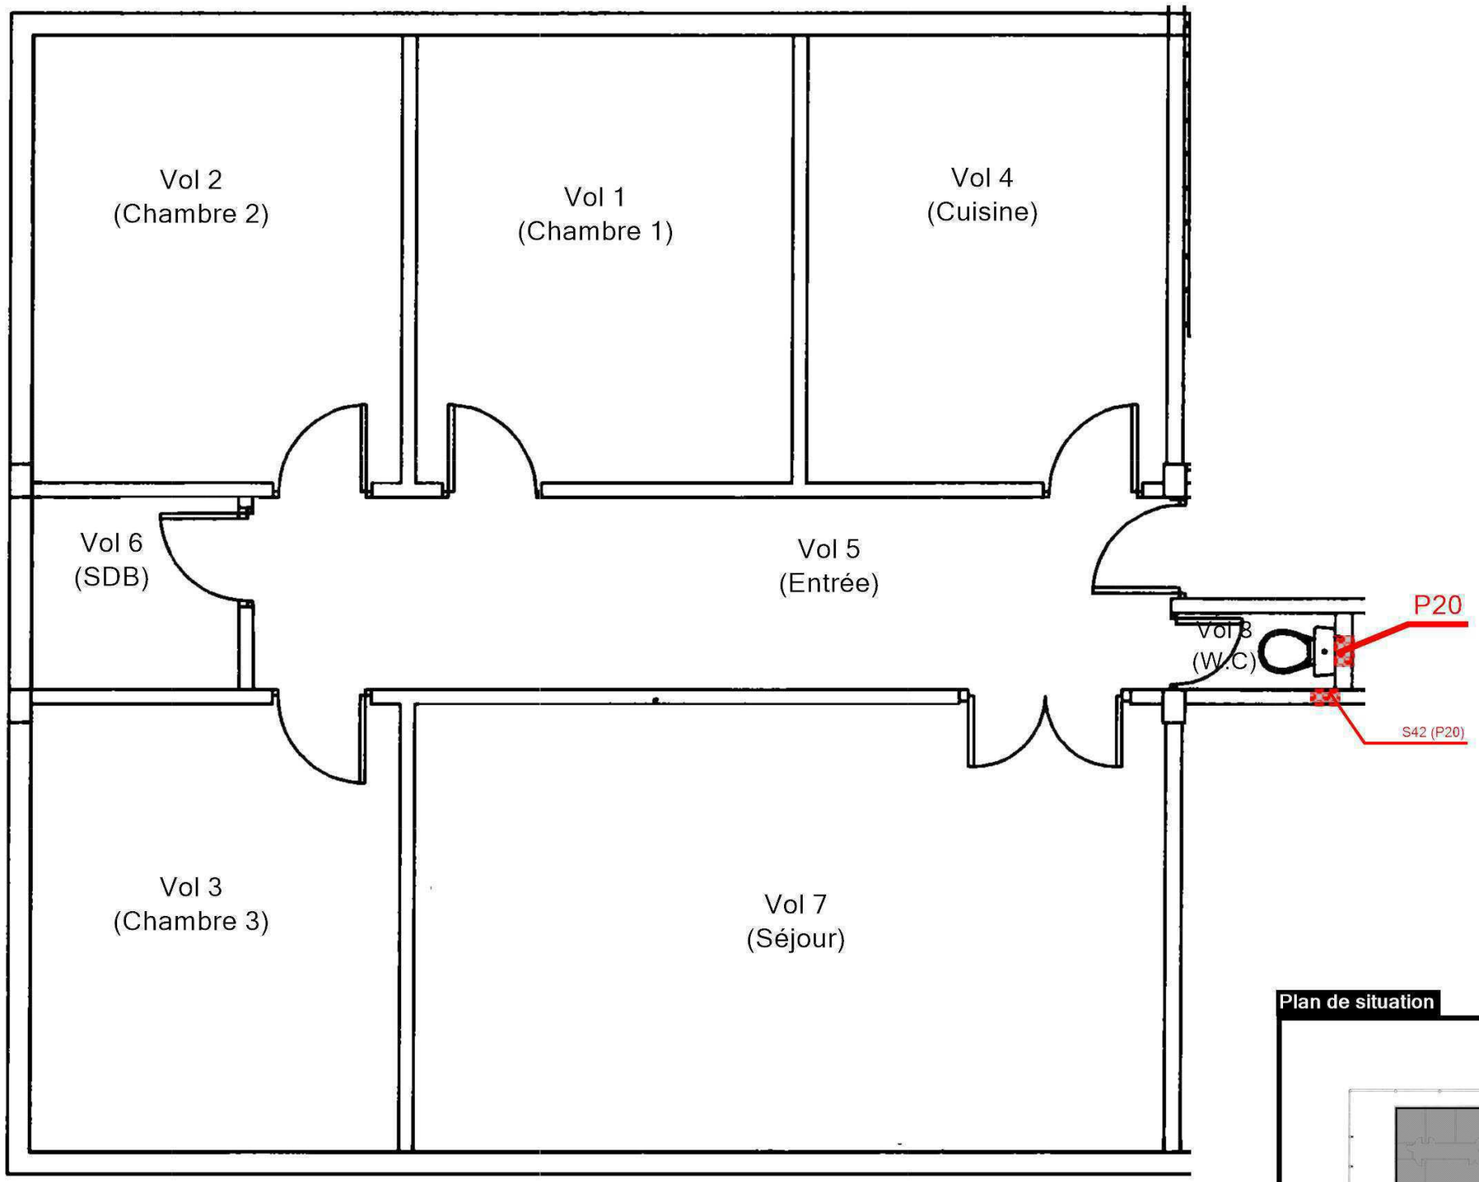

Légende

	P20 : Conduit en fibres-ciment

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
UNIVERSITÉ DORLÉANS - 1 RUE DE CHARTRES 45100 ORLEANS	R+2 Apt Droite - Administration des sciences	12/03/2025	BOUCHER ERIC

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW594195 n°1 - 1 (P1)	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EW594195 n°2 - 1 (P2)	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EW594195 n°3 - 1 (P3)	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 5 (Entrée)	Prélevement négatif
002EW594195 n°4 - 1 (P4)	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 5 (Entrée)	Prélevement négatif
002EW594195 n°5 - 1 (P5)	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 5 (Entrée)	Prélevement négatif
002EW594195 n°6 - 1 (P6)	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002EW594195 n°7 - 1 (P7)	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002EW594195 n°8 - 1 (P8)	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
S15 - 1 (S15)	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 7 (Séjour)	Absence : pas d'amiante par nature
002EW594195 n°9 - 1 (P9)	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002EW594195 n°10 - 1 (P10)	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002EW594195 n°11 - 1 (P11)	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002EW594195 n°12 - 1 (P12)	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EW594195 n°13 - 1 (P13)	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EW594195 n°14 - 1 (P14)	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002EW594195 n°15 - 1 (P15)	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EW594195 n°16 - 1 (P16)	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002EW594195 n°17 - 1 (P17)	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif

002EW594195 n°18 - 1 (P18)	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EW594195 n°19 - 1 (P19)	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002EW594195 n°20 - 1 (P20)	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 8 (W.C)	Prélevement positif
002EW594195 n°21 - 1 (P21)	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002EW594195 n°22 - 1 (P22)	R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif



002EW594195 n°1 - 1 (P1) - R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 4 (Cuisine)



002EW594195 n°2 - 1 (P2) - R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 4 (Cuisine)



002EW594195 n°3 - 1 (P3) - R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 5 (Entrée)



002EW594195 n°4 - 1 (P4) - R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 5 (Entrée)



002EW594195 n°5 - 1 (P5) - R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 5 (Entrée)



002EW594195 n°6 - 1 (P6) - R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 1 (Chambre 1)



002EW594195 n°7 - 1 (P7) - R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 1 (Chambre 1)



002EW594195 n°8 - 1 (P8) - R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 6 (SDB)



S15 - 1 (S15) - R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 7 (Séjour)



002EW594195 n°9 - 1 (P9) - R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 7 (Séjour)



002EW594195 n°10 - 1 (P10) - R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 7 (Séjour)



002EW594195 n°11 - 1 (P11) - R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 1 (Chambre 1)




002EW594195 n°12 - 1 (P12) - R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 4 (Cuisine)



002EW594195 n°13 - 1 (P13) - R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 4 (Cuisine)



002EW594195 n°14 - 1 (P14) - R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 7 (Séjour)



002EW594195 n°15 - 1 (P15) - R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 4 (Cuisine)



002EW594195 n°16 - 1 (P16) - R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 7 (Séjour)



002EW594195 n°17 - 1 (P17) - R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 6 (SDB)



002EW594195 n°18 - 1 (P18) - R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 4 (Cuisine)



002EW594195 n°19 - 1 (P19) - R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 6 (SDB)



002EW594195 n°20 - 1 (P20) - R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 8 (W.C)



002EW594195 n°21 - 1 (P21) - R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 7 (Séjour)



002EW594195 n°22 - 1 (P22) - R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 7 (Séjour)

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002EW594195
Materiau : Conduit en fibres-ciment
Réf mesure : P20
Destination du local :
Date évaluation : 12/03/2025
Local ou zone homogène :
Batiment : Vol 8 (W.C)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	**Résultat**
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : **Evaluation périodique**
Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Colle grise sous carrelage beige 1/1	R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 4 (Cuisine)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - Colle grise sous plinthes en carrelage beige 1/1	R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 4 (Cuisine)	
P3 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Marron - Lés plastique marron	R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 5 (Entrée)	
P3 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - Lés plastique marron	R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 5 (Entrée)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Beige / Jaune / Gris - Lés plastique marbré beige/marron sous 1er revêtement existant.	R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 5 (Entrée)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Dur / Effritable - Gris / Gris / Gris - Ragréage gris et ragréage marron sous 2ème revêtement.	R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 5 (Entrée)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette / Colle - Souple Fibreux / Souple - Gris / Jaune - Moquette fibreuse bleu/grise sous 1er revêtement existant.	R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 1 (Chambre 1)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Orange - Colle beige/jaune sous 2ème revêtement moquette	R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 1 (Chambre 1)	

P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Blanc Rose / Jaune - Lés plastique rose avec colle jaune	R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 6 (SDB)
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier peint / Enduit / Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Orange / Blanc - Donnant sur l'extérieur, pièces sèches.	R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 7 (Séjour)
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier peint / Enduit / Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - Mur de refend, pièces sèches	R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 7 (Séjour)
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Fibres / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Orange - Cloisons séparative, pièces sèches.	R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 1 (Chambre 1)
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - Donnant sur l'extérieur, pièces humides.	R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 4 (Cuisine)
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige - Mur de refend, pièces humides	R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 4 (Cuisine)
P14	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - En sous-face de plancher béton, pièces sèches	R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 7 (Séjour)
P15	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige - En sous-face de plancher béton, pièces humides	R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 4 (Cuisine)
P16	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau / Colle - Effritable / Souple - Blanc / Jaune - Colle jaune sous plinthes PVC grise peintes	R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 7 (Séjour)

P17	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Rose - Colle blanche sous faïences blanche 15/15	R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 6 (SDB)
P18	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - Colle blanche sous faïences blanche 15/15	R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 4 (Cuisine)
P19	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Colle - Dur - Beige - Plots de colle de scellement sur pieds de baignoire.	R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 6 (SDB)
P20	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris - Conduits rectangulaire en entrée et sortie d'air direct.	R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 8 (W.C)
P21	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Revêtement / Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Souple / Effritable / Effritable - Beige / Jaune / Blanc / Gris - Colle marron et colle blanche sous panneaux polystyrène 30/30	R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 7 (Séjour)
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Souple / Dur - Jaune / Gris - Enduit ciment sur marche donnant accès à la terrasse.	R+2-Appartement N °201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 7 (Séjour)

CHANTIER

Référence	**C012025761939**
Adresse	Commande : 002EW594195 Affaire : R+2 Apt Droite - Administration des sciences UNIVERSITÉ D'ORLÉANS - 1 RUE DE CHARTRES 45100 ORLEANS

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 18/03/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012025761939
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW594195_001

Référence labo	PM06861383
Date du prélèvement	12/03/2025
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage
Zone de prélèvement	R+2 Apt Droite - Administration des sciences - Vol 4 (Cuisine)
Remarque concernant le prélèvement	Colle grise sous carrelage beige 1/1 Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Gris

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	17/03/2025

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	HRC	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EW594195_002

Référence labo	PM06861384
Date du prélèvement	12/03/2025
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)
Zone de prélèvement	R+2 Apt Droite - Administration des sciences - Vol 4 (Cuisine)
Remarque concernant le prélèvement	Colle grise sous plinthes en carrelage beige 1/1 Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Gris

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	17/03/2025

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	HRC	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Peinture Effritable Violet, Carrelage Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW594195_003

Référence labo	PM06861385	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/03/2025		
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	17/03/2025
Zone de prélèvement	R+2 Apt Droite - Administration des sciences - Vol 5 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	Lés plastique marron		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Marron	-	-	-	Acétone	1	2	HRC	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	HRC	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW594195_004

Référence labo	PM06861386	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/03/2025		
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	17/03/2025
Zone de prélèvement	R+2 Apt Droite - Administration des sciences - Vol 5 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	Lés plastique marbré beige/marron sous 1er revêtement existant. Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Souple Beige Marron, Colle Souple Marron		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	HRC	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW594195_005

Référence labo	PM06861387	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/03/2025		
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage	Date d'analyse	17/03/2025
Zone de prélèvement	R+2 Apt Droite - Administration des sciences - Vol 5 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage gris et ragréage marron sous 2ème revêtement. Le client a demandé à n'analyser que les couches Ragréage Dur Effritable Gris, Ragréage Dur Effritable Beige Marron		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	HRC	Non détecté	●
	2	Colle Dur Gris	-	-	-						
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW594195_006

Référence labo	PM06861388	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/03/2025		
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Moquettes avec sous-couche	Date d'analyse	18/03/2025
Zone de prélèvement	R+2 Apt Droite - Administration des sciences - Vol 1 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Moquette fibreuse bleu/grise sous 1er revêtement existant. Le client a demandé à n'analyser que la couche Moquette Souple Fibreux Gris Bleu		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Moquette Souple Fibreux Gris	1	1	DGG	Acétone	1	2	HIH	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW594195_007

Référence labo	PM06861389	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/03/2025		
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol	Date d'analyse	17/03/2025
Zone de prélèvement	R+2 Apt Droite - Administration des sciences - Vol 1 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle beige/jaune sous 2ème revêtement moquette		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	HRC	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Orange	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW594195_008

Référence labo	PM06861390	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/03/2025		
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	17/03/2025
Zone de prélèvement	R+2 Apt Droite - Administration des sciences - Vol 6 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	Lés plastique rose avec colle jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Blanc Rose	-	-	-	Acétone	1	2	HRC	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW594195_009

Référence labo	PM06861391	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/03/2025		
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	17/03/2025
Zone de prélèvement	R+2 Apt Droite - Administration des sciences - Vol 7 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	Donnant sur l'extérieur, pièces sèches. Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Papier peint Souple Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HRC	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Orange	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW594195_010

Référence labo	PM06861392	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/03/2025		
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	17/03/2025
Zone de prélèvement	R+2 Apt Droite - Administration des sciences - Vol 7 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	Mur de refend, pièces sèches Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Papier peint Souple Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HRC	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW594195_011

Référence labo	PM06861393	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/03/2025		
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	17/03/2025
Zone de prélèvement	R+2 Apt Droite - Administration des sciences - Vol 1 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative, pièces sèches. Le client a demandé à n'analyser que les couches Plâtre Effritable Blanc Beige, Ciment Effritable Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HRC	Non détecté	●
	2	Fibres Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Orange	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW594195_012

Référence labo	PM06861394	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/03/2025		
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	17/03/2025
Zone de prélèvement	R+2 Apt Droite - Administration des sciences - Vol 4 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Donnant sur l'extérieur, pièces humides. Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HRC	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW594195_013

Référence labo	PM06861395	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/03/2025		
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	17/03/2025
Zone de prélèvement	R+2 Apt Droite - Administration des sciences - Vol 4 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Mur de refend, pièces humides Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HRC	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW594195_014

Référence labo	PM06861396	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/03/2025		
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre	Date d'analyse	17/03/2025
Zone de prélèvement	R+2 Apt Droite - Administration des sciences - Vol 7 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	En sous-face de plancher béton, pièces sèches Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HRC	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW594195_015

Référence labo	PM06861397	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	17/03/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	R+2 Apt Droite - Administration des sciences - Vol 4 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	En sous-face de plancher béton, pièces humides Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HRC	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW594195_016

Référence labo	PM06861398	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	17/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	R+2 Apt Droite - Administration des sciences - Vol 7 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle jaune sous plinthes PVC grise peintes Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune Marron		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HRC	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW594195_017

Référence labo	PM06861399	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	17/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	R+2 Apt Droite - Administration des sciences - Vol 6 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle blanche sous faïences blanche 15/15 Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HRC	Non détecté
	2	Peinture Effritable Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW594195_018

Référence labo	PM06861400	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/03/2025		
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	17/03/2025
Zone de prélèvement	R+2 Apt Droite - Administration des sciences - Vol 4 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle blanche sous faïences blanche 15/15 Le client a demandé à n'analyser que les couches Colle Dur Effritable Beige Gris, Joint Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	HRC	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW594195_019

Référence labo	PM06861401	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/03/2025		
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Baignoire - Colle de scellement	Date d'analyse	17/03/2025
Zone de prélèvement	R+2 Apt Droite - Administration des sciences - Vol 6 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	Plots de colle de scellement sur pieds de baignoire.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	HRC	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW594195_020

Référence labo	PM06861402	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/03/2025		
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Conduit en fibres-ciment	Date d'analyse	17/03/2025
Zone de prélèvement	R+2 Apt Droite - Administration des sciences - Vol 8 (W.C)		
Remarque concernant le prélèvement	Conduits rectangulaire en entrée et sortie d'air direct.		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	DGG	-	-	-	-	Chrysotile	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW594195_021

Référence labo	PM06861403	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	17/03/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Colle de panneaux		
Zone de prélèvement	R+2 Apt Droite - Administration des sciences - Vol 7 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	Colle marron et colle blanche sous panneaux polystyrène 30/30 Le client a demandé à n'analyser que les couches Colle Souple Blanc Beige, Colle Souple Gris Marron		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	HRC	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Peinture Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EW594195_022

Référence labo	PM06861404	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	17/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Nez de marche		
Zone de prélèvement	R+2 Apt Droite - Administration des sciences - Vol 7 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment sur marche donnant accès à la terrasse.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	HRC	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence dossier: RSC012025761939

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 2 MOLP et 22 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 23/23

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Tgurqpucdng"f)Áswkrg
Imen Mansour



Accréditation
N°1-7327
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Université d'ORLÉANS

A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse :	UNIVERSITÉ D'ORLÉANS - 1 RUE DE CHARTRES 45100 ORLEANS
Batiment :	NC
Etage :	NC
Références client :	ministration des sciences
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	R+2 Apt Droite - Administration des sciences
Date de construction ou permis de construire :	Avant 2025
Fonction du bâtiment :	Immeuble collectif en monopropriété

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
UNIVERSITE D'ORLEANS
Avenue du Château de la Source - BP 6749
45100 ORLEANS

Donneur d'ordre :
UNIVERSITE D'ORLEANS
Avenue du Château de la Source - BP 6749
45100 ORLEANS

Accompagnateur : Sans objet

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série :	FONDIS. XLp 300. (26245.)
Date de chargement de la source :	15/01/2023
Nature radionucléide :	Cd109.
Activité initiale :	850 MBq
Date de fin de validité de la source :	15/01/2027
Adresse du laboratoire éventuel :	Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission :	12/03/2025
Date du rapport :	12/03/2025
Référence mission :	002EW594195
Circonstance du constat :	Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret :	AC Environnement - 44135591400298
Nom prénom :	BOUCHER ERIC
Certification n° :	1315
Délivré le	08/12/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCP – 25 Avenue Léonard de Vinci – 33600 PESSAC



Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Ensemble de l'appartement N° 201, à droite de l'escalier,situé au R+2 du bâtiment Administration des Sciences.

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Réhabilitation de l'appartement.

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :

L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage . Il dresse la liste détaillée :

¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;

¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).

Cas particuliers :

¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;

¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.

L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.

Identification des zones :

L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces .

Exemple :

À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, …), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.

L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).

Identification des unités de repérage :

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X…) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.

L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles…) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l 'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d 'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l 'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).
Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.
Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).
Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.
En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).
Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.
Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.
L'opérateur de repérage peut avoir recours à l 'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.
L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

partement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences : Vol 1 (Cha	partement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences : Vol 2 (Cha
partement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences : Vol 3 (Cha	ppartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences : Vol 4 (C
ppartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences : Vol 5 (E	Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences : Vol 6 (
Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences : Vol 7 (S	Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences : Vol 8 (

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 1 (Chambre 1)								
19	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
20	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
21	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
22	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
23	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
24	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
25	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
26	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
82	A	Porte bois peinte (Porte bois)-Porte bois peinte1	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
83	A	Porte bois peinte (Porte bois)-Porte bois peinte2	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
102	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
103	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
123	C	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte1	Bas Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
124	B	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
125	B	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte2	Haut Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
126	C	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte2	Bas Droite	Autre	Autre	0,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 1 (Chambre 1)								
127	D	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
128	D	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte2	Bas Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
129	A	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte1	Haut Droite	Autre	Autre	0,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
130	A	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte2	Centre Droite	Autre	Autre	0,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
177	A	Dormant métallique peint (Dormant métallique)-Dorm métal peint1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,6 mg/cm²	Trace de grattage	Inconnu
178	A	Dormant métallique peint (Dormant métallique)-Dorm métal peint2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,6 mg/cm²	Trace de grattage	Inconnu
203	C	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
204	C	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
245	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
246	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
247	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
248	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
249	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 2 (Chambre 2)								
27	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
28	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 2 (Chambre 2)								
29	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
30	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
31	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
32	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
33	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
34	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
84	A	Porte bois peinte (Porte bois)-Porte bois peinte1	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
85	A	Porte bois peinte (Porte bois)-Porte bois peinte2	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
100	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
101	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
131	C	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte1	Centre Droite	Autre	Autre	0,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
132	C	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte2	Haut Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
133	B	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
134	B	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte2	Centre Centre	Autre	Autre	0,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
135	D	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte1	Haut Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
136	D	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte2	Haut Gauche	Autre	Autre	0,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 2 (Chambre 2)								
137	A	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte1	Haut Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
138	A	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte2	Centre Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
179	A	Dormant métallique peint (Dormant métallique)-Dorm métal peint1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,8 mg/cm²	Trace de grattage	Inconnu
180	A	Dormant métallique peint (Dormant métallique)-Dorm métal peint2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,8 mg/cm²	Trace de grattage	Inconnu
199	B	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
200	B	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
240	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
241	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
242	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
243	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
244	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 3 (Chambre 3)								
43	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
44	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
45	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
46	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
47	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 3 (Chambre 3)								
48	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
49	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
50	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
88	A	Porte bois peinte (Porte bois)-Porte bois peinte1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
89	A	Porte bois peinte (Porte bois)-Porte bois peinte2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,55 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
96	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
97	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
139	A	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte1	Haut Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
140	A	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte2	Bas Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	D	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte1	Haut Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
142	D	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte2	Centre Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
143	C	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
144	C	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte2	Haut Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
145	B	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte1	Bas Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
146	B	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte2	Bas Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 3 (Chambre 3)								
183	A	Dormant métallique peint (Dormant métallique)-Dorm métal peint1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,7 mg/cm²	Trace de grattage	Inconnu
184	A	Dormant métallique peint (Dormant métallique)-Dorm métal peint2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,7 mg/cm²	Trace de grattage	Inconnu
197	C	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
198	C	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
230	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
231	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
232	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
233	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
234	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 4 (Cuisine)								
11	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
17	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
18	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 4 (Cuisine)								
80	A	Porte bois peinte (Porte bois)-Porte bois peinte1	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,58 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
81	A	Porte bois peinte (Porte bois)-Porte bois peinte2	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
104	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
105	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
111	C	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
112	C	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
113	C	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
114	B	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
115	B	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
116	B	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
117	A	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
118	A	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
119	A	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
120	D	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
121	D	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
122	D	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
175	A	Dormant métallique peint (Dormant métallique)-Dorm métal peint1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,8 mg/cm²	Trace de grattage	Inconnu
176	A	Dormant métallique peint (Dormant métallique)-Dorm métal peint2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,8 mg/cm²	Trace de grattage	Inconnu
189	D	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,36 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 4 (Cuisine)								
190	D	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
205	C	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
206	B	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
210	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
211	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
212	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
213	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
214	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 5 (Entrée)								
3	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
67	D	Porte bois peinte (Porte bois)-Porte bois peinte1	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,58 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
68	D	Porte bois peinte (Porte bois)-Porte bois peinte2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,55 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 5 (Entrée)								
69	A	Porte bois peinte (Porte bois)-Porte bois peinte1	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
70	A	Porte bois peinte (Porte bois)-Porte bois peinte2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,54 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
71	B	Porte bois peinte (Porte bois)-Porte bois peinte1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
72	B	Porte bois peinte (Porte bois)-Porte bois peinte2	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
73	D	Porte bois peinte (Porte bois)-Porte bois peinte3	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
74	D	Porte bois peinte (Porte bois)-Porte bois peinte4	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
75	D	Porte bois peinte (Porte bois)-Porte bois peinte5	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,6 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
76	D	Porte bois peinte (Porte bois)-Porte bois peinte6	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
77	C	Porte bois peinte (Porte bois)-Porte bois peinte1	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,58 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
78	C	Porte bois peinte (Porte bois)-Porte bois peinte2	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,6 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
79	B	Porte bois peinte (Porte bois)-Porte bois peinte3	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,59 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
94	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
95	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
155	D	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte1	Haut Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
156	D	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte2	Haut Centre	Autre	Autre	0,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
157	A	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte1	Bas Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
158	A	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte2	Centre Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 5 (Entrée)								
159	B	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
160	B	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte2	Centre Gauche	Autre	Autre	0,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
161	C	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte1	Haut Centre	Autre	Autre	0,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
162	C	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte2	Haut Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
165	B	Dormant métallique peint (Dormant métallique)-Dorm métal peint1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,7 mg/cm²	Trace de grattage	Inconnu
166	B	Dormant métallique peint (Dormant métallique)-Dorm métal peint2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,7 mg/cm²	Trace de grattage	Inconnu
167	D	Dormant métallique peint (Dormant métallique)-Dorm métal peint1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,7 mg/cm²	Trace de grattage	Inconnu
168	D	Dormant métallique peint (Dormant métallique)-Dorm métal peint2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,7 mg/cm²	Trace de grattage	Inconnu
169	A	Dormant métallique peint (Dormant métallique)-Dorm métal peint1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,8 mg/cm²	Trace de grattage	Inconnu
170	A	Dormant métallique peint (Dormant métallique)-Dorm métal peint2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,8 mg/cm²	Trace de grattage	Inconnu
171	A	Dormant métallique peint (Dormant métallique)-Dorm métal peint3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,8 mg/cm²	Trace de grattage	Inconnu
172	A	Dormant métallique peint (Dormant métallique)-Dorm métal peint4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,8 mg/cm²	Trace de grattage	Inconnu
185	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
186	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
187	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
188	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 5 (Entrée)								
191	C	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
192	C	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 37

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 6 (SDB)								
35	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
36	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
37	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
38	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
39	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
40	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
41	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
42	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
86	A	Porte bois peinte (Porte bois)-Porte bois peinte1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
87	A	Porte bois peinte (Porte bois)-Porte bois peinte2	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
98	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
99	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
181	A	Dormant métallique peint (Dormant métallique)-Dorm métal peint1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,7 mg/cm²	Trace de grattage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 6 (SDB)								
182	A	Dormant métallique peint (Dormant métallique)-Dorm métal peint2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,8 mg/cm²	Trace de grattage	Inconnu
201	D	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
202	D	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
207	D	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
208	C	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
209	B	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
235	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
236	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
237	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
238	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
239	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 7 (Séjour)								
51	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
52	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
53	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
54	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
55	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
56	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 7 (Séjour)								
57	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
58	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
90	A	Porte bois peinte (Porte bois)-Porte bois peinte1	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
91	A	Porte bois peinte (Porte bois)-Porte bois peinte2	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
92	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
93	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
147	A	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
148	A	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte2	Centre Gauche	Autre	Autre	0,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
149	B	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte1	Centre Droite	Autre	Autre	0,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
150	B	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte2	Centre Centre	Autre	Autre	0,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
151	C	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte1	Centre Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
152	C	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte2	Haut Centre	Autre	Autre	0,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
153	D	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
154	D	Plinthes PVC peinte (Plinthes PVC peintes)-Plinthes PVC peinte2	Haut Gauche	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
163	A	Dormant métallique peint (Dormant métallique)-Dorm métal peint1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,8 mg/cm²	Trace de grattage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 7 (Séjour)								
164	A	Dormant métallique peint (Dormant métallique)-Dorm métal peint2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,8 mg/cm²	Trace de grattage	Inconnu
193	C	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
194	C	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,23 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
195	C	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
196	C	Radiateur métallique peint (Radiateur métallique)-Radia métal peint4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
215	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
216	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
217	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
218	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
219	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
220	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
221	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
222	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
223	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
224	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
225	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
226	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
227	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
228	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
229	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 24

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2-Appartement N°201 (droite)-Bâtiment Administration des sciences - Vol 8 (W.C)								
59	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
60	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
61	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
62	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
63	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
64	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
65	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
66	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
106	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
107	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
108	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
109	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
110	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
173	A	Dormant métallique peint (Dormant métallique)-Dorm métal peint1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,7 mg/cm²	Trace de grattage	Inconnu
174	A	Dormant métallique peint (Dormant métallique)-Dorm métal peint2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,7 mg/cm²	Trace de grattage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement










Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

R+2-APPARTEMENT N°201 (DROITE)-BÂTIMENT ADMINISTRATION DES SCIENCES - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW594195

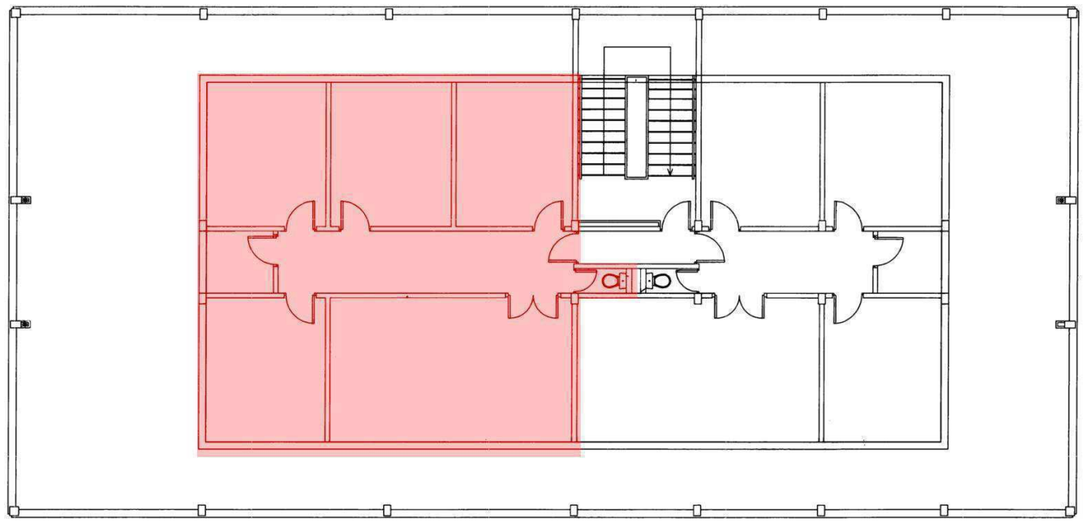


Légende	
	Périmètre dintervention 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
UNIVERSITÉ DORLÉANS - 1 RUE DE CHARTRES 45100 ORLEANS	R+2 Apt Droite - Administration des sciences	12/03/2025	BOUCHER ERIC


R+2-APPARTEMENT N°201 (DROITE)-BÂTIMENT ADMINISTRATION DES SCIENCES - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW594195

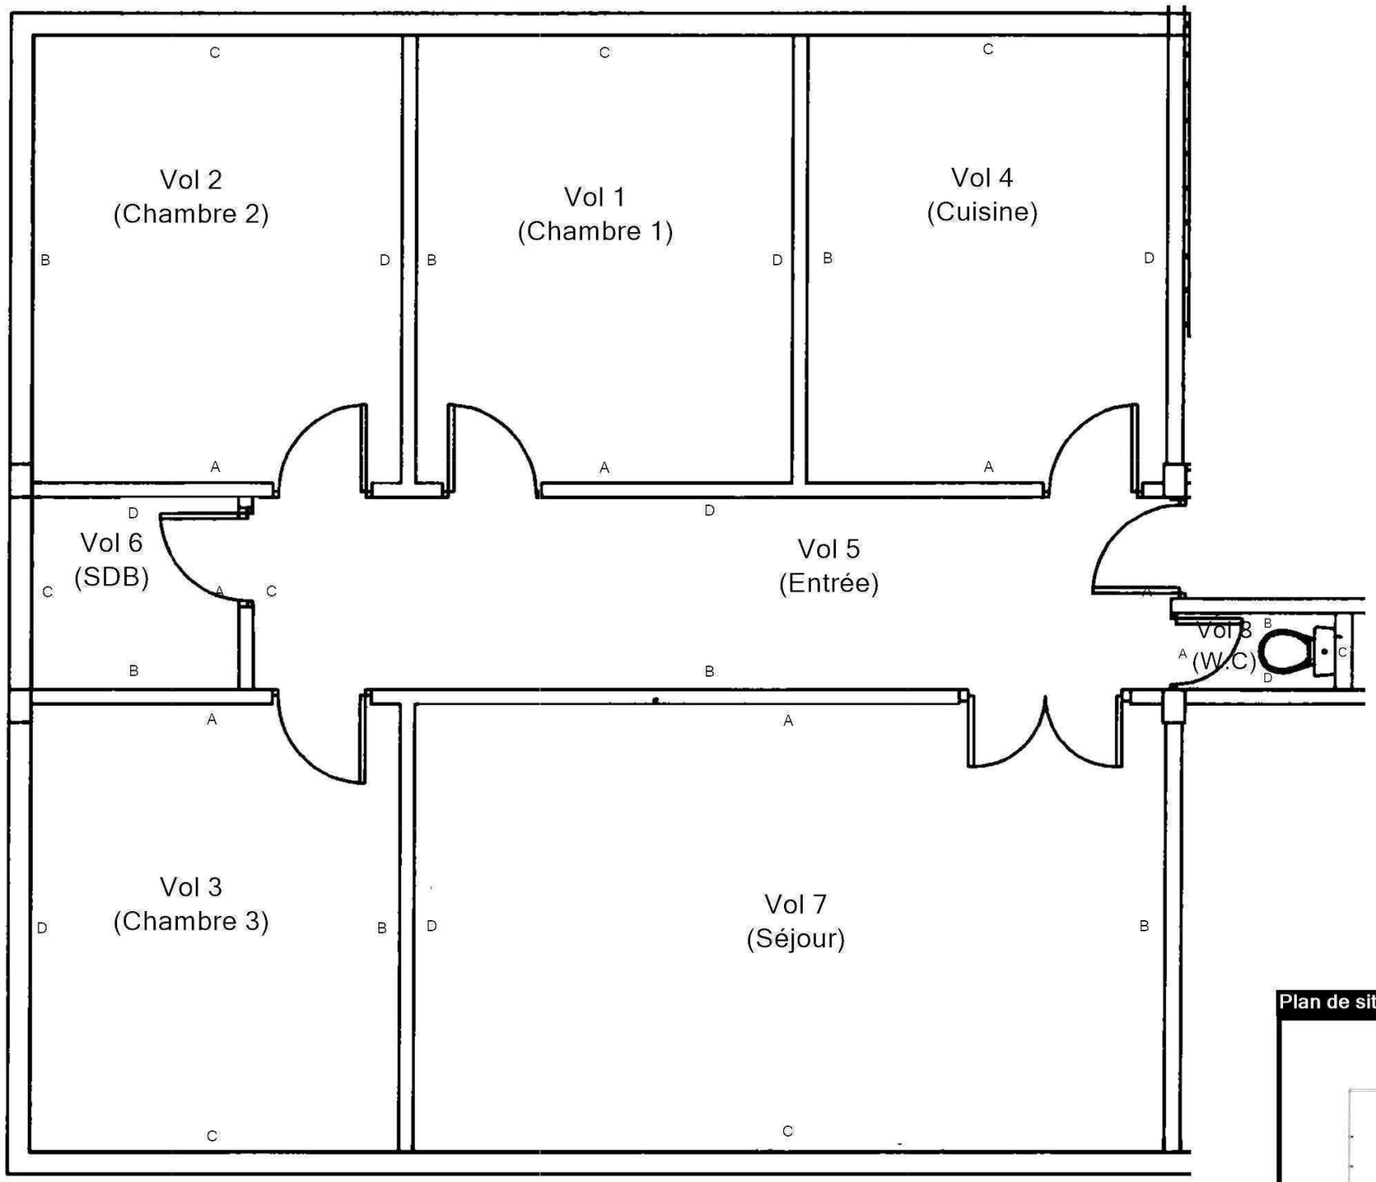

Légende


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
UNIVERSITÉ DORLÉANS - 1 RUE DE CHARTRES 45100 ORLEANS	R+2 Apt Droite - Administration des sciences	12/03/2025	BOUCHER ERIC

R+2-APPARTEMENT N°201 (DROITE)-BÂTIMENT ADMINISTRATION DES SCIENCES - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002EW594195

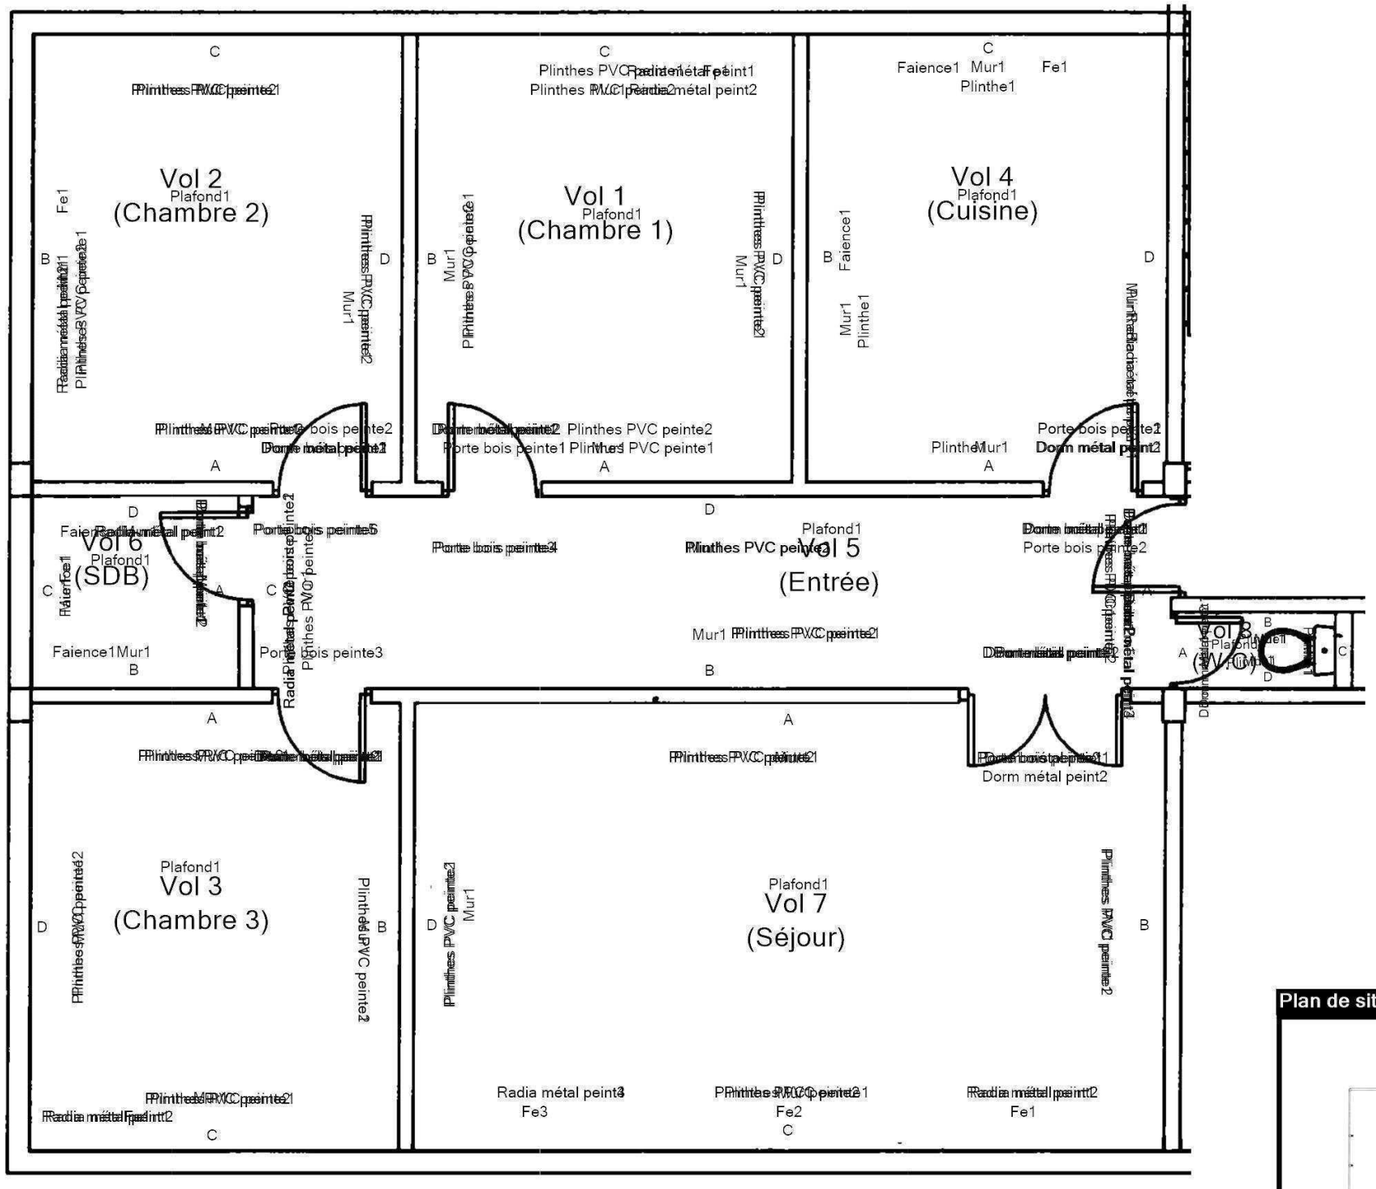

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
UNIVERSITÉ DORLÉANS - 1 RUE DE CHARTRES 45100 ORLEANS	R+2 Apt Droite - Administration des sciences	12/03/2025	BOUCHER ERIC

Reportage photographique du DDT

photo 1



photo 0



ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2



Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92085 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisée et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register: Sitz Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219828782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutler,
Dr. Mukadder Erdönmez, Dr. Christian Hermelingmeier, Dr Dirk Höring, David Hulin, Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt

Assurance AC 2025 2/2



Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92085 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 – RE/CT

HDI Global SE
Tour Trinity
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92085 Paris La Défense Cedex
Tél. : +33 1 44 05 56 00 – Fax : +33 1 44 05 56 66

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register: Sitz Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219828782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutler,
Dr. Mukadder Erdönmez, Dr. Christian Hermelingmeier, Dr Dirk Höring, David Hulin, Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt

Attestation AC 2025



ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscriptrice d'une **assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

ENVIRONNEMENT
AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
Tél. 04 77 44 92 44

LCP – 25 Avenue Léonard de Vinci – 33600 PESSAC - 1315



LCP CERTIFICATION DE PERSONNES

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°1315

MONSIEUR BOUCHER Eric

Amiante sans mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Amiante** Date d'effet : 08/12/2022 : - Date d'expiration : 07/12/2029
Amiante avec mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Missions spécifiques, bâtiments complexes** Date d'effet : 08/12/2022 : - Date d'expiration : 07/12/2029
DPE individuel Selon arrêté du 20 juillet 2023	**Diagnostic de performances énergétiques** Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 07/12/2029
Electricité Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Etat de l'installation intérieure électricité** Date d'effet : 08/12/2022 : - Date d'expiration : 07/12/2029
Gaz Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Etat de l'installation intérieure gaz** Date d'effet : 08/12/2022 : - Date d'expiration : 07/12/2029
Plomb sans mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Constat du risque d'exposition au plomb** Date d'effet : 08/12/2022 : - Date d'expiration : 07/12/2029
Termites métropole Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments** Date d'effet : 08/12/2022 : - Date d'expiration : 07/12/2029

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 02/09/2024, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – Technoparc Europarc – 33600 PESSAC
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 - Code APE : 7022 Z
En 4870 LE CERTIFICAT V013 du 01-09-2024

cofrac Accréditation N° 4-0350 Portée disponible sur www.cofrac.fr
CERTIFICATION DE PERSONNES
