
PLANNING CASERNE PAOLI BASTIA
INDICE 04

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**PERIODE DE PREPARATION**	**30 jrs**	**Lun 15/02/27**	**Ven 26/03/27**
2	**Préparation de chantier**	**30 jrs**	**Lun 15/02/27**	**Ven 26/03/27**
3	Approvisonnement VENTILATION et SOLA	20 jrs	Lun 15/02/27	Ven 12/03/27
4	Approvisonnement CHAUFFAGE CLIM	30 jrs	Lun 15/02/27	Ven 26/03/27
5	Plan EXE	10 jrs	Lun 15/02/27	Ven 26/02/27
6	Instalation de chantier	22 jrs	Lun 15/02/27	Mar 16/03/27
7				
8	**CHAUFFAGE CLIM**	**138 jrs**	**Lun 22/03/27**	**Mer 29/09/27**
9	**Bâtiment 7. 3 Equipes de 2 personnes**	**10 jrs**	**Lun 22/03/27**	**Ven 02/04/27**
10	Consignations/Percements intégrations	3 jrs	Lun 22/03/27	Mer 24/03/27
11	Intégration réseaux frigo/elec	3 jrs	Jeu 25/03/27	Lun 29/03/27
12	Pose appareillages et caissons	4 jrs	Mar 30/03/27	Ven 02/04/27
13				
14	**Bâtiment 4. 3 Equipes de 2 personnes**	**66 jrs**	**Mer 30/06/27**	**Mer 29/09/27**
15	Consignations/Percements intégrations	16 jrs	Mer 30/06/27	Mer 21/07/27
16	intégration réseaux frigo/élec	25 jrs	Jeu 22/07/27	Mer 25/08/27
17	Pose appareillages et caissons	25 jrs	Jeu 26/08/27	Mer 29/09/27
18				
19	**Bâtiment 5. 3 Equipes de 2 personnes**	**31 jrs**	**Lun 05/04/27**	**Lun 17/05/27**
20	Consignations/percements intégrations	7 jrs	Lun 05/04/27	Mar 13/04/27
21	intégration réseaux frigo/élec	12 jrs	Mer 14/04/27	Jeu 29/04/27
22	Pose appareillages et caissons	12 jrs	Ven 30/04/27	Lun 17/05/27
23				
24	**Bâtiment 6. 3 Equipes de 2 personnes**	**31 jrs**	**Mar 18/05/27**	**Mar 29/06/27**
25	Consignations/percements intégrations	7 jrs	Mar 18/05/27	Mer 26/05/27
26	intégration réseaux frigo/élec	12 jrs	Jeu 27/05/27	Ven 11/06/27
27	Pose appareillages et caissons	12 jrs	Lun 14/06/27	Mar 29/06/27
28				
29	**VENTILATION BASSE PRESSION**	**101 jrs**	**Lun 15/02/27**	**Lun 05/07/27**
30	**Bâtiment 7. 2 Equipes de 2 personnes**	**9 jrs**	**Lun 15/02/27**	**Jeu 25/02/27**
31	Installations en toiture	3 jrs	Lun 15/02/27	Mer 17/02/27
32	Intégration réseaux	3 jrs	Jeu 18/02/27	Lun 22/02/27
33	Pose appareillages et caissons	3 jrs	Mar 23/02/27	Jeu 25/02/27
34				
35	**Bâtiment 4. 2 Equipes de 2 personnes**	**50 jrs**	**Mar 27/04/27**	**Lun 05/07/27**
36	Installations en toiture	18 jrs	Mar 27/04/27	Jeu 20/05/27
37	intégration réseaux	16 jrs	Ven 21/05/27	Ven 11/06/27
38	Pose appareillages et caissons	16 jrs	Lun 14/06/27	Lun 05/07/27
39				
40	**Bâtiment 5. 2 Equipes de 2 personnes**	**21 jrs**	**Ven 26/02/27**	**Ven 26/03/27**
41	Installations en toiture	7 jrs	Ven 26/02/27	Lun 08/03/27
42	intégration réseaux	7 jrs	Mar 09/03/27	Mer 17/03/27
43	Pose appareillages et caissons	7 jrs	Jeu 18/03/27	Ven 26/03/27
44				
45	**Bâtiment 6. 2 Equipes de 2 personnes**	**21 jrs**	**Lun 29/03/27**	**Lun 26/04/27**
46	Installations en toiture	7 jrs	Lun 29/03/27	Mar 06/04/27
47	intégration réseaux	7 jrs	Mer 07/04/27	Jeu 15/04/27
48	Pose appareillages et caissons	7 jrs	Ven 16/04/27	Lun 26/04/27
49				
50	**PRODUCTION EAU CHAUDE SOLAIRE THERM**	**78 jrs**	**Mer 03/03/27**	**Ven 18/06/27**
51	**Bâtiment 7. 1 Equipe de 3 personnes**	**9 jrs**	**Mer 03/03/27**	**Lun 15/03/27**
52	Installations en toiture	3 jrs	Mer 03/03/27	Ven 05/03/27
53	Installations sous-sols	3 jrs	Lun 08/03/27	Mer 10/03/27
54	Liaisons fluides	3 jrs	Jeu 11/03/27	Lun 15/03/27
55				
56	**Bâtiment 4. 1 Equipe de 3 personnes**	**36 jrs**	**Ven 30/04/27**	**Ven 18/06/27**
57	Installations en toiture	12 jrs	Ven 30/04/27	Lun 17/05/27
58	Installations sous-sols	12 jrs	Mar 18/05/27	Mer 02/06/27
59	Liaisons fluides	12 jrs	Jeu 03/06/27	Ven 18/06/27
60				
61	**Bâtiment 5. 1 Equipe de 3 personnes**	**21 jrs**	**Jeu 11/03/27**	**Jeu 08/04/27**
62	Installations en toiture	7 jrs	Jeu 11/03/27	Ven 19/03/27
63	Installations sous-sols	7 jrs	Lun 22/03/27	Mar 30/03/27
64	Liaisons fluides	7 jrs	Mer 31/03/27	Jeu 08/04/27
65				
66	**Bâtiment 6. 1 Equipe de 2 personnes**	**21 jrs**	**Mar 06/04/27**	**Mar 04/05/27**
67	Installations en toiture	7 jrs	Mar 06/04/27	Mer 14/04/27
68	Installations sous-sols	7 jrs	Jeu 15/04/27	Ven 23/04/27
69	Liaisons fluides	7 jrs	Lun 26/04/27	Mar 04/05/27

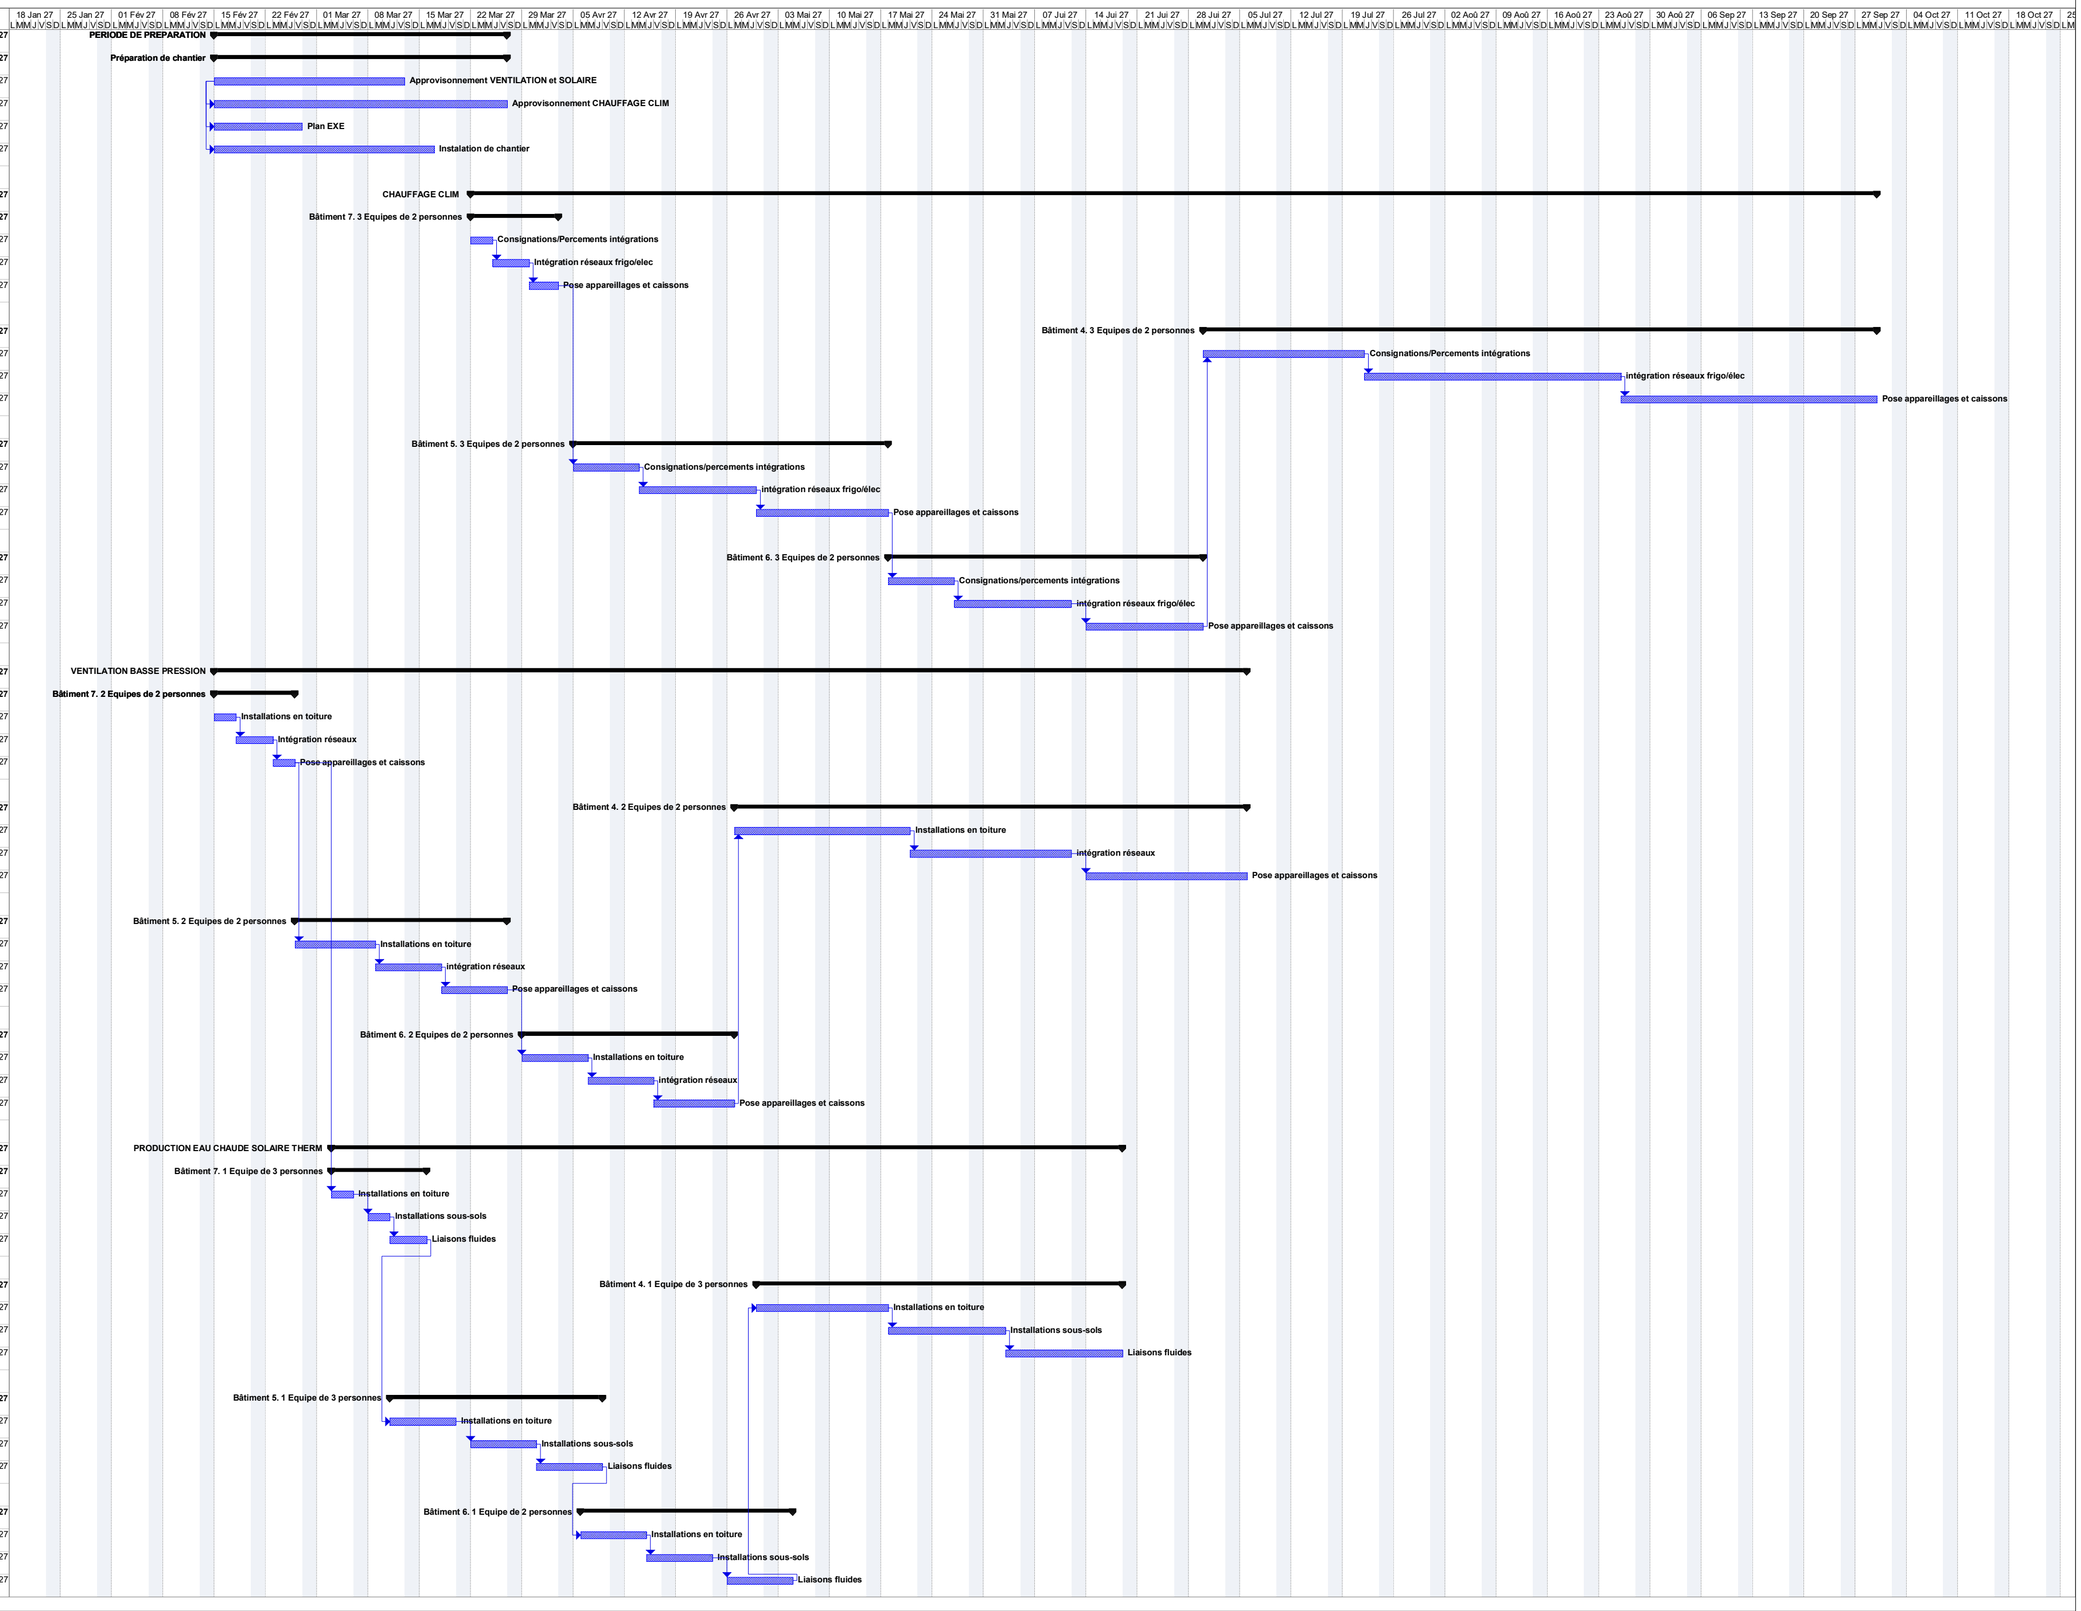

Projet : CASERNE PAOLI BASTIA
Date : Lun 14/09/26

Tâche, Fractionnement, Jalon, Récapitulative, Récapitulatif du projet, Tâches externes, Jalons externes, Tâche inactive, Jalon inactif, Récapitulatif inactif, Tâche manuelle, Durée uniquement, Report récapitulatif manuel, Récapitulatif manuel, Début uniquement, Fin uniquement, Tâches externes, Jalons externes, Avancement, Échéance

REDACTEUR: FREDERIC GRAZIANI
AOUT 2026
