BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
GEP RAA
Rue du bois joli
CS90002
63801 COURNON D'AUVERGNE

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 29474708/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 31/12/2025

Référence au programme de travaux :
Mail client Mail du 06/10 réalisé le 06/10/2025 par M. Albert PANTANELLA

DONNEUR D'ORDRE

ESID DE LYON

Albert PANTANELLA
LIEU-DIT LES GRAVANCHES
QUARTIER LT COLONEL DE LA BLANCHARDIER
MAGASIN
63000 CLERMONT-FERRAND

SITE D'INTERVENTION

USID CLERMONT FERRAND - Antenne CLERMONT-FERRAND
LIEU-DIT LES GRAVANCHES
63000 CLERMONT-FERRAND
0036
Code site : 630113003N
Latitude : 45.790100 / Longitude : 3.119400

Date(s) d'intervention(s) :
Le 16/12/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION

SANS AMIANTE repéré

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Ludovic FRANCOIS	Chargé d'affaires	Certification N° 13777640	Ludovic FRANCOIS

Le présent rapport comporte 33 pages, dont 22 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

Copyright BUREAU VERITAS

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION **3**
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 5

2. CONCLUSIONS **6**
2.1. Obligations réglementaires 7

3. INFORMATIONS GENERALES **8**
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 8
3.2. Parties prenantes 8

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE **8**
4.1. Références réglementaires 8

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE **9**
5.1. Date(s) de visite(s) 9
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 9
5.3. Conditions spécifiques 9
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 9

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **10**
6.1. Matériaux et produits repérés 10

7. ANNEXES **12**
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 12
7.2. Photos prélèvements 13
7.3. Photos observations 17
7.4. Attestation d'assurance 18
7.5. Certificat de compétence 20
7.6. Croquis de repérage 21
7.7. Rapport d'analyse du laboratoire 23

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Création d'une fosse, création d'une ouverture vers l'extérieur et suppression du local / bureau

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la façade	Conduits, Elements ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Primaires d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Peintures, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutrements, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutrements, Ossature, Rebouchages, Volets

1.3. Périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Zone atelier

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : USID CLERMONT FERRAND - Antenne CLERMONT-FERRAND
LIEU-DIT LES GRAVANCHES
63000 CLERMONT-FERRAND

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
USID CLERMONT FERRAND - Antenne CLERMONT-FERRAND	Industrie	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Albert PANTANELLA	Donneur d'ordre	ESID DE LYON	LIEU-DIT LES GRAVANCHES QUARTIER LT COLONEL DE LA BLANCHARDIERE MAGASIN 63000 CLERMONT-FERRAND	06.04.47.28.63

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 16/12/2025

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Mail client	M. Albert PANTANELLA	06/10/2025	Mail du 06/10	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 036 Atelier avt tx	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	Gris	1	P1* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Jaune	2	P2* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Jaune	2	P3 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Peintures de sol	Epais	Beige	3	P4* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Peintures de sol	Epais	Beige	3	P5 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	4	P6* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	4	P7 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	5	P8* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 036 Atelier avt tx	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	5	P9 N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Epais	Beige	6	P10* N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Epais	Beige	6	P11 N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Isolant	Laine de verre	Jaune	9	P16* N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Isolant	Laine de verre	Jaune	9	P17 N	/	AN	/	Non
	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Panneaux	Métallique, Peint	Beige	10	P18* N	/	AN	/	Non
	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Panneaux	Métallique, Peint	Beige	10	P19 N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Joints de dilatation	Mastic	Gris	7	P12* N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Joints de dilatation	Mastic	Gris	7	P13 N	/	AN	/	Non
	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Gris	8	P14* N	/	AN	Rondelle de bardage	Non
	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Gris	8	P15 N	/	AN	Rondelle de bardage	Non

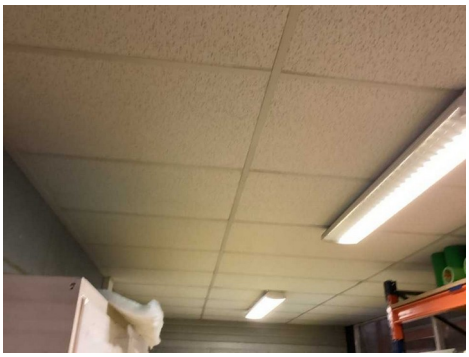
7. ANNEXES

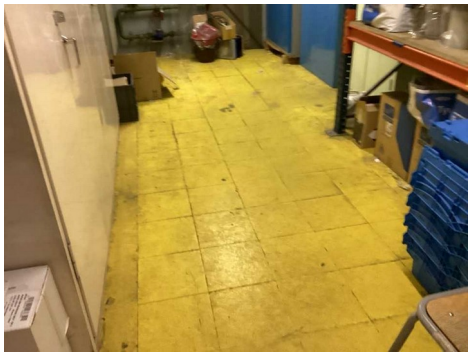
7.1. Parties d’immeuble bâti visitées

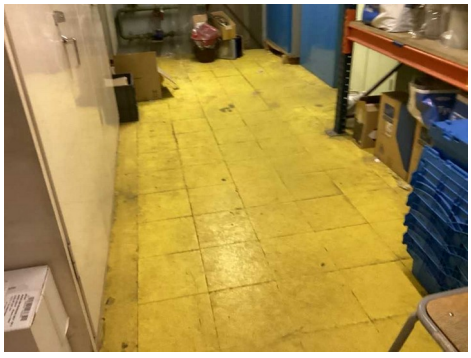
La liste ci-dessous présente les parties d’immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
BAT 036 Atelier avt tx	/

7.2. Photos prélèvements

P1	ZPSO 1
BAT 036 Atelier avt tx	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P2	ZPSO 2
BAT 036 Atelier avt tx	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol	

P3	ZPSO 2
BAT 036 Atelier avt tx	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol	

P4	ZPSO 3
BAT 036 Atelier avt tx	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol	

P5	ZPSO 3
BAT 036 Atelier avt tx	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol	

P6	ZPSO 4
BAT 036 Atelier avt tx	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P7	ZPSO 4
BAT 036 Atelier avt tx	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P8	ZPSO 5
BAT 036 Atelier avt tx	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P9	ZPSO 5
BAT 036 Atelier avt tx	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P10	ZPSO 6
BAT 036 Atelier avt tx	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P11	ZPSO 6
BAT 036 Atelier avt tx	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P12	ZPSO 7
BAT 036 Atelier avt tx	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Joints de dilatation	

P13	ZPSO 7
BAT 036 Atelier avt tx	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Joints de dilatation	

P14	ZPSO 8
BAT 036 Atelier avt tx	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Joints d'étanchéité	

P15	ZPSO 8
BAT 036 Atelier avt tx	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Joints d'étanchéité	

P16	ZPSO 9
BAT 036 Atelier avt tx	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Isolant	

P17	ZPSO 9
BAT 036 Atelier avt tx	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Isolant	

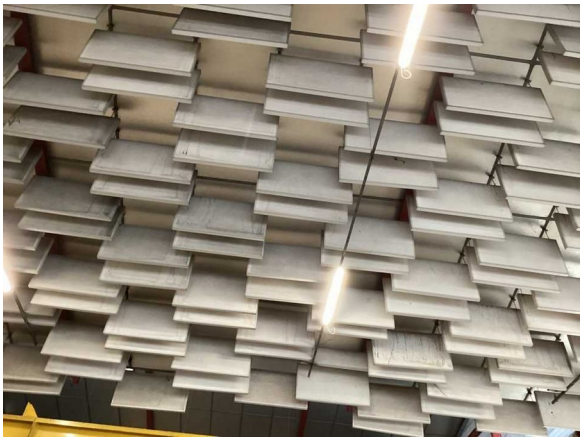
P18	ZPSO 10
BAT 036 Atelier avt tx	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Panneaux (Liste B)	

Copyright BUREAU VERITAS

P19	ZPSO 10
BAT 036 Atelier avt tx	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Panneaux (Liste B)	

7.3. Photos observations

BAT 036 Atelier avt tx	OBS 1
04 - Plafonds et faux plafonds	
Faux plafonds	



Observation :

Plafond et faux plafond non concernés par les travaux

7.4. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :
- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :
- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Allianz

Autres missions :
- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Signé par: Juliette Allavoine
E-mail: juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature: 07-01-2025 10:12:02
Adresse IP: 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.5. Certificat de compétence



BUREAU VERITAS
Certification

Certificat

Attribué à

Ludovic FRANCOIS

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	30/06/2022	29/06/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	30/06/2022	29/06/2029

Date :06/07/2022

Numéro de certificat : 13777640

Laurent Croguennec, Président

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0067

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/verification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX

7.6. Croquis de repérage

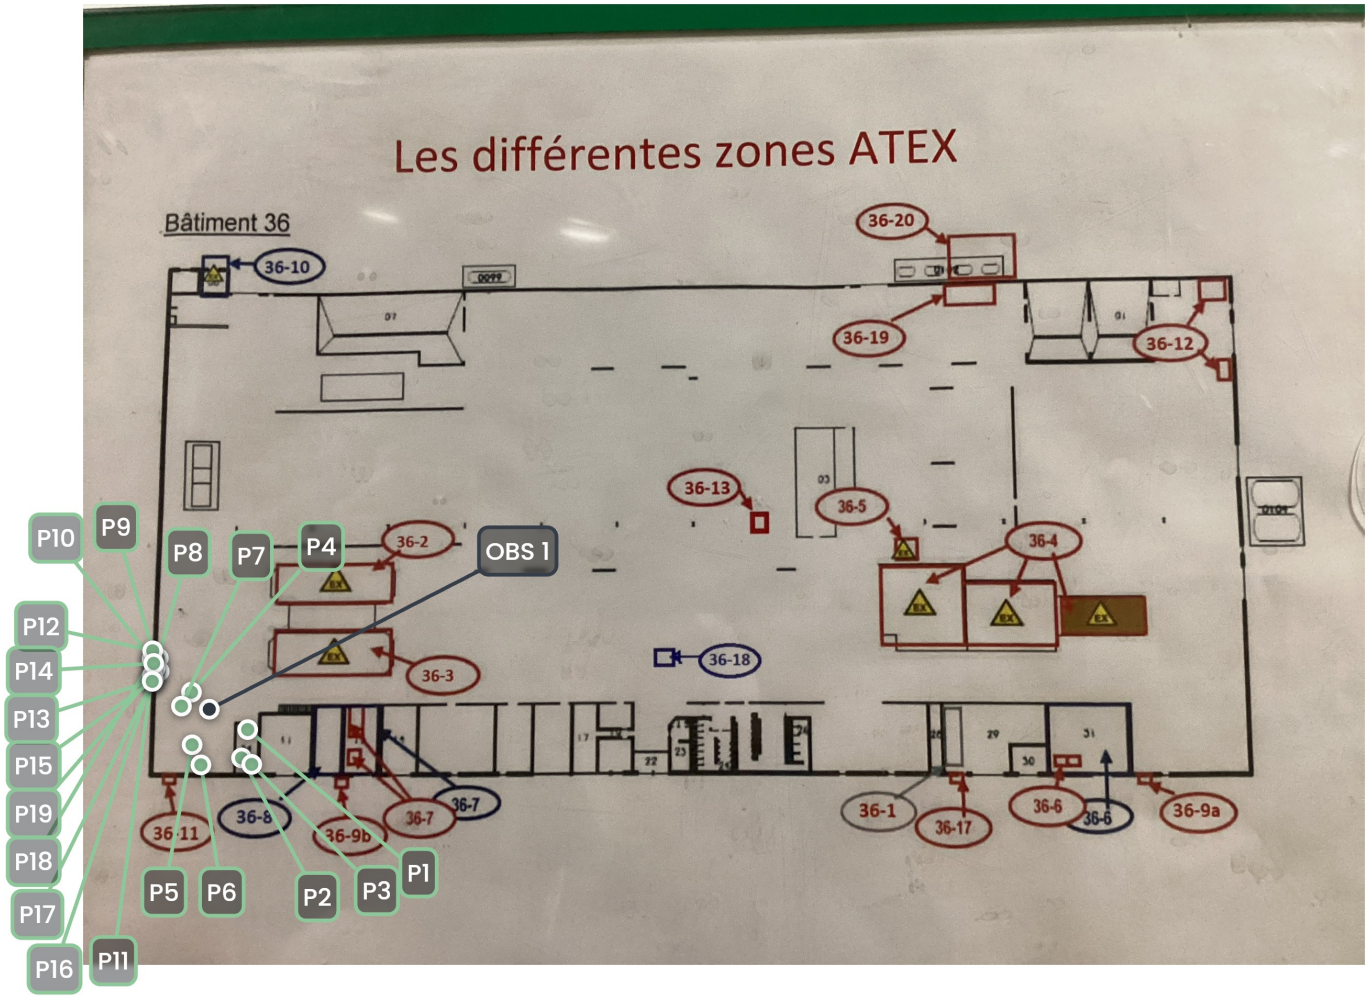
PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	USID CLERMONT FERRAND - Antenne CLERMONT-FERRAND LIEU-DIT LES GRAVANCHES 63000 CLERMONT-FERRAND	
Localisation BAT 036 Atelier avt tx	Date visite	Le 16/12/2025
	Auteur	Ludovic FRANCOIS
	N° dossier	29474708/S1/1
	Planche	1 / 1
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

7.7. Rapport d'analyse du laboratoire

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Ludovic FRANCOIS
Rue du Bois Jolie - CS 90002
63801 COURNON D'AUVERGNE CEDEX

Notre référence : AR-25-SG-069943-01

Numéro de dossier : 25Y034642
Référence de dossier : 1510797822/29474708/S1/1/1_29474708/1/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25Y034642-001 - Référence *BV3KC9113 Réf. Prel : P1 BAT 036 Atelier avt tx/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Fibreux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034642-002 - Référence *BV3KC9114 Réf. Prel : P2 BAT 036 Atelier avt tx/Revêtements de sol : Peintures de sol - (Décoratif/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034642-003 - Référence *BV3KC9115 Réf. Prel : P3 BAT 036 Atelier avt tx/Revêtements de sol : Peintures de sol - (Décoratif/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034642-004 - Référence *BV3KC9116 Réf. Prel : P4 BAT 036 Atelier avt tx/Revêtements de sol : Peintures de sol - (Epais/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034642-005 - Référence *BV3KC9117 Réf. Prel : P5 BAT 036 Atelier avt tx/Revêtements de sol : Peintures de sol - (Epais/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034642-006 - Référence *BV3KC9118 Réf. Prel : P6 BAT 036 Atelier avt tx/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034642-007 - Référence *BV3KC9119 Réf. Prel : P7 BAT 036 Atelier avt tx/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034642-008 - Référence *BV3KC9120 Réf. Prel : P8 BAT 036 Atelier avt tx/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034642-009 - Référence *BV3KC9121 Réf. Prel : P9 BAT 036 Atelier avt tx/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034642-010 - Référence *BV3KC9122 Réf. Prel : P10 BAT 036 Atelier avt tx/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Epais/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034642-011 - Référence *BV3KC9123 Réf. Prel : P11 BAT 036 Atelier avt tx/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Epais/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034642-012 - Référence *BV3KC9124 Réf. Prel : P12 BAT 036 Atelier avt tx/Façades lourdes y compris poteaux : Joints de dilatation - (Mastic/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034642-013 - Référence *BV3KC9125 Réf. Prel : P13 BAT 036 Atelier avt tx/Façades lourdes y compris poteaux : Joints de dilatation - (Mastic/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034642-014 - Référence *BV3KC9126 Réf. Prel : P14 BAT 036 Atelier avt tx/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs : Joints d'étanchéité - (Caoutchouc/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034642-015 - Référence *BV3KC9127 Réf. Prel : P15 BAT 036 Atelier avt tx/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs : Joints d'étanchéité - (Caoutchouc/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034642-016 - Référence *BV3KC9128 Réf. Prel : P16 BAT 036 Atelier avt tx/Façades lourdes y compris poteaux : Isolant - (Laine de verre/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034642-017 - Référence *BV3KC9129 Réf. Prel : P17 BAT 036 Atelier avt tx/Façades lourdes y compris poteaux : Isolant - (Laine de verre/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034642-018 - Référence *BV3KC9130 Réf. Prel : P18 BAT 036 Atelier avt tx/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs : Panneaux (Liste B) - (Métallique, Peint/Beige)*, prélevé pa vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034642-019 - Référence *BV3KC9131 Réf. Prel : P19 BAT 036 Atelier avt tx/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs : Panneaux (Liste B) - (Métallique, Peint/Beige)*, prélevé pa vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD EST SAS
Referent Sous Traitant
2 Rue Chanoine Ploton
42000 Saint-Etienne

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-078656-01
Référence laboratoire N° : 25EK069615
Reçu au laboratoire le : 19/12/2025
Date d'analyse : 23/12/2025
Référence dossier Client:25Y034642 - 1510797822/29474708/S1/1/1_29474708/1/1

Date d'émission de rapport : 23/12/2025 19:25
Référence de suivi du dossier N° : 25Y034642
Date de réception :18/12/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25Y034642-001 - BV3KC9113 Réf. Prel : P1 BAT 036 Atelier avt tx/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Fibreux/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	**MET** / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25Y034642-002 - BV3KC9114 Réf. Prel : P2 BAT 036 Atelier avt tx/Revêtements de sol : Peintures de sol - (Décoratif/Jaune)	Matériau de type peinture matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	25Y034642-003 - BV3KC9115 Réf. Prel : P3 BAT 036 Atelier avt tx/Revêtements de sol : Peintures de sol - (Décoratif/Jaune)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	25Y034642-004 - BV3KC9116 Réf. Prel : P4 BAT 036 Atelier avt tx/Revêtements de sol : Peintures de sol - (Epais/Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-078656-01
Référence laboratoire N° : 25EK069615
Reçu au laboratoire le : 19/12/2025
Date d'analyse : 23/12/2025
Référence dossier Client:25Y034642 - 1510797822/29474708/S1/1/1_29474708/1/1

Date d'émission de rapport : 23/12/2025 19:25
Référence de suivi du dossier N° : 25Y034642
Date de réception :18/12/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	25Y034642-005 - BV3KC9117 Réf. Prel : P5 BAT 036 Atelier avt tx/Revêtements de sol : Peintures de sol - (Epais/Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau (gris)	**MET** / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25Y034642-006 - BV3KC9118 Réf. Prel : P6 BAT 036 Atelier avt tx/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (marron)	**MET** / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25Y034642-007 - BV3KC9119 Réf. Prel : P7 BAT 036 Atelier avt tx/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (marron)	**MET** / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-078656-01
Référence laboratoire N° : 25EK069615
Reçu au laboratoire le : 19/12/2025
Date d'analyse : 23/12/2025
Référence dossier Client:25Y034642 - 1510797822/29474708/S1/1/1_29474708/1/1

Date d'émission de rapport : 23/12/2025 19:25
Référence de suivi du dossier N° : 25Y034642
Date de réception :18/12/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	25Y034642-008 - BV3KC9120 Réf. Prel : P8 BAT 036 Atelier avt tx/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	25Y034642-009 - BV3KC9121 Réf. Prel : P9 BAT 036 Atelier avt tx/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25Y034642-010 - BV3KC9122 Réf. Prel : P10 BAT 036 Atelier avt tx/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Epais/Beige)	Matériau semi-dur de type enduit (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-078656-01
Référence laboratoire N° : 25EK069615
Reçu au laboratoire le : 19/12/2025
Date d'analyse : 23/12/2025
Date d'émission de rapport : 23/12/2025 19:25
Référence de suivi du dossier N° : 25Y034642
Date de réception :18/12/2025

Référence dossier Client:25Y034642 - 1510797822/29474708/S1/1/1_29474708/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	25Y034642-011 - BV3KC9123 Réf. Prel : P11 BAT 036 Atelier av tx/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Epais/Beige)	Matériau semi-dur de type enduit (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	25Y034642-012 - BV3KC9124 Réf. Prel : P12 BAT 036 Atelier avt tx/Façades lourdes y compris poteaux : Joints de dilatation - (Mastic/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple de type mastic (gris)	**MET** / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	25Y034642-013 - BV3KC9125 Réf. Prel : P13 BAT 036 Atelier avt tx/Façades lourdes y compris poteaux : Joints de dilatation - (Mastic/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type mastic (gris)	**MET** / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014 (1)	25Y034642-014 - BV3KC9126 Réf. Prel : P14 BAT 036 Atelier avt tx/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs : Joints d''étanchéité - (Caoutchouc/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (gris)	**MET** / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-078656-01 | Date d'émission de rapport : 23/12/2025 19:25 |
Référence laboratoire N° : 25EK069615 | Référence de suivi du dossier N° : 25Y034642
Reçu au laboratoire le : 19/12/2025 | Date de réception :18/12/2025
Date d'analyse : 23/12/2025
Référence dossier Client:25Y034642 - 1510797822/29474708/S1/1/1_29474708/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015 (1)	25Y034642-015 - BV3KC9127 Réf. Prel : P15 BAT 036 Atelier avt tx/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs : Joints d''étanchéité - (Caoutchouc/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (gris)	**MET** / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016 (2)	25Y034642-016 - BV3KC9128 Réf. Prel : P16 BAT 036 Atelier avt tx/Façades lourdes y compris poteaux : Isolant - (Laine de verre/Jaune)	Matériau fibreux de type isolant (beige)	**MOLP** / Y65V	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
017 (2)	25Y034642-017 - BV3KC9129 Réf. Prel : P17 BAT 036 Atelier avt tx/Façades lourdes y compris poteaux : Isolant - (Laine de verre/Jaune)	Matériau fibreux de type isolant (beige)	**MOLP** / Y65V	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
018 (1)	25Y034642-018 - BV3KC9130 Réf. Prel : P18 BAT 036 Atelier avt tx/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs : Panneaux (Liste B) - (Métallique, Peint/Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (marron)	**MET** / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-078656-01 | Date d'émission de rapport : 23/12/2025 19:25 |
Référence laboratoire N° : 25EK069615 | Référence de suivi du dossier N° : 25Y034642
Reçu au laboratoire le : 19/12/2025 | Date de réception :18/12/2025
Date d'analyse : 23/12/2025
Référence dossier Client:25Y034642 - 1510797822/29474708/S1/1/1_29474708/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019 (1)	25Y034642-019 - BV3KC9131 Réf. Prel : P19 BAT 036 Atelier avt tx/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs : Panneaux (Liste B) - (Métallique, Peint/Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (marron)	**MET** / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) L'échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.

(2) Un matériau (pulvérulent) (noir) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 9.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-078656-01 | Date d'émission de rapport : 23/12/2025 19:25 |
Référence laboratoire N° : 25EK069615 | Référence de suivi du dossier N° : 25Y034642
Reçu au laboratoire le : 19/12/2025 | Date de réception :18/12/2025
Date d'analyse : 23/12/2025
Référence dossier Client:25Y034642 - 1510797822/29474708/S1/1/1_29474708/1/1

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.
NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/.
NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Beatriz Monteiro
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios
