APAVE
AGENCE DE LA ROCHE SUR YON
Rue Jacques Yves Cousteau ZA de Beaupuy
85036 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
N° SIRET : 90386907100287

DONNEUR D'ORDRE
CHD VENDEE
BOULEVARD STEPHANE MOREAU
85000 LA ROCHE-SUR-YON
CONTACT : **Madame RABILLER**

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuelles versions précédentes



Numéro d'offre **: 3596731**
Numéro de contrat : **C2630253**
Numéro de de tâche : **T260491840**
Date d'émission du rapport : **14/09/2026**

Rapport N° :
C2630253 _147107 _CHD VENDEE _amiante avant travaux

Lieu d'intervention :
Zone de stockage / Logistique N-2
boulevard STEPHANE MOREAU
85000 LA ROCHE-SUR-YON

Destinataire rapport :
CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES

Date d'intervention :
26/08/2026

Intervenant : **Monsieur Guillaume MANDIN**

Signature :

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 51 pages

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse :	**Zone de stockage / Logistique N-2 boulevard STEPHANE MOREAU 85000 LA ROCHE-SUR-YON**	Numéro de Lot :	
		Référence Cadastrale :	**Non communiqué**
		Date du Permis de Construire :	**Antérieur au 1er juillet 1997**
Étage :		Date de construction :	**Non communiquée**
Bâtiment :			
Nature du bâtiment :	**Bâtiment**		

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	**CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES**
Adresse :	**BOULEVARD STEPHANE MOREAU 85000 LA ROCHE-SUR-YON**

DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE

Nom :	**CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES**
Adresse :	**BOULEVARD STEPHANE MOREAU 85000 LA ROCHE-SUR-YON**

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par :	**MANDIN Guillaume**	Laboratoire d'Analyses :	**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest**
N° certification :	**CPDI5520**	Adresse laboratoire :	**7 rue Pierre Adolphe Bobierre - BP 44300 44300 Nantes Cedex 3**
Date d'obtention :	**28/02/2022**	Numéro d'accréditation :	**1-5597**
Organisme :	**I.CERT**		
Adresse :		Organisme d'assurance professionnelle :	**Allianz Global Corporate & Specialty SE**
		Adresse assurance :	**1 cours Michelet - CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex**
Date de la commande :	**07/09/2026**	N° de contrat d'assurance :	**FRL003861**
Accompagnateur :	**Aucun**	Date de validité :	**31/12/2026**

1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Nature des travaux envisagés : Passage Réseau de sprinklage.

1.5 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES 2
DESIGNATION DU BATIMENT 2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE 2
DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE 2
EXÉCUTION DE LA MISSION 2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE 2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT 2

RESULTATS DU REPERAGE 4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX 4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE 4

INVESTIGATIONS NON REALISEES 7
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE 7
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE 7

COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION 7
OBJECTIF 7
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES 8
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 8

PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION 9
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE 9
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE 9

RAPPORT(S) ANTERIEUR(S) 12

OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI 12

PRECONISATIONS 13

ANNEXE : CROQUIS 14

ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 16

ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSES 32

ANNEXE : TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES 46

ANNEXE : CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE 48

ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE 49

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS 50

2. RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Absence

2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R-2	Circulation 1	Revêtement de murs	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P1)	S001	Z001
		Revêtement de murs	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P2)	S002	Z002
		Revêtements de plafond	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P3)	S003	Z003
R-2	Pièce 1	Revêtement de murs	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P4)	S004	Z004
		Revêtements de plafond	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P8)	S008	Z008
		Revêtement de murs	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P6)	S006	Z006
		Revêtement de murs	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P7)	S007	Z007
		Revêtement de murs	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P5)	S005	Z005
R-2	Pièce 2	Revêtement de murs	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P4 - idem)	S031	Z004
		Revêtements de plafond	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P8 - idem)	S035	Z008
		Revêtement de murs	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P5 - idem)	S032	Z005
		Revêtement de murs	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P6 - idem)	S033	Z006
		Revêtement de murs	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P7 - idem)	S034	Z007
R-2	Pièce 3	Revêtement de murs	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P9 - idem)	S036	Z009
		Revêtements de plafond	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P13 - idem)	S040	Z013
		Revêtement de murs	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P10 - idem)	S037	Z010
		Revêtement de murs	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P11 - idem)	S038	Z011
		Revêtement de murs	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P12 - idem)	S039	Z012
R-2	Pièce 4	Revêtement de murs	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P9)	S009	Z009

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Revêtements de plafond	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P13)	S013	Z013
		Revêtement de murs	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P10)	S010	Z010
		Revêtement de murs	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P11)	S011	Z011
		Revêtement de murs	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P12)	S012	Z012
R-2	Pièce 5	Revêtement de murs	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P9 - idem)	S041	Z009
		Revêtements de plafond	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P13 - idem)	S045	Z013
		Revêtement de murs	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P10 - idem)	S042	Z010
		Revêtement de murs	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P11 - idem)	S043	Z011
		Revêtement de murs	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P12 - idem)	S044	Z012
R-2	Pièce 6	Revêtement de murs	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P9 - idem)	S046	Z009
		Revêtements de plafond	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P13 - idem)	S050	Z013
		Revêtement de murs	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P10 - idem)	S047	Z010
		Revêtement de murs	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P11 - idem)	S048	Z011
		Revêtement de murs	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P12 - idem)	S049	Z012
R-2	Pièce 7	Revêtement de murs	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P9 - idem)	S051	Z009
		Revêtements de plafond	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P13 - idem)	S055	Z013
		Revêtement de murs	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P10 - idem)	S052	Z010
		Revêtement de murs	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P11 - idem)	S053	Z011
		Revêtement de murs	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P12 - idem)	S054	Z012
R-2	Pièce 8	Revêtement de murs	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P14)	S014	Z014
		Revêtements de plafond	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P17)	S017	Z017
		Revêtement de murs	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P15)	S015	Z015
		Revêtement de	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse	S016	Z016

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		murs		(P16)		
R-2	Pièce 9	Revêtement de murs	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P14 - idem)	S056	Z014
		Revêtements de plafond	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P17 - idem)	S059	Z017
		Revêtement de murs	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P15 - idem)	S057	Z015
		Revêtement de murs	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P16 - idem)	S058	Z016
R-2	Pièce 10	Revêtement de murs	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P14 - idem)	S060	Z014
		Revêtements de plafond	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P17 - idem)	S063	Z017
		Revêtement de murs	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P15 - idem)	S061	Z015
		Revêtement de murs	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P16 - idem)	S062	Z016
R-2	Pièce 11	Revêtement de murs	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P20)	S020	Z020
		Revêtements de plafond	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P22)	S022	Z022
		Revêtement de murs	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P21)	S021	Z021
R-2	Pièce 12	Revêtement de murs	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P20 - idem)	S064	Z020
		Revêtements de plafond	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P22 - idem)	S066	Z022
		Revêtement de murs	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P21 - idem)	S065	Z021
R-2	Pièce 13	Revêtement de murs	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P23)	S023	Z023
		Revêtements de plafond	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P25)	S025	Z025
		Revêtement de murs	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P24)	S024	Z024
R-2	Pièce 14	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P26)	S026	Z026
		Revêtement de murs	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P23 - idem)	S067	Z023
		Revêtements de plafond	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P25 - idem)	S069	Z025
		Revêtement de murs	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P24 - idem)	S068	Z024
R-2	Pièce 15	Revêtement de murs	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P23 - idem)	S070	Z023

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Revêtements de plafond	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P25 - idem)	S072	Z025
		Revêtement de murs	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit	Résultat d'analyse (P24 - idem)	S071	Z024
R-2	Pièce 16	Revêtement de murs	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P20 - idem)	S073	Z020
		Revêtements de plafond	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P22 - idem)	S075	Z022
		Revêtement de murs	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P21 - idem)	S074	Z021
R-2	Pièce 17	Revêtement de murs	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P28)	S028	Z028
		Revêtements de plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P29)	S029	Z029
R-2	Circulation 2	Revêtement de murs	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P18)	S018	Z018
		Revêtement de murs	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P19)	S019	Z019
R-2	Circulation 3	Revêtement de murs	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P27)	S027	Z027
R-2	Circulation 4	Revêtement de murs	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P27 - idem)	S076	Z027
Extérieur	Zone de stockage	Revêtement de murs	Peinture + Enduit	Résultat d'analyse (P30)	S030	Z030

3. INVESTIGATIONS NON REALISEES

3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

4. COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,
Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,
Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,
Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

4.3 Conditions de réalisation du repérage

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet
26/08/0206	Repérage Amiante Avant Travaux

Documents remis :

Titre
Programme de travaux

Ecarts par rapport à la norme NF X 46-020 : Néant
Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de plénums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.
Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant
Commentaire : Néant

5. PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Référence du programme de travaux :
Nature des travaux envisagés : Passage Réseau de sprinklage.

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R-2	Circulation 1	**OUI**	
R-2	Pièce 1	**OUI**	
R-2	Pièce 2	**OUI**	
R-2	Pièce 3	**OUI**	
R-2	Pièce 4	**OUI**	
R-2	Pièce 5	**OUI**	
R-2	Pièce 6	**OUI**	
R-2	Pièce 7	**OUI**	
R-2	Pièce 8	**OUI**	
R-2	Pièce 9	**OUI**	
R-2	Pièce 10	**OUI**	
R-2	Pièce 11	**OUI**	
R-2	Pièce 12	**OUI**	
R-2	Pièce 13	**OUI**	
R-2	Pièce 14	**OUI**	
R-2	Pièce 15	**OUI**	
R-2	Pièce 16	**OUI**	
R-2	Pièce 17	**OUI**	
R-2	Circulation 2	**OUI**	
R-2	Circulation 3	**OUI**	
R-2	Circulation 4	**OUI**	
Extérieur	Zone de stockage	**OUI**	

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter	Matériau ou	Commentaire

construction	ou à sonder	Produit
2 - Parois verticales extérieures et Façades		
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	P
	Ardoises composites hors fibro ciment	P
	Ardoises en fibro ciment	P
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses	M
	Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures)	P
	Peintures des bardages métalliques	M
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés	M
	Carton-amiante	M
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M
	Revêtements plastiques épais (RPE)	M
	Peintures sur béton	M
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M
	Colles et joints (faience, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants	M
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire	P
	Garnissage des joints de dilatation	M
	Joints de dilatation	M
	Couvre-joints	P
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)	P
	Peintures décoratives	M
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation	P
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)	P
	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches	P
3 - Parois verticales intérieures		
Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu	M
	Fourreaux (carton, fibres-ciment…)	P
Poteaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibresciment, matériaux sandwich…), coffrages perdus	P
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Flocages	M
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M
	Bandes calicot	M
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M
	Sous couches des tissus muraux	P
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	P
Gaines et coffres verticaux	Flocages	M

	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Bandes calicot	M
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment, …)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	P
Portes coupe□feu, pare□flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)	P
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite	P
	Isolants intérieurs des portes	P
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures intumescentes	M
4 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds	Flocages	P
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Panneaux collés vissés ou cloués	P
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	M
	Bandes calicot	M
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	M
	Sous couches des tissus muraux	M
	Peintures intumescentes	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes…)	M
	Résines	M
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M
Poutres et charpentes	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibresciment, matériaux sandwich)	P
	Peintures intumescentes	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes…)	M
	Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	M
Gaines et coffres horizontaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
	Bandes calicot	P
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment, …)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	M
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux	P
	Pare vapeur	P
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P

	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P
Suspentes et contrevents	Flocages	M
	Protections en plâtre	M
	Peintures intumescentes	M
5 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sols	Dalles de sol	P
	Nez de marche	P
	Dalles moquettes avec entrecouche noire	P
	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	M
	Colles bitumineuses	M
	Colles non bitumineuses	M
	Moquette	M
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P
	Peintures de sol	M
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M
	Revêtements de sols sportifs	P
	Joints de dilatation et d'assemblage	P
	Joints de cantonnement sur faux planchers	P
	Enduit de cuvelage	M
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M

6. RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :
Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

7. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

8. PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.


Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

ANNEXE : CROQUIS

Planche de repérage

Client :	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	Titre :	Document 1
N° rapport :	T260491840		
N° planche :	1/1 Version : 0	Lieu d'intervention :	Zone de stockage / Logistique N-2 boulevard STEPHANE MOREAU 85000 LA ROCHE-SUR-YON
Type :	Croquis		
Date :	14/09/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	MANDIN Guillaume	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

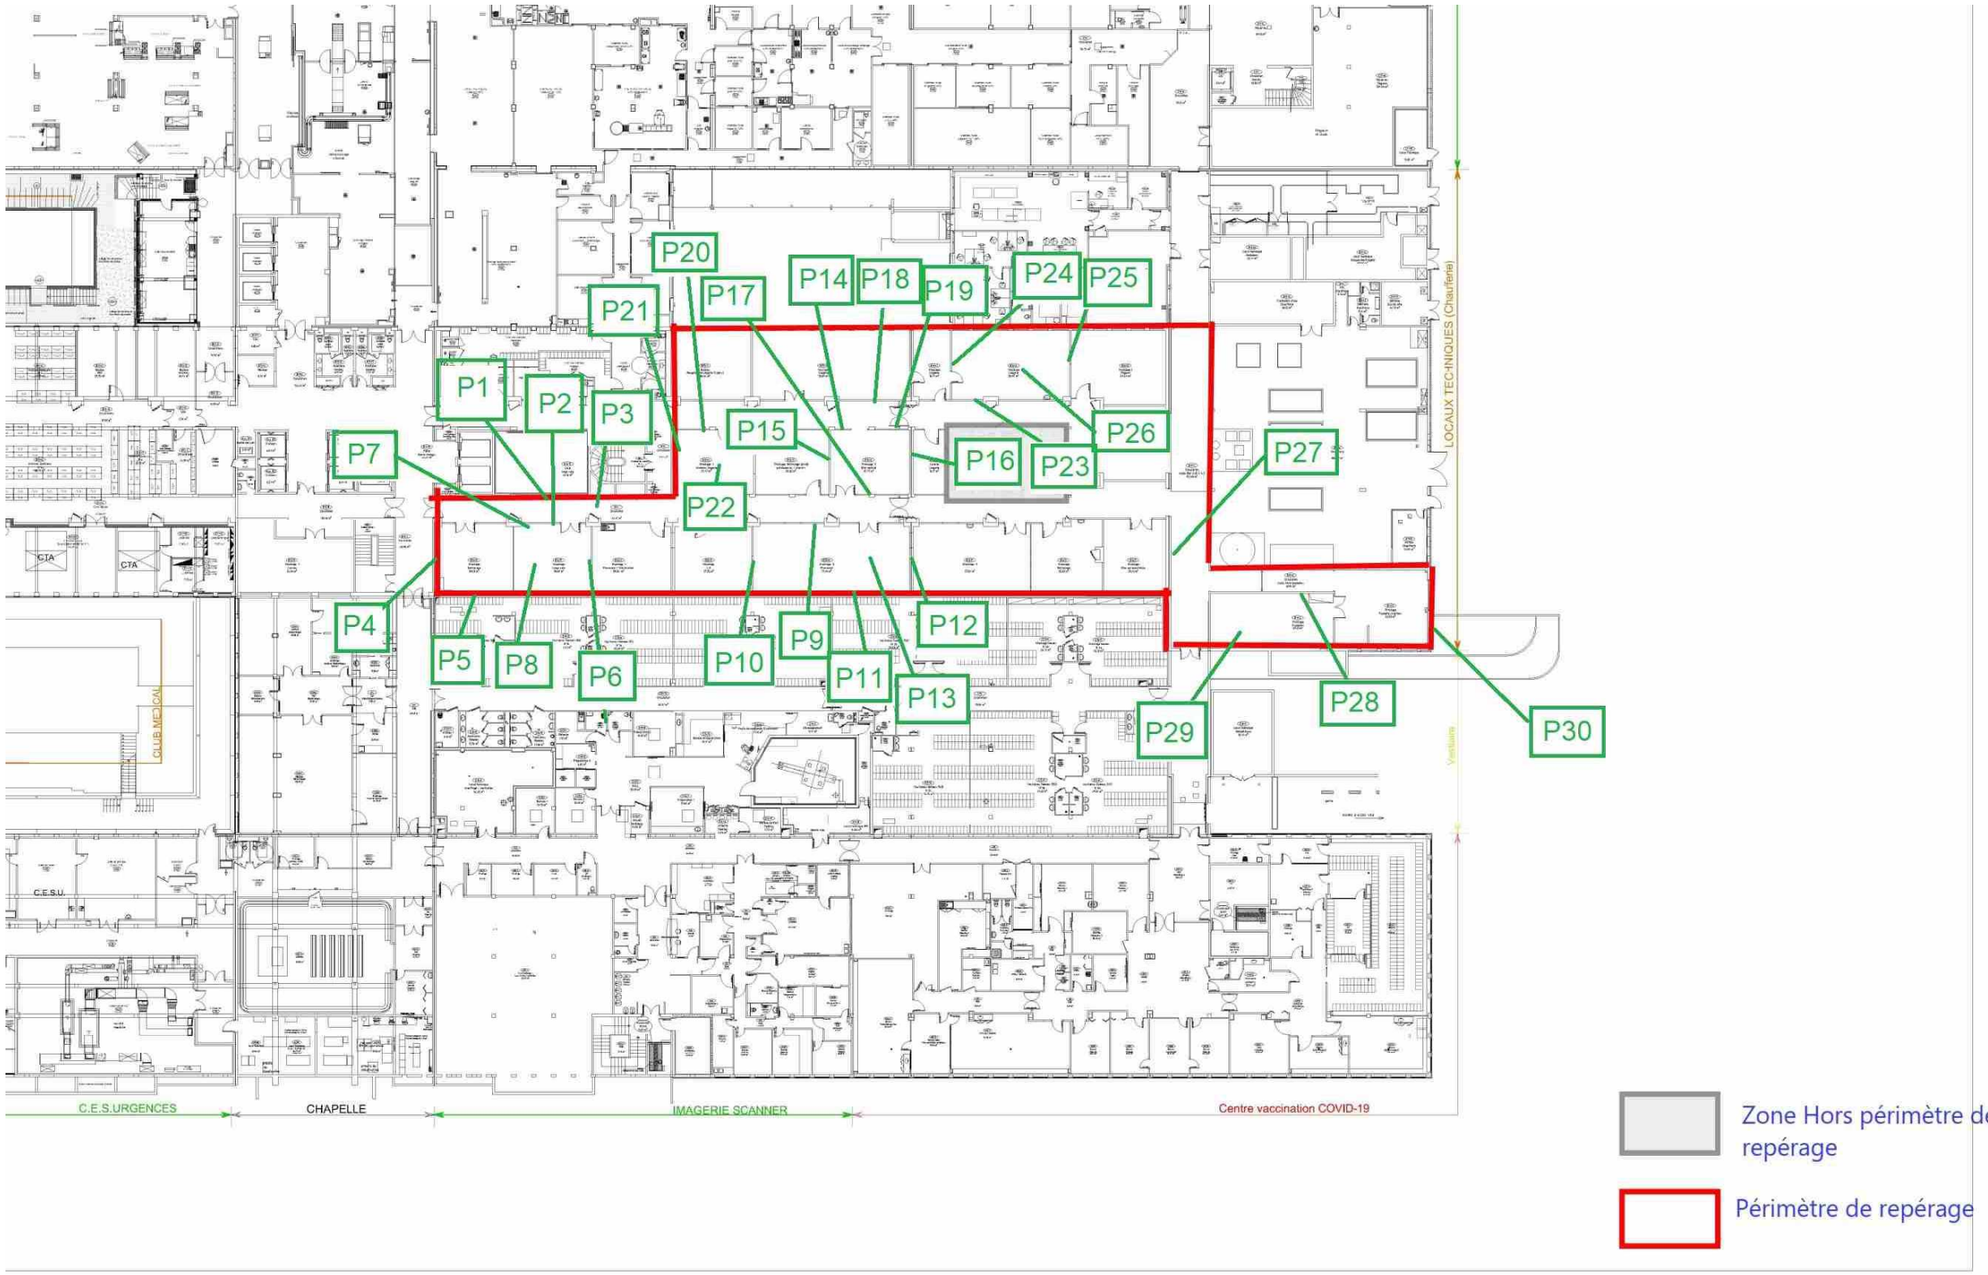

ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

PRELEVEMENT : P1

Matériau / Produit	**Peinture + Enduit**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	**Nom de l'opérateur**	MANDIN Guillaume
Numéro de dossier	C2630253	**Date de prélèvement**	26/08/2026
Pièce ou local	R-2 - Circulation 1	**Référence du sondage**	S001
Localisation	Revêtement de murs - Toutes zones		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Peinture + Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P2

Matériau / Produit	**Peinture + Enduit**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	**Nom de l'opérateur**	MANDIN Guillaume
Numéro de dossier	C2630253	**Date de prélèvement**	26/08/2026
Pièce ou local	R-2 - Circulation 1	**Référence du sondage**	S002
Localisation	Revêtement de murs - Toutes zones		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Peinture + Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P3

Matériau / Produit	**Peinture + Enduit**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	**Nom de l'opérateur**	MANDIN Guillaume
Numéro de dossier	C2630253	**Date de prélèvement**	26/08/2026
Pièce ou local	R-2 - Circulation 1	**Référence du sondage**	S003
Localisation	Revêtements de plafond - Toutes zones		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Peinture + Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P4

Matériau / Produit	**Peinture + Enduit**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	**Nom de l'opérateur**	MANDIN Guillaume
Numéro de dossier	C2630253	**Date de prélèvement**	26/08/2026
Pièce ou local	R-2 - Pièce 1	**Référence du sondage**	S004
Localisation	Revêtement de murs - Toutes zones		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Peinture + Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P5

Matériau / Produit	**Peinture + Enduit**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	**Nom de l'opérateur**	MANDIN Guillaume
Numéro de dossier	C2630253	**Date de prélèvement**	26/08/2026
Pièce ou local	R-2 - Pièce 1	**Référence du sondage**	S005
Localisation	Revêtement de murs - Toutes zones		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Peinture + Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P6

Matériau / Produit	**Peinture + Enduit**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	**Nom de l'opérateur**	MANDIN Guillaume
Numéro de dossier	C2630253	**Date de prélèvement**	26/08/2026
Pièce ou local	R-2 - Pièce 1	**Référence du sondage**	S006
Localisation	Revêtement de murs - Toutes zones		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Peinture + Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P7

Matériau / Produit	**Peinture + Enduit**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	**Nom de l'opérateur**	MANDIN Guillaume
Numéro de dossier	C2630253	**Date de prélèvement**	26/08/2026
Pièce ou local	R-2 - Pièce 1	**Référence du sondage**	S007
Localisation	Revêtement de murs - Toutes zones		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Peinture + Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P8

Matériau / Produit	Peinture + Enduit
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE

Emplacement



Nom du client	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	**Nom de l'opérateur**	MANDIN Guillaume
Numéro de dossier	C2630253	**Date de prélèvement**	26/08/2026
Pièce ou local	R-2 - Pièce 1	**Référence du sondage**	S008
Localisation	Revêtements de plafond - Toutes zones		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Peinture + Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P9

Matériau / Produit	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE

Emplacement



Nom du client	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	**Nom de l'opérateur**	MANDIN Guillaume
Numéro de dossier	C2630253	**Date de prélèvement**	26/08/2026
Pièce ou local	R-2 - Pièce 4	**Référence du sondage**	S009
Localisation	Revêtement de murs - Toutes zones		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Peinture + Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P10

Matériau / Produit	**Peinture Type "Gouttelette" + Enduit**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	**Nom de l'opérateur**	MANDIN Guillaume
Numéro de dossier	C2630253	**Date de prélèvement**	26/08/2026
Pièce ou local	R-2 - Pièce 4	**Référence du sondage**	S010
Localisation	Revêtement de murs - Toutes zones		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Peinture + Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P11

Matériau / Produit	**Peinture Type "Gouttelette" + Enduit**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	**Nom de l'opérateur**	MANDIN Guillaume
Numéro de dossier	C2630253	**Date de prélèvement**	26/08/2026
Pièce ou local	R-2 - Pièce 4	**Référence du sondage**	S011
Localisation	Revêtement de murs - Toutes zones		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Peinture + Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées


DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P12

Matériau / Produit	**Peinture Type "Gouttelette" + Enduit**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement

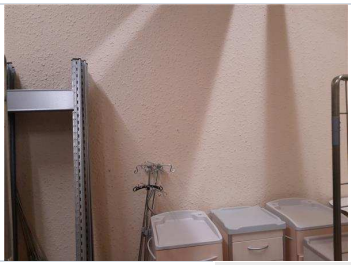

Nom du client	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	**Nom de l'opérateur**	MANDIN Guillaume
Numéro de dossier	C2630253	**Date de prélèvement**	26/08/2026
Pièce ou local	R-2 - Pièce 4	**Référence du sondage**	S012
Localisation	Revêtement de murs - Toutes zones		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Peinture + Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P13

Matériau / Produit	**Peinture Type "Gouttelette" + Enduit**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	**Nom de l'opérateur**	MANDIN Guillaume
Numéro de dossier	C2630253	**Date de prélèvement**	26/08/2026
Pièce ou local	R-2 - Pièce 4	**Référence du sondage**	S013
Localisation	Revêtements de plafond - Toutes zones		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Peinture + Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P14

Matériau / Produit	Peinture + Enduit
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE

Emplacement



Nom du client	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	Nom de l'opérateur	MANDIN Guillaume
Numéro de dossier	C2630253	Date de prélèvement	26/08/2026
Pièce ou local	R-2 - Pièce 8	Référence du sondage	S014
Localisation	Revêtement de murs - Toutes zones		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Peinture + Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P15

Matériau / Produit	Peinture + Enduit
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE

Emplacement



Nom du client	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	Nom de l'opérateur	MANDIN Guillaume
Numéro de dossier	C2630253	Date de prélèvement	26/08/2026
Pièce ou local	R-2 - Pièce 8	Référence du sondage	S015
Localisation	Revêtement de murs - Toutes zones		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Peinture + Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P16

Matériau / Produit	**Peinture + Enduit**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	**Nom de l'opérateur**	MANDIN Guillaume
Numéro de dossier	C2630253	**Date de prélèvement**	26/08/2026
Pièce ou local	R-2 - Pièce 8	**Référence du sondage**	S016
Localisation	Revêtement de murs - Toutes zones		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Peinture + Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P17

Matériau / Produit	**Peinture + Enduit**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	**Nom de l'opérateur**	MANDIN Guillaume
Numéro de dossier	C2630253	**Date de prélèvement**	26/08/2026
Pièce ou local	R-2 - Pièce 8	**Référence du sondage**	S017
Localisation	Revêtements de plafond - Toutes zones		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Peinture + Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P18

Matériau / Produit	**Peinture + Enduit**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	**Nom de l'opérateur**	MANDIN Guillaume
Numéro de dossier	C2630253	**Date de prélèvement**	26/08/2026
Pièce ou local	R-2 - Circulation 2	**Référence du sondage**	S018
Localisation	Revêtement de murs - Toutes zones		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Peinture + Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P19

Matériau / Produit	**Peinture + Enduit**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	**Nom de l'opérateur**	MANDIN Guillaume
Numéro de dossier	C2630253	**Date de prélèvement**	26/08/2026
Pièce ou local	R-2 - Circulation 2	**Référence du sondage**	S019
Localisation	Revêtement de murs - Toutes zones		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Peinture + Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P20

Matériau / Produit	**Peinture + Enduit**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	**Nom de l'opérateur**	MANDIN Guillaume
Numéro de dossier	C2630253	**Date de prélèvement**	26/08/2026
Pièce ou local	R-2 - Pièce 11	**Référence du sondage**	S020
Localisation	Revêtement de murs - Toutes zones		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Peinture + Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P21

Matériau / Produit	**Peinture + Enduit**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	**Nom de l'opérateur**	MANDIN Guillaume
Numéro de dossier	C2630253	**Date de prélèvement**	26/08/2026
Pièce ou local	R-2 - Pièce 11	**Référence du sondage**	S021
Localisation	Revêtement de murs - Toutes zones		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Peinture + Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P22

Matériau / Produit	Peinture + Enduit
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE

Emplacement



Nom du client	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	Nom de l'opérateur	MANDIN Guillaume
Numéro de dossier	C2630253	Date de prélèvement	26/08/2026
Pièce ou local	R-2 - Pièce 11	Référence du sondage	S022
Localisation	Revêtements de plafond - Toutes zones		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Peinture + Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P23

Matériau / Produit	Peinture Type "Gouttelette" + Enduit
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE

Emplacement



Nom du client	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	Nom de l'opérateur	MANDIN Guillaume
Numéro de dossier	C2630253	Date de prélèvement	26/08/2026
Pièce ou local	R-2 - Pièce 13	Référence du sondage	S023
Localisation	Revêtement de murs - Toutes zones		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Peinture + Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées


DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P24

Matériau / Produit	**Peinture Type "Gouttelette" + Enduit**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement

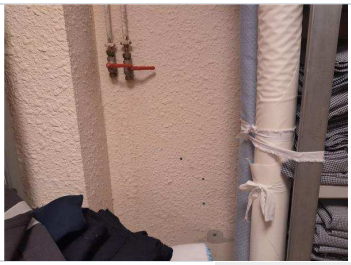

Nom du client	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	**Nom de l'opérateur**	MANDIN Guillaume
Numéro de dossier	C2630253	**Date de prélèvement**	26/08/2026
Pièce ou local	R-2 - Pièce 13	**Référence du sondage**	S024
Localisation	Revêtement de murs - Toutes zones		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Peinture + Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P25

Matériau / Produit	**Peinture Type "Gouttelette" + Enduit**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	**Nom de l'opérateur**	MANDIN Guillaume
Numéro de dossier	C2630253	**Date de prélèvement**	26/08/2026
Pièce ou local	R-2 - Pièce 13	**Référence du sondage**	S025
Localisation	Revêtements de plafond - Toutes zones		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Peinture + Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P26

Matériau / Produit	Plaque de faux-plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE

Emplacement



Nom du client	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	Nom de l'opérateur	MANDIN Guillaume
Numéro de dossier	C2630253	Date de prélèvement	26/08/2026
Pièce ou local	R-2 - Pièce 14	Référence du sondage	S026
Localisation	Faux-plafond - Toutes zones		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P27

Matériau / Produit	Peinture + Enduit
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE

Nom du client	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	Nom de l'opérateur	MANDIN Guillaume
Numéro de dossier	C2630253	Date de prélèvement	26/08/2026
Pièce ou local	R-2 - Circulation 3	Référence du sondage	S027
Localisation	Revêtement de murs - Toutes zones		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Peinture + Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P28

Matériau / Produit	**Peinture + Enduit**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	**Nom de l'opérateur**	MANDIN Guillaume
Numéro de dossier	C2630253	**Date de prélèvement**	26/08/2026
Pièce ou local	R-2 - Pièce 17	**Référence du sondage**	S028
Localisation	Revêtement de murs - Toutes zones		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Peinture + Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P29

Matériau / Produit	**Flocage**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	**Nom de l'opérateur**	MANDIN Guillaume
Numéro de dossier	C2630253	**Date de prélèvement**	26/08/2026
Pièce ou local	R-2 - Pièce 17	**Référence du sondage**	S029
Localisation	Revêtements de plafond - Toutes zones		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Flocage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**
001-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P30

Matériau / Produit	**Peinture + Enduit**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES	**Nom de l'opérateur**	MANDIN Guillaume
Numéro de dossier	C2630253	**Date de prélèvement**	26/08/2026
Pièce ou local	Extérieur - Zone de stockage	**Référence du sondage**	S030
Localisation	Revêtement de murs - Toutes zones		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Peinture + Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NS-054370-01	**Fibres d'amiante non détectées**

ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSES

PV_00720260901920957

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTI
Monsieur Guillaume MANDIN
Rue Jacques-Yves Cousteau - ZA de Beaupuy
85000 LA ROCHE-SUR-YON

Notre référence : AR-26-NS-054370-01

Numéro de dossier : 26W031467
Référence de dossier : T260491840
C2630253 A - Zone de stockage / Logistique N-2 boulevard STEPHANE MOREAU 85000 LA ROCHE-SUR-YON - CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26W031467-001 - Référence *P1-R-2 - Circulation 1 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26W031467-002 - Référence *P2-R-2 - Circulation 1 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26W031467-003 - Référence *P3-R-2 - Circulation 1 - Toutes zones - Revêtements de plafond - Peinture + Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26W031467-004 - Référence *P4-R-2 - Pièce 1 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26W031467-005 - Référence *P5-R-2 - Pièce 1 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26W031467-006 - Référence *P6-R-2 - Pièce 1 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26W031467-007 - Référence *P7-R-2 - Pièce 1 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 26W031467-008 - Référence *P8-R-2 - Pièce 1 - Toutes zones - Revêtements de plafond - Peinture + Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26W031467-009 - Référence *P9-R-2 - Pièce 4 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26W031467-010 - Référence *P10-R-2 - Pièce 4 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26W031467-011 - Référence *P11-R-2 - Pièce 4 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26W031467-012 - Référence *P12-R-2 - Pièce 4 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26W031467-013 - Référence *P13-R-2 - Pièce 4 - Toutes zones - Revêtements de plafond - Peinture + Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26W031467-014 - Référence *P14-R-2 - Pièce 8 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26W031467-015 - Référence *P15-R-2 - Pièce 8 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26W031467-016 - Référence *P16-R-2 - Pièce 8 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26W031467-017 - Référence *P17-R-2 - Pièce 8 - Toutes zones - Revêtements de plafond - Peinture + Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26W031467-018 - Référence *P18-R-2 - Circulation 2 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26W031467-019 - Référence *P19-R-2 - Circulation 2 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 26W031467-020 - Référence *P20-R-2 - Pièce 11 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26W031467-021 - Référence *P21-R-2 - Pièce 11 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26W031467-022 - Référence *P22-R-2 - Pièce 11 - Toutes zones - Revêtements de plafond - Peinture + Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26W031467-023 - Référence *P23-R-2 - Pièce 13 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26W031467-024 - Référence *P24-R-2 - Pièce 13 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26W031467-025 - Référence *P25-R-2 - Pièce 13 - Toutes zones - Revêtements de plafond - Peinture + Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26W031467-026 - Référence *P26-R-2 - Pièce 14 - Toutes zones - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26W031467-027 - Référence *P27-R-2 - Circulation 3 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26W031467-028 - Référence *P28-R-2 - Pièce 17 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26W031467-029 - Référence *P29-R-2 - Pièce 17 - Toutes zones - Revêtements de plafond - Flocage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26W031467-030 - Référence *P30-Extérieur - Zone de stockage - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT OUEST SAS
Sous-traitance Bâtiment Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-059569-01 — Date d'émission de rapport : 10/09/2026 19:23 — Page1/9
Référence laboratoire N° : 26RI059776 — Référence de suivi du dossier N° : 26W031467
Reçu au laboratoire le : 09/09/2026 — Date de réception :08/09/2026
Date d'analyse : 10/09/2026
Référence dossier Client:26W031467 - T260491840C2630253 A - Zone de stockage / Logistique N-2 boulevard STEPHANE MOREAU 85000 LA ROCHE-SUR-YON - CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	26W031467-001 - P1-R-2 - Circulation 1 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	26W031467-002 - P2-R-2 - Circulation 1 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / WOUQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	26W031467-003 - P3-R-2 - Circulation 1 - Toutes zones - Revêtements de plafond - Peinture + Enduit	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-059569-01 — Date d'émission de rapport : 10/09/2026 19:23 — Page2/9
Référence laboratoire N° : 26RI059776 — Référence de suivi du dossier N° : 26W031467
Reçu au laboratoire le : 09/09/2026 — Date de réception :08/09/2026
Date d'analyse : 10/09/2026
Référence dossier Client:26W031467 - T260491840C2630253 A - Zone de stockage / Logistique N-2 boulevard STEPHANE MOREAU 85000 LA ROCHE-SUR-YON - CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	26W031467-004 - P4-R-2 - Pièce 1 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / WOUQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	26W031467-005 - P5-R-2 - Pièce 1 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / WOUQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	26W031467-006 - P6-R-2 - Pièce 1 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	26W031467-007 - P7-R-2 - Pièce 1 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-059569-01 — Date d'émission de rapport : 10/09/2026 19:23 — Page3/9
Référence laboratoire N° : 26RI059776 — Référence de suivi du dossier N° : 26W031467
Reçu au laboratoire le : 09/09/2026 — Date de réception :08/09/2026
Date d'analyse : 10/09/2026
Référence dossier Client:26W031467 - T260491840C2630253 A - Zone de stockage / Logistique N-2 boulevard STEPHANE MOREAU 85000 LA ROCHE-SUR-YON - CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	26W031467-008 - P8-R-2 - Pièce 1 - Toutes zones - Revêtements de plafond - Peinture + Enduit	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	26W031467-009 - P9-R-2 - Pièce 4 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / WOUQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	26W031467-010 - P10-R-2 - Pièce 4 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	26W031467-011 - P11-R-2 - Pièce 4 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / WOUQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-059569-01 — Date d'émission de rapport : 10/09/2026 19:23 — Page4/9
Référence laboratoire N° : 26RI059776 — Référence de suivi du dossier N° : 26W031467
Reçu au laboratoire le : 09/09/2026 — Date de réception :08/09/2026
Date d'analyse : 10/09/2026
Référence dossier Client:26W031467 - T260491840C2630253 A - Zone de stockage / Logistique N-2 boulevard STEPHANE MOREAU 85000 LA ROCHE-SUR-YON - CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	26W031467-012 - P12-R-2 - Pièce 4 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	26W031467-013 - P13-R-2 - Pièce 4 - Toutes zones - Revêtements de plafond - Peinture + Enduit	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	26W031467-014 - P14-R-2 - Pièce 8 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	**MET** / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	26W031467-015 - P15-R-2 - Pièce 8 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / WOUQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-059569-01 — Date d'émission de rapport : 10/09/2026 19:23 — Page5/9
Référence laboratoire N° : 26RI059776 — Référence de suivi du dossier N° : 26W031467
Reçu au laboratoire le : 09/09/2026 — Date de réception :08/09/2026
Date d'analyse : 10/09/2026
Référence dossier Client:26W031467 - T260491840C2630253 A - Zone de stockage / Logistique N-2 boulevard STEPHANE MOREAU 85000 LA ROCHE-SUR-YON - CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	26W031467-016 - P16-R-2 - Pièce 8 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / WOUQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	26W031467-017 - P17-R-2 - Pièce 8 - Toutes zones - Revêtements de plafond - Peinture + Enduit	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / WOUQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	26W031467-018 - P18-R-2 - Circulation 2 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / WOUQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	26W031467-019 - P19-R-2 - Circulation 2 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-059569-01 — Date d'émission de rapport : 10/09/2026 19:23 — Page6/9
Référence laboratoire N° : 26RI059776 — Référence de suivi du dossier N° : 26W031467
Reçu au laboratoire le : 09/09/2026 — Date de réception :08/09/2026
Date d'analyse : 10/09/2026
Référence dossier Client:26W031467 - T260491840C2630253 A - Zone de stockage / Logistique N-2 boulevard STEPHANE MOREAU 85000 LA ROCHE-SUR-YON - CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	26W031467-020 - P20-R-2 - Pièce 11 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / WOUQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	26W031467-021 - P21-R-2 - Pièce 11 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	26W031467-022 - P22-R-2 - Pièce 11 - Toutes zones - Revêtements de plafond - Peinture + Enduit	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / WOUQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	26W031467-023 - P23-R-2 - Pièce 13 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / WOUQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-059569-01 — Date d'émission de rapport : 10/09/2026 19:23 — Page7/9
Référence laboratoire N° : 26RI059776 — Référence de suivi du dossier N° : 26W031467
Reçu au laboratoire le : 09/09/2026 — Date de réception :08/09/2026
Date d'analyse : 10/09/2026
Référence dossier Client:26W031467 - T260491840C2630253 A - Zone de stockage / Logistique N-2 boulevard STEPHANE MOREAU 85000 LA ROCHE-SUR-YON - CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	26W031467-024 - P24-R-2 - Pièce 13 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	**MET** / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	26W031467-025 - P25-R-2 - Pièce 13 - Toutes zones - Revêtements de plafond - Peinture + Enduit	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / WOUQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	26W031467-026 - P26-R-2 - Pièce 14 - Toutes zones - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	**MET** / WOUQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	26W031467-027 - P27-R-2 - Circulation 3 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / WOUQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-059569-01 — Date d'émission de rapport : 10/09/2026 19:23 — Page8/9
Référence laboratoire N° : 26RI059776 — Référence de suivi du dossier N° : 26W031467
Reçu au laboratoire le : 09/09/2026 — Date de réception :08/09/2026
Date d'analyse : 10/09/2026
Référence dossier Client:26W031467 - T260491840C2630253 A - Zone de stockage / Logistique N-2 boulevard STEPHANE MOREAU 85000 LA ROCHE-SUR-YON - CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	26W031467-028 - P28-R-2 - Pièce 17 - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau (gris)	**MET** / WOUQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	26W031467-029 - P29-R-2 - Pièce 17 - Toutes zones - Revêtements de plafond - Flocage	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau (gris)	**MET** / WOUQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	**MOLP** / TA4R	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
030	26W031467-030 - P30-Extérieur - Zone de stockage - Toutes zones - Revêtement de murs - Peinture + Enduit	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / WOUQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-059569-01 | Date d'émission de rapport : 10/09/2026 19:23 | Page9/9
Référence laboratoire N° : 26RI059776 | Référence de suivi du dossier N° : 26W031467
Reçu au laboratoire le : 09/09/2026 | Date de réception :08/09/2026
Date d'analyse : 10/09/2026
Référence dossier Client:26W031467 - T260491840C2630253 A - Zone de stockage / Logistique N-2 boulevard STEPHANE MOREAU 85000 LA ROCHE-SUR-YON - CHD VENDEE HOPITAL LES OUDAIRIES

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),). Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Krzysztof Zemlo
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

ANNEXE : TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

SANS OBJET

ANNEXE : CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI5520 Version 003

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MANDIN Guillaume

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 28/02/2022 - Date d'expiration : 27/02/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 28/02/2022 - Date d'expiration : 27/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/09/2024.

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

cofrac ACCREDITATION N° 4-0522 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CERTIFICATION DE PERSONNES

CPE DI FR 11 rev19

ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE

Allianz

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société:

SAS APAVE
Immeuble CANOPY 6 rue du général Audran
92400 COURBEVOIE
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL003861** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle			
Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs sur base « Loss of use »	2 500 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages causés par l'amiante et le plomb (hors Faute Inexcusable)	5 000 000	EUR	Par année d'assurance

Il est précisé que le souscripteur est à jour du paiement de ses primes / ne fait pas l'objet d'une procédure de mise à demeure pour non - paiement de prime / ne fait l'objet d'aucune suspension de garantie, ni d'aucune procédure de mise en demeure pour non-paiement de prime au titre de ce contrat.Les activités assurées sont décrites dans l'Annexe suivante.
Période d'assurance du 01/01/2026 au 31/12/2026

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 17/11/2025

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :

Signature autorisée/ Authorised signatory :

S. PERREAU
Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet - CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social:
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com


CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « *Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.* »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets

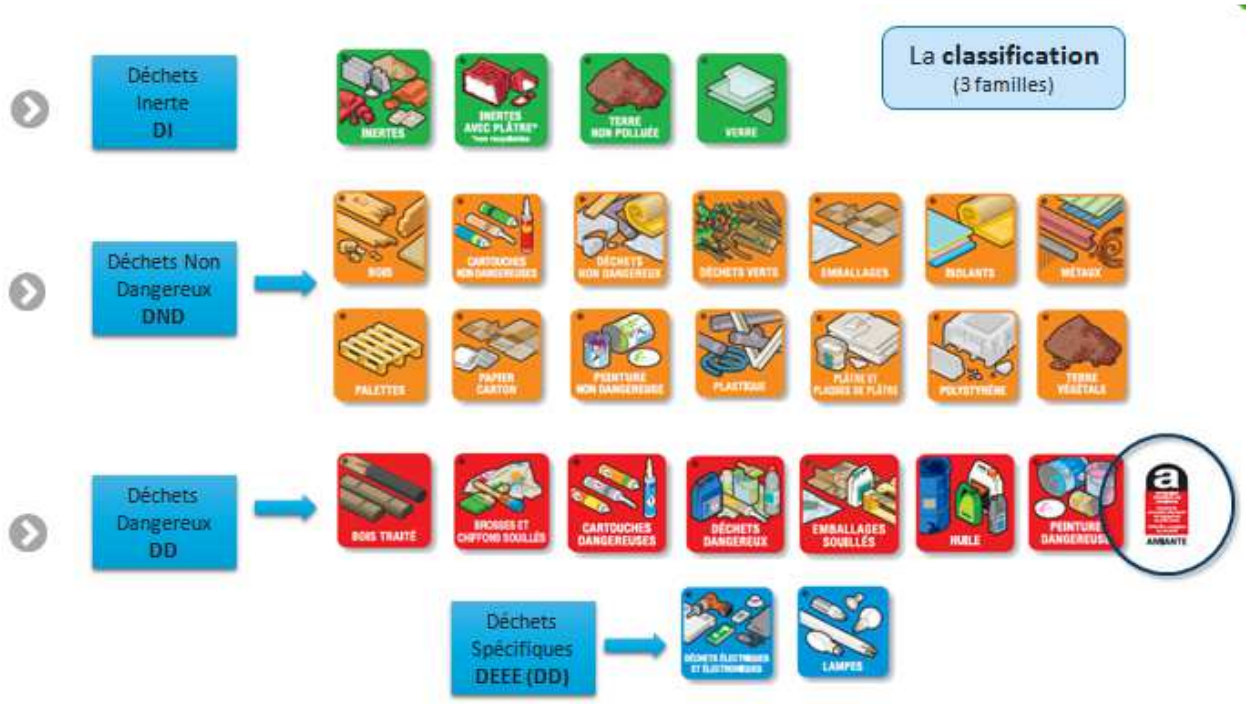


Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE

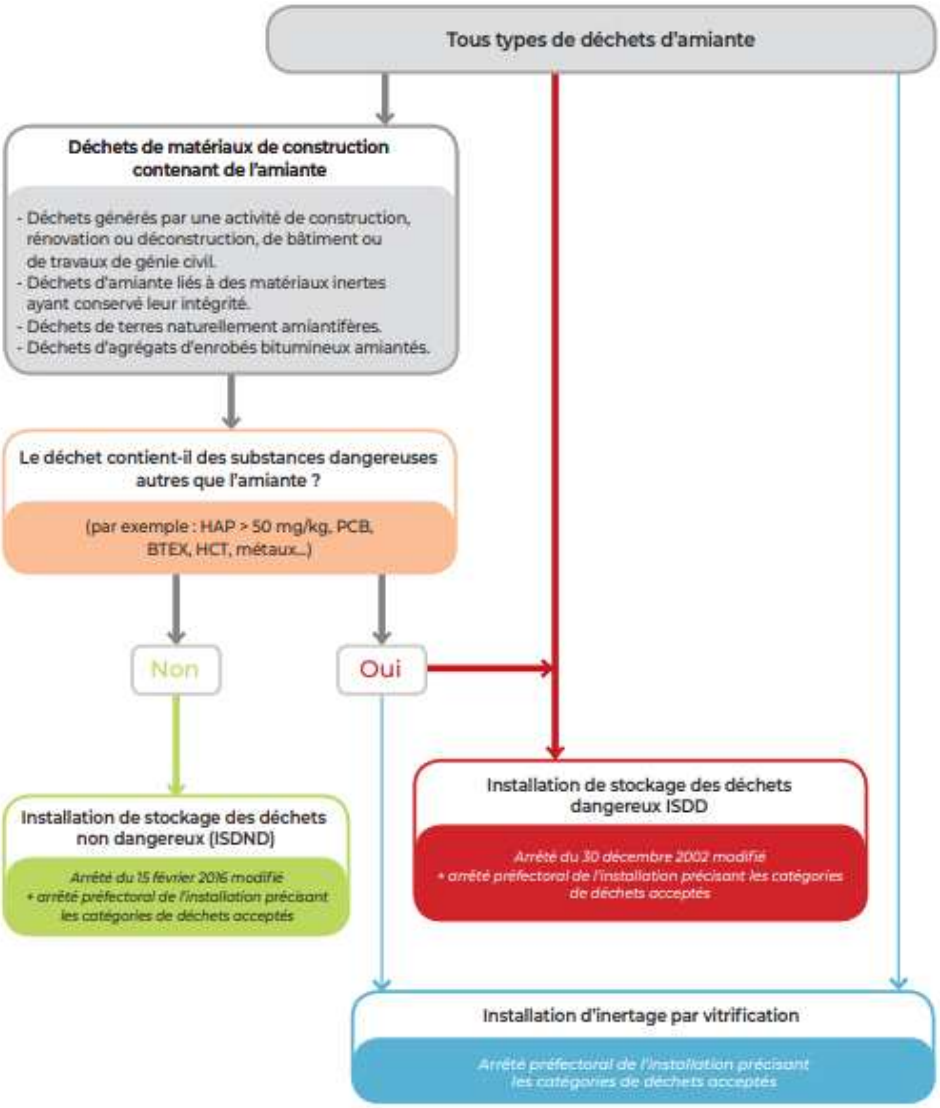

Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfectures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

https://www.sinoe.org/

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
