RAPPORT INTERVENTION N°022495

CLIENT	M. DALLE	E.R.I

DATE	25 / 11 / 2025	LIEU	Caserne de Gendarmerie, 54 avenue de Corbeil - melun

OBJET	Liaison HTA 20kV

1) **PDL Quartier Lemaitre → Poste P3**
2) **PDL Quartier Lemaitre → Poste P1**
3) **Poste P1 → Poste P2**
4) **Poste P2 → Poste P3**

NATURE DES ESSAIS

Essais diélectriques :

Application pendant 5 minutes sur chaque phase par rapport aux écrans reliés à la terre et aux autres phases, d'une tension alternative 0,1Hz de 24kV RMS avec enregistrements des courbes U et I


RESULTATS :	BON
Essais diélectriques :	**Pas d'amorçage**

ANNEXES	Enregistrements des courbes U et I

TECHNICIEN	T.GUILHEN	DATE RAPPORT	26 / 11 / 2025

FRANCE MESURE SAS
24 rue Eugène Tartasse
91550 Paray-Vielle-Poste
Tel 01 60 48 06 44
SIRET 442 905 881 00029
APE 7120B - RCS EVRY

PDL Quartier Lemaitre → Poste P3 L1

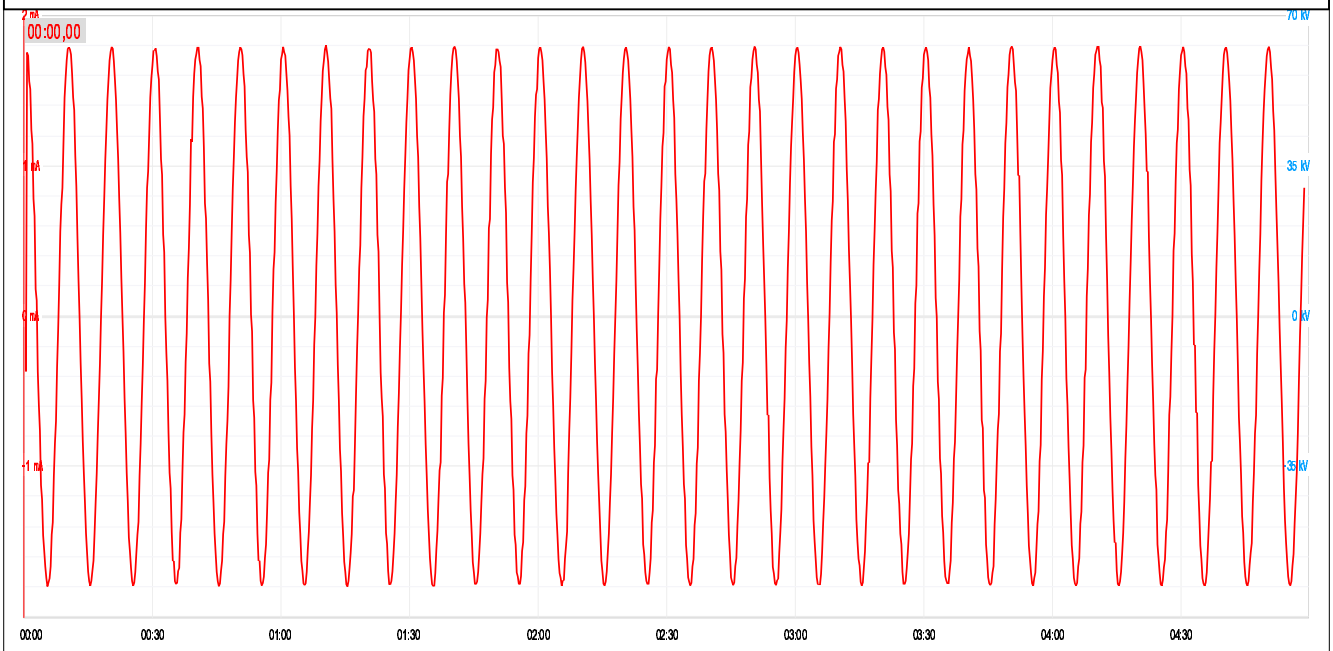

Curseur	00:00,00	Courant	0 µA
		Tension	0 V

Date/ heure	25.11.2025 09:30:37
Phase	L1
Plage	40 kV
Fréquence	0,1 Hz
Capacité	84,0 nF
Résistance	>100 MΩ
Heure(objectif)	10:00 min
Heure(réelle)	10:00,00 min
Tension	33,900 kV
Courant	1,713 mA
Résultat	Succès


Date d'impression 26.11.2025

Testeur T.GUILHEN

Signature

FRANCE MESURE SAS
24 rue Eugène Tartasse
91550 Paray-Vieille-Poste
Tel.01 60 48 06 44
Siret 442 905 881 00029
APE 7120B - RCS EVRY

PDL Quartier Lemaitre → Poste P3 L2

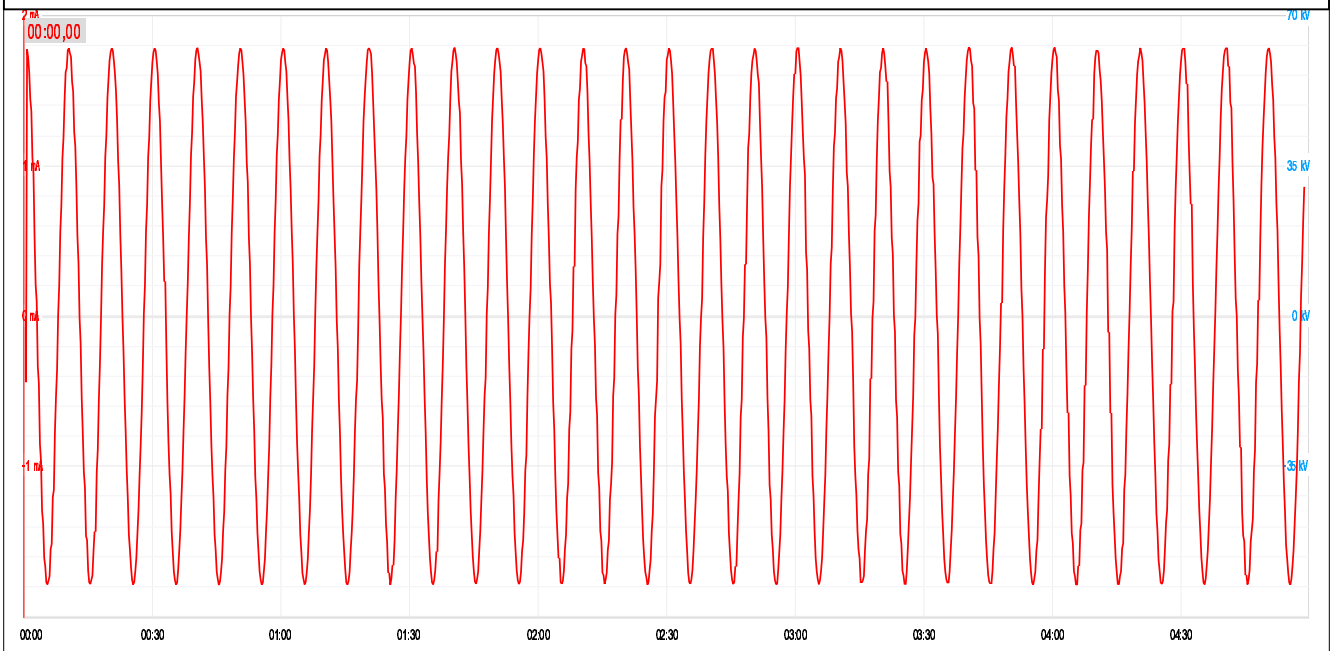

Curseur	00:00,00	Courant	0 µA
		Tension	0 V

Date/ heure	25.11.2025 09:45:17
Phase	L1
Plage	40 kV
Fréquence	0,1 Hz
Capacité	82,0 nF
Résistance	>100 MΩ
Heure(objectif)	10:00 min
Heure(réelle)	10:00,00 min
Tension	33,900 kV
Courant	1,74 mA
Résultat	Succès


Date d'impression 26.11.2025

Testeur T.GUILHEN

Signature

FRANCE MESURE SAS
24 rue Eugène Tartasse
91550 Paray-Vieille-Poste
Tel.01 60 48 06 44
Siret 442 905 881 00029
APE 7120B - RCS EVRY

PDL Quartier Lemaitre → Poste P3 L3

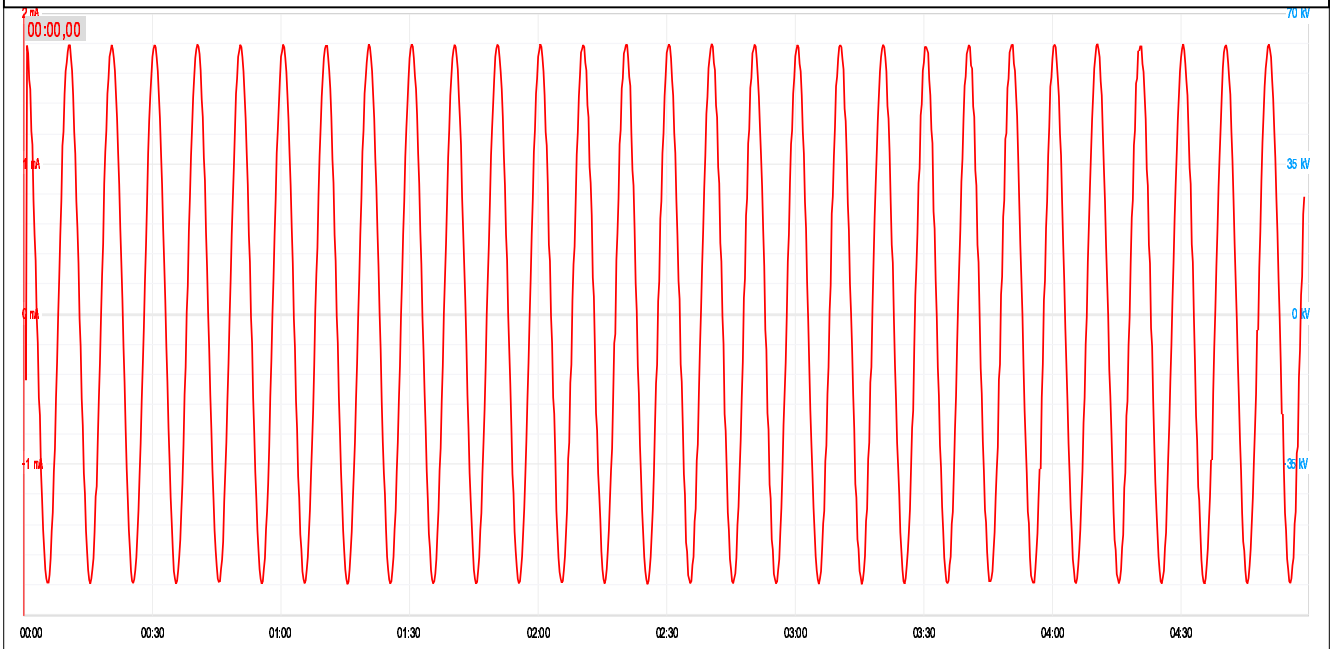

Curseur	00:00,00	Courant	0 µA
		Tension	0 V

Date/ heure	25.11.2025 09:57:08
Phase	L1
Plage	40 kV
Fréquence	0,1 Hz
Capacité	83,0 nF
Résistance	>100 MΩ
Heure(objectif)	10:00 min
Heure(réelle)	10:00,00 min
Tension	33,900 kV
Courant	1,74 mA
Résultat	Succès


Date d'impression 26.11.2025

Testeur T.GUILHEN

Signature

FRANCE MESURE SAS
24 rue Eugène Tartasse
91550 Paray-Vieille-Poste
Tel.01 60 48 06 44
Siret 442 905 881 00029
APE 7120B - RCS EVRY

PDL Quartier Lemaitre → Poste P1 L1

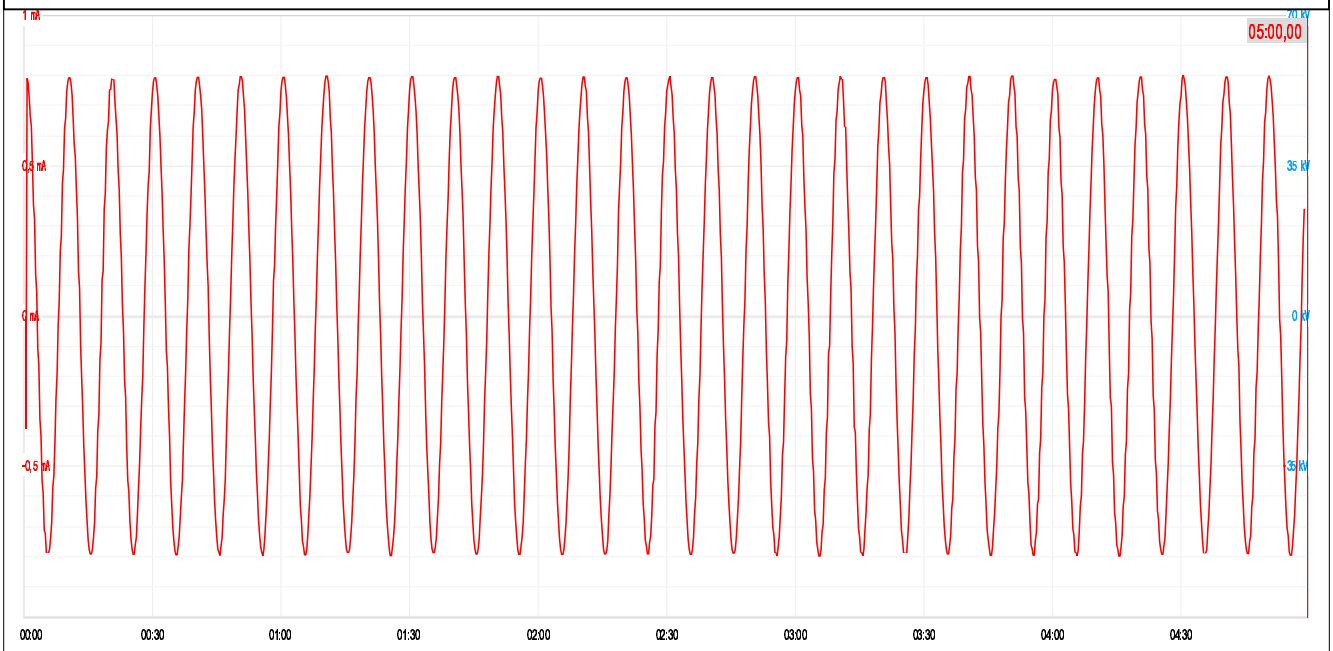

Curseur	05:00,00	Courant	732 µA
		Tension	-7,71 kV

Date/ heure	25.11.2025 10:30:41
Phase	L1
Plage	40 kV
Fréquence	0,1 Hz
Capacité	36,0 nF
Résistance	>100 MΩ
Heure(objectif)	05:00 min
Heure(réelle)	05:00,00 min
Tension	33,900 kV
Courant	732 µA
Résultat	Succès


Date d'impression 25.11.2025

Testeur T.GUILHEN

Signature

FRANCE MESURE SAS
24 rue Eugène Tartasse
91550 Paray-Vieille-Poste
Tel 01 60 48 06 44
Siret 442 905 881 00029
APE 7120B - RCS EVRY

PDL Quartier Lemaitre → Poste P1 L2

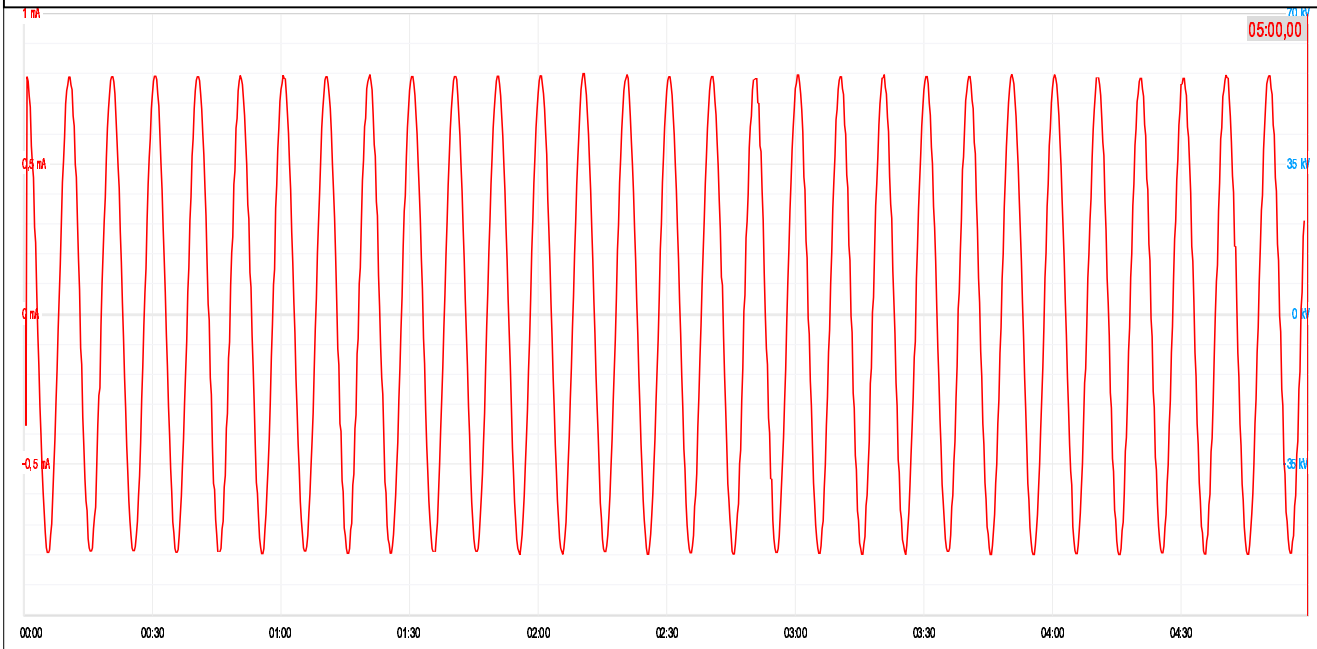

Curseur	05:00,00	Courant	750 µA
		Tension	-5,51 kV

Date/ heure	25.11.2025 10:37:22
Phase	L1
Plage	40 kV
Fréquence	0,1 Hz
Capacité	37,0 nF
Résistance	>100 MΩ
Heure(objectif)	05:00 min
Heure(réelle)	05:00,00 min
Tension	33,900 kV
Courant	706 µA
Résultat	Succès


Date d'impression 25.11.2025

Testeur T.GUILHEN

Signature

FRANCE MESURE SAS
24 rue Eugène Tartasse
91550 Paray-Vieille-Poste
Tel.01 60 48 06 44
Siret 442 905 881 00029
APE 7120B - RCS EVRY

PDL Quartier Lemaitre → Poste P1 L3

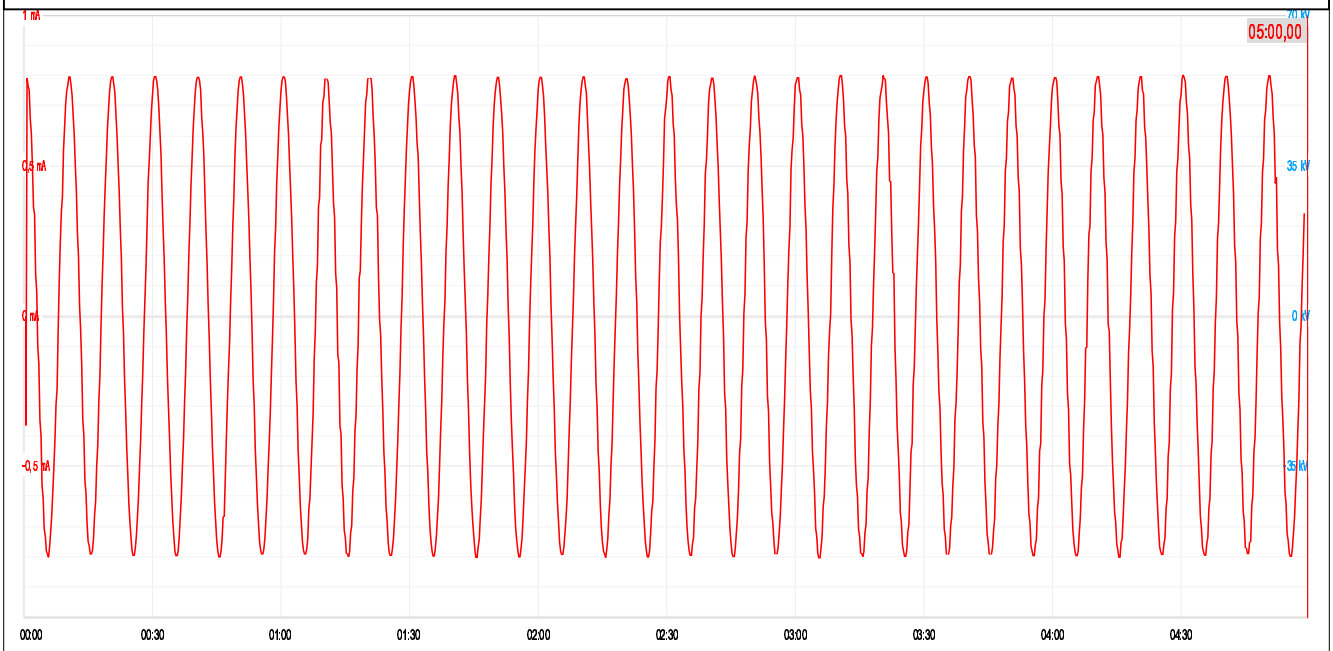

Curseur	05:00,00	Courant	766 µA
		Tension	-3,83 kV

Date/ heure	25.11.2025 10:44:56
Phase	L1
Plage	40 kV
Fréquence	0,1 Hz
Capacité	37,0 nF
Résistance	>100 MΩ
Heure(objectif)	05:00 min
Heure(réelle)	05:00,00 min
Tension	33,900 kV
Courant	766 µA
Résultat	Succès

Date d'impression 25.11.2025


Testeur T.GUILHEN

Signature

FRANCE MESURE SAS
24 rue Eugène Tartasse
91550 Paray-Vieille-Poste
Tel.01 60 48 06 44
Siret 442 905 881 00029
APE 7120B - RCS EVRY

Poste P1 → Poste P2

L1

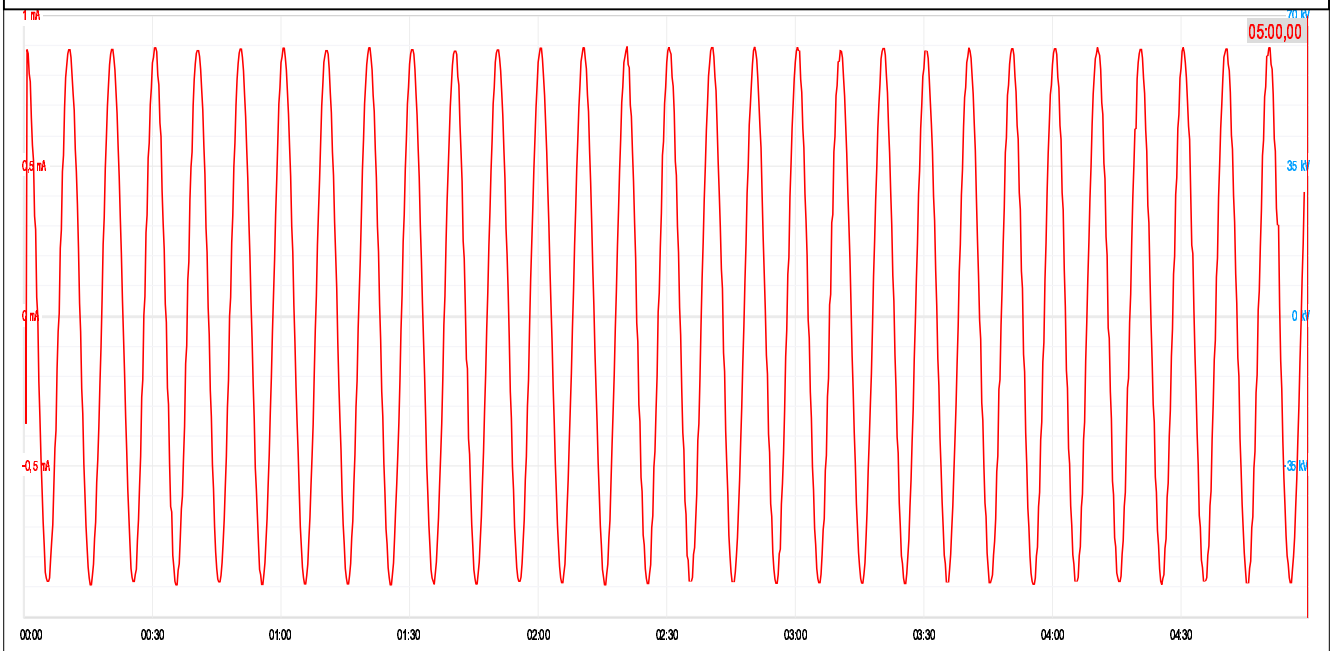

Curseur	05:00,00	Courant	856 µA
		Tension	-3,83 kV

Date/ heure	25.11.2025 11:14:26
Phase	L1
Plage	40 kV
Fréquence	0,1 Hz
Capacité	41,0 nF
Résistance	>100 MΩ
Heure(objectif)	05:00 min
Heure(réelle)	05:00,00 min
Tension	33,900 kV
Courant	856 µA
Résultat	Succès


Date d'impression 25.11.2025

Testeur T.GUILHEN

Signature

FRANCE MESURE SAS
24 rue Eugène Tartasse
91550 Paray-Vieille-Poste
Tel.01 60 48 06 44
Siret 442 905 881 00029
APE 7120B - RCS EVRY

Poste P1 → Poste P2 L2

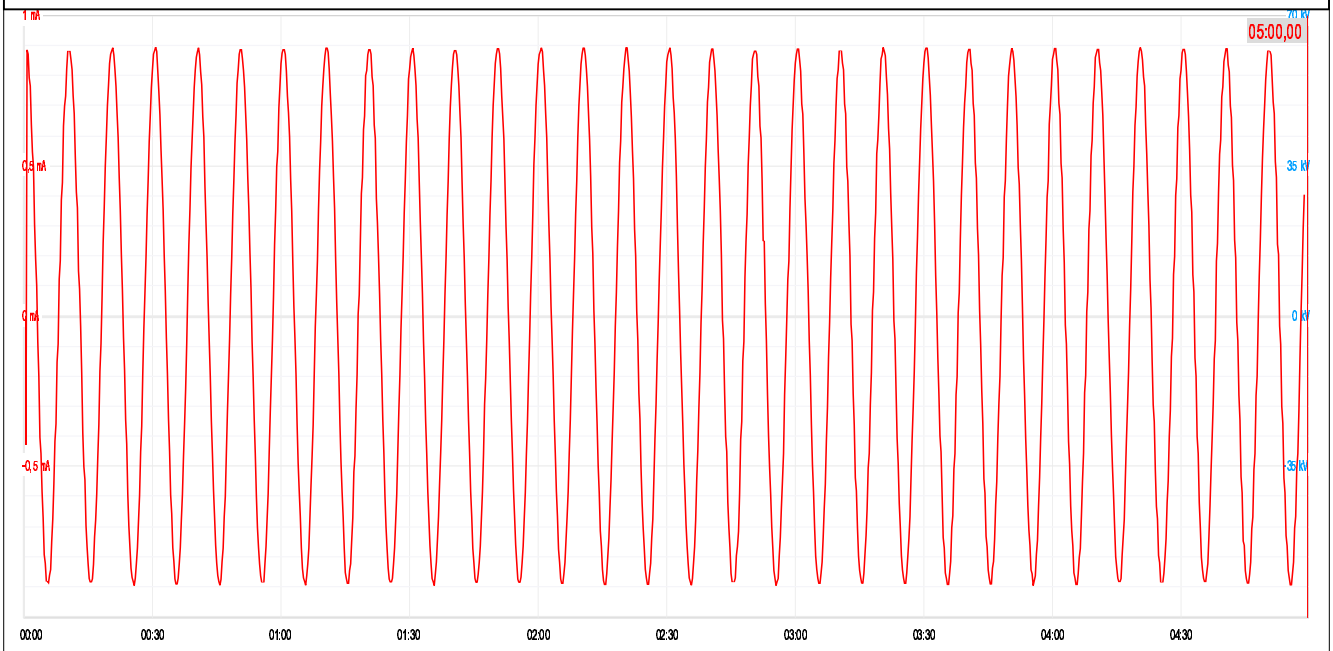

Curseur	05:00,00	Courant	845 µA
		Tension	-5,5 kV

Date/ heure	25.11.2025 11:20:50
Phase	L1
Plage	40 kV
Fréquence	0,1 Hz
Capacité	41,0 nF
Résistance	>100 MΩ
Heure(objectif)	05:00 min
Heure(réelle)	05:00,00 min
Tension	33,900 kV
Courant	845 µA
Résultat	Succès


Date d'impression 25.11.2025

Testeur T.GUILHEN

Signature

FRANCE MESURE SAS
24 rue Eugène Tartasse
91550 Paray-Vieille-Poste
Tel.01 60 48 06 44
Siret 442 905 881 00029
APE 7120B - RCS EVRY

Poste P1 → Poste P2 L3

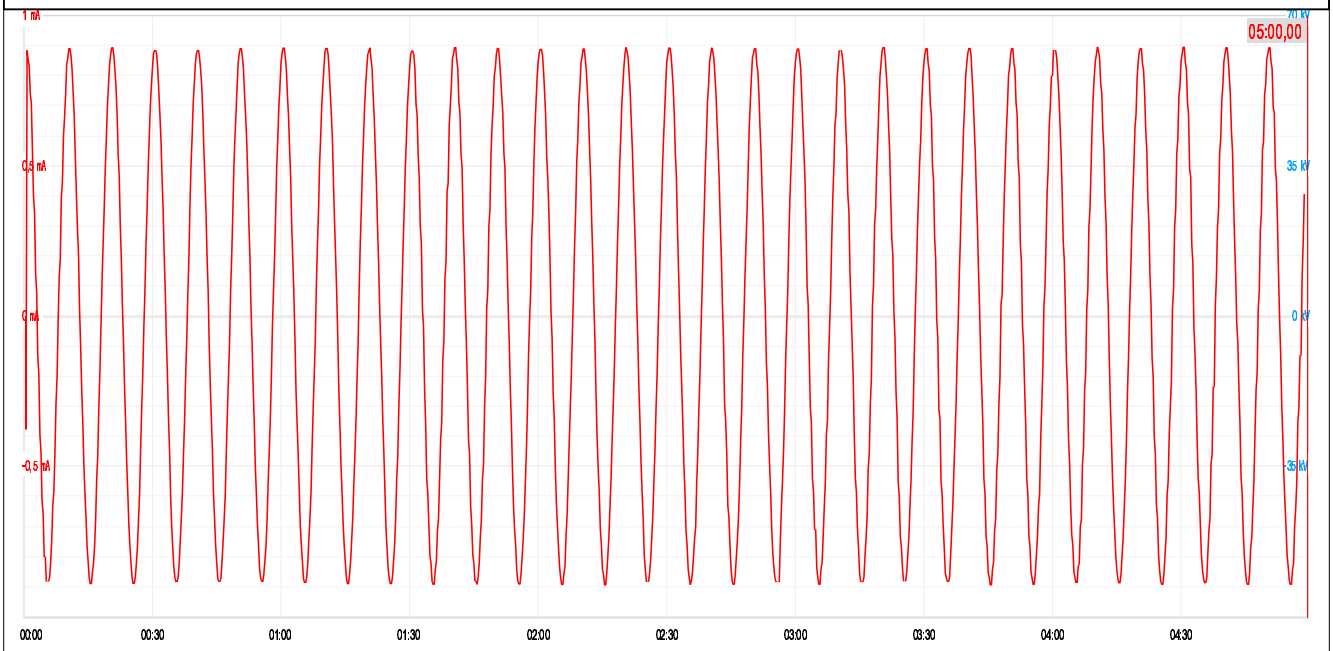

Curseur	05:00,00	Courant	845 µA
		Tension	-5,5 kV

Date/ heure	25.11.2025 11:27:13
Phase	L1
Plage	40 kV
Fréquence	0,1 Hz
Capacité	40,0 nF
Résistance	>100 MΩ
Heure(objectif)	05:00 min
Heure(réelle)	05:00,00 min
Tension	33,900 kV
Courant	797 µA
Résultat	Succès

Date d'impression 25.11.2025


Testeur T.GUILHEN

Signature

FRANCE MESURE SAS
24 rue Eugène Tartasse
91550 Paray-Vieille-Poste
Tel.01 60 48 06 44
Siret 442 905 881 00029
APE 7120B - RCS EVRY

Poste P2 → Poste P3

L1

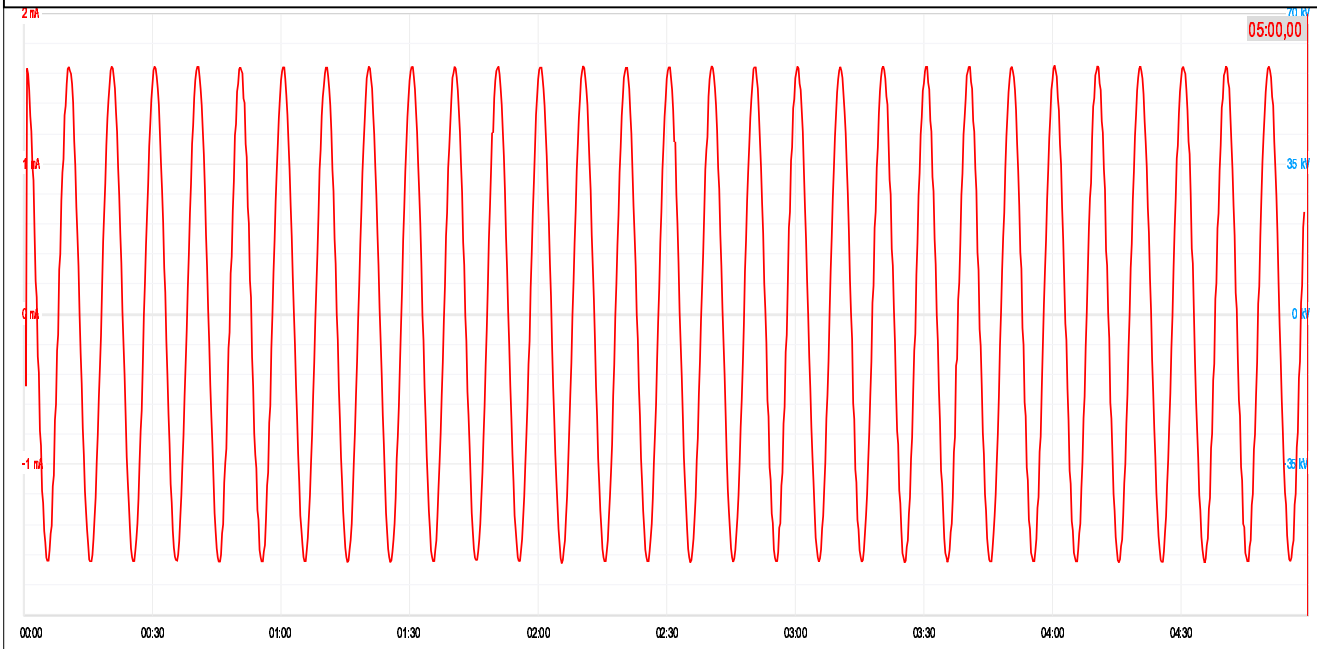

Curseur	05:00,00	Courant	1,587 mA
		Tension	-4,16 kV

Date/ heure	25.11.2025 11:36:10
Phase	L1
Plage	40 kV
Fréquence	0,1 Hz
Capacité	76,0 nF
Résistance	>100 MΩ
Heure(objectif)	05:00 min
Heure(réelle)	05:00,00 min
Tension	33,900 kV
Courant	1,587 mA
Résultat	Succès

Date d'impression 25.11.2025


Testeur T.GUILHEN

Signature

FRANCE MESURE SAS
24 rue Eugène Tartasse
91550 Paray-Vieille-Poste
Tel.01 60 48 06 44
Siret 442 905 881 00029
APE 7120B - RCS EVRY

Poste P2 → Poste P3

L2

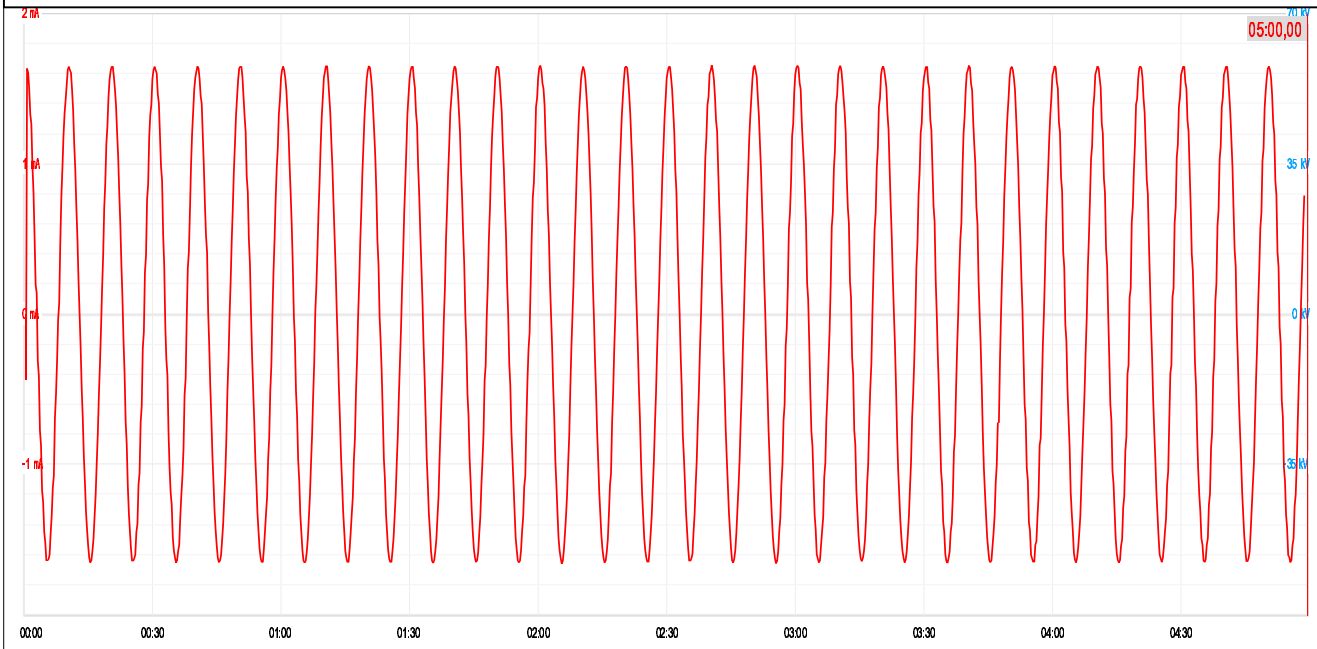

Curseur	05:00,00	Courant	1,594 mA
		Tension	-3,93 kV

Date/ heure	25.11.2025 11:42:52
Phase	L1
Plage	40 kV
Fréquence	0,1 Hz
Capacité	75,0 nF
Résistance	>100 MΩ
Heure(objectif)	05:00 min
Heure(réelle)	05:00,00 min
Tension	33,900 kV
Courant	1,594 mA
Résultat	Succès

Date d'impression 25.11.2025


Testeur T.GUILHEN

Signature

FRANCE MESURE SAS
24 rue Eugène Tartasse
91550 Paray-Vieille-Poste
Tel.01 60 48 06 44
Siret 442 905 881 00029
APE 7120B - RCS EVRY

Poste P2 → Poste P3

L3

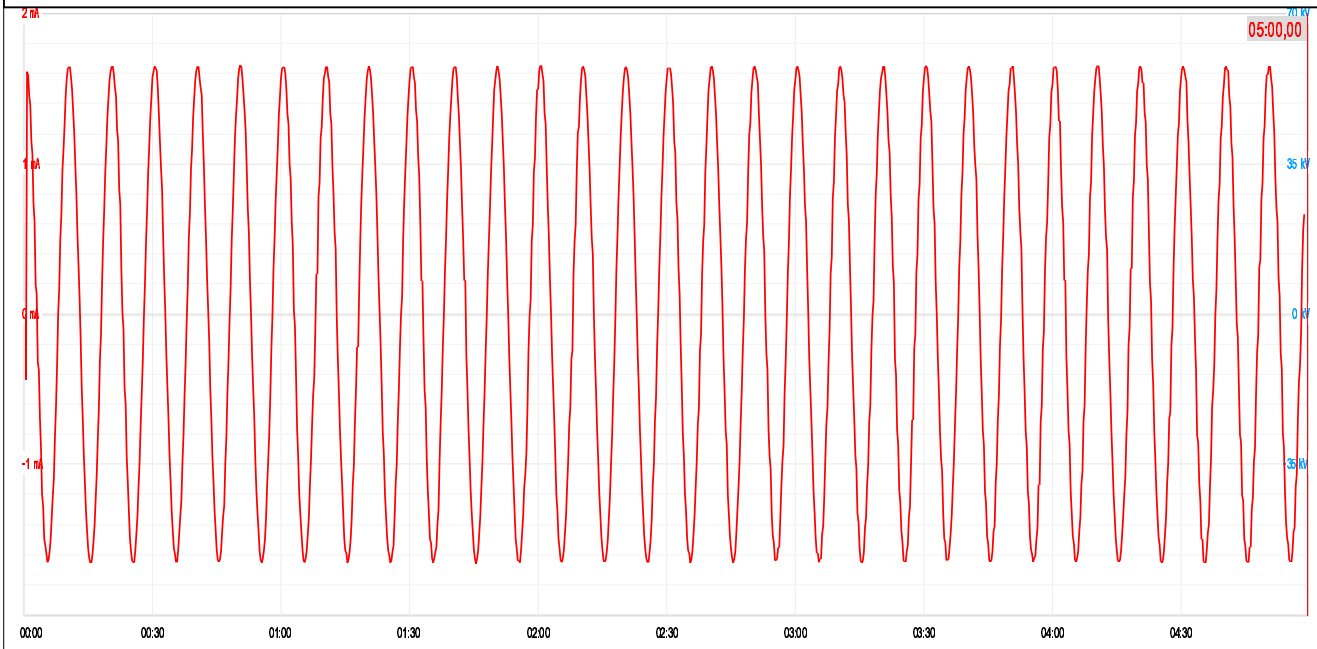

Curseur	05:00,00	Courant	1,592 mA
		Tension	-4,13 kV

Date/ heure	25.11.2025 11:49:59
Phase	L1
Plage	40 kV
Fréquence	0,1 Hz
Capacité	75,0 nF
Résistance	>100 MΩ
Heure(objectif)	05:00 min
Heure(réelle)	05:00,00 min
Tension	33,900 kV
Courant	1,592 mA
Résultat	Succès

Date d'impression 25.11.2025

Testeur T.GUILHEN

Signature

FRANCE MESURE SAS
24 rue Eugène Tartasse
91550 Paray-Vieille-Poste
Tel.01 60 48 06 44
Siret 442 905 881 00029
APE 7120B - RCS EVRY
