APAVE
AGENCE D'ANGOULEME

ZI N°3 74 avenue Maryse Bastié
16340 L'ISLE-D'ESPAGNAC
N° SIRET : 90386907100048

DONNEUR D'ORDRE
INRAE
Le Chêne
86600 LUSIGNAN
CONTACT : Madame BERNARD Michèle

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuelles versions précédentes



Numéro d'offre : **3259951.2_44-03-016-BUREAU-CIA_44-03-PORCHERIE-24-PL**
Numéro de contrat : **C26160456_44-03-016-BUREAU-CIA_44-03-PORCHERIE-24-PL**
Numéro de rapport (n° de tâche) : **T260230694**
Date : **29/08/2026**

Lieu d'intervention :
44 03 016 BUREAU CIA // 44 03 018 PORCHERIE 24 PL
1 rue des Quatre Vents
86480 ROUILLÉ

Destinataire rapport :
Mme BERNARD Michèle

Date d'intervention :
Du **22/06/2026** au **22/06/2026**

Intervenant : **Monsieur Ugo RAMON**

Signature :

RAMON U.

Validation électronique

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 71 pages

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse :	**1 rue des Quatre Vents 86480 ROUILLÉ**	Référence Cadastrale :	**000AI - 0002**
Bâtiment :		Date du permis de construire :	**Antérieur au 1er juillet 1997**
Nature du bâtiment :	**44 03 016 BUREAU CIA // 44 03 018 PORCHERIE 24 PL**	Date de construction :	**Antérieure au 1er juillet 1997**

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	**INRAE**
Adresse :	**Le Chêne 86600 LUSIGNAN**
Qualité :	

DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE

Nom:	**INRAE**
Adresse :	**Le Chêne 86600 LUSIGNAN**

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par :	**RAMON Ugo**	Laboratoire d'Analyses :	**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est**
N° certificat de qualification :	**CPDI8058**	Adresse laboratoire :	**2, rue Chanoine Ploton 42000 Saint Etienne**
Date d'obtention :	**04/12/2025**	Numéro d'accréditation :	**1-1591**
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :	**ICert Bâtiment K Parc d'Affaires Espace Performance 35760 SAINT-GRÉGOIRE**	Organisme d'assurance professionnelle :	**Allianz Global Corporate & Specialty SE**
		Adresse assurance :	**1 cours Michelet - CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex**
Date de la commande :	**30/07/2026**	N° de contrat d'assurance :	**FRL003861**
Accompagnateur :	**Aucun**	Date de validité :	**31/12/2026**

1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Nature des travaux envisagés : Démolition totale.

2 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Moyens d'accès à mettre en œuvre : se reporter au paragraphe 3.1.

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES **2**
DESIGNATION DU BATIMENT 2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE 2
DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE 2
EXÉCUTION DE LA MISSION 2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE 2

CONCLUSION(S) DU RAPPORT **2**

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **4**
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE 4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE 4

INVESTIGATIONS NON REALISEES **6**
LOCAUX NON VISITES / MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE 6
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE 7

PRECONISATIONS **7**

COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION **8**
OBJECTIF 8
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES 8
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 8

PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION **9**
PROGRAMME DE DEMOLITION 9
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE 9

RAPPORT(S) ANTERIEUR(S) **20**

ANNEXE CROQUIS **21**

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION **23**

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES **55**

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES **67**

ANNEXE ATTESTATION ASSURANCE **69**

3 RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

3.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
RDC	PORCHERIE - VÉRATRIE	Plafond	Plaques planes en fibres-ciment	Résultat d'analyse (P028)		
Ectérieur	BUREAUX - TOITURE	Toiture	Plaques ondulées en fibres-ciment	Résultat d'analyse (P030)		Z015
Ectérieur	PORCHERIE - TOITURE	Toiture	Plaques ondulées en fibres-ciment	Résultat d'analyse (P029)		Z014

3.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
RDC	BUREAUX - HALL D'ENTRÉE	Revêtement de murs	Colle + joint de plinthe (GRIS / ROSE)	**Résultat d'analyse (P007)**		Z004
		Revêtement de sols	Colle + joint de carrelage (GRIS / ROSE)	**Résultat d'analyse (P005)**		Z003
		Cloisons sèches	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bandes calicot	**Résultat d'analyse (P014)**		Z007
RDC	BUREAUX - SALLE CAFÉ	Revêtement de sols	Colle + joint de carrelage (GRIS)	**Résultat d'analyse (P001)**		Z001
		Revêtement de murs	Colle + joint de plinthe (GRIS)	**Résultat d'analyse (P003)**		Z002
RDC	BUREAUX - SALLE CAFÉ - SANITAIRES - ZONE LAVABO	Revêtement de sols	Colle + joint de carrelage (GRIS)	**Résultat d'analyse (P002)**		Z001
		Revêtement de murs	Colle + joint de plinthe (GRIS)	**Résultat d'analyse (P004)**		Z002
		Revêtement de murs	Colle + joint de faïence (BLANC)	**Résultat d'analyse (P016)**		Z008
RDC	BUREAUX - EXPÉDITION - STOCKAGE DOSES	Revêtement de murs	Colle + joint de plinthe (BLANC TÂCHETÉ)	**Résultat d'analyse (P011)**		Z006
		Revêtement de sols	Colle + joint de carrelage (BLANC TÂCHETÉ)	**Résultat d'analyse (P009)**		Z005
RDC	BUREAUX - SAS D'ENTRÉE DU LABO CIA	Cloisons sèches	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bandes calicot	**Résultat d'analyse (P013)**		Z007
RDC	PORCHERIE - HALL D'ENTRÉE	Revêtement de sols	Colle + joint de carrelage (GRIS / ROSE)	**Résultat d'analyse (P006)**		Z003
		Revêtement de murs	Colle + joint de plinthe (GRIS / ROSE)	**Résultat d'analyse (P008)**		Z004
		Revêtement de sols	Colle + joint de carrelage (BLANC TÂCHETÉ)	**Résultat d'analyse (P010)**		Z005
		Revêtement de murs	Colle + joint de plinthe (BLANC TÂCHETÉ)	**Résultat d'analyse (P012)**		Z006

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		Cloisons sèches	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bandes calicot	**Résultat d'analyse (P015)**		Z007
		Revêtement de murs	Colle + joint de faïence (BLANC)	**Résultat d'analyse (P017)**		Z008
RDC	PORCHERIE - SALLE DE COLLECTE	Revêtement de murs	Colle + joint de faïence (BLANC & GRIS)	**Résultat d'analyse (P018)**		Z009
		Revêtement de murs	Colle + joint de faïence (BLANC & GRIS)	**Résultat d'analyse (P019)**		Z009
		Revêtement de sols	Revêtement bitumineux	**Résultat d'analyse (P020)**		Z010
		Revêtement de sols	Revêtement bitumineux	**Résultat d'analyse (P021)**		Z010
		Revêtement de murs	Colle + joint de faïence dans les escaliers (BEIGE)	**Résultat d'analyse (P022)**		Z011
		Revêtement de murs	Colle + joint de faïence dans les escaliers (BEIGE)	**Résultat d'analyse (P023)**		Z011
		Revêtement de sols	Colle + joint de carrelage (PETIT CARREAU BEIGE)	**Résultat d'analyse (P024)**		Z012
		Revêtement de sols	Colle + joint de carrelage (PETIT CARREAU BEIGE)	**Résultat d'analyse (P025)**		Z012
		Cloisons maçonnées	Enduit à base de ciment	**Résultat d'analyse (P026)**		Z013
RDC	PORCHERIE - VÉRATRIE	Cloisons maçonnées	Enduit à base de ciment	**Résultat d'analyse (P027)**		Z013
Ectérieur	PORCHERIE - FAÇADE SUD-EST	Façades lourdes	Enduit à base de ciment	**Résultat d'analyse (P032)**		Z016
Ectérieur	PORCHERIE - FAÇADE SUD-OUEST	Façades lourdes	Enduit à base de ciment	**Résultat d'analyse (P031)**		Z016

4 INVESTIGATIONS NON REALISEES

4.1 Locaux non visités / Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Etage	Local / partie d'immeuble	Justification	Moyen d'accès à prévoir
Sous sol	VIDE SANITAIRE 	Inaccessible	

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies conformément à l'article R1334-19, « Le propriétaire s'assure que les personnes accompagnant l'opérateur dans sa mission connaissent l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.). »

4.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

5 PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante qui doit être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les

travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

6 COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

6.1 OBJECTIF

La prestation a pour objectif de réaliser le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante dont le propriétaire doit disposer avant démolition totale ou de plus de 50 % de la structure de son immeuble.

6.2 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004,
Décret n° 2010 – 1200 du 11 Octobre 2010 pris en application de l'article L 271-6 du code de la construction et de l'habitation,
Décret 2011-629 du 3 juin 2011 : protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis,
Articles R 1334-19 et R 1334-22 du code de la santé publique,
Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage,
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,
Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification,
Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

6.3 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date de réalisation du repérage : 22/06/2026
Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de plénums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération.
Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant
Documents remis : Néant

Commentaire : **Le vide sanitaire n'a pas pu être visité dans le cadre de la présente mission en raison de son inaccessibilité. Par ailleurs, malgré les sondages destructifs réalisés sur les parois et ouvrages accessibles, l'intégralité des volumes situés derrière les doublages, cloisons, gaines techniques, coffrages et complexes**

de parois n'a pas pu être contrôlée. Certains ouvrages se prolongeant dans le sol, leur emprise, leur profondeur et leur étendue n'ont également pas pu être déterminées dans leur intégralité.

En conséquence, certains matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante peuvent ne pas avoir été repérés, ou leur localisation et leur quantité exactes ne pas avoir pu être caractérisées à ce stade.

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux de démolition ou de terrassement, si des matériaux ou ouvrages non caractérisés venaient à être mis au jour, des investigations complémentaires pourront être réalisées, si besoin, afin d'en déterminer la nature et l'étendue.
Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante, défini à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.
Il ne peut être finalisé qu'après évacuation définitive de l'immeuble bâti et enlèvement des mobiliers afin que tous les composants soient accessibles.

7 PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

7.1 PROGRAMME DE DEMOLITION

Démolition totale.

7.2 PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE

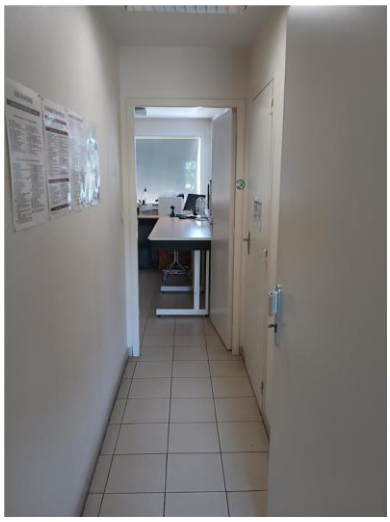
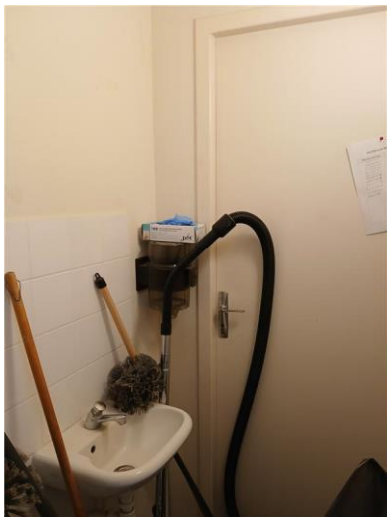
Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties d'immeuble concernés par la démolition telle que définie par le donneur d'ordre.
Programme de repérage : Matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction et susceptibles d'être affectés par la démolition en regard des matériaux ou produits figurant dans la liste

C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, le tableau A1 de la norme NF X 46 020 et tout autre matériau réputé contenir de l'amiante dont l'opérateur aurait connaissance.

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de démolition tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

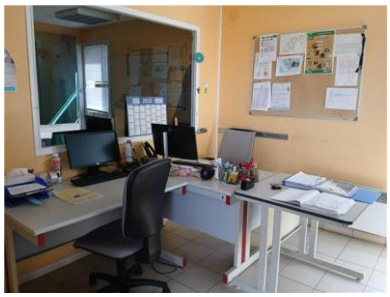
Liste des locaux (visités / non visités) :

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
RDC	BUREAUX - HALL D'ENTRÉE 	OUI	
RDC	BUREAUX - SALLE CAFÉ 	OUI	
RDC	BUREAUX - SALLE CAFÉ - SANITAIRES - ZONE LAVABO 	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
RDC	BUREAUX - SALLE CAFÉ - SANITAIRES - WC 	OUI	
RDC	BUREAUX - COULOIR 	OUI	
RDC	BUREAUX - COULOIR - LOCAL MÉNAGE 	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
RDC	BUREAUX - COULOIR - LOCAL VENTILATION 	OUI	
RDC	BUREAUX - EXPÉDITION 	OUI	
RDC	BUREAUX - EXPÉDITION - STOCKAGE 	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
RDC	BUREAUX - EXPÉDITION - STOCKAGE DOSES 	OUI	
RDC	BUREAUX - SAS D'ENTRÉE DU LABO CIA 	OUI	
RDC	BUREAUX - LABO CIA 	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
RDC	BUREAUX - LABO CIA - SANITAIRES - ZONE LAVABO 	OUI	
RDC	BUREAUX - LABO CIA - SANITAIRES - WC 	OUI	
RDC	BUREAUX - BUREAU N°1 	OUI	
RDC	BUREAUX - BUREAU N°2 	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
RDC	PORCHERIE - HALL D'ENTRÉE 	OUI	
RDC	PORCHERIE - DOUCHE 	OUI	
RDC	PORCHERIE - WC 	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
RDC	PORCHERIE - BUREAU N°3 	OUI	
RDC	PORCHERIE - SALLE DE COLLECTE 	OUI	
RDC	PORCHERIE - VÉRATRIE 	OUI	
Ectérieur	BUREAUX - FAÇADE SUD-OUEST 	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
Ectérieur	BUREAUX - FAÇADE NORD-OUEST 	OUI	
Ectérieur	BUREAUX - FAÇADE NORD-EST 	OUI	
Ectérieur	PORCHERIE - FAÇADE NORD-OUEST 	OUI	
Ectérieur	PORCHERIE - FAÇADE NORD-EST 	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
Ectérieur	PORCHERIE - FAÇADE SUD-EST 	OUI	
Ectérieur	PORCHERIE - FAÇADE SUD-OUEST 	OUI	
Ectérieur	BUREAUX - TOITURE 	OUI	
Ectérieur	PORCHERIE - TOITURE 	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
Sous sol	VIDE SANITAIRE 	NON	Inaccessible

8 RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

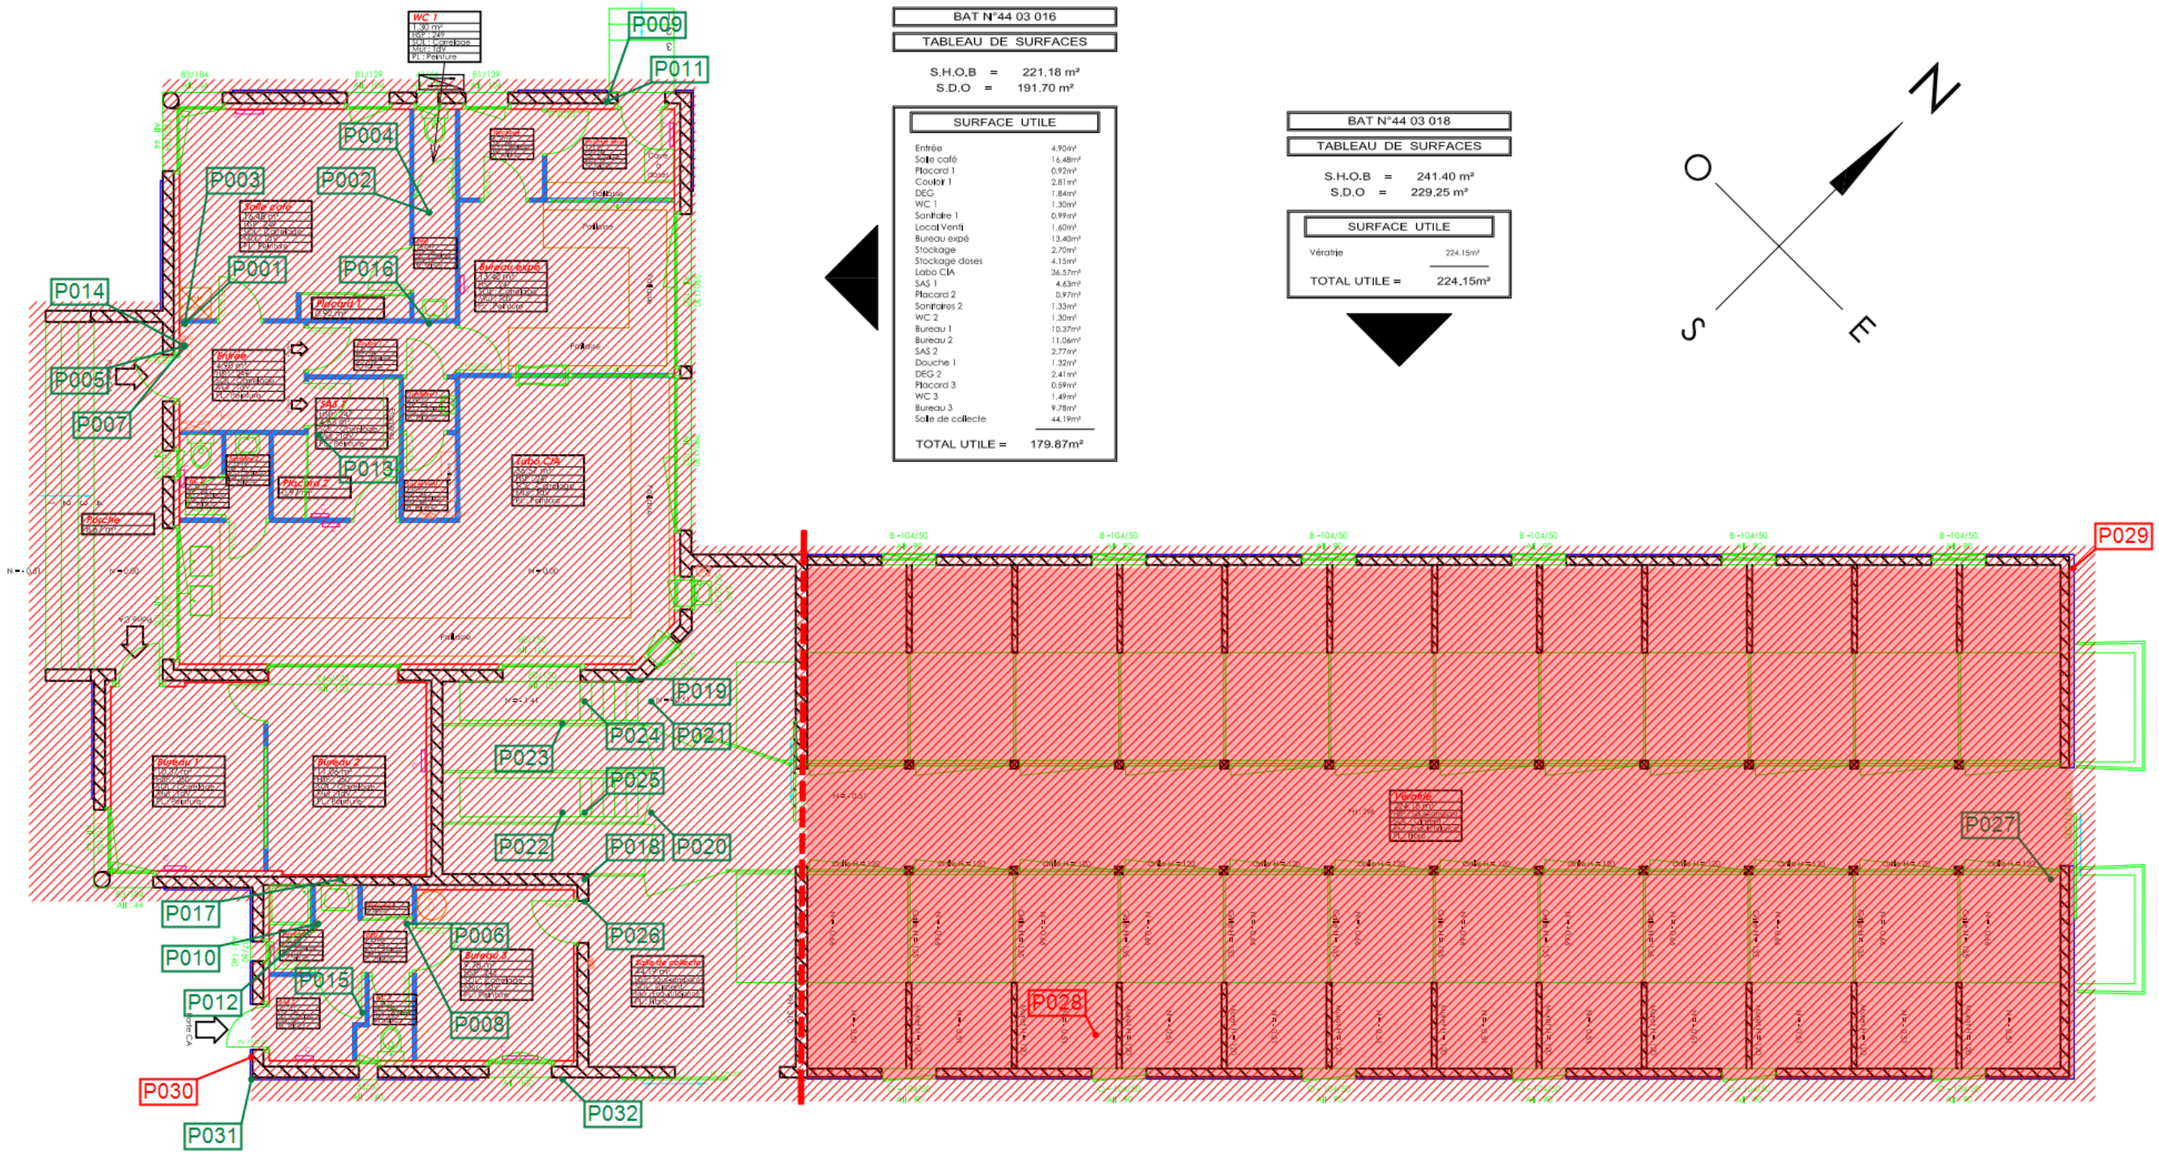
Rapports précédents :
Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

ANNEXE CROQUIS

apave	**Planche de repérage**				
Client :	INRAE		Titre :	44 03 016 BUREAU CIA // 44 03 018	
N° rapport :	T260230694				
N° planche :	1/1	Version : 0	Lieu d'intervention :	1 rue des Quatre Vents 86480 ROUILLÉ	
Type :	Croquis				
Date :	29/08/2026		Bâtiment :		
Intervenant :	RAMON Ugo		Etage :		
Origine du plan :			Commentaire :		

Legende :

- Plaques planes en fibres-ciment (PLAFOND)
- Plaques ondulées en amiante-ciment
- Prélèvements positifs
- Prélèvements négatifs



BAT N°44 03 016

TABLEAU DE SURFACES

S.H.O.B = 221.18 m²
S.D.O = 191.70 m²

SURFACE UTILE

Entrée	4.90m²
Salle café	16.48m²
Placard 1	0.92m²
Couloir 1	2.81m²
DEG	1.84m²
WC 1	1.30m²
Sanitaire 1	0.99m²
Local Vent	1.60m²
Bureau expé	13.40m²
Stockage	2.70m²
Stockage doses	4.15m²
Labo CIA	36.57m²
SAS 1	4.63m²
Placard 2	0.97m²
Sanitaires 2	1.33m²
WC 2	1.30m²
Bureau 1	10.37m²
Bureau 2	11.06m²
SAS 2	2.77m²
Douche 1	1.32m²
DEG 2	2.41m²
Placard 3	0.59m²
WC 3	1.49m²
Bureau 3	9.78m²
Salle de collecte	44.19m²

TOTAL UTILE = 179.87m²

BAT N°44 03 018

TABLEAU DE SURFACES

S.H.O.B = 241.40 m²
S.D.O = 229.25 m²

SURFACE UTILE

Véranda	224.15m²

TOTAL UTILE = 224.15m²

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

PRELEVEMENT : P001

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	RDC - BUREAUX - SALLE CAFÉ
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle + joint de carrelage (GRIS)	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation

Revêtement de sols - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle + joint de carrelage (GRIS)




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	RDC - BUREAUX - SALLE CAFÉ - SANITAIRES - ZONE LAVABO
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle + joint de carrelage (GRIS)	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation


Revêtement de sols - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle + joint de carrelage (GRIS)



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	RDC - BUREAUX - SALLE CAFÉ
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle + joint de plinthe (GRIS)	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle + joint de plinthe (GRIS)




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (gris)	
001-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	RDC - BUREAUX - SALLE CAFÉ - SANITAIRES - ZONE LAVABO
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle + joint de plinthe (GRIS)	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation


Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle + joint de plinthe (GRIS)



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (gris)	
001-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	RDC - BUREAUX - HALL D'ENTRÉE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle + joint de carrelage (GRIS / ROSE)	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation

Revêtement de sols - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle + joint de carrelage (GRIS / ROSE)




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (gris)	
001-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	RDC - PORCHERIE - HALL D'ENTRÉE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle + joint de carrelage (GRIS / ROSE)	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation

Revêtement de sols - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle + joint de carrelage (GRIS / ROSE)



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	RDC - BUREAUX - HALL D'ENTRÉE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle + joint de plinthe (GRIS / ROSE)	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle + joint de plinthe (GRIS / ROSE)




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	RDC - PORCHERIE - HALL D'ENTRÉE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle + joint de plinthe (GRIS / ROSE)	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle + joint de plinthe (GRIS / ROSE)




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (gris)	
001-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	RDC - BUREAUX - EXPÉDITION - STOCKAGE DOSES
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle + joint de carrelage (BLANC TÂCHETÉ)	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation

Revêtement de sols - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle + joint de carrelage (BLANC TÂCHETÉ)




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (gris)	
001-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	RDC - PORCHERIE - HALL D'ENTRÉE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle + joint de carrelage (BLANC TÂCHETÉ)	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation

Revêtement de sols - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle + joint de carrelage (BLANC TÂCHETÉ)




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple (gris) ; matériau de type poussières en traces ; matériau de type polystyrène (blanc) en traces	
001-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (gris)	
002-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (beige) (granulaire)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	RDC - BUREAUX - EXPÉDITION - STOCKAGE DOSES
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle + joint de plinthe (BLANC TÂCHETÉ)	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle + joint de plinthe (BLANC TÂCHETÉ)




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple de type joint (gris)	
001-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (gris)	
002-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	RDC - PORCHERIE - HALL D'ENTRÉE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle + joint de plinthe (BLANC TÂCHETÉ)	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle + joint de plinthe (BLANC TÂCHETÉ)



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (noir) ; matériau (blanc) en traces	
001-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	RDC - BUREAUX - SAS D'ENTRÉE DU LABO CIA
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bandes calicot	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation

Cloisons sèches - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bandes calicot



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	
002-COUCHE	Matériau de type plaque métallique (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	RDC - BUREAUX - HALL D'ENTRÉE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bandes calicot	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation

Cloisons sèches - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bandes calicot


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) n°1 + n°2 ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	RDC - PORCHERIE - HALL D'ENTRÉE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bandes calicot	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation

Cloisons sèches - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bandes calicot



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) n°1 + n°2 ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	RDC - BUREAUX - SALLE CAFÉ - SANITAIRES - ZONE LAVABO
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle + joint de faïence (BLANC)	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle + joint de faïence (BLANC)



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type joint (blanc)	
001-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	RDC - PORCHERIE - HALL D'ENTRÉE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle + joint de faïence (BLANC)	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle + joint de faïence (BLANC)

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (blanc)	
001-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	RDC - PORCHERIE - SALLE DE COLLECTE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle + joint de faïence (BLANC & GRIS)	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle + joint de faïence (BLANC & GRIS)



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	RDC - PORCHERIE - SALLE DE COLLECTE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle + joint de faïence (BLANC & GRIS)	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle + joint de faïence (BLANC & GRIS)




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (gris)	
001-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	RDC - PORCHERIE - SALLE DE COLLECTE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement bitumineux	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation

Revêtement de sols - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Revêtement bitumineux




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (gris) (granulaire) + (blanc) (beige) (granulaire) + (noir) (bitumineux)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	RDC - PORCHERIE - SALLE DE COLLECTE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement bitumineux	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation

Revêtement de sols - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Revêtement bitumineux



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (noir) (bitumineux) + (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	RDC - PORCHERIE - SALLE DE COLLECTE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle + joint de faïence dans les escaliers (BEIGE)	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle + joint de faïence dans les escaliers (BEIGE)



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	RDC - PORCHERIE - SALLE DE COLLECTE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle + joint de faïence dans les escaliers (BEIGE)	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle + joint de faïence dans les escaliers (BEIGE)



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) (granulaire)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	RDC - PORCHERIE - SALLE DE COLLECTE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle + joint de carrelage (PETIT CARREAU BEIGE)	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation

Revêtement de sols - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle + joint de carrelage (PETIT CARREAU BEIGE)




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (gris)	
001-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	RDC - PORCHERIE - SALLE DE COLLECTE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle + joint de carrelage (PETIT CARREAU BEIGE)	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation

Revêtement de sols - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle + joint de carrelage (PETIT CARREAU BEIGE)



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	RDC - PORCHERIE - SALLE DE COLLECTE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit à base de ciment	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation

Cloisons maçonnées - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit à base de ciment



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type poussières en traces ; matériau semi-dur (gris) (granulaire)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	RDC - PORCHERIE - VÉRATRIE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit à base de ciment	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation

Cloisons maçonnées - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit à base de ciment



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (gris) (granulaire)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	RDC - PORCHERIE - VÉRATRIE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plaques planes en fibres-ciment	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Plaques planes en fibres-ciment



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type poussières en traces ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P029

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	Ectérieur - PORCHERIE - TOITURE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plaques ondulées en fibres-ciment	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation

Toiture - Toiture

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Plaques ondulées en fibres-ciment



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P030

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	Ectérieur - BUREAUX - TOITURE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plaques ondulées en fibres-ciment	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation

Toiture - Toiture

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Plaques ondulées en fibres-ciment



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P031

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	Ectérieur - PORCHERIE - FAÇADE SUD-OUEST
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit à base de ciment	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation

Façades lourdes - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit à base de ciment



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur (beige) (granulaire) ; matériau de type poussières en traces	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INRAE	T260230694	Ectérieur - PORCHERIE - FAÇADE SUD-EST
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit à base de ciment	22/06/2026	RAMON Ugo

Localisation

Façades lourdes - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit à base de ciment



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type poussières en traces ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur (beige) (granulaire)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-056505-01	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

PV_00720260801902921

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Ugo RAMON
ZI N°3 Avenue Maryse Bastié
16340 L'ISLE-D'ESPAGNAC

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-056505-01 — Date d'émission de rapport : 31/08/2026 14:29 — Page1/12
Dossier N° : 26K029686 — Date de réception : 26/08/2026 — Date d'analyse : 27/08/2026
Référence dossier Client:t260230694

C26160456_44-03-016-BUREAU-CIA_44-03-PORCHERIE-24-PL A - 1 rue des Quatre Vents 86480 ROUILLÉ - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-RDC - BUREAUX - SALLE CAFÉ - Sol - Revêtement de sols - Colle + joint de carrelage (GRIS)	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002-RDC - BUREAUX - SALLE CAFÉ - SANITAIRES - ZONE LAVABO - Sol - Revêtement de sols - Colle + joint de carrelage (GRIS)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)(i)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003-RDC - BUREAUX - SALLE CAFÉ - Murs - Revêtement de murs - Colle + joint de plinthe (GRIS)	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s) Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-056505-01 | Date d'émission de rapport : 31/08/2026 14:29 | Page2/12
Dossier N° : 26K029686 | Date de réception : 26/08/2026 | Date d'analyse : 27/08/2026
Référence dossier Client:t260230694

C26160456_44-03-016-BUREAU-CIA_44-03-PORCHERIE-24-PL A - 1 rue des Quatre Vents 86480 ROUILLÉ - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	P004-RDC - BUREAUX - SALLE CAFÉ - SANITAIRES - ZONE LAVABO - Murs - Revêtement de murs - Colle + joint de plinthe (GRIS)	Matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P005-RDC - BUREAUX - HALL D'ENTRÉE - Sol - Revêtement de sols - Colle + joint de carrelage (GRIS / ROSE)	Matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P006-RDC - PORCHERIE - HALL D'ENTRÉE - Sol - Revêtement de sols - Colle + joint de carrelage (GRIS / ROSE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-056505-01 | Date d'émission de rapport : 31/08/2026 14:29 | Page3/12
Dossier N° : 26K029686 | Date de réception : 26/08/2026 | Date d'analyse : 27/08/2026
Référence dossier Client:t260230694

C26160456_44-03-016-BUREAU-CIA_44-03-PORCHERIE-24-PL A - 1 rue des Quatre Vents 86480 ROUILLÉ - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	P007-RDC - BUREAUX - HALL D'ENTRÉE - Murs - Revêtement de murs - Colle + joint de plinthe (GRIS / ROSE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P008-RDC - PORCHERIE - HALL D'ENTRÉE - Murs - Revêtement de murs - Colle + joint de plinthe (GRIS / ROSE)	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P009-RDC - BUREAUX - EXPÉDITION - STOCKAGE DOSES - Sol - Revêtement de sols - Colle + joint de carrelage (BLANC TÂCHETÉ)	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-056505-01 | Date d'émission de rapport : 31/08/2026 14:29 | Page4/12
Dossier N° : 26K029686 | Date de réception : 26/08/2026 | Date d'analyse : 27/08/2026
Référence dossier Client:t260230694

C26160456_44-03-016-BUREAU-CIA_44-03-PORCHERIE-24-PL A - 1 rue des Quatre Vents 86480 ROUILLÉ - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	P010-RDC - PORCHERIE - HALL D'ENTRÉE - Sol - Revêtement de sols - Colle + joint de carrelage (BLANC TÂCHETÉ)	Matériau souple (gris) ; matériau de type poussières en traces ; matériau de type polystyrène (blanc) en traces(ii)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (beige) (granulaire)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P011-RDC - BUREAUX - EXPÉDITION - STOCKAGE DOSES - Murs - Revêtement de murs - Colle + joint de plinthe (BLANC TÂCHETÉ)	Matériau souple de type joint (gris)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-056505-01 | Date d'émission de rapport : 31/08/2026 14:29 | Page5/12
Dossier N° : 26K029686 | Date de réception : 26/08/2026 | Date d'analyse : 27/08/2026
Référence dossier Client:t260230694

C26160456_44-03-016-BUREAU-CIA_44-03-PORCHERIE-24-PL A - 1 rue des Quatre Vents 86480 ROUILLÉ - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P012-RDC - PORCHERIE - HALL D'ENTRÉE - Murs - Revêtement de murs - Colle + joint de plinthe (BLANC TÂCHETÉ)	Matériau dur de type joint ciment (noir) ; matériau (blanc) en traces	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination et * attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P013-RDC - BUREAUX - SAS D'ENTRÉE DU LABO CIA - Murs - Cloisons sèches - Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bandes calicot	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / LP5L	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type plaque métallique (gris)(iii)	MOLP * / LP5L	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-056505-01 | Date d'émission de rapport : 31/08/2026 14:29 | Page6/12
Dossier N° : 26K029686 | Date de réception : 26/08/2026 | Date d'analyse : 27/08/2026
Référence dossier Client:t260230694

C26160456_44-03-016-BUREAU-CIA_44-03-PORCHERIE-24-PL A - 1 rue des Quatre Vents 86480 ROUILLÉ - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	P014-RDC - BUREAUX - HALL D'ENTRÉE - Murs - Cloisons sèches - Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bandes calicot	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) n°1 + n °2 ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron)	**MOLP** * / LP5L	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
015	P015-RDC - PORCHERIE - HALL D'ENTRÉE - Murs - Cloisons sèches - Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bandes calicot	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) n°1 + n °2 ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron)	**MOLP** * / LP5L	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
016	P016-RDC - BUREAUX - SALLE CAFÉ - SANITAIRES - ZONE LAVABO - Murs - Revêtement de murs - Colle + joint de faïence (BLANC)	Matériau semi-dur de type joint (blanc)(ii)	**MET** * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-056505-01 | Date d'émission de rapport : 31/08/2026 14:29 | Page7/12
Dossier N° : 26K029686 | Date de réception : 26/08/2026 | Date d'analyse : 27/08/2026
Référence dossier Client:t260230694

C26160456_44-03-016-BUREAU-CIA_44-03-PORCHERIE-24-PL A - 1 rue des Quatre Vents 86480 ROUILLÉ - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (beige)	MET * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P017-RDC - PORCHERIE - HALL D'ENTRÉE - Murs - Revêtement de murs - Colle + joint de faïence (BLANC)	Matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	P018-RDC - PORCHERIE - SALLE DE COLLECTE - Murs - Revêtement de murs - Colle + joint de faïence (BLANC & GRIS)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	P019-RDC - PORCHERIE - SALLE DE COLLECTE - Murs - Revêtement de murs - Colle + joint de faïence (BLANC & GRIS)	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-056505-01 | Date d'émission de rapport : 31/08/2026 14:29 | Page8/12
Dossier N° : 26K029686 | Date de réception : 26/08/2026 | Date d'analyse : 27/08/2026
Référence dossier Client:t260230694

C26160456_44-03-016-BUREAU-CIA_44-03-PORCHERIE-24-PL A - 1 rue des Quatre Vents 86480 ROUILLÉ - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / UGT2	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	P020-RDC - PORCHERIE - SALLE DE COLLECTE - Sol - Revêtement de sols - Revêtement bitumineux	Matériau semi-dur (gris) (granulaire) + (blanc) (beige) (granulaire) + (noir) (bitumineux)	MET * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	P021-RDC - PORCHERIE - SALLE DE COLLECTE - Sol - Revêtement de sols - Revêtement bitumineux	Matériau semi-dur (noir) (bitumineux) + (blanc)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	P022-RDC - PORCHERIE - SALLE DE COLLECTE - Murs - Revêtement de murs - Colle + joint de faïence dans les escaliers (BEIGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / UGT2	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-056505-01 — Date d'émission de rapport : 31/08/2026 14:29 — Page9/12
Dossier N° : 26K029686 — Date de réception : 26/08/2026 — Date d'analyse : 27/08/2026
Référence dossier Client:t260230694

C26160456_44-03-016-BUREAU-CIA_44-03-PORCHERIE-24-PL A - 1 rue des Quatre Vents 86480 ROUILLÉ - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	P023-RDC - PORCHERIE - SALLE DE COLLECTE - Murs - Revêtement de murs - Colle + joint de faïence dans les escaliers (BEIGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) (granulaire)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	P024-RDC - PORCHERIE - SALLE DE COLLECTE - Sol - Revêtement de sols - Colle + joint de carrelage (PETIT CARREAU BEIGE)	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	P025-RDC - PORCHERIE - SALLE DE COLLECTE - Sol - Revêtement de sols - Colle + joint de carrelage (PETIT CARREAU BEIGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	P026-RDC - PORCHERIE - SALLE DE COLLECTE - Murs - Cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment	Matériau de type poussières en traces ; matériau semi-dur (gris) (granulaire)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-056505-01 | Date d'émission de rapport : 31/08/2026 14:29 | Page10/12
Dossier N° : 26K029686 | Date de réception : 26/08/2026 | Date d'analyse : 27/08/2026
Référence dossier Client:t260230694

C26160456_44-03-016-BUREAU-CIA_44-03-PORCHERIE-24-PL A - 1 rue des Quatre Vents 86480 ROUILLÉ - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	P027-RDC - PORCHERIE - VÉRATRIE - Murs - Cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment	Matériau semi-dur (gris) (granulaire)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
028 (1)	P028-RDC - PORCHERIE - VÉRATRIE - Plafond - Plafond - Plaques planes en fibres-ciment	Matériau de type poussières en traces ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
029 (1)	P029-Ectérieur - PORCHERIE - TOITURE - Toiture - Toiture - Plaques ondulées en fibres-ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / LP5L	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
030 (1)	P030-Ectérieur - BUREAUX - TOITURE - Toiture - Toiture - Plaques ondulées en fibres-ciment	Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)(iv)	MOLP * / LP5L	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
031	P031-Ectérieur - PORCHERIE - FAÇADE SUD-OUEST - Murs - Façades lourdes - Enduit à base de ciment	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur (beige) (granulaire) ; matériau de type poussières en traces	MET * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-056505-01 | Date d'émission de rapport : 31/08/2026 14:29 | Page11/12
Dossier N° : 26K029686 | Date de réception : 26/08/2026 | Date d'analyse : 27/08/2026
Référence dossier Client:t260230694

C26160456_44-03-016-BUREAU-CIA_44-03-PORCHERIE-24-PL A - 1 rue des Quatre Vents 86480 ROUILLÉ - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	P032-Ectérieur - PORCHERIE - FAÇADE SUD-EST - Murs - Façades lourdes - Enduit à base de ciment	Matériau de type poussières en traces ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur (beige) (granulaire)	**MET** * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)
(1) Une lingette ayant été utilisée lors du prélèvement pour la protection de l'opérateur de repérage est présente dans l'échantillon. Celle-ci n'a pas été analysée.

Observation(s) couche(s)
(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(ii) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(iii) Le matériau de type plaque métallique (gris) est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.
(iv) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau dur ibreux de type fibres-ciment (gris)». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-056505-01 | Date d'émission de rapport : 31/08/2026 14:29 | Page12/12
Dossier N° : 26K029686 | Date de réception : 26/08/2026 | Date d'analyse : 27/08/2026
Référence dossier Client:t260230694

C26160456_44-03-016-BUREAU-CIA_44-03-PORCHERIE-24-PL A - 1 rue des Quatre Vents 86480 ROUILLÉ - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection." ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Ines NOUYA
Chef(fe) de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s) Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Estimation des quantités	Observations
RDC	**PORCHERIE - VÉRATRIE**	**Plafond**	Plaques planes en fibres-ciment	**300 m²**	
Ectérieur	**BUREAUX - TOITURE**	**Toiture**	Plaques ondulées en fibres-ciment	**350 m²**	
Ectérieur	**PORCHERIE - TOITURE**	**Toiture**	Plaques ondulées en fibres-ciment	**350 m²**	

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.
Elle ne prend pas en compte :

- **Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux**
- **Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.**
- **La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective …)**

ANNEXE CERTIFICAT DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI8058 Version 001

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur RAMON Ugo

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 04/12/2025 - Date d'expiration : 03/12/2032
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 04/12/2025 - Date d'expiration : 03/12/2032
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 04/12/2025 - Date d'expiration : 03/12/2032

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 04/12/2025.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire

cofrac ACCREDITATION N° 4-0322 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CERTIFICATION DE PERSONNES

CPE DI FR 11 rev22

ANNEXE ATTESTATION ASSURANCE

Allianz

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société:

SAS APAVE
Immeuble CANOPY 6 rue du général Audran
92400 COURBEVOIE
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL003861** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle			
Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs sur base « Loss of use »	2 500 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages causés par l'amiante et le plomb (hors Faute Inexcusable)	5 000 000	EUR	Par année d'assurance

Il est précisé que le souscripteur est à jour du paiement de ses primes / ne fait pas l'objet d'une procédure de mise à demeure pour non - paiement de prime / ne fait l'objet d'aucune suspension de garantie, ni d'aucune procédure de mise en demeure pour non-paiement de prime au titre de ce contrat.Les activités assurées sont décrites dans l'Annexe suivante.
Période d'assurance du 01/01/2026 au 31/12/2026

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 17/11/2025

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :

Signature autorisée/ Authorised signatory :

S. PERREAU
Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet - CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social:
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : *« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »*

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

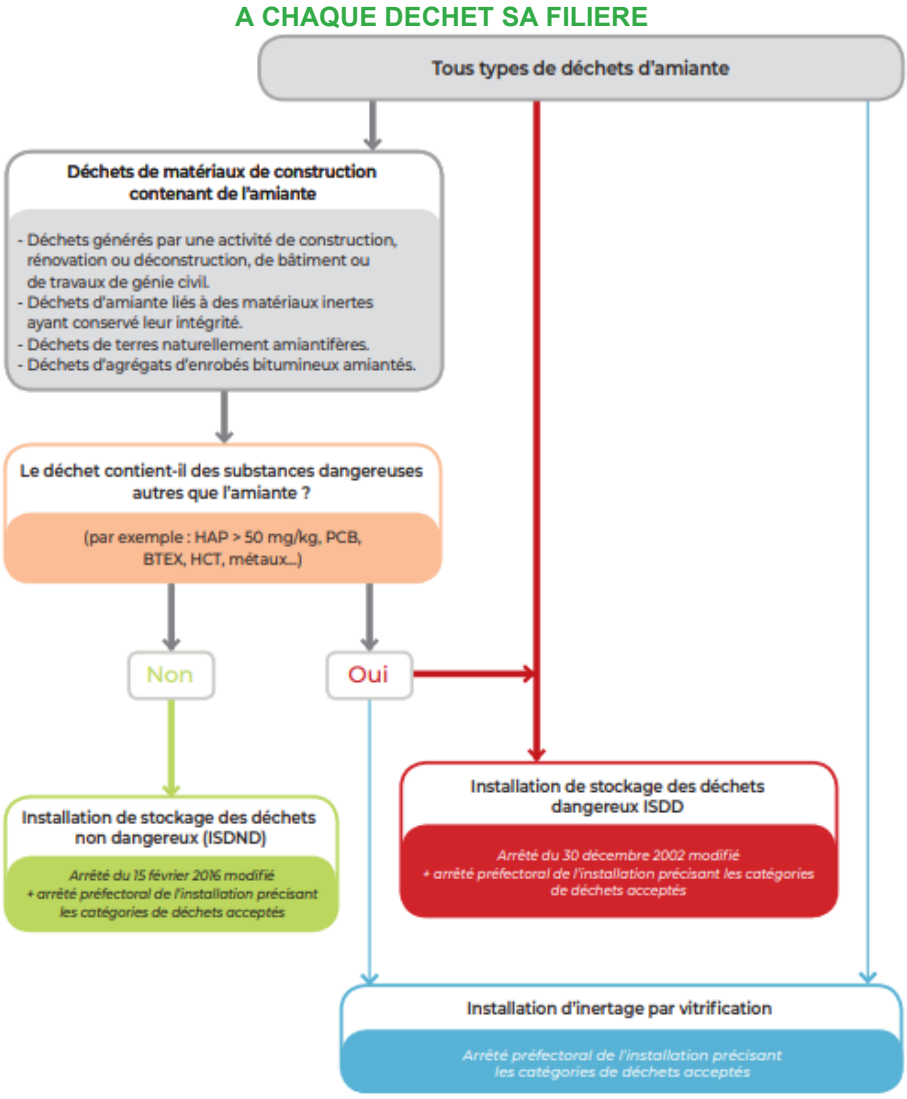
Les familles de déchets



Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	**Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)**
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés



Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.
Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfectures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :
https://www.sinoe.org/
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
