APAVE
AGENCE D'ANGOULEME
ZI N°3 74 avenue Maryse Bastié
16340 L'ISLE-D'ESPAGNAC
N° SIRET : 90386907100048

DONNEUR D'ORDRE
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
Le Chêne
86600 LUSIGNAN
CONTACT : Madame BERNARD Michèle

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuelles versions précédentes



Numéro d'offre : **3259951.2_44-03-006-BÂTIMENT-ADMINISTRATIF**
Numéro de contrat : **C26160456_44-03-006-BÂTIMENT-ADMINISTRATIF**
Numéro de rapport (n° de tâche) : **T260230694**
Date : **28/08/2026**

Lieu d'intervention :
44 03 006 ADMINISTRATIF
1 rue des Quatre Vents
86480 ROUILLÉ

Destinataire rapport :
Mme BERNARD Michèle

Date d'intervention :
Du **10/07/2026** au **10/07/2026**

Intervenant : **Monsieur Ugo RAMON**

Signature :

RAMON U.

Validation électronique

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 44 pages

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse :	**1 rue des Quatre Vents 86480 ROUILLÉ**	Référence Cadastrale :	**000AI - 0002**
Bâtiment :		Date du permis de construire :	**Antérieur au 1er juillet 1997**
Nature du bâtiment :	**44 03 006 ADMINISTRATIF**	Date de construction :	**Antérieure au 1er juillet 1997**

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	**INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT**
Adresse :	**Le Chêne 86600 LUSIGNAN**
Qualité :	

DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE

Nom:	**INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT**
Adresse :	**Le Chêne 86600 LUSIGNAN**

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par :	**RAMON Ugo**	Laboratoire d'Analyses :	**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud**
N° certificat de qualification :	**CPDI8058**	Adresse laboratoire :	**75C Avenue de Pascalet 30310 Vergèze**
Date d'obtention :	**04/12/2025**	Numéro d'accréditation :	**1-5922**
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :	**ICert Bâtiment K Parc d'Affaires Espace Performance 35760 SAINT-GRÉGOIRE**	Organisme d'assurance professionnelle :	**Allianz Global Corporate & Specialty SE**
		Adresse assurance :	**1 cours Michelet - CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex**
Date de la commande :	**30/07/2026**	N° de contrat d'assurance :	**FRL003861**
Accompagnateur :	**Aucun**	Date de validité :	**31/12/2026**

1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Nature des travaux envisagés : Démolition totale.

2 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES 2
DESIGNATION DU BATIMENT 2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE 2
DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE 2
EXÉCUTION DE LA MISSION 2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE 2

CONCLUSION(S) DU RAPPORT 2

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE 4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE 4

INVESTIGATIONS NON REALISEES 5
LOCAUX NON VISITES / MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE 6
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE 6

PRECONISATIONS 6

COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION 6
OBJECTIF 6
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES 6
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 6

PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION 7
PROGRAMME DE DEMOLITION 7
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE 7

RAPPORT(S) ANTERIEUR(S) 13

ANNEXE CROQUIS 14

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 17

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES 33

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES 38

ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE 39

ANNEXE ATTESTATION ASSURANCE 42

3 RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

3.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
Extérieur	TOITURE	Toiture	Plaques ondulées en fibres-ciment - Brut	Résultat d'analyse (P016)		Z009

3.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
RDC	SALLE D'ATTENTE	Revêtement de sols	Ragréage	**Résultat d'analyse (P001)**		Z001
		Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	**Résultat d'analyse (P013)**		Z007
RDC	BUREAU N°1	Cloisons sèches	Plots de colle fixant l'isolant au mur	**Résultat d'analyse (P007)**		Z004
RDC	LOCAL IMPRIMANTE	Cloisons sèches	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bandes calicot	**Résultat d'analyse (P009)**		Z005
		Cloisons sèches	Plots de colle fixant l'isolant au mur	**Résultat d'analyse (P008)**		Z004
RDC	SANITAIRES - LAVABO/DOUCHE	Revêtement de murs	Colle + joints de faïence	**Résultat d'analyse (P005)**		Z003
		Revêtement de sols	Ragréage	**Résultat d'analyse (P002)**		Z001
RDC	SANITAIRES - WC	Revêtement de murs	Colle + joints de faïence	**Résultat d'analyse (P006)**		Z003
Entresol	CAGE D'ESCALIERS	Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre + Peinture	**Résultat d'analyse (P011)**		Z006
Sous sol	LOCAL EMBALLAGE	Revêtement de sols	Ragréage + Peinture de sol	**Résultat d'analyse (P003)**		Z002
		Cloisons sèches	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bandes calicot	**Résultat d'analyse (P010)**		Z005
Sous sol	LOCAL ARCHIVES	Revêtement de sols	Ragréage + Peinture de sol	**Résultat d'analyse (P004)**		Z002
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre + Peinture	**Résultat d'analyse (P012)**		Z006
Extérieur	FAÇADE SUD-EST	Façades lourdes	Enduit à base de ciment + Peinture	**Résultat d'analyse (P014)**		Z008
Extérieur	FAÇADE NORD-OUEST	Façades lourdes	Enduit à base de ciment + Peinture	**Résultat d'analyse (P015)**		Z008

4 INVESTIGATIONS NON REALISEES

4.1 Locaux non visités / Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

4.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

5 PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante qui doit être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

6 COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

6.1 OBJECTIF

La prestation a pour objectif de réaliser le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante dont le propriétaire doit disposer avant démolition totale ou de plus de 50 % de la structure de son immeuble.

6.2 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004,
Décret n° 2010 – 1200 du 11 Octobre 2010 pris en application de l'article L 271-6 du code de la construction et de l'habitation,
Décret 2011-629 du 3 juin 2011 : protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis,
Articles R 1334-19 et R 1334-22 du code de la santé publique,
Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage,
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,
Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification,
Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

6.3 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date de réalisation du repérage : 10/07/2026
Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques

communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de plénums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération.
Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant
Documents remis : Néant

Commentaire : **Des sondages destructifs ont été réalisés sur les parois et ouvrages accessibles dans le cadre de la présente mission. Toutefois, l'intégralité des volumes situés derrière les doublages, cloisons, gaines techniques, coffrages et complexes de parois n'a pas pu être contrôlée.**
Par ailleurs, certains ouvrages se prolongeant dans le sol, leur emprise, leur profondeur et leur étendue n'ont pas pu être déterminées dans leur intégralité.
En conséquence, certains matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante peuvent ne pas avoir été repérés ou leur quantité exacte ne pas avoir pu être caractérisée à ce stade.
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux de démolition ou de terrassement, si des matériaux ou ouvrages non caractérisés venaient à être mis au jour, des investigations complémentaires pourront être réalisées, si besoin, afin d'en déterminer la nature et l'étendue.
Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante, défini à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.
Il ne peut être finalisé qu'après évacuation définitive de l'immeuble bâti et enlèvement des mobiliers afin que tous les composants soient accessibles.

7 PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

7.1 PROGRAMME DE DEMOLITION

Démolition totale.

7.2 PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties d'immeuble concernés par la démolition telle que définie par le donneur d'ordre.
Programme de repérage : Matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction et susceptibles d'être affectés par la démolition en regard des matériaux ou produits figurant dans la liste

C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, le tableau A1 de la norme NF X 46 020 et tout autre matériau réputé contenir de l'amiante dont l'opérateur aurait connaissance.


Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de démolition tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

Liste des locaux (visités / non visités) :

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
RDC	SALLE D'ATTENTE 	OUI	
RDC	BUREAU N°1 	OUI	
RDC	BUREAU N°2 	OUI	
RDC	BUREAU N°3 	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
RDC	BUREAU N°4 	OUI	
RDC	LOCAL IMPRIMANTE 	OUI	
RDC	SALLE DE RÉUNION 	OUI	
RDC	SANITAIRES - LAVABO/DOUCHE 	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
RDC	SANITAIRES - WC 	OUI	
Entresol	CAGE D'ESCALIERS 	OUI	
Sous sol	LOCAL EMBALLAGE 	OUI	
Sous sol	LOCAL N°1 	OUI	

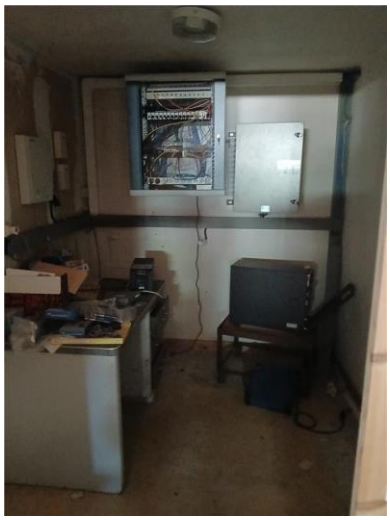Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
Sous sol	LOCAL N°2 	OUI	
Sous sol	LOCAL INFORMATIQUE 	OUI	
Sous sol	LOCAL ARCHIVES 	OUI	
Extérieur	FAÇADE SUD-EST 	OUI	
Extérieur	FAÇADE SUD-OUEST	OUI	
Extérieur	FAÇADE NORD-OUEST	OUI	
Extérieur	FAÇADE NORD-EST	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
Extérieur	TOITURE 	OUI	

8 RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)


Rapports précédents :
Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

ANNEXE CROQUIS

apave	**Planche de repérage**		
Client :	INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR	Titre :	44 03 007 BÂTIMENT ADMINISTRATIF -
N° rapport :	T260230694		
N° planche :	1/2 Version : 0	Lieu d'intervention :	1 rue des Quatre Vents 86480 ROUILLÉ
Type :	Croquis		
Date :	28/08/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	RAMON Ugo	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

Prélèvements négatifs

Prélèvements positifs

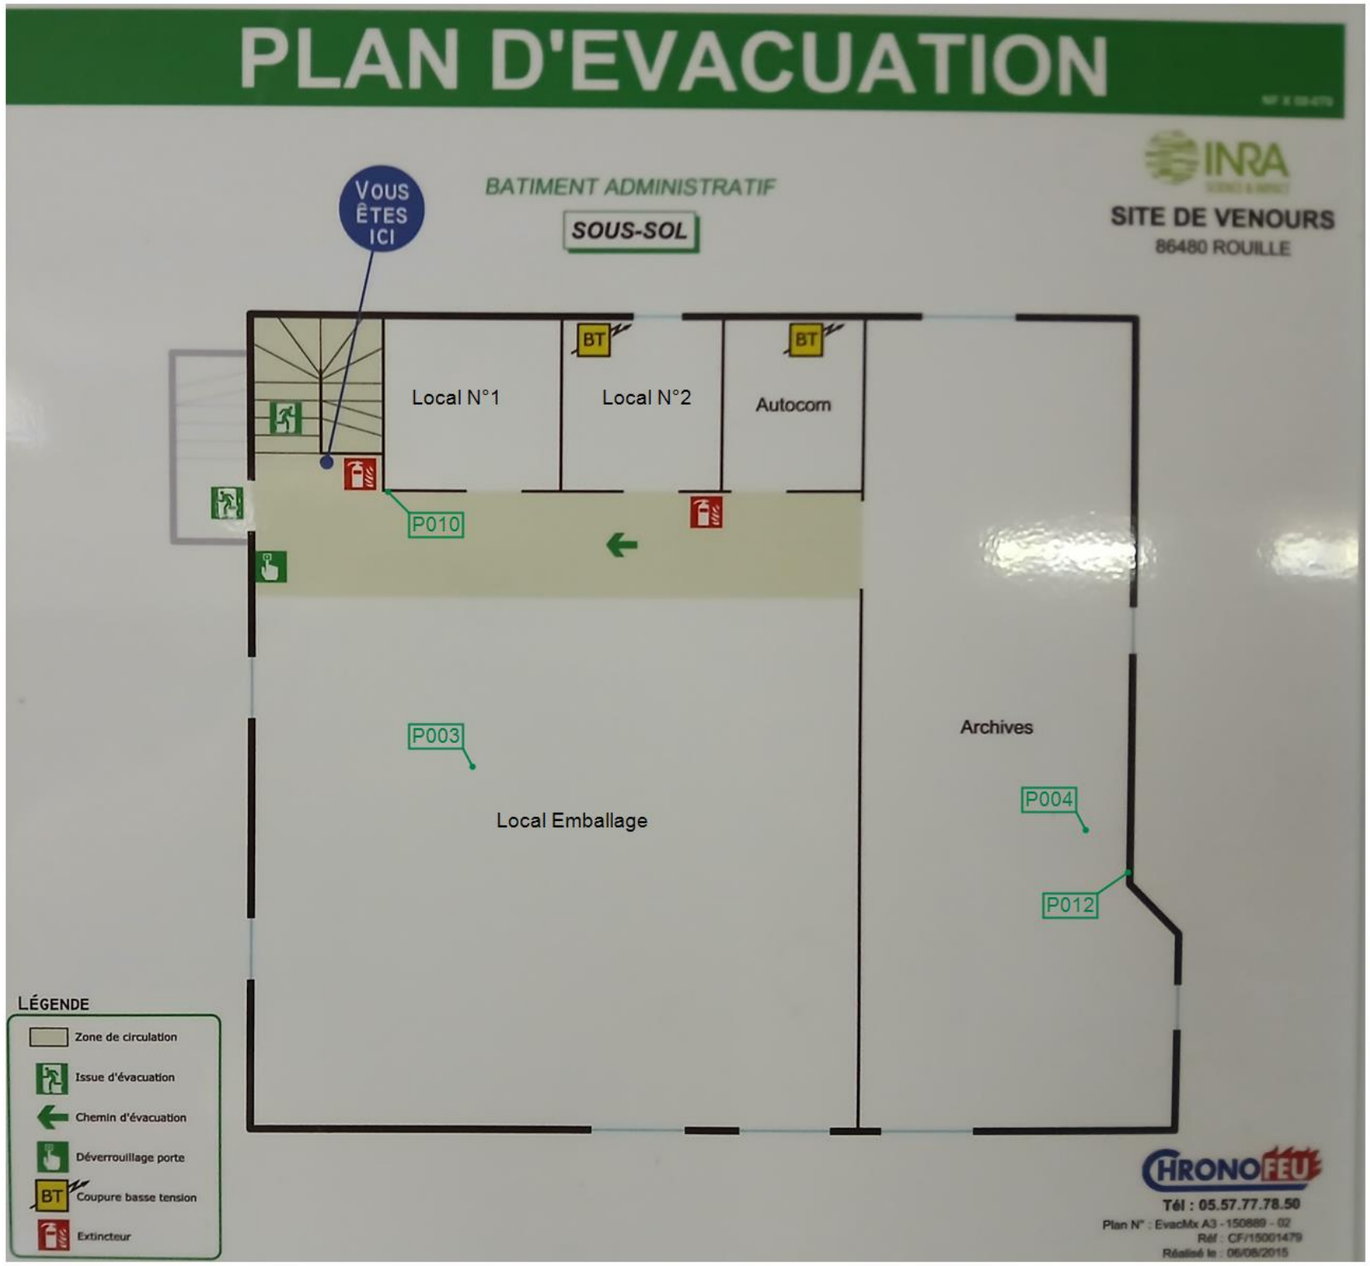


Client :	INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR	Titre :	44 03 007 BÂTIMENT ADMINISTRATIF - RDC
N° rapport :	T260230694		
N° planche :	2/2 Version : 0	Lieu d'intervention :	1 rue des Quatre Vents 86480 ROUILLÉ
Type :	Croquis		
Date :	28/08/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	RAMON Ugo	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

Planche de repérage

Prélèvements négatifs

Prélèvements positifs

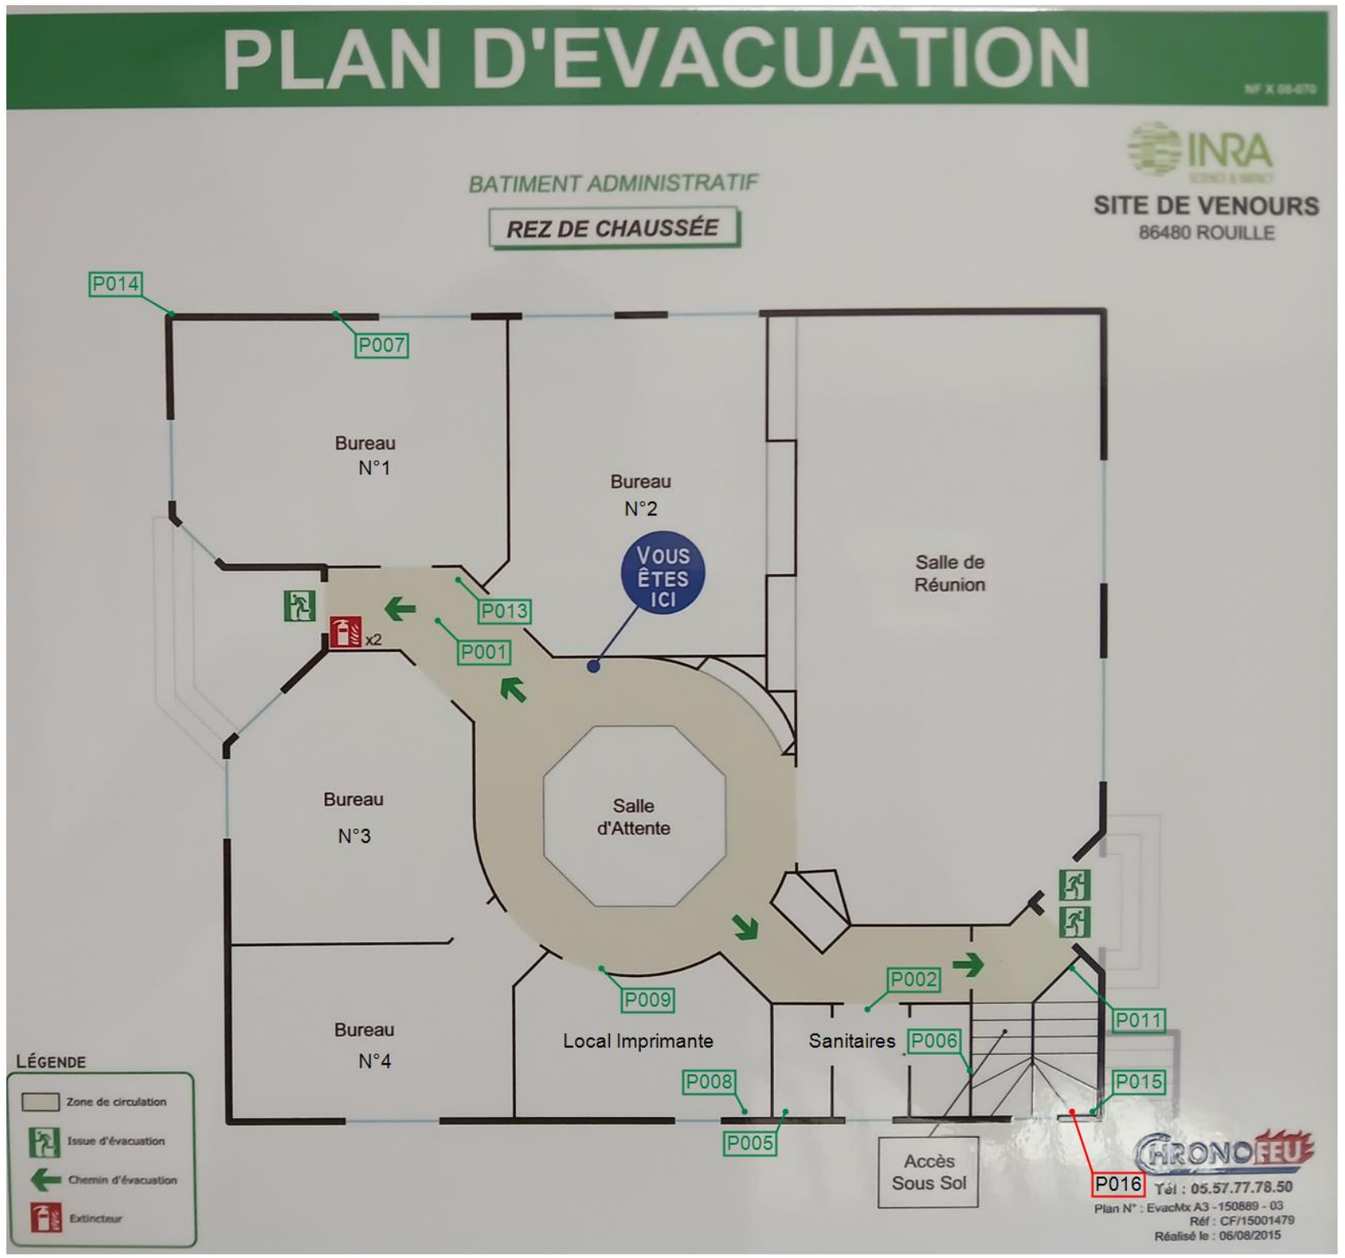

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

PRELEVEMENT : P001

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT	T260230694	RDC - SALLE D'ATTENTE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Ragréage	10/07/2026	RAMON Ugo

Localisation

Revêtement de sols - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Ragréage



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (rose) + (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-049026-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT	T260230694	RDC - SANITAIRES - LAVABO/DOUCHE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Ragréage	10/07/2026	RAMON Ugo

Localisation

Revêtement de sols - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Ragréage



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-049026-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT	T260230694	Sous sol - LOCAL EMBALLAGE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Ragréage + Peinture de sol	10/07/2026	RAMON Ugo

Localisation

Revêtement de sols - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Ragréage + Peinture de sol




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-049026-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT	T260230694	Sous sol - LOCAL ARCHIVES

Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage + Peinture de sol	10/07/2026	RAMON Ugo

Localisation

Revêtement de sols - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Ragréage + Peinture de sol




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-049026-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005

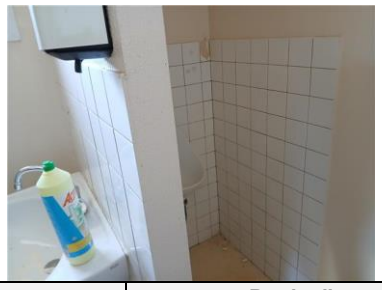Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT	T260230694	RDC - SANITAIRES - LAVABO/DOUCHE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle + joints de faïence	10/07/2026	RAMON Ugo

Localisation

Revêtement de murs - Murs


Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle + joints de faïence



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-049026-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT	T260230694	RDC - SANITAIRES - WC
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle + joints de faïence	10/07/2026	RAMON Ugo

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle + joints de faïence



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (gris)	
001-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-049026-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-049026-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-26-KC-049026-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT	T260230694	RDC - BUREAU N°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plots de colle fixant l'isolant au mur	10/07/2026	RAMON Ugo

Localisation

Cloisons sèches - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Plots de colle fixant l'isolant au mur




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type colle (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur (jaune)	
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-049026-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-049026-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

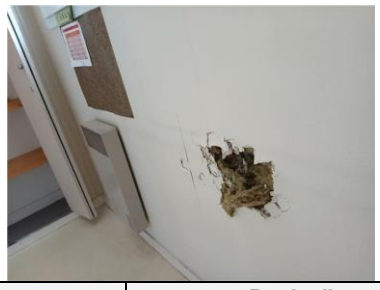Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT	T260230694	RDC - LOCAL IMPRIMANTE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plots de colle fixant l'isolant au mur	10/07/2026	RAMON Ugo

Localisation

Cloisons sèches - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Plots de colle fixant l'isolant au mur



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type colle (blanc) (plâtreux)	
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-049026-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-049026-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT	T260230694	RDC - LOCAL IMPRIMANTE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bandes calicot	10/07/2026	RAMON Ugo

Localisation

Cloisons sèches - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bandes calicot



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (marron)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-049026-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-049026-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT	T260230694	Sous sol - LOCAL EMBALLAGE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bandes calicot	10/07/2026	RAMON Ugo

Localisation

Cloisons sèches - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bandes calicot



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type plaque métallique	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-049026-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-049026-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT	T260230694	Entresol - CAGE D'ESCALIERS
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit à base de plâtre + Peinture	10/07/2026	RAMON Ugo

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit à base de plâtre + Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-049026-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT	T260230694	Sous sol - LOCAL ARCHIVES
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit à base de plâtre + Peinture	10/07/2026	RAMON Ugo

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit à base de plâtre + Peinture




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-049026-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT	T260230694	RDC - SALLE D'ATTENTE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Dalles de faux-plafond	10/07/2026	RAMON Ugo

Localisation

Faux-plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Dalles de faux-plafond



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-049026-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT	T260230694	Extérieur - FAÇADE SUD-EST
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit à base de ciment + Peinture	10/07/2026	RAMON Ugo

Localisation

Façades lourdes - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit à base de ciment + Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type ciment (jaune)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-049026-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT	T260230694	Extérieur - FAÇADE NORD-OUEST
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit à base de ciment + Peinture	10/07/2026	RAMON Ugo

Localisation

Façades lourdes - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit à base de ciment + Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type ciment (jaune)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-049026-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT	T260230694	Extérieur - TOITURE
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plaques ondulées en fibres-ciment - Brut	10/07/2026	RAMON Ugo

Localisation

Toiture - Toiture


Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Plaques ondulées en fibres-ciment / Brut



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-049026-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

PV_00720260801897895

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Ugo RAMON
ZI N°3 Avenue Maryse Bastié
16340 L'ISLE-D'ESPAGNAC

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-049026-01 — Date d'émission de rapport : 13/08/2026 17:57 — Page1/5
Dossier N° : 26K028064 — Date de réception : 07/08/2026 — Date d'analyse : 12/08/2026
Référence dossier Client:t260230694
C26160456_44-03-006-BÂTIMENT-ADMINISTRATIF A /83259951.2_44-03-006- 1 rue des Quatre Vents 86480 ROUILLÉ - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-RDC - SALLE D'ATTENTE - Sol - Revêtement de sols - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (rose) + (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002-RDC - SANITAIRES - LAVABO/DOUCHE - Sol - Revêtement de sols - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003-Sous sol - LOCAL EMBALLAGE - Sol - Revêtement de sols - Ragréage + Peinture de sol	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004-Sous sol - LOCAL ARCHIVES - Sol - Revêtement de sols - Ragréage + Peinture de sol	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-049026-01 — Date d'émission de rapport : 13/08/2026 17:57 — Page2/5
Dossier N° : 26K028064 — Date de réception : 07/08/2026 — Date d'analyse : 12/08/2026
Référence dossier Client:t260230694
C26160456_44-03-006-BÂTIMENT-ADMINISTRATIF A /83259951.2_44-03-006- 1 rue des Quatre Vents 86480 ROUILLÉ - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P005-RDC - SANITAIRES - LAVABO/DOUCHE - Murs - Revêtement de murs - Colle + joints de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P006-RDC - SANITAIRES - WC - Murs - Revêtement de murs - Colle + joints de faïence	Matériau dur de type joint ciment (gris)(ii)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / F437	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
007 (1)	P007-RDC - BUREAU N°1 - Murs - Cloisons sèches - Plots de colle fixant l'isolant au mur	Matériau de type colle (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur (jaune)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / F437	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-049026-01 — Date d'émission de rapport : 13/08/2026 17:57 — Page3/5
Dossier N° : 26K028064 — Date de réception : 07/08/2026 — Date d'analyse : 12/08/2026
Référence dossier Client:t260230694
C26160456_44-03-006-BÂTIMENT-ADMINISTRATIF A /83259951.2_44-03-006- 1 rue des Quatre Vents 86480 ROUILLÉ - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008 (1)	P008-RDC - LOCAL IMPRIMANTE - Murs - Cloisons sèches - Plots de colle fixant l'isolant au mur	Matériau de type colle (blanc) (plâtreux)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** * / F437	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
009	P009-RDC - LOCAL IMPRIMANTE - Murs - Cloisons sèches - Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bandes calicot	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (marron)	**MOLP** * / F437	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
010	P010-Sous sol - LOCAL EMBALLAGE - Murs - Cloisons sèches - Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bandes calicot	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type plaque métallique	**MOLP** * / F437	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
011	P011-Entresol - CAGE D'ESCALIERS - Murs - Revêtement de murs - Enduit à base de plâtre + Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-049026-01 — Date d'émission de rapport : 13/08/2026 17:57 — Page4/5
Dossier N° : 26K028064 — Date de réception : 07/08/2026 — Date d'analyse : 12/08/2026
Référence dossier Client:t260230694
C26160456_44-03-006-BÂTIMENT-ADMINISTRATIF A /83259951.2_44-03-006- 1 rue des Quatre Vents 86480 ROUILLÉ - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	P012-Sous sol - LOCAL ARCHIVES - Murs - Revêtement de murs - Enduit à base de plâtre + Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013	P013-RDC - SALLE D'ATTENTE - Plafond - Faux-plafond - Dalles de faux-plafond	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014	P014-Extérieur - FAÇADE SUD-EST - Murs - Façades lourdes - Enduit à base de ciment + Peinture	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type ciment (jaune)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
015	P015-Extérieur - FAÇADE NORD-OUEST - Murs - Façades lourdes - Enduit à base de ciment + Peinture	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type ciment (jaune)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
016 (2)	P016-Extérieur - TOITURE - Toiture - Toiture - Plaques ondulées en fibres-ciment - Brut	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)(iii)	**MOLP** * / F437	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-049026-01 | Date d'émission de rapport : 13/08/2026 17:57 | Page5/5
Dossier N° : 26K028064 | Date de réception : 07/08/2026 | Date d'analyse : 12/08/2026
Référence dossier Client:t260230694
C26160456_44-03-006-BÂTIMENT-ADMINISTRATIF A /83259951.2_44-03-006- 1 rue des Quatre Vents 86480 ROUILLÉ - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT

Observation(s) échantillon(s)

(1) Des fibres minérales susceptibles d'être inhalées (l<3 µm) ont été observées au sein de la couche/l'échantillon. Ces fibres sont de nature non-asbestiforme

(2) Une lingette ayant été utilisée lors du prélèvement pour la protection de l'opérateur de repérage est présente dans l'échantillon. Celle-ci n'a pas été analysée.

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

(ii) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

(iii) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau fibres-ciment (gris) ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection." ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Ines NOUYA
Chef(fe) de Groupe



Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Estimation des quantités	Observations
Extérieur	**TOITURE**	**Toiture**	Plaques ondulées en fibres-ciment - Brut	**450 m²**	

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.
Elle ne prend pas en compte :

- **Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux**
- **Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.**
- **La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective …)**

ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE

Z001 - Ensemble du ragréage de toutes les pièces du RDC							Continue : OUI
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**SALLE D'ATTENTE**	Revêtement de sols	X	**Ragréage**		**P001**	**Non**
RDC	**SANITAIRES - LAVABO/DOUCHE**	Revêtement de sols		**Ragréage**		**P002**	**Non**

Z002 - Ensemble du ragréage et de la peinture de sol de toutes les pièces du sous-sol							Continue : OUI
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
Sous sol	**LOCAL EMBALLAGE**	Revêtement de sols	X	**Ragréage + Peinture de sol**		**P003**	**Non**
Sous sol	**LOCAL ARCHIVES**	Revêtement de sols		**Ragréage + Peinture de sol**		**P004**	**Non**

Z003 - Ensemble de la colle et des joints de la faïence des sanitaire du RDC							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**SANITAIRES - LAVABO/DOUCHE**	Revêtement de murs	X	**Colle + joints de faïence**		**P005**	**Non**
RDC	**SANITAIRES - WC**	Revêtement de murs		**Colle + joints de faïence**		**P006**	**Non**

Z004 - Ensemble des plots de colle fixant l'isolant aux murs de toutes les pièces du RDC							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**BUREAU N°1**	Cloisons sèches	X	**Plots de colle fixant l'isolant au mur**		**P007**	**Non**
RDC	**LOCAL IMPRIMANTE**	Cloisons sèches		**Plots de colle fixant l'isolant au mur**		**P008**	**Non**

Z005 - Ensemble des enduits de jointoiement des plaques de plâtre et des bandes calicot des cloisons du RDC et du sous-sol	Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	LOCAL IMPRIMANTE	Cloisons sèches	X	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bandes calicot		P009	Non
Sous sol	LOCAL EMBALLAGE	Cloisons sèches		Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bandes calicot		P010	Non

Z006 - Ensemble des enduits à base de plâtre des murs du sous-sol	Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
Entresol	CAGE D'ESCALIERS	Revêtement de murs	X	Enduit à base de plâtre + Peinture		P011	Non
Sous sol	LOCAL ARCHIVES	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre + Peinture		P012	Non

Z007 - Ensemble des dalles de faux-plafond présents dans une partie des locaux du RDC	Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	SALLE D'ATTENTE	Faux-plafond	X	Dalles de faux-plafond		P013	Non

Z008 - Ensemble de l'enduit à base de ciment des façades du bâtiment	Continue : OUI

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
Extérieur	FAÇADE SUD-EST	Façades lourdes	X	Enduit à base de ciment + Peinture		P014	Non
Extérieur	FAÇADE NORD-OUEST	Façades lourdes		Enduit à base de ciment + Peinture		P015	Non

Z009 - Ensemble des plaques ondulées en fibres-ciment de la toiture du bâtiment	Continue : OUI

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
Extérieur	TOITURE	Toiture	X	Plaques ondulées en fibres-ciment - Brut		P016	Oui

ANNEXE CERTIFICAT DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI8058 Version 001

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur RAMON Ugo

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 04/12/2025 - Date d'expiration : 03/12/2032
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 04/12/2025 - Date d'expiration : 03/12/2032
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 04/12/2025 - Date d'expiration : 03/12/2032

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 04/12/2025.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire

cofrac ACCREDITATION N° 4-0522 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CERTIFICATION DE PERSONNES

CPE DI FR 11 rev22

ANNEXE ATTESTATION ASSURANCE

Allianz

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société:

SAS APAVE
Immeuble CANOPY 6 rue du général Audran
92400 COURBEVOIE
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL003861** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle			
Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs sur base « Loss of use »	2 500 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages causés par l'amiante et le plomb (hors Faute Inexcusable)	5 000 000	EUR	Par année d'assurance

Il est précisé que le souscripteur est à jour du paiement de ses primes / ne fait pas l'objet d'une procédure de mise à demeure pour non - paiement de prime / ne fait l'objet d'aucune suspension de garantie, ni d'aucune procédure de mise en demeure pour non-paiement de prime au titre de ce contrat.Les activités assurées sont décrites dans l'Annexe suivante.
Période d'assurance du 01/01/2026 au 31/12/2026

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 17/11/2025

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :

Signature autorisée/ Authorised signatory :

S. PERREAU
Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet - CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social:
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : *« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »*

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.


Les familles de déchets



Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	**Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)**
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

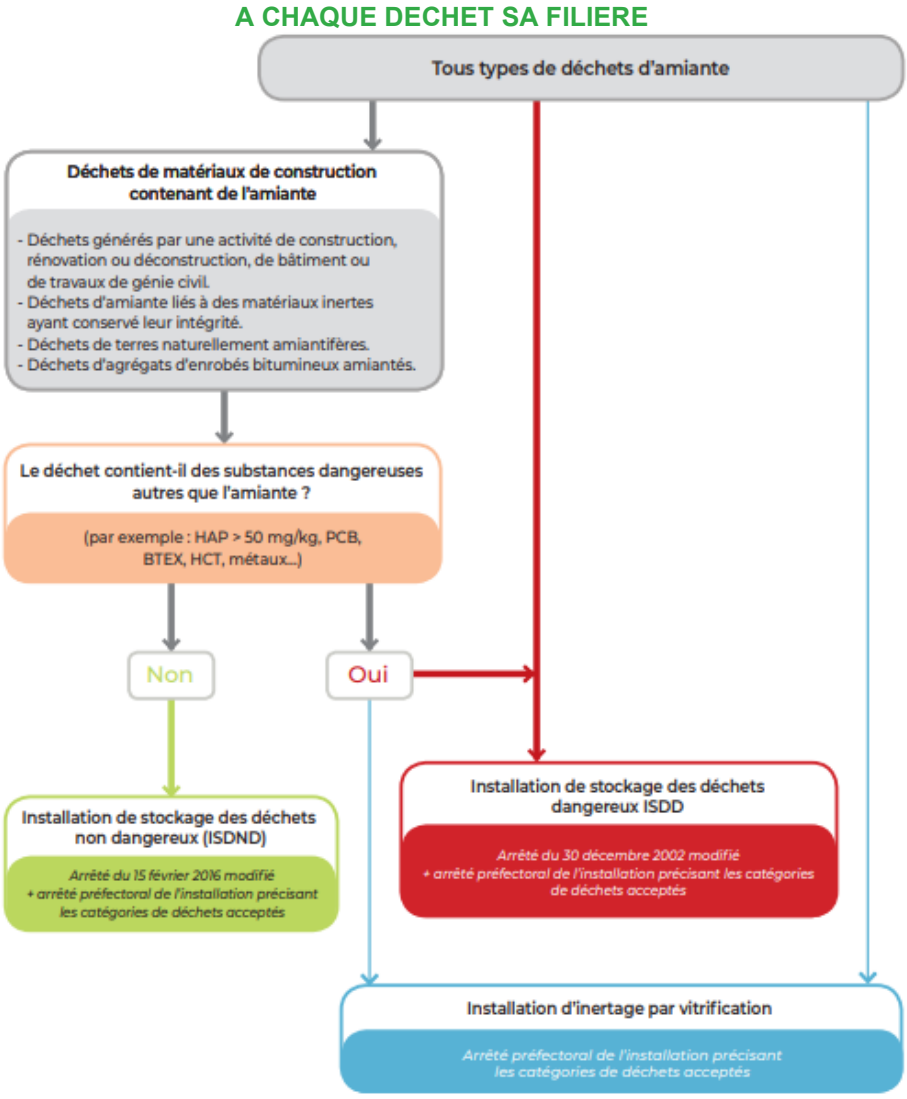

Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.
Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfectures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :
https://www.sinoe.org/
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
