Mission de coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé

UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE À REIMS - REFONTE DU CÂBLAGE VOIX DONNÉES IMAGES (VDI) DU BÂTIMENT 18

Campus du Moulin de la Housse – 51100 REIMS

51100 Reims

Dossier n° : 260613200000001

Plan Général Simplifié de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé

Mission CSPS : Catégorie 3

Indice	Date	Modifications	Rédaction
2	16/09/2026	PGSC du 16/09/2026 Commentaire : Mise à jour du PGSC conformément aux remarques du maître d'ouvrage	Benoit DE TIMMERMAN
1	16/09/2026	PGSC indice 1 du 16/09/2026 Commentaire : Mise à jour du PGSC conformément aux remarques du maître d'ouvrage	Benoit DE TIMMERMAN
0	15/07/2026	PGSC indice 0 du 15/07/2026	James CALONEGO

SOMMAIRE

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET D'ORDRE ADMINISTRATIF INTÉRESSANT LE CHANTIER

1.1. Liste des intervenants
1.1.1. Liste des intervenants
1.2. Liste des lots
1.2.1. Liste des lots
1.3. Etat d'avancement de l'affaire
1.3.1. Etat d'avancement de l'affaire lors de l'élaboration
1.4. Renseignements généraux concernant l'opération
1.4.1. Description générale de l'opération et de l'ouvrage
1.4.2. Phasage de l'opération
1.4.3. Informations complémentaires
1.5. Informations complémentaires
1.5.1. Début des travaux Février/Mars. durée 12 mois maximum
1.5.2. Adresse chantier : Bâtiment 18, UFR des Sciences Exactes et Naturelles, Campus Moulin de la Housse - chemin des rouliers BP 1039 - 51687 Reims Cedex 2in des rouliers
1.6. Contexte réglementaire
1.6.1. Contexte réglementaire de l'opération

2. SUJÉTIONS LIÉES À LA CONFIGURATION ET AUX CARACTÉRISTIQUES DU SITE - SUJÉTIONS DÉCOULANT DES INTERFÉRENCES AVEC DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION SUR LE SITE À L'INTÉRIEUR OU À PROXIMITÉ DUQUEL EST IMPLANTÉ LE CHANTIER

2.1. Réseaux existants
2.1.1. Présence de Réseaux
2.2. Matériaux dangereux (amiante, plomb …)
2.2.1. Amiante Diagnostic

3. MESURES ET SUJÉTIONS GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE COORDINATION ARRÊTÉES EN CONCERTATION AVEC LE MAITRE D’ŒUVRE ET MAÎTRE D'OUVRAGE

3.1. Planification
3.1.1. Planning de l'opération
3.2. Délimitation du chantier et autorisation d'accès
3.2.1. Clôture de chantier extérieure
3.2.2. Clôture ou cloison de chantier intérieure
3.2.3. Zone de stockage
3.3. Accueil du personnel
3.3.1. Base vie - Modalités d'organisation
3.4. Organisation des secours
3.4.1. Consignes de sécurité et d'alerte des secours
3.4.2. Matériel de secours

4. MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ

4.1. Conditions d'enlèvement des matériaux dangereux
4.1.1. Evacuation des matières dangereuses
4.2. Travaux comportant des risques particuliers - Plan Général Simplifié de Coordination
4.2.1. Travaux exposant à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres - Travaux sur échafaudages et nacelles

5. MODALITÉS DE COOPÉRATION ENTRE INTERVENANTS

5.1. Modalités de coopération
5.1.1. Plan Général Simplifié de Coordination
5.1.2. Désignation des entreprises
5.1.3. Acceptation et désignation des sous-traitants
5.1.4. Prestataires de services et Travailleurs indépendants

5.1.5. Présence de personnel étranger
5.1.6. Inspection Commune
5.1.7. Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé Simplifié
5.1.8. Rôle du coordonnateur
5.1.9. Registre journal

6 DOCUMENT HARMONISÉ D'ORGANISATION DES LIVRAISONS

7 ANNEXES

7.1 URCA BATIMENT 18 - Reims - Planning Prévisionnel - Câblage VDI-E REV2.1.pdf
7.2 Les_installations_daccueil_et_dhygiène_sur_chantier.pdf
7.3 Affiche-en-cas-d-accident.pdf
7.4 32797937_Repérage amiante avant-travaux - BATIMENT 18.pdf

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET D'ORDRE ADMINISTRATIF INTÉRESSANT LE CHANTIER

1.1. Liste des intervenants

Maître d'ouvrage	URCA	2 Avenue Robert Schuman 51100 REIMS
Coordonnateur SPS suppléant	SOCOTEC	8 Rue Jules Meline B4 au R+2 ZAC Bezannes 51340 BEZANNES

1.2. Liste des lots

N°- Lot attribué	Entreprise	Adresse	Contact
1 - Entreprise générale			

1.3. Etat d'avancement de l'affaire

1.3.1. Etat d'avancement de l'affaire lors de l'élaboration

Le coordonnateur établissant le Plan Général de coordination avant la nomination des entreprises, le présent article renvoie au chapitre I du registre Journal de coordination où les éléments visés ci-dessus sont tenus à jour régulièrement.

Le plan général de coordination, indice 0, est élaboré pour l'intégrer au dossier de consultation des entreprises.

1.4. Renseignements généraux concernant l'opération

Refonte du câblage Voix Données Images (VDI) du bâtiment 18

1.4.1. Description générale de l'opération et de l'ouvrage

Ouvrage existant

1.4.2. Phasage de l'opération

L'opération se fera en deux tranches (tranche ferme A et D et optionnelle B et C)

1.4.3. Informations complémentaires

1.5. Informations complémentaires

1.5.1. Début des travaux Février/Mars. durée 12 mois maximum

1.5.2. Adresse chantier : Bâtiment 18, UFR des Sciences Exactes et Naturelles, Campus Moulin de la Housse - chemin des rouliers BP 1039 - 51687 Reims Cedex 2in des rouliers

1.6. Contexte réglementaire

1.6.1. Contexte réglementaire de l'opération

Les interventions seront réalisées en site occupé. L'entreprise devra prendre toutes les dispositions utiles afin d'assurer la sécurité des personnes. Lorsque l'activité du chantier présente un danger pour les personnes amenées à circuler à sa

proximité, le titulaire s’engage à assurer une protection réglementaire des lieux (balisage, signalisation, interdiction d’accès, etc. …).

Les travaux bruyants tels que les percements importants, carottages, devront être réalisés en dehors des heures de travail (de 8h00 à 17h30).

2. SUJÉTIONS LIÉES À LA CONFIGURATION ET AUX CARACTÉRISTIQUES DU SITE - SUJÉTIONS DÉCOULANT DES INTERFÉRENCES AVEC DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION SUR LE SITE À L'INTÉRIEUR OU À PROXIMITÉ DUQUEL EST IMPLANTÉ LE CHANTIER

2.1. Réseaux existants

2.1.1. Présence de Réseaux

Présence de Réseaux enterrés

Dispositions prévues	A la charge de
L'Université de Reims Champagne Ardenne (URCA) fournira à l'entreprise un repérage de l'ensemble des réseaux présents sur le site.	Tous Corps d'état 1 - Entreprise générale Maître d'ouvrage

2.2. Matériaux dangereux (amiante, plomb …)

2.2.1. Amiante Diagnostic

Dispositions prévues	A la charge de
Conformément aux dispositions réglementaires, le maître d'ouvrage a fait établir un diagnostic en recherche d'amiante avant travaux par la société . Rapport N°:.32797937/S1/1/AM-RTV_V1 en date du,.02/07/2026.. Ce rapport est joint au dossier de la consultation des entreprises. L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.	Maître d'ouvrage 1 - Entreprise générale
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4	1 - Entreprise générale

3. MESURES ET SUJÉTIONS GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE COORDINATION ARRÊTÉES EN CONCERTATION AVEC LE MAITRE D'ŒUVRE ET MAÎTRE D'OUVRAGE

3.1. Planification

3.1.1. Planning de l'opération

Dispositions prévues	A la charge de
Le planning général des travaux a été transmis au coordonnateur lors de la rédaction du présent PGC. Voir en annexe.	Maître d'ouvrage Maître d'œuvre
Le planning de réalisation, à établir au démarrage de l'opération, fera apparaître chaque phase de travaux, continue ou fractionnée, des différents corps d'état. Les risques d'interférence entre entreprises doivent être minimisés : - En limitant les programmations simultanées dans une même zone, - En organisant des interventions successives par zones, - En interdisant les travaux superposés, sans mesures spécifiques de protection et d'organisation, - En facilitant les interventions en matière de flux (matériel, matériaux), - En faisant apparaître l'utilisation des moyens communs (stade de mise en œuvre planifiés).	Maître d'œuvre 1 - Entreprise générale

3.2. Délimitation du chantier et autorisation d'accès

3.2.1. Clôture de chantier extérieure

Dispositions prévues	A la charge de
Une clôture assurera l'indépendance du chantier pendant toute la durée des travaux sur chacune des zones d'intervention. Elle sera installée dès le démarrage des travaux et complétera les clôtures existantes le cas échéant. Elle sera constituée par des panneaux métalliques pleins ou grillagés, d'une hauteur de 2,00m. L'entreprise devra la maintenance et l'adaptation des clôtures pendant toute la durée de l'opération suivant les besoins.	1 - Entreprise générale

3.2.2. Clôture ou cloison de chantier intérieure

Dispositions prévues	A la charge de
Les zones de travaux mitoyennes avec les locaux existants en activité seront isolées par des cloisons provisoires.	1 - Entreprise générale

3.2.3. Zone de stockage

Dispositions prévues	A la charge de
Le local technique principal (LTP) au RDC pourra être utilisé pour une zone de stockage en accord avec les entreprises lors de la réunion de préparation	Maître d'ouvrage 1 - Entreprise générale

3.3. Accueil du personnel

3.3.1. Base vie - Modalités d'organisation

Dispositions prévues	A la charge de
Sanitaires : Sanitaires mis à disposition par l'établissement dans le bâtiment 18 au RDC	Tous Corps d'état
L'espace disponible sur site étant réduit et devant l'impossibilité de mettre en place des installations provisoires, chaque entreprise devra prendre des dispositions afin que son personnel arrive en tenue de travail sur le chantier (Fourgon aménagé etc…)	Tous Corps d'état 1 - Entreprise générale
En raison de l'espace limité sur le site du chantier, aucun réfectoire ne pourra être mis en place. Les entreprises intervenantes devront prendre les dispositions nécessaires pour organiser la restauration de leur personnel à l'extérieur au chantier.	Tous Corps d'état 1 - Entreprise générale

3.4. Organisation des secours

3.4.1. Consignes de sécurité et d'alerte des secours

Dispositions prévues	A la charge de
Les principaux numéros à appeler sont le 15 et le 18 pour le téléphone fixe et le 112 pour les téléphones mobiles.	Tous Corps d'état 1 - Entreprise générale
Les consignes d'alertes seront reprises dans les PPSPS.	Tous Corps d'état 1 - Entreprise générale
Les consignes de sécurité spécifiques du site (chantier en site occupé) doivent être transmises à toutes les entreprises par le maître d'ouvrage et intégrées au PPSPS des entreprises.	Maître d'ouvrage

3.4.2. Matériel de secours

Dispositions prévues	A la charge de
Chaque entreprise disposera d'une trousse de premier secours pour son personnel.	Tous Corps d'état 1 - Entreprise générale

4. MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ

4.1. Conditions d'enlèvement des matériaux dangereux

4.1.1. Evacuation des matières dangereuses

Dispositions prévues	A la charge de
Aucune matière dangereuse ne doit être stockée sur le chantier, tant les déchets que les produits amenés pour mise en oeuvre.	Tous Corps d'état 1 - Entreprise générale
Les matières dangereuses seront amenées à pied d'oeuvre au fur et à mesure des besoins, les déchets issus de la mise en oeuvre seront évacués au quotidien et traités par les entreprises concernées.	Tous Corps d'état 1 - Entreprise générale

4.2. Travaux comportant des risques particuliers - Plan Général Simplifié de Coordination

4.2.1. Travaux exposant à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres - Travaux sur échafaudages et nacelles

Dispositions prévues	A la charge de
Pour le montage des échafaudages, condamnation des zones situées sous la zone à risque de chute des matériels en cours d'installation. Toute superposition de tâche est interdite lors de ces interventions spécifiques et pouvant présenter des risques de chutes de matériel.	1 - Entreprise générale Tous Corps d'état
La zone de montage ou démontage des échafaudages, devra être balisée au moyen d'un dispositif physique, afin de prévenir les risques vis-à-vis des autres intervenants.	1 - Entreprise générale Tous Corps d'état
Les échafaudages seront installés sur un sol nivelé et stabilisé.	1 - Entreprise générale Tous Corps d'état
Les locaux devront être débarrassés par zone pour permettre l'installation et le déplacement correct des échafaudages roulant ou de pied et plates-formes individuelles de travail. Les zones d'intervention seront organisées pour permettre les interventions successives ou simultanées. Les emballages et chutes de matériaux seront évacués au quotidien pour éviter l'encombrement des locaux.	1 - Entreprise générale Tous Corps d'état

5. MODALITÉS DE COOPÉRATION ENTRE INTERVENANTS

5.1. Modalités de coopération

5.1.1. Plan Général Simplifié de Coordination

Le maître d'Ouvrage diffuse à l'ensemble des titulaires de lot le Plan Général de Coordination (PGSC) et ses différents additifs. Le titulaire d'un lot diffuse à chacun de ses sous-traitants le PGSC, ainsi que son propre PPSPSS.

5.1.2. Désignation des entreprises

Au démarrage de la phase réalisation (début de la période de préparation soit 30 jours, avant le démarrage des travaux), le maître d'ouvrage communiquera au coordonnateur, les coordonnées (nom, adresse, tél, Mail, interlocuteur) des entreprises titulaires de lot.

5.1.3. Acceptation et désignation des sous-traitants

Dès l'acceptation d'un sous-traitant, le maître d'ouvrage communiquera au coordonnateur les coordonnées (nom, adresse, tél, Mail, interlocuteur) des entreprises agréées.

Les titulaires de lots et leurs sous-traitants doivent informer le coordonnateur de leur intention de sous-traiter tout ou partie de leur lot au moins 30 jours avant intervention (ou 8 jours dans certains cas) en précisant les coordonnées des/du sous-traitant/s permettant l'organisation des inspections communes et la production du PPSPS pour chaque sous-traitant.

5.1.4. Prestataires de services et Travailleurs indépendants

Travailleurs indépendants et locatiers

Toutes les entreprises concourant à la réalisation de l'opération, qu'elles soient, prestataires soumis à obligation de PPSPS, sous-traitantes, travailleurs indépendants, devront préalablement à leur intervention, réaliser une inspection commune avec le Coordonnateur SPS.

Lorsqu'une entreprise réalise une action technique sur le chantier, que ce soit directement sur l'ouvrage, sur ses équipements, sur ses installations provisoires ou sur les moyens nécessaires à sa réalisation, elle est soumise à l'obligation d'établir un PPSPS. Il en va de même lorsqu'elle intervient techniquement sur des moyens ou équipements utilisés pour la réalisation ou la sécurisation des travaux. Dans ces situations, les travaux sont considérés comme concourant à la réalisation de l'opération, ce qui rend le PPSPS obligatoire, sauf en cas de situation d'urgence.

En revanche, lorsqu'une entreprise n'effectue aucune action technique sur l'ouvrage ou ses équipements et que son intervention n'a aucune incidence sur le processus de réalisation, elle n'est pas soumise à cette obligation. Cela concerne notamment les interventions en phase de conception, les prestations intellectuelles ou de contrôle sans action technique, les interventions de fournisseurs, ainsi que les opérations de mesures, relevés ou observations.

Toutefois, même en l'absence d'obligation de rédiger un PPSPS, l'entreprise doit mettre en place un dispositif de prévention adapté à la nature de son intervention. Celui-ci doit inclure une analyse des risques ainsi que des mesures de prévention appropriées.

Tout prestataire appelé à intervenir sur le chantier devra, avant son intervention, faire l'objet d'une analyse conjointe avec son « donneur d'ordres ». Cette analyse sera reprise sur la fiche d'autorisation d'intervention (FAI en annexe de ce PGCSPS) et transmise au maître d'ouvrage au CSPS et au Maître d'œuvre (3 semaines au plus tard avant l'intervention du prestataire) pour déterminer la nécessité de réaliser une inspection commune et d'établir un PPSPS selon les critères cités précédemment.

Le maître d'ouvrage validera les entreprises soumises à PPSPS après analyse de la FAI.

En cas de doute, l'argumentaire technique du CSPS pourra être demandé pour aiguiller le choix du maître d'ouvrage.

Mesures compensatoires : À défaut d'obligation de PPSPS, les prestataires devront remettre leur analyse de risques à leur donneur d'ordre afin qu'il l'intègre dans son PPSPS.
L'avenant du PPSPS du donneur d'ordres sera remis au CSPS et au Maître d'ouvrage.

Les travailleurs indépendants participeront à une inspection commune préalable et remettront un PPSPS avant le début des travaux.

5.1.5. Présence de personnel étranger

En cas de présence de personnels étrangers, ne parlant pas ou parlant mal le français : personnel employé dans l'entreprise, en sous-traitance ou entreprise mandataire, l'entreprise devra assurer la présence permanente sur le chantier d'un interprète pour permettre la transmission des consignes de sécurité.

5.1.6. Inspection Commune

Préalablement à toute intervention, chaque entreprise (entreprise titulaire de lot ou sous-traitant, prestataire soumis à PPSPS) procédera à une inspection commune du chantier avec le coordonnateur SPS en vue de préciser les consignes à observer en fonction des caractéristiques des travaux à réaliser.

Les délais de prévenance pour la réalisation des inspections communes seront définis en concertation avec les équipes Moa, Moe et entreprises lors des réunions de préparation de chantier.

5.1.7. Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé Simplifié

Le titulaire d'un lot diffuse à chacun de ses sous-traitants le PGSC, ainsi que son propre PPSPSS. Les PPSPSS sont à disposition de l'ensemble des intervenants.

Chaque entreprise teindra à disposition des organismes de contrôles et de prévention un exemplaire de son PPSPSS sur le chantier.

5.1.8. Rôle du coordonnateur

Le coordonnateur ne saurait être un agent de sécurité ni un animateur de sécurité. Il est le gestionnaire de la coactivité des risques (des interfaces des entreprises simultanées ou successives), les entrepreneurs restent pleinement responsables de leurs obligations à l'égard de leurs salariés.

5.1.9. Registre journal

Une copie des notes d'observation est diffusée par courriel à l'ensemble des intervenants (ex: MOA, MOE et entreprises concernées).

Le registre journal sera diffusé sur demande écrite des intervenants de l'opération ou des organismes de contrôle et de prévention.

6 DOCUMENT HARMONISÉ D'ORGANISATION DES LIVRAISONS.

CSPS : Société: SOCOTEC Construction Nom: Benoit DE TIMMERMAN	Tél : 0620333136 Email : benoit.detimmerman@socotec.com
Etabli le : 16/09/2026 Date de modification : 16/09/2026	Elements modifiés :

Partie à remplir par le CSPS:

Adresse chantier : Campus du Moulin de la Housse – 51100 REIMS 51100 Reims	
Contraintes horaires de livraisons : Etablissement restant en acitivté	Moyens mutualisés de levage et manutention (cf.PGSCSPS)
Autres renseignements utiles : (contraintes administratives, etc..)	

Partie à renseigner par le client(entreprise du BTP) :


Nom de l'entreprise :	Adresse siège :
Nom du réceptionnaire :	Coordonnées du réceptionnaire Tél :
Plages horaires de livraisons	Heures :
Présence chef d'un manoeuvre :	☐ Oui ☐ Non
Distance et hauteur maxi de la zone de déchargement au camion :	Distance (m) : Hauteur (m) :
Charge utile de la recette à matériaux (le cas échéant)	Charge :
Appareil de levage utilisé pour l'opération :	☐ Grue de chargement ☐ Appareil propre au chantier ☐ Appareil à la charge du fournisseur (Type)
Autres renseignements utiles :	

Projet de Plan d'installation de chantier avec :

- Accès
- Voies de circulation
- Installations sanitaires
- Points sensibles (dans l’emprise du chantier et en périphérie
- Zones de stockage
- Dimensions des aires de stockage
- Charges admissibles
- Nature du terrain
- Hauteur à respecter (emplacement portique, gabarit)

Annexes :

1 URCA BATIMENT 18 - Reims - Planning Prévisionnel - Câblage VDI-E REV2.1.pdf

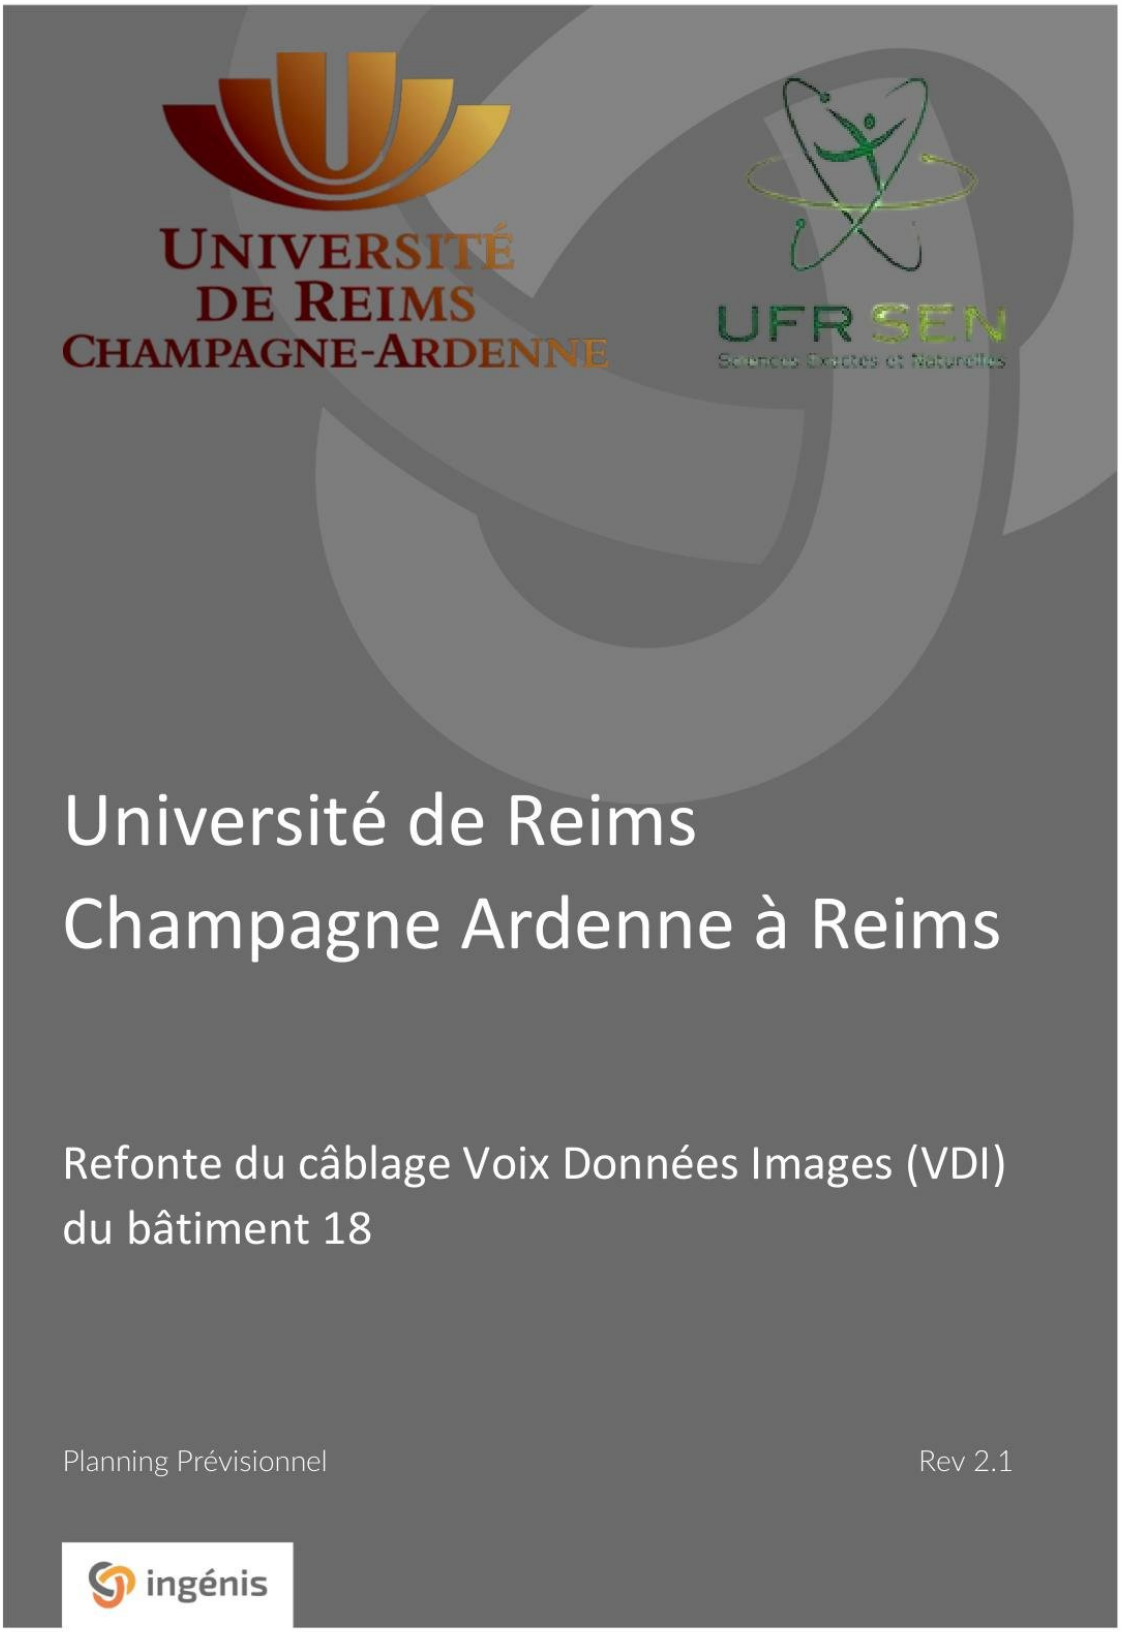
UNIVERSITÉ
DE REIMS
CHAMPAGNE-ARDENNE
UFR SEN
Sciences Exactes et Naturelles
Université de Reims
Champagne Ardenne à Reims
Refonte du câblage Voix Données Images (VDI)
du bâtiment 18
Planning Prévisionnel
Rev 2.1
ingénis

URCA REIMS - BATIMENT 18 - TRANCHE FERME - PLANNING PREVISIONNEL


Phase	Mois 0	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12
1. Études d'exécution, repérages et préparation	■												
2. Création des locaux techniques		■	■										
3. Aménagement des baies			■	■									
4. Création des cheminements FO et VDI			■	■	■	■							
5. Passage et tirage des câbles FO et VDI				■	■	■	■	■	■				
6. Raccordement RJ45 côté baie									■	■			
7. Intervention dans les bureaux, en une seule intervention										■	■	■	■
8. Bascule vers la nouvelle infrastructure										■	■	■	
9. Dépose de l'ancien câblage										■	■	■	
10. Essais, contrôles et levée des réserves												■	■
11. DOE et réception													■

2 Les_installations_daccueil_et_dhygiène_sur_chantier.pdf

les essentiels

LES INSTALLATIONS D'ACCUEIL ET D'HYGIÈNE SUR CHANTIER

Il appartient à chaque employeur de mettre à disposition des travailleurs des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, si besoin, des douches. Certaines spécificités s'appliquent néanmoins pour les chantiers de courte durée.

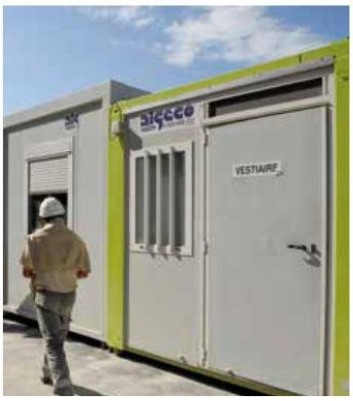

© Frédéric Vielcanet

▲ Généralement visibles de l'extérieur, les installations d'accueil font partie de l'image de marque de l'entreprise.

1 Pourquoi effectuer cette démarche ?

Il est absolument nécessaire de permettre à chaque travailleur d'assurer sa propreté individuelle sur les chantiers.

2 Qui est concerné ?

Tout chef d'entreprise employant au moins un salarié doit mettre à disposition du personnel les installations adaptées.

3 Quel est le contenu ?

Type d'installation	Mesures à respecter	D*	Code du travail
Vestiaires collectifs			
Local dédié	Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local dédié, de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage, et placé à proximité du passage des travailleurs. Pour les chantiers souterrains, et sauf exception, le local doit être installé au jour.	✔	R.4228-2 R4534-139
Entretien	Ces locaux sont tenus en état constant de propreté. Le sol et les parois sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.	✔	R.4228-3
Aération et chauffage	Locaux aérés et convenablement chauffés.	✔	R.4228-4
Personnel mixte	Installations séparées en présence de travailleurs masculins et féminins.	✔	R.4228-5
Sièges	Nombre suffisant de sièges.	✔	R.4228-6
Armoires	Nombre suffisant d'armoires individuelles ininflammables : – Permettant de suspendre 2 vêtements de ville ; – Munies d'une serrure ou d'un cadenas ; – Comprenant, le cas échéant, un compartiment réservé aux vêtements de travail qui sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes.	✔	R.4228-6
Sanitaires			
Lavabos	Un lavabo à eau potable et à température réglable pour 10 travailleurs maximum. Des moyens de nettoyage, de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Entretenus chaque fois que cela est nécessaire.	✔	R.4228-7

Le + prévention

Chantiers de courte durée

Sur les chantiers courts, lorsque les installations ne sont pas adaptées à la nature du chantier, des véhicules de chantier spécialement aménagés à cet effet peuvent être utilisés pour permettre aux travailleurs d'assurer leur propreté individuelle, de disposer de cabinets d'aisance, de vestiaires et, si possible, de douches.

Le + réglementation

Des dérogations aux règles ci-contre sont possibles pour les chantiers d'une durée inférieure à 4 mois sous certaines conditions précisées aux articles R.4534-137 à R.4534-145 du Code du travail.

Type d'installation	Mesures à respecter	D*	Code du travail
Sanitaires			
Douches	Des douches sont mises à disposition des travailleurs réalisant des travaux insalubres et salissants. La température de l'eau des douches est réglable. Le local est tenu en état constant de propreté, le sol et les parois du local des douches permettant un nettoyage efficace		R.4228-8 R.4228-9
WC	1 cabinet d'aisance et un urinoir pour 20 hommes. 2 cabinets pour 20 femmes, comportant chacun un récipient pour garnitures périodiques. Les WC doivent être : – Séparés hommes / femmes, si le personnel est mixte, – Séparés des autres locaux et aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, – Equipés de chasse d'eau et de papier hygiénique, – Aérés et convenablement chauffés. Le sol et les parois permettent un nettoyage efficace et un nettoyage / désinfection au moins 1 fois par jour.	✔	R.4228-10 à R.4228-15
Restauration et repos			
Local de restauration	Dans les établissements d'au moins cinquante salariés, l'employeur, après avis du comité social et économique, met à leur disposition un local de restauration pourvu : – De sièges et de tables en nombre suffisant ; – D'un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour 10 usagers ; – D'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons ; – D'une installation permettant de réchauffer les plats. – Après chaque repas, nettoyage du local et des équipements qui y sont installés.	✔	R.4228-22 R.4228-24
Emplacement pour se restaurer	Si moins de 25 travailleurs souhaitent prendre habituellement leur repas sur le chantier, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Il peut être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux. Après chaque repas, nettoyage de cet emplacement et des équipements qui y sont installés.	✔	R.4228-23 R.4228-24
Local de repos	A défaut de local de repos, et en dehors des heures de repas, le local ou l'emplacement de restauration peut être utilisé comme local ou emplacement de repos. Les sièges doivent comporter des dossiers.	✔	R.4228-25

* Dérogations possibles pour les chantiers d'une durée inférieure à 4 mois.

Le + doc

Sur www.preventionbtp.fr :

- **Fiches :**
- Installations d'accueil et d'hygiène sur chantier, *La fiche juridique du magazine Prévention BTP*, n° 223, octobre 2018
- Nettoyage et hygiène des bottes, *Réf. H3 F 02 13*
- Installations de solutions d'hygiène provisoires, *Fiche Prévention et performance*



3 Affiche-en-cas-d-accident.pdf

En cas d'accident

Appelez le sauveteur secouriste du travail qui, après avoir examiné la victime, vous demandera d'appeler les secours.

Téléphonez au :

18	112	15
Pompiers	Centre d'appels secours	Samu

et dites...

1 Ici chantier

À (commune ou arrondissement) .....

N° ..... Rue .....

En face de .....

Téléphone

2 Précisez la nature de l'accident

Par exemple : éboulement, asphyxie, chute...
Précisez la position du blessé et s'il y a nécessité de dégagement.
Par exemple : le blessé est sur le toit, il est au sol ou dans une fouille...

3 Signalez le nombre de blessés et leur état

Par exemple : trois ouvriers blessés dont un saigne et un ne parle pas.

4 Décrivez l'intervention du secouriste

Par exemple : premiers soins, bouche-à-bouche...

5 Fixez un point de rendez-vous

Et envoyez quelqu'un à ce point pour guider les secours.

6 Faites répéter le message

Ne raccrochez jamais le premier.

SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL : une liste **à jour** mentionnant **leur nom** doit être affichée sur le chantier. Les sauveteurs secouristes du travail sont reconnaissables au logo placé sur leur casque et sur leur tenue de travail

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

OPPBTP

SCANNER pour télécharger l'affiche

preventionbtp.fr

4 32797937_Repérage amiante avant-travaux - BATIMENT 18.pdf

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
BEZANNES
54 RUE RENE CASSIN

51430 BEZANNES

Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 32797937/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 13/07/2026

Référence au programme de travaux :
MAIL MAIL réalisé le 04/06/2026 par Mohamed Moussalih
Chargé des infrastructures VDI
Direction du Numérique (DN)

DONNEUR D'ORDRE

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS
REGIS MARION
Chemin des Rouliers
51100 REIMS

SITE D'INTERVENTION

CAMPUS MOULIN DE LA HOUSSE

Chemin des Rouliers
51100 REIMS
Batiment 18

Date(s) d'intervention(s) :
Du 02/07/2026 au 02/07/2026



SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Sébastien ROBERT	Diagnostiqueur Immobilier	Certification N° 2222	Sébastien ROBERT

Le présent rapport comporte 70 pages, dont 54 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

Copyright BUREAU VERITAS

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION **3**
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 5

2. CONCLUSIONS **6**
2.1. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre 7
2.2. Obligations réglementaires 8

3. INFORMATIONS GENERALES **9**
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 9
3.2. Parties prenantes 9

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE **9**
4.1. Références réglementaires 9

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE **10**
5.1. Date(s) de visite(s) 10
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 10
5.3. Conditions spécifiques 10
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 10

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **11**
6.1. Matériaux et produits repérés 11

7. ANNEXES **17**
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 17
7.2. Photos prélèvements 19
7.3. Photos inaccessibilités 28
7.4. Attestation d'assurance 29
7.5. Certificat de compétence 31
7.6. Croquis de repérage 32
7.7. Rapport d'analyse du laboratoire 46

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Travaux de câblage informatique de l'ensemble du bâtiment 18 et l'aménagement du futur local informatique au RDC, R+1, R+2 selon les ailes du bâtiment (voir les plans). Des percements et des carottages au niveau des dalles (Zone colonne technique) entre les étages, et sur les murs afin de passer les câbles dans les pièces. Un carottage ou percement sera réalisé sur la face extérieure du bâtiment, afin de passer des tuyaux de la climatisation.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits de fumée, Conduits eaux pluviales, Conduits eaux usées
Eléments associés à la façade	Conduits, Elements ponctuels (façade)
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibrociment, Ardoises fibrociment, Bacs fibrociment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis fenêtres fibrociment, Coffrages perdus, Colle, Colles carrelage, Colles faïence, Colles pâte de verre, Couvre-joints, Enduits pelliculaires façades, Enduits projetés/crépis façades, Garnissage joints dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints carrelage, Joints dilatation, Joints faïence, Joints pâte de verre, Maçonnerie silico-calcaire, Peintures façades, Primaires d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés sous bardage, Flocages sous bardage
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction fenêtres, Joints d'étanchéité, Mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques fibrociment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales, Bourre en vrac cloisons, Enduits finition plaques de plâtre verticales, Enduits projetés cloisons, Enduits projetés/talochés cloisons, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux, Panneaux cloisons, Peinture cloisons, Plots de colle cloisons, Sous couches tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot gaines, Enduits finition gaines plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage gaines, Enduits projetés gaines, Enduits projetés/talochés gaines, Flocages gaines, Jonctions panneaux, Panneaux

Copyright BUREAU VERITAS

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction fenêtres, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques fibrociment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits lissage/ragréage murs, Enduits projetés murs, Enduits projetés/talochés murs, Flocages murs, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture murs, Revêtements durs
Plinthes	Peintures plinthes
Portes	Peintures
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs portes, Joints bandes portes, Joints portes, Joints tresses portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs portes, Joints portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs portes, Joints portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs portes, Joints portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits lissage/ragréage poteaux, Enduits projetés poteaux, Enduits projetés/talochés poteaux, Entourages de poteaux, Flocages poteaux, Joints d'assemblage poteaux/poutres, Joints de dilatation poteaux, Peintures poteaux, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles carrelage, Colles faïence, Colles plinthe, Dalles plastique, Joints carrelage, Joints faïence, Joints plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs fibrociment, Sous couches tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits projetés charpente, Enduits projetés/talochés charpente, Flocages charpente, Joints charpentes, Jonctions façade/calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures charpente, Peintures intumescentes charpente, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions faux plafond/structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot gaines, Enduits finition gaines plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage gaines, Enduits projetés gaines, Enduits projetés/talochés gaines, Flocages gaines, Jonctions entre panneaux, Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot plafonds, Coffrages perdus, Colles carrelage, Enduits finition plafonds plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage plafonds, Enduits projetés plafonds, Enduits projetés/talochés plafonds, Flocages plafonds, Fourreaux, Joints carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés plafonds, Panneaux vissés plafonds, Peintures intumescentes, Peintures plafonds, Plots de colle plafonds, Primaires d'accrochage plafonds, Rebouchages trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches tissus plafonds
Poutres	Enduits lissage/ragréage poutres, Enduits projetés poutres, Enduits projetés/talochés poutres, Entourages de poutres, Flocages poutres, Joints poutres, Jonctions façade/calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures poutres, Revêtements bitumineux poutres
Suspentes et contrevents	Flocages suspentes, Peintures suspentes, Projections en plâtre suspentes
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints cantonnement planchers, Joints carrelage, Joints dilatation/assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures sol, Plaques fibrociment sol, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous couche moquette, Sous-couches revêtements souples

Copyright BUREAU VERITAS

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du bâtiment

Copyright BUREAU VERITAS

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Copyright BUREAU VERITAS

2.1. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
R+2 -> PLAN 3 SUR 3 -> PII39 LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRA (IA 1)	3- Parois verticales intérieures - local occupé composé de 2 baies vitrées dont les pieds de cloison n'ont pu être investigués	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Copyright BUREAU VERITAS

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Copyright BUREAU VERITAS

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : CAMPUS MOULIN DE LA HOUSSE
Chemin des Rouliers
51100 REIMS

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
CAMPUS MOULIN DE LA HOUSSE	Enseignement supérieur / Recherche	ERP de la 3ème et la 4ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
REGIS MARION	Donneur d'ordre	UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS	Chemin des Rouliers 51100 REIMS	03.26.91.84.32
REGIS MARION	Gestionnaire	UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE - ARDENNE	9 BOULEVARD DE LA PAIX 51724 REIMS CEDEX	+33 3 26 91 84 32 - regis.marion@univ-reims.fr
MOHAMED MOUSSALIH	Accompagnateur, Gestionnaire	UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE	CAMPUS DU MOULIN DE LA HOUSSE BP 1039 51687 REIMS CEDEX 2	+33 7 65 17 74 56 - mohamed.moussalih@univ-reims.fr
UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE	Propriétaire	/	9 BOULEVARD DE LA PAIX 51724 REIMS CEDEX	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 02/07/2026 au 02/07/2026

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / MAIL	Mohamed Moussalih Chargé des infrastructures VDI Direction du Numérique (DN)	04/06/2026	MAIL	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

Copyright BUREAU VERITAS

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SOUS-SOL -> PLAN 1 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE	Gaines et coffres verticaux	Enduits projetés/talochés gaines	Plâtre	Clair	1	P11* N	/	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits projetés/talochés gaines	Plâtre	Clair	1	P12 N	/	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Flocages gaines	Cotonneux, Duveteux, Fibreux	Clair, Gris	2	Idem P 3	/	AN	/	Non
SOUS-SOL -> PLAN 2 SUR 3 -> LOCAL HS 02	Gaines et coffres verticaux	Enduits projetés/talochés gaines	Plâtre	Clair	1	P1 N	/	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits projetés/talochés gaines	Plâtre	Clair	1	P2 N	/	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Flocages gaines	Cotonneux, Duveteux, Fibreux	Clair, Gris	2	P3* N	/	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Flocages gaines	Cotonneux, Duveteux, Fibreux	Clair, Gris	2	P4 N	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SOUS-SOL -> PLAN 2 SUR 3 -> LOCAL HS 02	Façades lourdes y compris poteaux	Isolant	Cotonneux, Fibreux, Laine de roche, Laine de verre	/	3	P5* N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Isolant	Cotonneux, Fibreux, Laine de roche, Laine de verre	/	3	P6 N	/	AN	/	Non
SOUS-SOL -> PLAN 3 SUR 3 -> DEGAGEMENT	Faux plafonds	Plaques	Rigide	Clair	4	P7* N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Fibreux, Rigide	Blanc	5	P8* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Dur, Granuleux	/	6	P9* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Dur, Granuleux	/	6	P10 N	/	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Flocages gaines	Cotonneux, Duveteux, Fibreux	Clair, Gris	2	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> PLAN 1 SUR 3 -> LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRC	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	9	P21* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	9	P21* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	9	P22 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	9	P22 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier, Plâtre	/	8	P19* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier, Plâtre	/	8	P20 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Dur, Granuleux	/	6	P23 N	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> PLAN 1 SUR 3 -> LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRC	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Dur, Granuleux	/	6	P24 N	/	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits projetés/talochés gaines	Plâtre	Clair	1	Idem P 11	/	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Flocages gaines	Cotonneux, Duveteux, Fibreux	Clair, Gris	2	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> PLAN 1 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE	Gaines et coffres verticaux	Enduits projetés/talochés gaines	Plâtre	Clair	1	P27 N	/	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits projetés/talochés gaines	Plâtre	Clair	1	P28 N	/	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Flocages gaines	Cotonneux, Duveteux, Fibreux	Clair, Gris	2	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> PLAN 2 SUR 3 -> LT PRINCIPAL	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Compact, Ciment, Dur	Clair, Gris	7	P13* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Compact, Ciment, Dur	Clair, Gris	7	P14 N	/	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits projetés/talochés gaines	Plâtre	Clair	1	P15 N	/	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits projetés/talochés gaines	Plâtre	Clair	1	P16 N	/	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Flocages gaines	Cotonneux, Duveteux, Fibreux	Clair, Gris	2	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> PLAN 2 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE 1	Gaines et coffres verticaux	Flocages gaines	Cotonneux, Duveteux, Fibreux	Clair, Gris	2	P17 N	/	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits projetés/talochés gaines	Plâtre	Clair	1	Idem P 11	/	AN	/	Non
RDC -> PLAN 2 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE 2	Gaines et coffres verticaux	Flocages gaines	Cotonneux, Duveteux, Fibreux	Clair, Gris	2	P18 N	/	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits projetés/talochés gaines	Plâtre	Clair	1	Idem P 11	/	AN	/	Non
RDC -> PLAN 3 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE	Gaines et coffres verticaux	Enduits projetés/talochés gaines	Plâtre	Clair	1	P25 N	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> PLAN 3 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE	Gaines et coffres verticaux	Enduits projetés/talochés gaines	Plâtre	Clair	1	P26 N	/	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Flocages gaines	Cotonneux, Duveteux, Fibreux	Clair, Gris	2	Idem P 3	/	AN	/	Non
R+1 -> PLAN 2 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE 1	Gaines et coffres verticaux	Flocages gaines	Cotonneux, Duveteux, Fibreux	Clair, Gris	2	P35 N	/	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits projetés/talochés gaines	Plâtre	Clair	1	Idem P 11	/	AN	/	Non
R+1 -> PLAN 2 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE 2	Gaines et coffres verticaux	Flocages gaines	Cotonneux, Duveteux, Fibreux	Clair, Gris	2	P36 N	/	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits projetés/talochés gaines	Plâtre	Clair	1	Idem P 11	/	AN	/	Non
R+1 -> PLAN 2 SUR 3 -> LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE HI 21 (SRB)	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	10	P29* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	10	P29* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	10	P30 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	10	P30 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Dur	Beige, Clair	11	P31* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Dur	Beige, Clair	11	P32 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Dur	/	12	P33* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Dur	/	12	P34 N	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> PLAN 2 SUR 3 -> LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE HI 21 (SRB)	Gaines et coffres verticaux	Enduits projetés/talochés gaines	Plâtre	Clair	1	Idem P 11	/	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Flocages gaines	Cotonneux, Duveteux, Fibreux	Clair, Gris	2	Idem P 3	/	AN	/	Non
R+1 -> PLAN 3 SUR 3	Gaines et coffres verticaux	Enduits projetés/talochés gaines	Plâtre	Clair	1	Idem P 11	/	AN	/	Non
R+2 -> PLAN 2 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE 1	Gaines et coffres verticaux	Flocages gaines	Cotonneux, Duveteux, Fibreux	Clair, Gris	2	P37 N	/	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits projetés/talochés gaines	Plâtre	Clair	1	Idem P 11	/	AN	/	Non
R+2 -> PLAN 2 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE 2	Gaines et coffres verticaux	Flocages gaines	Cotonneux, Duveteux, Fibreux	Clair, Gris	2	P38 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bourre en vrac cloisons	/	/	13	P39* N	/	AN	mousse expansée	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bourre en vrac cloisons	/	/	13	P40 N	/	AN	mousse expansée	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits projetés/talochés gaines	Plâtre	Clair	1	Idem P 11	/	AN	/	Non
R+2 -> PLAN 3 SUR 3 -> PII39 LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRA	Faux plafonds	Plaques	Compact, Fibreux, Poreux	/	17	P47* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	15	P43* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	15	P43* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	15	P44 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	15	P44 N	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> PLAN 3 SUR 3 -> PII39 LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRA	Cloisons (légères et préfabriquées)	Sous couches tissus muraux	/	/	16	P45* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Sous couches tissus muraux	/	/	16	P46 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	14	P41* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	14	P42 N	/	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits projetés/talochés gaines	Plâtre	Clair	1	Idem P 11	/	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Flocages gaines	Cotonneux, Duveteux, Fibreux	Clair, Gris	2	Idem P 3	/	AN	/	Non
ELEMENTS EXTERIEUR -> FACADES	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits projetés/crépis façades	/	/	18	P48* N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits projetés/crépis façades	/	/	18	P49 N	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
SOUS-SOL	/
SOUS-SOL -> PLAN 1 SUR 3	/
SOUS-SOL -> PLAN 1 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE	/
SOUS-SOL -> PLAN 2 SUR 3	/
SOUS-SOL -> PLAN 2 SUR 3 -> LOCAL HS 02	/
SOUS-SOL -> PLAN 3 SUR 3	/
SOUS-SOL -> PLAN 3 SUR 3 -> DEGAGEMENT	/
RDC	/
RDC -> PLAN 1 SUR 3	/
RDC -> PLAN 1 SUR 3 -> LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRC	/
RDC -> PLAN 1 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE	/
RDC -> PLAN 2 SUR 3	/
RDC -> PLAN 2 SUR 3 -> LT PRINCIPAL	/
RDC -> PLAN 2 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE 1	/
RDC -> PLAN 2 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE 2	/
RDC -> PLAN 3 SUR 3	/
RDC -> PLAN 3 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE	/
R+1	/
R+1 -> PLAN 1 SUR 3	/
R+1 -> PLAN 2 SUR 3	/
R+1 -> PLAN 2 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE 1	/
R+1 -> PLAN 2 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE 2	/
R+1 -> PLAN 2 SUR 3 -> LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE HI 21 (SRB)	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+1 -> PLAN 3 SUR 3	/
R+2	/
R+2 -> PLAN 1 SUR 3	/
R+2 -> PLAN 2 SUR 3	/
R+2 -> PLAN 2 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE 1	/
R+2 -> PLAN 2 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE 2	/
R+2 -> PLAN 3 SUR 3	/
R+2 -> PLAN 3 SUR 3 -> PII39 LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRA	/
ELEMENTS EXTERIEUR	/
ELEMENTS EXTERIEUR -> FACADES	/
ELEMENTS EXTERIEUR -> TOITURE	/

Copyright BUREAU VERITAS

7.2. Photos prélèvements

P2	ZPSO 1
SOUS-SOL -> PLAN 2 SUR 3 -> LOCAL HS 02	
	
Gaines et coffres verticaux -> Enduits projetés/talochés gaines	

P3	ZPSO 2
SOUS-SOL -> PLAN 2 SUR 3 -> LOCAL HS 02	
	
Gaines et coffres verticaux -> Flocages gaines (Liste A)	

P4	ZPSO 2
SOUS-SOL -> PLAN 2 SUR 3 -> LOCAL HS 02	
	
Gaines et coffres verticaux -> Flocages gaines (Liste A)	

P5	ZPSO 3
SOUS-SOL -> PLAN 2 SUR 3 -> LOCAL HS 02	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Isolant	


P6	ZPSO 3
SOUS-SOL -> PLAN 2 SUR 3 -> LOCAL HS 02	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Isolant	

P7	ZPSO 4
SOUS-SOL -> PLAN 3 SUR 3 -> DEGAGEMENT	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

Copyright BUREAU VERITAS

P8	ZPSO 5
SOUS-SOL -> PLAN 3 SUR 3 -> DEGAGEMENT	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P9	ZPSO 6
SOUS-SOL -> PLAN 3 SUR 3 -> DEGAGEMENT	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

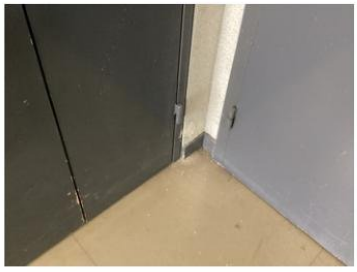P10	ZPSO 6
SOUS-SOL -> PLAN 3 SUR 3 -> DEGAGEMENT	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

P11	ZPSO 1
SOUS-SOL -> PLAN 1 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE	
	
Gaines et coffres verticaux -> Enduits projetés/talochés gaines	

P12	ZPSO 1
SOUS-SOL -> PLAN 1 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE	
	
Gaines et coffres verticaux -> Enduits projetés/talochés gaines	

P13	ZPSO 7
RDC -> PLAN 2 SUR 3 -> LT PRINCIPAL	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

Copyright BUREAU VERITAS

P13	ZPSO 7
RDC -> PLAN 2 SUR 3 -> LT PRINCIPAL	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P14	ZPSO 7
RDC -> PLAN 2 SUR 3 -> LT PRINCIPAL	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P15	ZPSO 1
RDC -> PLAN 2 SUR 3 -> LT PRINCIPAL	
	
Gaines et coffres verticaux -> Enduits projetés/talochés gaines	

P16	ZPSO 1
RDC -> PLAN 2 SUR 3 -> LT PRINCIPAL	
	
Gaines et coffres verticaux -> Enduits projetés/talochés gaines	

P17	ZPSO 2
RDC -> PLAN 2 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE 1	
	
Gaines et coffres verticaux -> Flocages gaines (Liste A)	

P18	ZPSO 2
RDC -> PLAN 2 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE 2	
	
Gaines et coffres verticaux -> Flocages gaines (Liste A)	

Copyright BUREAU VERITAS

P19	ZPSO 8
RDC -> PLAN 1 SUR 3 -> LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRC	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot verticales	

P20	ZPSO 8
RDC -> PLAN 1 SUR 3 -> LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRC	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot verticales	

P21	ZPSO 9
RDC -> PLAN 1 SUR 3 -> LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRC	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses | Ragréages	

P22	ZPSO 9
RDC -> PLAN 1 SUR 3 -> LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRC	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses | Ragréages	

P23	ZPSO 6
RDC -> PLAN 1 SUR 3 -> LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRC	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

P24	ZPSO 6
RDC -> PLAN 1 SUR 3 -> LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRC	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

Copyright BUREAU VERITAS

P25	ZPSO 1
RDC -> PLAN 3 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE	
	
Gaines et coffres verticaux -> Enduits projetés/talochés gaines	

P26	ZPSO 1
RDC -> PLAN 3 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE	
	
Gaines et coffres verticaux -> Enduits projetés/talochés gaines	

P27	ZPSO 1
RDC -> PLAN 1 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE	
	
Gaines et coffres verticaux -> Enduits projetés/talochés gaines	

P28	ZPSO 1
RDC -> PLAN 1 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE	
	
Gaines et coffres verticaux -> Enduits projetés/talochés gaines	

P29	ZPSO 10
R+1 -> PLAN 2 SUR 3 -> LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE HI 21 (SRB)	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses | Ragréages	

P30	ZPSO 10
R+1 -> PLAN 2 SUR 3 -> LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE HI 21 (SRB)	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses | Ragréages	

Copyright BUREAU VERITAS

P31	ZPSO 11
R+1 -> PLAN 2 SUR 3 -> LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE HI 21 (SRB)	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

P32	ZPSO 11
R+1 -> PLAN 2 SUR 3 -> LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE HI 21 (SRB)	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

P33	ZPSO 12
R+1 -> PLAN 2 SUR 3 -> LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE HI 21 (SRB)	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	


P34	ZPSO 12
R+1 -> PLAN 2 SUR 3 -> LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE HI 21 (SRB)	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

P35	ZPSO 2
R+1 -> PLAN 2 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE 1	
	
Gaines et coffres verticaux -> Flocages gaines (Liste A)	

P36	ZPSO 2
R+1 -> PLAN 2 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE 2	
	
Gaines et coffres verticaux -> Flocages gaines (Liste A)	

Copyright BUREAU VERITAS

P37	ZPSO 2
R+2 -> PLAN 2 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE 1	
	
Gaines et coffres verticaux -> Flocages gaines (Liste A)	

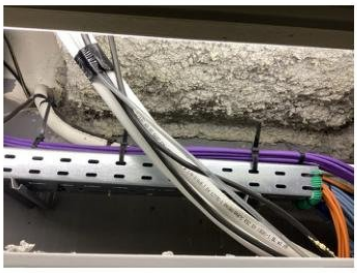P38	ZPSO 2
R+2 -> PLAN 2 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE 2	
	
Gaines et coffres verticaux -> Flocages gaines (Liste A)	

P39	ZPSO 13
R+2 -> PLAN 2 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE 2	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bourre en vrac cloisons	

P40	ZPSO 13
R+2 -> PLAN 2 SUR 3 -> GAINE TECHNIQUE 2	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bourre en vrac cloisons	

P41	ZPSO 14
R+2 -> PLAN 3 SUR 3 -> PII39 LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRA	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P42	ZPSO 14
R+2 -> PLAN 3 SUR 3 -> PII39 LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRA	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

Copyright BUREAU VERITAS

P43	ZPSO 15
R+2 -> PLAN 3 SUR 3 -> PII39 LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRA	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses | Ragréages	

P44	ZPSO 15
R+2 -> PLAN 3 SUR 3 -> PII39 LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRA	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses | Ragréages	

P45	ZPSO 16
R+2 -> PLAN 3 SUR 3 -> PII39 LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRA	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Sous couches tissus muraux	

P46	ZPSO 16
R+2 -> PLAN 3 SUR 3 -> PII39 LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRA	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Sous couches tissus muraux	

P47	ZPSO 17
R+2 -> PLAN 3 SUR 3 -> PII39 LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRA	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P48	ZPSO 18
ELEMENTS EXTERIEUR -> FACADES	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits projetés/crépis façades	

Copyright BUREAU VERITAS

P49	ZPSO 18
ELEMENTS EXTERIEUR -> FACADES	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits projetés/crépis façades	

Copyright BUREAU VERITAS

7.3. Photos inaccessibilités

Investigation(s) approfondie(s) à réaliser avant les travaux

R+2 -> PLAN 3 SUR 3 -> PII39 LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRA	IA 1
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** local occupé composé de 2 baies vitrées dont les pieds de cloison n'ont pu être investigués Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

7.4. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Allianz

Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) ..... **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre

Signed by: LORENZO BATTISTI
EMail: lorenzo.battisti1@allianz.com
Signing time: 23-12-2025 10:46:58
IP address: 193.253.202.119

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.5. Certificat de compétence

LCP CERTIFICATION DE PERSONNES

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°2222

MONSIEUR ROBERT Sébastien

Amiante sans mention Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Amiante** Date d'effet : 12/02/2024 : - Date d'expiration : 11/02/2031
Amiante avec mention Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Missions spécifiques, bâtiments complexes** Date d'effet : 12/02/2024 : - Date d'expiration : 11/02/2031
DPE individuel Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Diagnostic de performances énergétiques** Date d'effet : 12/02/2024 : - Date d'expiration : 11/02/2031
Electricité Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Etat de l'installation intérieure électricité** Date d'effet : 05/12/2023 : - Date d'expiration : 04/12/2030
Gaz Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Etat de l'installation intérieure gaz** Date d'effet : 05/12/2023 : - Date d'expiration : 04/12/2030
Plomb sans mention Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Constat du risque d'exposition au plomb** Date d'effet : 05/12/2023 : - Date d'expiration : 04/12/2030

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 12/02/2024, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Scanné avec CamScanner

Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – Technoparc Europarc – 33600 PESSAC
Salles d'examens : 71/73, rue Desnouettes – 75015 PARIS
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 - - Code APE : 7022 Z
Enr487@ LE CERTIFICAT V011 du 16-12-2022

cofrac Accréditation N° 4-0590 Portée disponible sur www.cofrac.fr

7.6. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CAMPUS MOULIN DE LA HOUSSE Chemin des Rouliers 51100 REIMS	
Localisation SOUS-SOL > PLAN 1 SUR 3	Date visite	Du 02/07/2026 au 02/07/2026
	Auteur	Sébastien ROBERT
	N° dossier	32797937/S1/1
	Planche	1 / 13
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :




LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CAMPUS MOULIN DE LA HOUSSE Chemin des Rouliers 51100 REIMS	
Localisation	Date visite	Du 02/07/2026 au 02/07/2026
SOUS-SOL > PLAN 2 SUR 3	Auteur	Sébastien ROBERT
	N° dossier	32797937/S1/1
	Planche	2 / 13
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

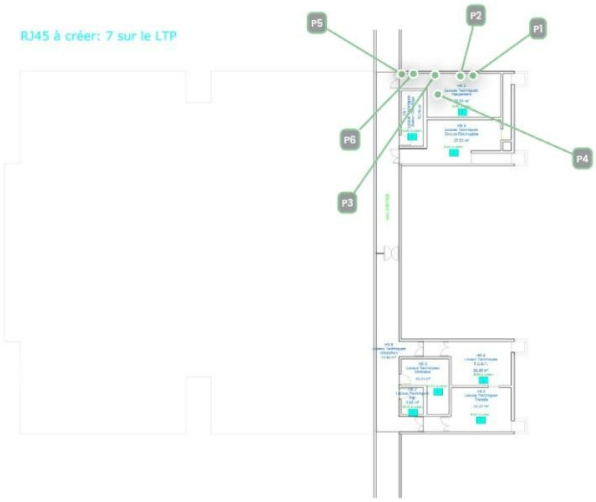


LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CAMPUS MOULIN DE LA HOUSSE Chemin des Rouliers 51100 REIMS	
Localisation	Date visite	Du 02/07/2026 au 02/07/2026
SOUS-SOL > PLAN 3 SUR 3	Auteur	Sébastien ROBERT
	N° dossier	32797937/S1/1
	Planche	3 / 13
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

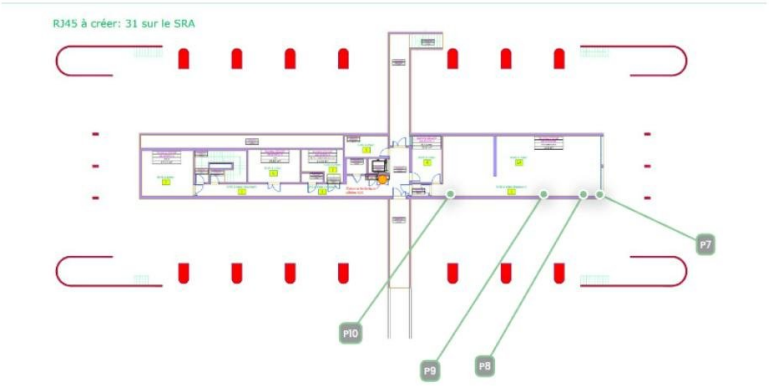


LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CAMPUS MOULIN DE LA HOUSSE Chemin des Rouliers 51100 REIMS	
Localisation RDC > PLAN 1 SUR 3	Date visite	Du 02/07/2026 au 02/07/2026
	Auteur	Sébastien ROBERT
	N° dossier	32797937/S1/1
	Planche	4 / 13
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

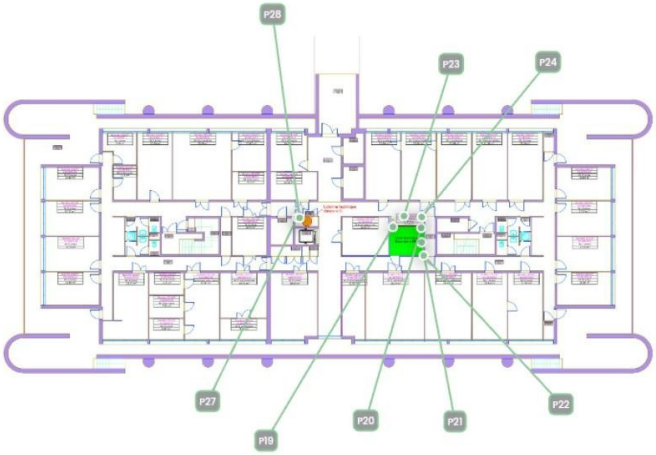

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CAMPUS MOULIN DE LA HOUSSE Chemin des Rouliers 51100 REIMS	
Localisation RDC > PLAN 2 SUR 3	Date visite	Du 02/07/2026 au 02/07/2026
	Auteur	Sébastien ROBERT
	N° dossier	32797937/S1/1
	Planche	5 / 13
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CAMPUS MOULIN DE LA HOUSSE Chemin des Rouliers 51100 REIMS	
Localisation RDC > PLAN 3 SUR 3	Date visite	Du 02/07/2026 au 02/07/2026
	Auteur	Sébastien ROBERT
	N° dossier	32797937/S1/1
	Planche	6 / 13
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :




LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CAMPUS MOULIN DE LA HOUSSE Chemin des Rouliers 51100 REIMS	
Localisation R+1 > PLAN 1 SUR 3	Date visite	Du 02/07/2026 au 02/07/2026
	Auteur	Sébastien ROBERT
	N° dossier	32797937/S1/1
	Planche	7 / 13
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

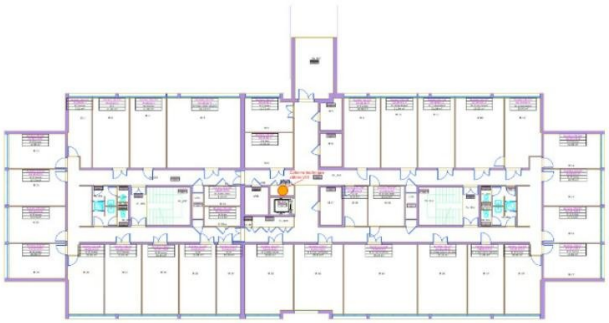

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CAMPUS MOULIN DE LA HOUSSE Chemin des Rouliers 51100 REIMS	
Localisation R+1 > PLAN 2 SUR 3	Date visite	Du 02/07/2026 au 02/07/2026
	Auteur	Sébastien ROBERT
	N° dossier	32797937/S1/1
	Planche	8 / 13
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :




LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CAMPUS MOULIN DE LA HOUSSE Chemin des Rouliers 51100 REIMS	
Localisation R+1 > PLAN 3 SUR 3	Date visite	Du 02/07/2026 au 02/07/2026
	Auteur	Sébastien ROBERT
	N° dossier	32797937/S1/1
	Planche	9 / 13
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

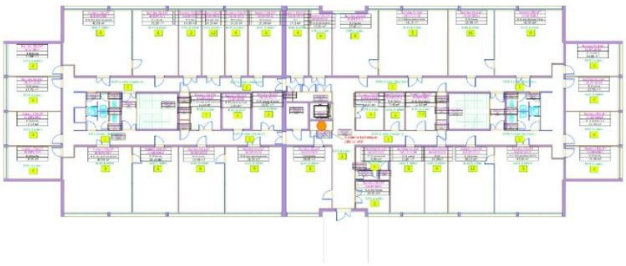

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CAMPUS MOULIN DE LA HOUSSE Chemin des Rouliers 51100 REIMS	
Localisation R+2 > PLAN 1 SUR 3	Date visite	Du 02/07/2026 au 02/07/2026
	Auteur	Sébastien ROBERT
	N° dossier	32797937/S1/1
	Planche	10 / 13
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CAMPUS MOULIN DE LA HOUSSE Chemin des Rouliers 51100 REIMS	
Localisation R+2 > PLAN 2 SUR 3	Date visite	Du 02/07/2026 au 02/07/2026
	Auteur	Sébastien ROBERT
	N° dossier	32797937/S1/1
	Planche	11 / 13
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CAMPUS MOULIN DE LA HOUSSE Chemin des Rouliers 51100 REIMS	
Localisation R+2 > PLAN 3 SUR 3	Date visite	Du 02/07/2026 au 02/07/2026
	Auteur	Sébastien ROBERT
	N° dossier	32797937/S1/1
	Planche	12 / 13
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


Copyright BUREAU VERITAS

Date du rapport : 13/07/2026
Rapport N°:32797937/S1/1

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CAMPUS MOULIN DE LA HOUSSE Chemin des Rouliers 51100 REIMS	
Localisation ELEMENTS EXTERIEUR	Date visite	Du 02/07/2026 au 02/07/2026
	Auteur	Sébastien ROBERT
	N° dossier	32797937/S1/1
	Planche	13 / 13
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

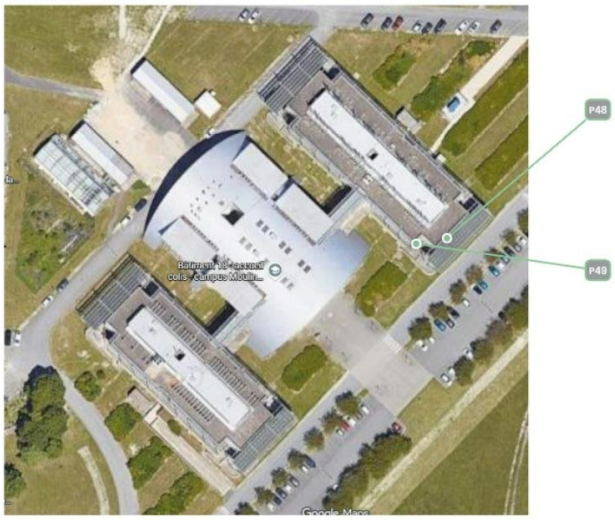

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS

Date du rapport : 13/07/2026
Rapport N°:32797937/S1/1

7.7. Rapport d'analyse du laboratoire

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Sébastien ROBERT
54 rue René Cassin
51430 BEZANNES

Notre référence : AR-26-HB-049868-01

Numéro de dossier : 26N030639
Référence de dossier : 1510797887/32797937/S1/1/1_32797937/1/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26N030639-001 - Référence *BV3ND4545 Réf. Prel : P1 SOUS-SOL - PLAN 2 SUR 3 - LOCAL HS 02/Gaines et coffres verticaux : Enduits projetés/talochés gaines - (Plâtre/Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-002 - Référence *BV3ND4546 Réf. Prel : P2 SOUS-SOL - PLAN 2 SUR 3 - LOCAL HS 02/Gaines et coffres verticaux : Enduits projetés/talochés gaines - (Plâtre/Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-003 - Référence *BV3ND4547 Réf. Prel : P3 SOUS-SOL - PLAN 2 SUR 3 - LOCAL HS 02/Gaines et coffres verticaux : Flocages gaines (Liste A) - (Cotonneux, Duveteux, Fibreux/Clair, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-004 - Référence *BV3ND4548 Réf. Prel : P4 SOUS-SOL - PLAN 2 SUR 3 - LOCAL HS 02/Gaines et coffres verticaux : Flocages gaines (Liste A) - (Cotonneux, Duveteux, Fibreux/Clair, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-005 - Référence *BV3ND4549 Réf. Prel : P5 SOUS-SOL - PLAN 2 SUR 3 - LOCAL HS 02/Façades lourdes y compris poteaux : Isolant - (Laine de roche, Laine de verre, Fibreux, Cotonneux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-006 - Référence *BV3ND4550 Réf. Prel : P6 SOUS-SOL - PLAN 2 SUR 3 - LOCAL HS 02/Façades lourdes y compris poteaux : Isolant - (Laine de roche, Laine de verre, Fibreux, Cotonneux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 26N030639-007 - Référence *BV3ND4551 Réf. Prel : P7 SOUS-SOL - PLAN 3 SUR 3 - DEGAGEMENT/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Rigide/Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-008 - Référence *BV3ND4552 Réf. Prel : P8 SOUS-SOL - PLAN 3 SUR 3 - DEGAGEMENT/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Fibreux, Rigide/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-009 - Référence *BV3ND4553 Réf. Prel : P9 SOUS-SOL - PLAN 3 SUR 3 - DEGAGEMENT/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Dur, Granuleux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-010 - Référence *BV3ND4554 Réf. Prel : P10 SOUS-SOL - PLAN 3 SUR 3 - DEGAGEMENT/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Dur, Granuleux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-011 - Référence *BV3ND4555 Réf. Prel : P11 SOUS-SOL - PLAN 1 SUR 3 - GAINE TECHNIQUE/Gaines et coffres verticaux : Enduits projetés/talochés gaines - (Plâtre/Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-012 - Référence *BV3ND4556 Réf. Prel : P12 SOUS-SOL - PLAN 1 SUR 3 - GAINE TECHNIQUE/Gaines et coffres verticaux : Enduits projetés/talochés gaines - (Plâtre/Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-013 - Référence *BV3ND4557 Réf. Prel : P13 RDC - PLAN 2 SUR 3 - LT PRINCIPAL/Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment - (Dur, Compact, Ciment/Clair, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-014 - Référence *BV3ND4558 Réf. Prel : P14 RDC - PLAN 2 SUR 3 - LT PRINCIPAL/Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment - (Dur, Compact, Ciment/Clair, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-015 - Référence *BV3ND4559 Réf. Prel : P15 RDC - PLAN 2 SUR 3 - LT PRINCIPAL/Gaines et coffres verticaux : Enduits projetés/talochés gaines - (Plâtre/Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 26N030639-016 - Référence *BV3ND4560 Réf. Prel : P16 RDC - PLAN 2 SUR 3 - LT PRINCIPAL/Gaines et coffres verticaux : Enduits projetés/talochés gaines - (Plâtre/Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-017 - Référence *BV3ND4561 Réf. Prel : P17 RDC - PLAN 2 SUR 3 - GAINE TECHNIQUE 1/Gaines et coffres verticaux : Flocages gaines (Liste A) - (Cotonneux, Duveteux, Fibreux/Clair, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-018 - Référence *BV3ND4562 Réf. Prel : P18 RDC - PLAN 2 SUR 3 - GAINE TECHNIQUE 2/Gaines et coffres verticaux : Flocages gaines (Liste A) - (Cotonneux, Duveteux, Fibreux/Clair, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-019 - Référence *BV3ND4563 Réf. Prel : P19 RDC - PLAN 1 SUR 3 - LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRC/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot verticales - (Papier, Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-020 - Référence *BV3ND4564 Réf. Prel : P20 RDC - PLAN 1 SUR 3 - LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRC/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot verticales - (Papier, Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-021 - Référence *BV3ND4565 Réf. Prel : P21 RDC - PLAN 1 SUR 3 - LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRC/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses / Ragréages*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-022 - Référence *BV3ND4566 Réf. Prel : P22 RDC - PLAN 1 SUR 3 - LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRC/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses / Ragréages*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-023 - Référence *BV3ND4567 Réf. Prel : P23 RDC - PLAN 1 SUR 3 - LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRC/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Dur, Granuleux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-024 - Référence *BV3ND4568 Réf. Prel : P24 RDC - PLAN 1 SUR 3 - LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRC/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Dur, Granuleux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 26N030639-025 - Référence *BV3ND4569 Réf. Prel : P25 RDC - PLAN 3 SUR 3 - GAINE TECHNIQUE/Gaines et coffres verticaux : Enduits projetés/talochés gaines - (Plâtre/Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-026 - Référence *BV3ND4570 Réf. Prel : P26 RDC - PLAN 3 SUR 3 - GAINE TECHNIQUE/Gaines et coffres verticaux : Enduits projetés/talochés gaines - (Plâtre/Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-027 - Référence *BV3ND4571 Réf. Prel : P27 RDC - PLAN 1 SUR 3 - GAINE TECHNIQUE/Gaines et coffres verticaux : Enduits projetés/talochés gaines - (Plâtre/Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-028 - Référence *BV3ND4572 Réf. Prel : P28 RDC - PLAN 1 SUR 3 - GAINE TECHNIQUE/Gaines et coffres verticaux : Enduits projetés/talochés gaines - (Plâtre/Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-029 - Référence *BV3ND4573 Réf. Prel : P29 R+1 - PLAN 2 SUR 3 - LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE HI 21 (SRB)/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses / Ragréages*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-030 - Référence *BV3ND4574 Réf. Prel : P30 R+1 - PLAN 2 SUR 3 - LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE HI 21 (SRB)/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses / Ragréages*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-031 - Référence *BV3ND4575 Réf. Prel : P31 R+1 - PLAN 2 SUR 3 - LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE HI 21 (SRB)/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Dur/Beige, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-032 - Référence *BV3ND4576 Réf. Prel : P32 R+1 - PLAN 2 SUR 3 - LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE HI 21 (SRB)/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Dur/Beige, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-033 - Référence *BV3ND4577 Réf. Prel : P33 R+1 - PLAN 2 SUR 3 - LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE HI 21 (SRB)/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Dur/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

- N° 26N030639-034 - Référence *BV3ND4578 Réf. Prel : P34 R+1 - PLAN 2 SUR 3 - LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE HI 21 (SRB)/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Dur/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-035 - Référence *BV3ND4579 Réf. Prel : P35 R+1 - PLAN 2 SUR 3 - GAINE TECHNIQUE 1/Gaines et coffres verticaux : Flocages gaines (Liste A) - (Cotonneux, Duveteux, Fibreux/Clair, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-036 - Référence *BV3ND4580 Réf. Prel : P36 R+1 - PLAN 2 SUR 3 - GAINE TECHNIQUE 2/Gaines et coffres verticaux : Flocages gaines (Liste A) - (Cotonneux, Duveteux, Fibreux/Clair, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-037 - Référence *BV3ND4581 Réf. Prel : P37 R+2 - PLAN 2 SUR 3 - GAINE TECHNIQUE 1/Gaines et coffres verticaux : Flocages gaines (Liste A) - (Cotonneux, Duveteux, Fibreux/Clair, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-038 - Référence *BV3ND4582 Réf. Prel : P38 R+2 - PLAN 2 SUR 3 - GAINE TECHNIQUE 2/Gaines et coffres verticaux : Flocages gaines (Liste A) - (Cotonneux, Duveteux, Fibreux/Clair, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-039 - Référence *BV3ND4583 Réf. Prel : P39 R+2 - PLAN 2 SUR 3 - GAINE TECHNIQUE 2/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bourre en vrac cloisons*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-040 - Référence *BV3ND4584 Réf. Prel : P40 R+2 - PLAN 2 SUR 3 - GAINE TECHNIQUE 2/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bourre en vrac cloisons*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-041 - Référence *BV3ND4585 Réf. Prel : P41 R+2 - PLAN 3 SUR 3 - PII39 LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRA/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-042 - Référence *BV3ND4586 Réf. Prel : P42 R+2 - PLAN 3 SUR 3 - PII39 LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRA/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 26N030639-043 - Référence *BV3ND4587 Réf. Prel : P43 R+2 - PLAN 3 SUR 3 - PII39 LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRA/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses / Ragréages*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-044 - Référence *BV3ND4588 Réf. Prel : P44 R+2 - PLAN 3 SUR 3 - PII39 LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRA/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses / Ragréages*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-045 - Référence *BV3ND4590 Réf. Prel : P45 R+2 - PLAN 3 SUR 3 - PII39 LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRA/Cloisons (légères et préfabriquées) : Sous couches tissus muraux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-046 - Référence *BV3ND4589 Réf. Prel : P46 R+2 - PLAN 3 SUR 3 - PII39 LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRA/Cloisons (légères et préfabriquées) : Sous couches tissus muraux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-047 - Référence *BV3ND4591 Réf. Prel : P47 R+2 - PLAN 3 SUR 3 - PII39 LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRA/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Compact, Fibreux, Poreux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-048 - Référence *BV3ND4592 Réf. Prel : P48 ELEMENTS EXTERIEUR - FACADES/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits projetés/crépis façades*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N030639-049 - Référence *BV3ND4593 Réf. Prel : P49 ELEMENTS EXTERIEUR - FACADES/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits projetés/crépis façades*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT NORD SAS
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-046889-01 — Date d'émission de rapport : 10/07/2026 5:37 — Page1/18
Référence laboratoire N° : 26RI046122 — Référence de suivi du dossier N° : 26N030639
Reçu au laboratoire le : 08/07/2026 — Date de réception :07/07/2026
Date d'analyse : 09/07/2026
Référence dossier Client:26N030639 - 1510797887/32797937/S1/1/1_32797937/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	26N030639-001 - BV3ND4545 Réf. Prel : P1 SOUS-SOL - PLAN 2 SUR 3 - LOCAL HS 02/Gaines et coffres verticaux : Enduits projetés/talochés gaines - (Plâtre/Clair)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	26N030639-002 - BV3ND4546 Réf. Prel : P2 SOUS-SOL - PLAN 2 SUR 3 - LOCAL HS 02/Gaines et coffres verticaux : Enduits projetés/talochés gaines - (Plâtre/Clair)	Matériau semi-dur (blanc)	**MET** / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003 (1)	26N030639-003 - BV3ND4547 Réf. Prel : P3 SOUS-SOL - PLAN 2 SUR 3 - LOCAL HS 02/Gaines et coffres verticaux : Flocages gaines (Liste A) - (Cotonneux, Duveteux, Fibreux/Clair, Gris)	Matériau (gris) ; matériau friable fibreux de type flocage (gris)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-046889-01 | Date d'émission de rapport : 10/07/2026 5:37 | Page2/18
Référence laboratoire N° : 26RI046122 | Référence de suivi du dossier N° : 26N030639
Reçu au laboratoire le : 08/07/2026 | Date de réception :07/07/2026
Date d'analyse : 09/07/2026
Référence dossier Client:26N030639 - 1510797887/32797937/S1/1/1_32797937/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004 (1)	26N030639-004 - BV3ND4548 Réf. Prel : P4 SOUS-SOL - PLAN 2 SUR 3 - LOCAL HS 02/Gaines et coffres verticaux : Flocages gaines (Liste A) - (Cotonneux, Duveteux, Fibreux/Clair, Gris)	Matériau (gris) ; matériau friable fibreux de type flocage (gris)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	26N030639-005 - BV3ND4549 Réf. Prel : P5 SOUS-SOL - PLAN 2 SUR 3 - LOCAL HS 02/Façades lourdes y compris poteaux : Isolant - (Laine de roche, Laine de verre, Fibreux, Cotonneux/)	Matériau (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / 35Q3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
006	26N030639-006 - BV3ND4550 Réf. Prel : P6 SOUS-SOL - PLAN 2 SUR 3 - LOCAL HS 02/Façades lourdes y compris poteaux : Isolant - (Laine de roche, Laine de verre, Fibreux, Cotonneux/)	Matériau (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** / ZV3Z	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / 35Q3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
007 (2)	26N030639-007 - BV3ND4551 Réf. Prel : P7 SOUS-SOL - PLAN 3 SUR 3 - DEGAGEMENT/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Rigide/Clair	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET** / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-046889-01 | Date d'émission de rapport : 10/07/2026 5:37 | Page3/18
Référence laboratoire N° : 26RI046122 | Référence de suivi du dossier N° : 26N030639
Reçu au laboratoire le : 08/07/2026 | Date de réception :07/07/2026
Date d'analyse : 09/07/2026
Référence dossier Client:26N030639 - 1510797887/32797937/S1/1/1_32797937/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	26N030639-008 - BV3ND4552 Réf. Prel : P8 SOUS-SOL - PLAN 3 SUR 3 - DEGAGEMENT/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Fibreux, Rigide/Blanc)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009 (1)	26N030639-009 - BV3ND4553 Réf. Prel : P9 SOUS-SOL - PLAN 3 SUR 3 - DEGAGEMENT/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Dur, Granuleux/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010 (1)	26N030639-010 - BV3ND4554 Réf. Prel : P10 SOUS-SOL - PLAN 3 SUR 3 - DEGAGEMENT/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Dur, Granuleux/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-046889-01 | Date d'émission de rapport : 10/07/2026 5:37 | Page4/18
Référence laboratoire N° : 26RI046122 | Référence de suivi du dossier N° : 26N030639
Reçu au laboratoire le : 08/07/2026 | Date de réception :07/07/2026
Date d'analyse : 09/07/2026
Référence dossier Client:26N030639 - 1510797887/32797937/S1/1/1_32797937/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	26N030639-011 - BV3ND4555 Réf. Prel : P11 SOUS-SOL - PLAN 1 SUR 3 - GAINE TECHNIQUE/Gaines e coffres verticaux : Enduits projetés/talochés gaines - (Plâtre/Clair)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / ZV3Z	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	26N030639-012 - BV3ND4556 Réf. Prel : P12 SOUS-SOL - PLAN 1 SUR 3 - GAINE TECHNIQUE/Gaines e coffres verticaux : Enduits projetés/talochés gaines - (Plâtre/Clair)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (gris)	**MET** / ZV3Z	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	26N030639-013 - BV3ND4557 Réf. Prel : P13 RDC - PLAN 2 SUR 3 - LT PRINCIPAL/Revêtemer ts de sol : Sols coulés à base ciment - (Dur, Compact, Ciment/Clair, Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / ZV3Z	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-046889-01 | Date d'émission de rapport : 10/07/2026 5:37 | Page5/18
Référence laboratoire N° : 26RI046122 | Référence de suivi du dossier N° : 26N030639
Reçu au laboratoire le : 08/07/2026 | Date de réception :07/07/2026
Date d'analyse : 09/07/2026
Référence dossier Client:26N030639 - 1510797887/32797937/S1/1/1_32797937/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	26N030639-014 - BV3ND4558 Réf. Prel : P14 RDC - PLAN 2 SUR 3 - LT PRINCIPAL/Revêtemer ts de sol : Sols coulés à base ciment - (Dur, Compact, Ciment/Clair, Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	26N030639-015 - BV3ND4559 Réf. Prel : P15 RDC - PLAN 2 SUR 3 - LT PRINCIPAL/Gaines et coffres verticaux : Enduits projetés/talochés gaines - (Plâtre/Clair)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau (gris)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	26N030639-016 - BV3ND4560 Réf. Prel : P16 RDC - PLAN 2 SUR 3 - LT PRINCIPAL/Gaines et coffres verticaux : Enduits projetés/talochés gaines - (Plâtre/Clair)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau (gris)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-046889-01 | Date d'émission de rapport : 10/07/2026 5:37 | Page6/18
Référence laboratoire N° : 26RI046122 | Référence de suivi du dossier N° : 26N030639
Reçu au laboratoire le : 08/07/2026 | Date de réception :07/07/2026
Date d'analyse : 09/07/2026
Référence dossier Client:26N030639 - 1510797887/32797937/S1/1/1_32797937/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	26N030639-017 - BV3ND4561 Réf. Prel : P17 RDC - PLAN 2 SUR 3 - GAINE TECHNIQUE 1/Gaines et coffres verticaux : Flocages gaines (Liste A) - (Cotonneux, Duveteux, Fibreux/Clair, Gris)	Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	**MOLP** / LMI6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
018	26N030639-018 - BV3ND4562 Réf. Prel : P18 RDC - PLAN 2 SUR 3 - GAINE TECHNIQUE 2/Gaines et coffres verticaux : Flocages gaines (Liste A) - (Cotonneux, Duveteux, Fibreux/Clair, Gris)	Matériau (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	**MOLP** / LMI6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
019	26N030639-019 - BV3ND4563 Réf. Prel : P19 RDC - PLAN 1 SUR 3 - LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRC/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot verticales - (Papier, Plâtre/)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** / LMI6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-046889-01 | Date d'émission de rapport : 10/07/2026 5:37 | Page7/18
Référence laboratoire N° : 26RI046122 | Référence de suivi du dossier N° : 26N030639
Reçu au laboratoire le : 08/07/2026 | Date de réception :07/07/2026
Date d'analyse : 09/07/2026
Référence dossier Client:26N030639 - 1510797887/32797937/S1/1/1_32797937/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / LMI6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
020	26N030639-020 - BV3ND4564 Réf. Prel : P20 RDC - PLAN 1 SUR 3 - LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRC/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot verticales - (Papier, Plâtre/)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** / LMI6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / LMI6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
021	26N030639-021 - BV3ND4565 Réf. Prel : P21 RDC - PLAN 1 SUR 3 - LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRC/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses / Ragréages	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	**MET** / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET** / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-046889-01 | Date d'émission de rapport : 10/07/2026 5:37 | Page8/18
Référence laboratoire N° : 26RI046122 | Référence de suivi du dossier N° : 26N030639
Reçu au laboratoire le : 08/07/2026 | Date de réception :07/07/2026
Date d'analyse : 09/07/2026
Référence dossier Client:26N030639 - 1510797887/32797937/S1/1/1_32797937/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	26N030639-022 - BV3ND4566 Réf. Prel : P22 RDC - PLAN 1 SUR 3 - LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRC/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses / Ragréages	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	**MET** / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau souple (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET** / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023 (1)	26N030639-023 - BV3ND4567 Réf. Prel : P23 RDC - PLAN 1 SUR 3 - LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRC/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Dur, Granuleux/)	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-046889-01 | Date d'émission de rapport : 10/07/2026 5:37 | Page9/18
Référence laboratoire N° : 26RI046122 | Référence de suivi du dossier N° : 26N030639
Reçu au laboratoire le : 08/07/2026 | Date de réception :07/07/2026
Date d'analyse : 09/07/2026
Référence dossier Client:26N030639 - 1510797887/32797937/S1/1/1_32797937/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024 (1)	26N030639-024 - BV3ND4568 Réf. Prel : P24 RDC - PLAN 1 SUR 3 - LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRC/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Dur, Granuleux/)	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	26N030639-025 - BV3ND4569 Réf. Prel : P25 RDC - PLAN 3 SUR 3 - GAINE TECHNIQUE/Gaines e coffres verticaux : Enduits projetés/talochés gaines - (Plâtre/Clair)	Matériau (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / ZV3Z	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	26N030639-026 - BV3ND4570 Réf. Prel : P26 RDC - PLAN 3 SUR 3 - GAINE TECHNIQUE/Gaines e coffres verticaux : Enduits projetés/talochés gaines - (Plâtre/Clair)	Matériau (fibreux) (blanc) en traces ; matériau (fibreux) (jaune) en traces ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-046889-01 | Date d'émission de rapport : 10/07/2026 5:37 | Page10/18
Référence laboratoire N° : 26RI046122 | Référence de suivi du dossier N° : 26N030639
Reçu au laboratoire le : 08/07/2026 | Date de réception :07/07/2026
Date d'analyse : 09/07/2026
Référence dossier Client:26N030639 - 1510797887/32797937/S1/1/1_32797937/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	26N030639-027 - BV3ND4571 Réf. Prel : P27 RDC - PLAN 1 SUR 3 - GAINE TECHNIQUE/Gaines e coffres verticaux : Enduits projetés/talochés gaines - (Plâtre/Clair)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	26N030639-028 - BV3ND4572 Réf. Prel : P28 RDC - PLAN 1 SUR 3 - GAINE TECHNIQUE/Gaines e coffres verticaux : Enduits projetés/talochés gaines - (Plâtre/Clair)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau (gris) en traces	**MET** / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	26N030639-029 - BV3ND4573 Réf. Prel : P29 R+1 - PLAN 2 SUR 3 - LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE HI 21 (SRB)/Revêtements d sol : Colles non bitumineuses / Ragréages	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (rose)	**MET** / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-046889-01 | Date d'émission de rapport : 10/07/2026 5:37 | Page11/18
Référence laboratoire N° : 26RI046122 | Référence de suivi du dossier N° : 26N030639
Reçu au laboratoire le : 08/07/2026 | Date de réception :07/07/2026
Date d'analyse : 09/07/2026
Référence dossier Client:26N030639 - 1510797887/32797937/S1/1/1_32797937/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	26N030639-030 - BV3ND4574 Réf. Prel : P30 R+1 - PLAN 2 SUR 3 - LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE HI 21 (SRB)/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses / Ragréages	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	26N030639-031 - BV3ND4575 Réf. Prel : P31 R+1 - PLAN 2 SUR 3 - LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE HI 21 (SRB)/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Dur/Beige, Clair)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / ZV3Z	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	26N030639-032 - BV3ND4576 Réf. Prel : P32 R+1 - PLAN 2 SUR 3 - LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE HI 21 (SRB)/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Dur/Beige, Clair)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / ZV3Z	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-046889-01 | Date d'émission de rapport : 10/07/2026 5:37 | Page12/18
Référence laboratoire N° : 26RI046122 | Référence de suivi du dossier N° : 26N030639
Reçu au laboratoire le : 08/07/2026 | Date de réception :07/07/2026
Date d'analyse : 09/07/2026
Référence dossier Client:26N030639 - 1510797887/32797937/S1/1/1_32797937/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	26N030639-033 - BV3ND4577 Réf. Prel : P33 R+1 - PLAN 2 SUR 3 - LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE HI 21 (SRB)/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Dur/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / ZV3Z	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	26N030639-034 - BV3ND4578 Réf. Prel : P34 R+1 - PLAN 2 SUR 3 - LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE HI 21 (SRB)/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Dur/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / ZV3Z	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	26N030639-035 - BV3ND4579 Réf. Prel : P35 R+1 - PLAN 2 SUR 3 - GAINE TECHNIQUE 1/Gaines et coffres verticaux : Flocages gaines (Liste A) - (Cotonneux, Duveteux, Fibreux/Clair, Gris)	Matériau (gris) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	**MET** / ZV3Z	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-046889-01 | Date d'émission de rapport : 10/07/2026 5:37 | Page13/18
Référence laboratoire N° : 26RI046122 | Référence de suivi du dossier N° : 26N030639
Reçu au laboratoire le : 08/07/2026 | Date de réception :07/07/2026
Date d'analyse : 09/07/2026
Référence dossier Client:26N030639 - 1510797887/32797937/S1/1/1_32797937/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036	26N030639-036 - BV3ND4580 Réf. Prel : P36 R+1 - PLAN 2 SUR 3 - GAINE TECHNIQUE 2/Gaines et coffres verticaux : Flocages gaines (Liste A) - (Cotonneux, Duveteux, Fibreux/Clair, Gris)	Matériau (gris) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	**MET** / ZV3Z	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	**MOLP** / LMI6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
037	26N030639-037 - BV3ND4581 Réf. Prel : P37 R+2 - PLAN 2 SUR 3 - GAINE TECHNIQUE 1/Gaines et coffres verticaux : Flocages gaines (Liste A) - (Cotonneux, Duveteux, Fibreux/Clair, Gris)	Matériau (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	**MET** / ZV3Z	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	**MOLP** / LMI6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
038	26N030639-038 - BV3ND4582 Réf. Prel : P38 R+2 - PLAN 2 SUR 3 - GAINE TECHNIQUE 2/Gaines et coffres verticaux : Flocages gaines (Liste A) - (Cotonneux, Duveteux, Fibreux/Clair, Gris)	Matériau (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	**MET** / ZV3Z	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	**MOLP** / LMI6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-046889-01 | Date d'émission de rapport : 10/07/2026 5:37 | Page14/18
Référence laboratoire N° : 26RI046122 | Référence de suivi du dossier N° : 26N030639
Reçu au laboratoire le : 08/07/2026 | Date de réception :07/07/2026
Date d'analyse : 09/07/2026
Référence dossier Client:26N030639 - 1510797887/32797937/S1/1/1_32797937/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	26N030639-039 - BV3ND4583 Réf. Prel : P39 R+2 - PLAN 2 SUR 3 - GAINE TECHNIQUE 2/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bourre en vrac cloisons	Matériau (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type mousse (rose)	**MET** / ZV3Z	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	26N030639-040 - BV3ND4584 Réf. Prel : P40 R+2 - PLAN 2 SUR 3 - GAINE TECHNIQUE 2/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bourre en vrac cloisons	Matériau de type mousse (orange)	**MET** / ZV3Z	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	26N030639-041 - BV3ND4585 Réf. Prel : P41 R+2 - PLAN 3 SUR 3 - PII39 LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRA/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-046889-01 | Date d'émission de rapport : 10/07/2026 5:37 | Page15/18
Référence laboratoire N° : 26RI046122 | Référence de suivi du dossier N° : 26N030639
Reçu au laboratoire le : 08/07/2026 | Date de réception :07/07/2026
Date d'analyse : 09/07/2026
Référence dossier Client:26N030639 - 1510797887/32797937/S1/1/1_32797937/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042	26N030639-042 - BV3ND4586 Réf. Prel : P42 R+2 - PLAN 3 SUR 3 - PII39 LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRA/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau (blanc) en traces	**MET** / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	26N030639-043 - BV3ND4587 Réf. Prel : P43 R+2 - PLAN 3 SUR 3 - PII39 LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRA/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses / Ragréages	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	**MET** / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	26N030639-044 - BV3ND4588 Réf. Prel : P44 R+2 - PLAN 3 SUR 3 - PII39 LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRA/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses / Ragréages	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) ; matériau (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-046889-01 | Date d'émission de rapport : 10/07/2026 5:37 | Page16/18
Référence laboratoire N° : 26RI046122 | Référence de suivi du dossier N° : 26N030639
Reçu au laboratoire le : 08/07/2026 | Date de réception :07/07/2026
Date d'analyse : 09/07/2026
Référence dossier Client:26N030639 - 1510797887/32797937/S1/1/1_32797937/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045	26N030639-045 - BV3ND4590 Réf. Prel : P45 R+2 - PLAN 3 SUR 3 - PII39 LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRA/Cloisons (légères et préfabriquées) : Sous couches tissus muraux	Matériau souple (fibreux) (bleu) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	26N030639-046 - BV3ND4589 Réf. Prel : P46 R+2 - PLAN 3 SUR 3 - PII39 LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRA/Cloisons (légères et préfabriquées) : Sous couches tissus muraux	Matériau (fibreux) (bleu) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris) en traces	**MET** / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	26N030639-047 - BV3ND4591 Réf. Prel : P47 R+2 - PLAN 3 SUR 3 - PII39 LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE SRA/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Compact, Fibreux, Poreux/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-046889-01 | Date d'émission de rapport : 10/07/2026 5:37 | Page17/18
Référence laboratoire N° : 26RI046122 | Référence de suivi du dossier N° : 26N030639
Reçu au laboratoire le : 08/07/2026 | Date de réception :07/07/2026
Date d'analyse : 09/07/2026
Référence dossier Client:26N030639 - 1510797887/32797937/S1/1/1_32797937/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
048	26N030639-048 - BV3ND4592 Réf. Prel : P48 ELEMENTS EXTERIEUR - FACADES/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits projetés/crépis façades	Matériau (noir) ; matériau dur (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	26N030639-049 - BV3ND4593 Réf. Prel : P49 ELEMENTS EXTERIEUR - FACADES/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits projetés/crépis façades	Matériau (noir) ; matériau dur (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	**MET** / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)
(1) Echantillon mouillé.
(2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-046889-01 | Date d'émission de rapport : 10/07/2026 5:37 | Page18/18
Référence laboratoire N° : 26RI046122 | Référence de suivi du dossier N° : 26N030639
Reçu au laboratoire le : 08/07/2026 | Date de réception :07/07/2026
Date d'analyse : 09/07/2026
Référence dossier Client:26N030639 - 1510797887/32797937/S1/1/1_32797937/1/1

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Dominika Dolik
Chef d'équipe suppléant

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA
