Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux

(Hors champ du code de la santé publique)

Numéro de dossier : 2026/04/14/0229
Date du repérage : 10/04/2026

Adresse du bien immobilier

Localisation du ou des bâtiments :
Département :... **Haute-Garonne**
Adresse : ..... **Caserne de gendarmerie TREMBLIER**
2 Avenue du Général de Croutte
"Logements"
Commune : ..... **31100 TOULOUSE (France)**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
, Lot numéro Non communiqué
Année de construction :

Donneur d'ordre / Propriétaire :

Donneur d'ordre :
SGAMI SUD Délégation Régionale
4 Chemin de Bordeblanque
31770 COLOMIERS (France)

Propriétaire :
SGAMI SUD Délégation Régionale
4 Chemin de Bordeblanque
31770 COLOMIERS (France)

Le Diagnostic suivant concerne

X	Les parties privatives		Avant la vente
	Les parties occupées		Avant la mise en location
X	Les parties communes d'un immeuble	X	Avant travaux *N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP*

Nature des travaux : Rénovation / Réhabilitation : OUI Démolition : NON

Société réalisant le constat

Nom et prénom de l'auteur du constat	**FONTA Kevin**
N° de certificat de certification	**6128 le 29/09/2021**
Nom de l'organisme de certification	**I.Cert**
Organisme d'assurance professionnelle	**AXA**
N° de contrat d'assurance	**7444835104**
Date de validité :	**01/01/2027**

Ce diagnostic plomb avant travaux a été rédigé par FONTA Kevin le 10/04/2026.



Objectif de la mission :

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Périmètre des travaux :

Le donneur d'ordre remet au diagnostiqueur ces informations via un tableau synthétique dont le modèle est téléchargeable sur le site de la DIRECCTE Centre : Annexe 2 Tableau de recensement des travaux établi par le donneur d'ordre ainsi qu'une description détaillée des travaux, de leur localisation et si déjà définis le nom et adresse des entreprises intervenantes. Il est important de disposer d'informations précises pour définir la stratégie de mesures.

Appareil utilisé	
Nom du fabricant de l'appareil	**FONDIS**
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	**FenX2 / 23-1102**
Nature du radionucléide	**109 Cd**
Date du dernier chargement de la source Activité à cette date et durée de vie de la source	**-** **850 MBq**

Tableau de recensement des travaux :

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenante

1. Rappel des références règlementaires

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail,
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants,
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb,
- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb.
- Norme NF X 46 035 juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et produits de construction.

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	**FONDIS**	
Modèle de l'appareil	**FenX2**	
N° de série de l'appareil	**23-1102**	
Nature du radionucléide	**109 Cd**	
Date du dernier chargement de la source	**-**	Activité à cette date et durée de vie : **850 MBq**
Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR)	**N° N° Codep-LYO-2020-0300521**	Nom du titulaire/signataire **Champurney Pascal**
	Date d'autorisation/de déclaration **20/05/2020**	Date de fin de validité (si applicable) **-**
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	**Champurney Pascal**	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	**Stéphane Diebolt**	

Étalon : FONDIS ; 226722 ; 1,01 mg/cm² +/- 0,01 mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm²)
Etalonnage entrée	1	14/04/2026	0,31 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	1424	14/04/2026	0,31 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	**Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse**
Nom du contact	**-**
Coordonnées	**-**
Référence du rapport d'essai	**-**
Date d'envoi des prélèvements	**-**
Date de réception des résultats	**-**

Liste des locaux visités

2ème étage - A5 DGT,
2ème étage - A5 Cuisine,
2ème étage - A5 WC,
2ème étage - B17 CH1,
2ème étage - B17 CH2,
2ème étage - B17 CH3,

2ème étage - A5 SDB,
2ème étage - A5 Séjour,
2ème étage - A5 CH1,
2ème étage - A5 CH2,
2ème étage - A5 CH3,
2ème étage - A5 CH4,
2ème étage - A5 Débarras,
2ème étage - A5 Débarras 2,
2ème étage - A6 DGT,
2ème étage - A6 Cuisine,
2ème étage - A6 WC,
2ème étage - A6 SDB,
2ème étage - A6 Séjour,
2ème étage - A6 CH1,
2ème étage - A6 CH2,
2ème étage - A6 Pièce,
Rez de chaussée - Hall entrée A,
Rez de chaussée - Local Cycle A,
Rez de chaussée - Local A,
Rez de chaussée - Cage d'escalier A,
1er étage - Cage d'escalier A,
3ème étage - C29 DGT,
3ème étage - C29 Cuisine,
3ème étage - C29 WC,
3ème étage - C29 SDB,
3ème étage - C29 Séjour,
3ème étage - C29 CH1,
3ème étage - C29 CH2,
3ème étage - C29 CH3,
3ème étage - C29 Débarras,
3ème étage - C29 Débarras 2,
2ème étage - B17 DGT,
2ème étage - B17 Cuisine,
2ème étage - B17 WC,
2ème étage - B17 SDB,
2ème étage - B17 Séjour,
2ème étage - B17 CH4,
2ème étage - B17 Débarras,
2ème étage - B17 Débarras 2,
Rez de chaussée - Hall entrée B,
Rez de chaussée - Local Cycle B,
Rez de chaussée - Local B,
2ème étage - Cage d'escalier C,
3ème étage - Cage d'escalier C,
1er étage - B15 DGT,
1er étage - B15 Cuisine,
1er étage - B15 WC,
1er étage - B15 SDB,
1er étage - B15 Séjour,
1er étage - B15 CH1,
1er étage - B15 CH2,
1er étage - B15 CH3,
1er étage - B15 Débarras,
1er étage - B15 Débarras 2,
3ème étage - C30 DGT,
3ème étage - C30 Cuisine,
3ème étage - C30 WC,
3ème étage - C30 SDB,
3ème étage - C30 Séjour,
3ème étage - C30 CH1,
3ème étage - C30 CH2,
3ème étage - C30 CH3,
3ème étage - C30 CH4,
3ème étage - C30 Débarras,
3ème étage - C30 Débarras 2,
Rez de chaussée - Cage d'escalier B,
2ème étage - A6 Débarras,
1er étage - Cage d'escalier B,
Extérieur - Toitures,
Sous-Sol - Vide sanitaire,
Sous-Sol - Chaufferie,
Extérieur - Façades

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

3. Méthodologie employée

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de repérage sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de repérage impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

3.1 Stratégie de mesurage

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de repérage (UR) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UR et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de repérage, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, …).

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire (idem réglementation du CREP).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», … dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de repérage (UR) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, …) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de repérage (UR) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

5. Résultats des mesures

2ème étage - A5 DGT

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
2	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
3		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
4	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
5		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
6	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
7		Mur (partie haute)			0,09	0,01	
8	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
9		Mur (partie haute)			0	0,01	
10		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
11		Plafond (mesure 2)			0,08	0,01	
12		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,03	0,01	
13		Plinthes (mesure 2)			0,06	0,01	
14	A	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
15		Porte d'entrée intérieure (partie haute)			0,05	0,01	
16	A	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
17		Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)			0,03	0,01	

18	A	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,1	0,01	
19		Porte d'entrée extérieure (partie haute)			0,04	0,01	
20	A	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
21		Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)			0,06	0,01	
22	B	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01	0,01	
23		Radiateur (mesure 2)			0,03	0,01	
24	B	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,08	0,01	
25		Canalisation (mesure 2)			0,01	0,01	
26		Huisserie (mesure 1)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
27		Huisserie (mesure 2)			0,03	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 13							

2ème étage - A5 Cuisine

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
28	A	Mur 1 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,1	0,01	
29		Mur 1 (mesure 2)			0,09	0,01	
30	B	Mur 2 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
31		Mur 2 (mesure 2)			0,01	0,01	
32	C	Mur 3 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
33		Mur 3 (mesure 2)			0,05	0,01	
34	D	Mur 4 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
35		Mur 4 (mesure 2)			0,09	0,01	
36		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
37		Plafond (mesure 2)			0,01	0,01	
38		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,09	0,01	
39		Plinthes (mesure 2)			0,02	0,01	
40	C	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
41		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
42	C	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
43		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
44	C	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
45		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
46	C	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
47		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
48	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
49		Porte (partie haute)			0,07	0,01	
50	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,1	0,01	
51		Huisserie Porte (partie haute)			0,08	0,01	
52	B	Mur 5 (mesure 1)	Faïence		n.m		
53		Mur 5 (mesure 2)			n.m		
54	C	Mur 6 (mesure 1)	Faïence		n.m		
55		Mur 6 (mesure 2)			n.m		
56	D	Mur 7 (mesure 1)	Faïence		n.m		
57		Mur 7 (mesure 2)			n.m		
58	B	Huisserie (mesure 1)	Bois	Peinture	0,07	0,01	
59		Huisserie (mesure 2)			0,05	0,01	
60	B	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,04	0,01	
61		Canalisation (mesure 2)			0,03	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 17							

2ème étage - A5 WC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
62	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
63		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
64	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
65		Mur (partie haute)			0,04	0,01	
66	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
67		Mur (partie haute)			0,04	0,01	
68	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	

69		Mur (partie haute)			0	0,01	
70	E	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
71		Mur (partie haute)			0	0,01	
72		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
73		Plafond (mesure 2)			0,04	0,01	
74		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		n.m		
75		Plinthes (mesure 2)			n.m		
76	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	0,01	
77		Porte (partie haute)			0	0,01	
78	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
79		Huisserie Porte (partie haute)			0,07	0,01	
80	B	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,07	0,01	
81		Canalisation (mesure 2)			0,08	0,01	
82	C	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,07	0,01	
83		Canalisation (mesure 2)			0,02	0,01	
84	D	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01	0,01	
85		Canalisation (mesure 2)			0	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 12							

2ème étage - A5 SDB

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
86	A	Mur 1 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
87		Mur 1 (mesure 2)			0	0,01	
88	B	Mur 2 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0	0,01	
89		Mur 2 (mesure 2)			0,02	0,01	
90	C	Mur 3 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
91		Mur 3 (mesure 2)			0,01	0,01	
92	D	Mur 4 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
93		Mur 4 (mesure 2)			0,04	0,01	
94	E	Mur 5 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
95		Mur 5 (mesure 2)			0,05	0,01	
96	F	Mur 6 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
97		Mur 6 (mesure 2)			0,03	0,01	
98	D	Mur 7 (mesure 1)	Faïence		n.m		
99		Mur 7 (mesure 2)			n.m		
100	F	Mur 8 (mesure 1)	Faïence		n.m		
101		Mur 8 (mesure 2)			n.m		
102		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
103		Plafond (mesure 2)			0,04	0,01	
104		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		n.m		
105		Plinthes (mesure 2)			n.m		
106	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0	0,01	
107		Porte (partie haute)			0,03	0,01	
108	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	0,01	
109		Huisserie Porte (partie haute)			0,09	0,01	
110	E	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
111		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
112	E	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
113		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
114	E	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
115		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
116	E	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
117		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
118	E	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,07	0,01	
119		Radiateur (mesure 2)			0,01	0,01	
120	E	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,03	0,01	
121		Canalisation (mesure 2)			0,08	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 18							

2ème étage - A5 Séjour

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
122	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0	0,01	
123		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
124	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
125		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
126	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
127		Mur (partie haute)			0	0,01	
128	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
129		Mur (partie haute)			0,04	0,01	
130	E	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
131		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
132	F	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
133		Mur (partie haute)			0	0,01	
134		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
135		Plafond (mesure 2)			0	0,01	
136		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,02	0,01	
137		Plinthes (mesure 2)			0,05	0,01	
138	C	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
139		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
140	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
141		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
142	C	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
143		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
144	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
145		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
146	E	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
147		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			n.m		
148	E	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
149		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			n.m		
150	E	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
151		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			n.m		
152	E	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
153		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			n.m		
154	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	0,01	
155		Porte (partie haute)			0,08	0,01	
156	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
157		Huisserie Porte (partie haute)			0,05	0,01	
158	E	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,02	0,01	
159		Radiateur (mesure 2)			0	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 19							

2ème étage - A5 CH1

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
160	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
161		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
162	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
163		Mur (partie haute)			0,09	0,01	
164	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
165		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
166	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
167		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
168		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
169		Plafond (mesure 2)			0,08	0,01	
170		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,03	0,01	

171		Plinthes (mesure 2)			0,08	0,01	
172	C	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
173		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
174	C	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
175		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
176	C	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
177		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
178	C	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
179		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
180	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	0,01	
181		Porte (partie haute)			0,02	0,01	
182	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
183		Huisserie Porte (partie haute)			0	0,01	
184	D	Huisserie (mesure 1)	Bois	Peinture	0,02	0,01	
185		Huisserie (mesure 2)			0,09	0,01	
186	C	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,06	0,01	
187		Canalisation (mesure 2)			0,01	0,01	
188	D	Porte fer (partie basse)	Métal	Peinture	0,08	0,01	
189		Porte fer (partie haute)			0,04	0,01	
190	D	Huisserie Porte fer (partie basse)	Métal	Peinture	0,01	0,01	
191		Huisserie Porte fer (partie haute)			0,04	0,01	
192	C	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,02	0,01	
193		Radiateur (mesure 2)			0,07	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 17							

2ème étage - A5 CH2

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
194	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
195		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
196	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
197		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
198	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
199		Mur (partie haute)			0,04	0,01	
200	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
201		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
202		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
203		Plafond (mesure 2)			0,04	0,01	
204		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,08	0,01	
205		Plinthes (mesure 2)			0,03	0,01	
206	C	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
207		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
208	C	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
209		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
210	C	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
211		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
212	C	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
213		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
214	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
215		Porte (partie haute)			0,02	0,01	
216	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
217		Huisserie Porte (partie haute)			0,08	0,01	
218	B	Huisserie (mesure 1)	Bois	Peinture	0,05	0,01	

219		Huisserie (mesure 2)			0,07	0,01	
220	C	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,04	0,01	
221		Canalisation (mesure 2)			0,03	0,01	
222	C	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,02	0,01	
223		Radiateur (mesure 2)			0,09	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 15							

2ème étage - A5 CH3

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
224	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
225		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
226	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
227		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
228	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
229		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
230	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
231		Mur (partie haute)			0	0,01	
232		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
233		Plafond (mesure 2)			0,03	0,01	
234		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,07	0,01	
235		Plinthes (mesure 2)			0,02	0,01	
236	C	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
237		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
238	C	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
239		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
240	C	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
241		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
242	C	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
243		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
244	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	0,01	
245		Porte (partie haute)			0,02	0,01	
246	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
247		Huisserie Porte (partie haute)			0,07	0,01	
248	D	Huisserie (mesure 1)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
249		Huisserie (mesure 2)			0,04	0,01	
250	C	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0	0,01	
251		Canalisation (mesure 2)			0,09	0,01	
252		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,07	0,01	
253		Radiateur (mesure 2)			0	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 15							

2ème étage - A5 CH4

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
254	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
255		Mur (partie haute)			0,04	0,01	
256	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
257		Mur (partie haute)			0	0,01	
258	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
259		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
260	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
261		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
262		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0	0,01	
263		Plafond (mesure 2)			0,08	0,01	
264		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,07	0,01	
265		Plinthes (mesure 2)			0	0,01	
266	C	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
267		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
268	C	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
269		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
270	C	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		

271		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
272	C	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
273		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
274	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	0,01	
275		Porte (partie haute)			0,01	0,01	
276	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0	0,01	
277		Huisserie Porte (partie haute)			0,01	0,01	
278	C	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,05	0,01	
279		Canalisation (mesure 2)			0,06	0,01	
280	C	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,07	0,01	
281		Radiateur (mesure 2)			0,06	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 14							

2ème étage - A5 Débarras

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
282	A	Mur (partie basse)	Tapisserie		0,09	0,01	
283		Mur (partie haute)			0,1	0,01	
284	B	Mur (partie basse)	Tapisserie		0,08	0,01	
285		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
286	C	Mur (partie basse)	Tapisserie		0,05	0,01	
287		Mur (partie haute)			0,04	0,01	
288	D	Mur (partie basse)	Tapisserie		0,06	0,01	
289		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
290		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0	0,01	
291		Plafond (mesure 2)			0,04	0,01	
292		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
293		Plinthes (mesure 2)			0,06	0,01	
294	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	0,01	
295		Porte (partie haute)			0,05	0,01	
296	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	0,01	
297		Huisserie Porte (partie haute)			0,05	0,01	
298	C	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,06	0,01	
299		Canalisation (mesure 2)			0,03	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 9							

2ème étage - A5 Débarras 2

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
300	A	Mur (partie basse)	Tapisserie		0,09	0,01	
301		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
302	B	Mur (partie basse)	Tapisserie		0,01	0,01	
303		Mur (partie haute)			0,1	0,01	
304	C	Mur (partie basse)	Tapisserie		0,06	0,01	
305		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
306	D	Mur (partie basse)	Tapisserie		0,06	0,01	
307		Mur (partie haute)			0,1	0,01	
308		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
309		Plafond (mesure 2)			0,03	0,01	
310		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,02	0,01	
311		Plinthes (mesure 2)			0,04	0,01	
312	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	0,01	
313		Porte (partie haute)			0,06	0,01	
314	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	0,01	
315		Huisserie Porte (partie haute)			0,1	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 8							

2ème étage - A6 DGT

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
316	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
317		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
318	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
319		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
320	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
321		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
322	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
323		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
324		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
325		Plafond (mesure 2)			0,04	0,01	
326		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,08	0,01	

327		Plinthes (mesure 2)			0,07	0,01	
328	A	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	0,01	
329		Porte d'entrée intérieure (partie haute)			0,07	0,01	
330	A	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
331		Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)			0,07	0,01	
332	A	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
333		Porte d'entrée extérieure (partie haute)			0,09	0,01	
334	A	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
335		Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)			0	0,01	
336	B	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,02	0,01	
337		Radiateur (mesure 2)			0,03	0,01	
338	B	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,06	0,01	
339		Canalisation (mesure 2)			0,07	0,01	
340		Huisserie (mesure 1)	Bois	Peinture	0,02	0,01	
341		Huisserie (mesure 2)			0,01	0,01	
342		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
343		Porte (partie haute)			0,07	0,01	
344		Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
345		Huisserie Porte (partie haute)			0,06	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 15							

2ème étage - A6 Cuisine

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
346	A	Mur 1 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
347		Mur 1 (mesure 2)			0,06	0,01	
348	B	Mur 2 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
349		Mur 2 (mesure 2)			0,06	0,01	
350	C	Mur 3 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
351		Mur 3 (mesure 2)			0,08	0,01	
352	D	Mur 4 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
353		Mur 4 (mesure 2)			0,06	0,01	
354		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
355		Plafond (mesure 2)			0,07	0,01	
356		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		n.m		
357		Plinthes (mesure 2)			n.m		
358	C	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
359		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
360	C	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
361		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
362	C	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
363		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
364	C	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
365		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
366	B	Mur 5 (mesure 1)	Faïence		n.m		
367		Mur 5 (mesure 2)			n.m		
368	C	Mur 6 (mesure 1)	Faïence		n.m		
369		Mur 6 (mesure 2)			n.m		
370	D	Mur 7 (mesure 1)	Faïence		n.m		
371		Mur 7 (mesure 2)			n.m		
372	A	Huisserie (mesure 1)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
373		Huisserie (mesure 2)			0,09	0,01	
374	D	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,04	0,01	

375		Canalisation (mesure 2)			0,04	0,01	
376	D	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,02	0,01	
377		Radiateur (mesure 2)			0,03	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 16							

2ème étage - A6 WC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
378	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
379		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
380	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
381		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
382	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
383		Mur (partie haute)			0,09	0,01	
384	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
385		Mur (partie haute)			0	0,01	
386	E	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
387		Mur (partie haute)			0,04	0,01	
388		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
389		Plafond (mesure 2)			0	0,01	
390		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		n.m		
391		Plinthes (mesure 2)			n.m		
392	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	0,01	
393		Porte (partie haute)			0,09	0,01	
394	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,1	0,01	
395		Huisserie Porte (partie haute)			0,08	0,01	
396	B	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,09	0,01	
397		Canalisation (mesure 2)			0,06	0,01	
398	C	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,04	0,01	
399		Canalisation (mesure 2)			0,05	0,01	
400	D	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,02	0,01	
401		Canalisation (mesure 2)			0	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 12							

2ème étage - A6 SDB

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
402	A	Mur 1 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
403		Mur 1 (mesure 2)			0,01	0,01	
404	B	Mur 2 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
405		Mur 2 (mesure 2)			0,04	0,01	
406	C	Mur 3 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
407		Mur 3 (mesure 2)			0,08	0,01	
408	D	Mur 4 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
409		Mur 4 (mesure 2)			0,09	0,01	
410	E	Mur 5 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0	0,01	
411		Mur 5 (mesure 2)			0	0,01	
412	F	Mur 6 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
413		Mur 6 (mesure 2)			0,06	0,01	
414	B	Mur 7 (mesure 1)	Faïence		n.m		
415		Mur 7 (mesure 2)			n.m		
416	D	Mur 8 (mesure 1)	Faïence		n.m		
417		Mur 8 (mesure 2)			n.m		
418		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0	0,01	
419		Plafond (mesure 2)			0,07	0,01	
420		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		n.m		
421		Plinthes (mesure 2)			n.m		
422	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
423		Porte (partie haute)			0,05	0,01	
424	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	0,01	
425		Huisserie Porte (partie haute)			0,06	0,01	
426	C	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
427		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
428	C	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
429		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
430	C	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
431		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		

432	C	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
433		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
434	C	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,05	0,01	
435		Radiateur (mesure 2)			0,02	0,01	
436	C	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,03	0,01	
437		Canalisation (mesure 2)			0,04	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 18							

2ème étage - A6 Séjour

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
438	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
439		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
440	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
441		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
442	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
443		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
444	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0	0,01	
445		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
446		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
447		Plafond (mesure 2)			0	0,01	
448		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,08	0,01	
449		Plinthes (mesure 2)			0	0,01	
450	C	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
451		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
452	C	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
453		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
454	C	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
455		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
456	C	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
457		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
458	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
459		Porte (partie haute)			0,08	0,01	
460	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	0,01	
461		Huisserie Porte (partie haute)			0,03	0,01	
462	C	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,07	0,01	
463		Radiateur (mesure 2)			0,03	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 13							

2ème étage - A6 CH1

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
464	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
465		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
466	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
467		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
468	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
469		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
470	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
471		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
472		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
473		Plafond (mesure 2)			0,04	0,01	
474		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
475		Plinthes (mesure 2)			0,02	0,01	
476	C	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
477		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
478	C	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
479		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
480	C	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		

481		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
482	C	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
483		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
484	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
485		Porte (partie haute)			0,08	0,01	
486	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	0,01	
487		Huisserie Porte (partie haute)			0,03	0,01	
488	B	Huisserie (mesure 1)	Bois	Peinture	0,06	0,01	
489		Huisserie (mesure 2)			0,03	0,01	
490	C	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,05	0,01	
491		Canalisation (mesure 2)			0,04	0,01	
492	B	Porte fer (partie basse)	Métal	Peinture	0,09	0,01	
493		Porte fer (partie haute)			0,02	0,01	
494	B	Huisserie Porte fer (partie basse)	Métal	Peinture	0,09	0,01	
495		Huisserie Porte fer (partie haute)			0,01	0,01	
496	C	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,07	0,01	
497		Radiateur (mesure 2)			0,03	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 17							

2ème étage - A6 CH2

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
498	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
499		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
500	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
501		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
502	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
503		Mur (partie haute)			0,09	0,01	
504	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
505		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
506		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
507		Plafond (mesure 2)			0,1	0,01	
508		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
509		Plinthes (mesure 2)			0,06	0,01	
510	B	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
511		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
512	B	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
513		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
514	B	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
515		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
516	B	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
517		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
518	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	0,01	
519		Porte (partie haute)			0,09	0,01	
520	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,08	0,01	
521		Huisserie Porte (partie haute)			0,02	0,01	
522	C	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,04	0,01	
523		Canalisation (mesure 2)			0,09	0,01	
524	C	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,04	0,01	
525		Radiateur (mesure 2)			0,06	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 14							

2ème étage - A6 Pièce

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
526	A	Mur (partie basse)	Tapisserie		0,02	0,01	
527		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
528	B	Mur (partie basse)	Tapisserie		0	0,01	

529		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
530	C	Mur (partie basse)	Tapisserie		0,05	0,01	
531		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
532	D	Mur (partie basse)	Tapisserie		0,07	0,01	
533		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
534		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
535		Plafond (mesure 2)			0,01	0,01	
536		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
537		Plinthes (mesure 2)			0,02	0,01	
538	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
539		Porte (partie haute)			0,07	0,01	
540	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,08	0,01	
541		Huisserie Porte (partie haute)			0,07	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 8							

Rez de chaussée - Hall entrée A

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
542	A	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,09	0,01	
543		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
544	B	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,05	0,01	
545		Mur (partie haute)			0	0,01	
546	C	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,06	0,01	
547		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
548	D	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,02	0,01	
549		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
550		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
551		Plafond (mesure 2)			0,04	0,01	
552		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		n.m		
553		Plinthes (mesure 2)			n.m		
554	A	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
555		Porte d'entrée intérieure (partie haute)			n.m		
556	A	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
557		Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)			n.m		
558	A	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
559		Porte d'entrée extérieure (partie haute)			n.m		
560	A	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
561		Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)			n.m		
562	C	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	0,01	
563		Porte (partie haute)			0,03	0,01	
564	C	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
565		Huisserie Porte (partie haute)			0,04	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 12							

Rez de chaussée - Local Cycle A

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
566	A	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,03	0,01	
567		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
568	B	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,01	0,01	
569		Mur (partie haute)			0,09	0,01	
570	C	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0	0,01	
571		Mur (partie haute)			0	0,01	
572	D	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,05	0,01	
573		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
574		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
575		Plafond (mesure 2)			0,04	0,01	
576	B	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
577		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
578	B	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		

579		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
580	B	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
581		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
582	B	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
583		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
584	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
585		Porte (partie haute)			0	0,01	
586	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	0,01	
587		Huisserie Porte (partie haute)			0,05	0,01	
588	C	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,08	0,01	
589		Canalisation (mesure 2)			0,05	0,01	
590	D	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,07	0,01	
591		Canalisation (mesure 2)			0,06	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 13							

Rez de chaussée - Local A

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
592	A	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,01	0,01	
593		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
594	B	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,02	0,01	
595		Mur (partie haute)			0	0,01	
596	C	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0	0,01	
597		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
598	D	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,09	0,01	
599		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
600	E	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,01	0,01	
601		Mur (partie haute)			0,04	0,01	
602	F	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,04	0,01	
603		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
604		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
605		Plafond (mesure 2)			0,08	0,01	
606	D	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
607		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
608	D	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
609		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
610	D	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
611		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
612	D	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
613		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
614	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
615		Porte (partie haute)			0,07	0,01	
616	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	0,01	
617		Huisserie Porte (partie haute)			0,09	0,01	
618		Support linge (mesure 1)	métal	peinture	0,01	0,01	
619		Support linge (mesure 2)			0,08	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 14							

Rez de chaussée - Cage d'escalier A

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
620	A	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,07	0,01	
621		Mur (partie haute)			0	0,01	
622	B	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,05	0,01	
623		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
624	C	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,02	0,01	
625		Mur (partie haute)			0,09	0,01	

626	D	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,05	0,01	
627		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
628		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0	0,01	
629		Plafond (mesure 2)			0,06	0,01	
630		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		n.m		
631		Plinthes (mesure 2)			n.m		
632	A	Porte (partie basse)	Aluminium		n.m		
633		Porte (partie haute)			n.m		
634	A	Huisserie Porte (partie basse)	Aluminium		n.m		
635		Huisserie Porte (partie haute)			n.m		
636		Garde corps (mesure 1)	Métal	Peinture	n.m		
637		Garde corps (mesure 2)			n.m		
638	B	Porte vers SS (partie basse)	Bois	Peinture	n.m		
639		Porte vers SS (partie haute)			n.m		
640	B	Huisserie Porte vers SS (partie basse)	Bois	Peinture	n.m		
641		Huisserie Porte vers SS (partie haute)			n.m		
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

1er étage - Cage d'escalier A

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
642	A	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,09	0,01	
643		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
644	B	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,04	0,01	
645		Mur (partie haute)			0,09	0,01	
646	C	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,05	0,01	
647		Mur (partie haute)			0,04	0,01	
648	D	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,02	0,01	
649		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
650		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
651		Plafond (mesure 2)			0,04	0,01	
652		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		n.m		
653		Plinthes (mesure 2)			n.m		
654		Garde corps (mesure 1)	Métal	Peinture	0	0,01	
655		Garde corps (mesure 2)			0,02	0,01	
656	D	Porte placard gaz (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	0,01	
657		Porte placard gaz (partie haute)			0,02	0,01	
658	D	Huisserie Porte placard gaz (partie basse)	Bois	Peinture	0,1	0,01	
659		Huisserie Porte placard gaz (partie haute)			0,06	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 9							

3ème étage - C29 DGT

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
660	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
661		Mur (partie haute)			0	0,01	
662	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
663		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
664	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
665		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
666	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
667		Mur (partie haute)			0	0,01	
668		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
669		Plafond (mesure 2)			0	0,01	
670		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,02	0,01	
671		Plinthes (mesure 2)			0,01	0,01	
672	A	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
673		Porte d'entrée intérieure (partie haute)			0,09	0,01	
674	A	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0	0,01	
675		Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)			0	0,01	
676	A	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	0,01	

677		Porte d'entrée extérieure (partie haute)			0,05	0,01	
678	A	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	0,01	
679		Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)			0,02	0,01	
680	D	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,02	0,01	
681		Radiateur (mesure 2)			0,03	0,01	
682	D	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,02	0,01	
683		Canalisation (mesure 2)			0,07	0,01	
684		Huisserie (mesure 1)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
685		Huisserie (mesure 2)			0,08	0,01	
686	D	Porte fer (partie basse)			0,09	0,01	
687		Porte fer (partie haute)			0,02	0,01	
688	D	Huisserie Porte fer (partie basse)			0	0,01	
689		Huisserie Porte fer (partie haute)			0,03	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 15							

3ème étage - C29 Cuisine

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
690	A	Mur 1 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0	0,01	
691		Mur 1 (mesure 2)			0,04	0,01	
692	B	Mur 2 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
693		Mur 2 (mesure 2)			0,06	0,01	
694	C	Mur 3 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
695		Mur 3 (mesure 2)			0,04	0,01	
696	D	Mur 4 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
697		Mur 4 (mesure 2)			0,02	0,01	
698		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,1	0,01	
699		Plafond (mesure 2)			0,08	0,01	
700		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		n.m		
701		Plinthes (mesure 2)			n.m		
702	C	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
703		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
704	C	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
705		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
706	C	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
707		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
708	C	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
709		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
710	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	0,01	
711		Porte (partie haute)			0,07	0,01	
712	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	0,01	
713		Huisserie Porte (partie haute)			0	0,01	
714	B	Mur 5 (mesure 1)	Faïence		n.m		
715		Mur 5 (mesure 2)			n.m		
716	C	Mur 6 (mesure 1)	Faïence		n.m		
717		Mur 6 (mesure 2)			n.m		
718	D	Mur 7 (mesure 1)	Faïence		n.m		
719		Mur 7 (mesure 2)			n.m		
720	B	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,02	0,01	
721		Canalisation (mesure 2)			0,02	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 16							

3ème étage - C29 WC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
722	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
723		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
724	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
725		Mur (partie haute)			0,09	0,01	

726	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
727		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
728	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
729		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
730	E	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
731		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
732		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
733		Plafond (mesure 2)			0,03	0,01	
734		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		n.m		
735		Plinthes (mesure 2)			n.m		
736	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,08	0,01	
737		Porte (partie haute)			0,09	0,01	
738	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,1	0,01	
739		Huisserie Porte (partie haute)			0,01	0,01	
740	B	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0	0,01	
741		Canalisation (mesure 2)			0,06	0,01	
742	C	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0	0,01	
743		Canalisation (mesure 2)			0,07	0,01	
744	D	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,02	0,01	
745		Canalisation (mesure 2)			0,09	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 12							

3ème étage - C29 SDB

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
746	A	Mur 1 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
747		Mur 1 (mesure 2)			0,07	0,01	
748	B	Mur 2 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
749		Mur 2 (mesure 2)			0,09	0,01	
750	C	Mur 3 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
751		Mur 3 (mesure 2)			0,07	0,01	
752	D	Mur 4 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
753		Mur 4 (mesure 2)			0	0,01	
754	E	Mur 5 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
755		Mur 5 (mesure 2)			0,08	0,01	
756	F	Mur 6 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
757		Mur 6 (mesure 2)			0,02	0,01	
758	B	Mur 7 (mesure 1)	Faïence		0,04	0,01	
759		Mur 7 (mesure 2)			0,05	0,01	
760	D	Mur 8 (mesure 1)	Faïence		0,08	0,01	
761		Mur 8 (mesure 2)			0,07	0,01	
762		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
763		Plafond (mesure 2)			0,03	0,01	
764		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		n.m		
765		Plinthes (mesure 2)			n.m		
766	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	0,01	
767		Porte (partie haute)			0,06	0,01	
768	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	0,01	
769		Huisserie Porte (partie haute)			0,02	0,01	
770	C	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
771		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
772	C	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
773		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
774	C	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
775		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
776	C	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
777		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
778	C	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0	0,01	
779		Radiateur (mesure 2)			0,03	0,01	
780	C	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,04	0,01	
781		Canalisation (mesure 2)			0	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 18							

3ème étage - C29 Séjour

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
782	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
783		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
784	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
785		Mur (partie haute)			0,04	0,01	
786	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0	0,01	
787		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
788	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
789		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
790	E	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
791		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
792	F	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
793		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
794	C	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
795		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
796	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
797		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
798	C	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
799		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
800	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
801		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
802	C	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
803		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			n.m		
804	C	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
805		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			n.m		
806	C	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
807		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			n.m		
808	C	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
809		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			n.m		
810	C	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,09	0,01	
811		Radiateur (mesure 2)			0,04	0,01	
812	F	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0	0,01	
813		Radiateur (mesure 2)			0,06	0,01	
814	C	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,02	0,01	
815		Canalisation (mesure 2)			0,05	0,01	
816	F	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,09	0,01	
817		Canalisation (mesure 2)			0,06	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 18							

3ème étage - C29 CH1

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
818	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
819		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
820	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
821		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
822	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
823		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
824	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
825		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
826		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
827		Plafond (mesure 2)			0,05	0,01	
828		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
829		Plinthes (mesure 2)			0,02	0,01	
830	C	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		

831		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
832	C	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
833		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
834	C	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
835		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
836	C	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
837		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
838	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	0,01	
839		Porte (partie haute)			0,03	0,01	
840	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	0,01	
841		Huisserie Porte (partie haute)			0,04	0,01	
842	B	Huisserie (mesure 1)	Bois	Peinture	0,07	0,01	
843		Huisserie (mesure 2)			0,02	0,01	
844	C	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,07	0,01	
845		Canalisation (mesure 2)			0,03	0,01	
846	C	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,06	0,01	
847		Radiateur (mesure 2)			0,04	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 15							

3ème étage - C29 CH2

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
848	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
849		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
850	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
851		Mur (partie haute)			0,04	0,01	
852	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
853		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
854	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
855		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
856		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
857		Plafond (mesure 2)			0,03	0,01	
858		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0	0,01	
859		Plinthes (mesure 2)			0,07	0,01	
860	C	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
861		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
862	C	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
863		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
864	C	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
865		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
866	C	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
867		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
868	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
869		Porte (partie haute)			0,05	0,01	
870	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	0,01	
871		Huisserie Porte (partie haute)			0,04	0,01	
872	D	Huisserie (mesure 1)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
873		Huisserie (mesure 2)			0,09	0,01	
874	C	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,03	0,01	
875		Canalisation (mesure 2)			0,02	0,01	
876	C	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,09	0,01	
877		Radiateur (mesure 2)			0,06	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 15							

3ème étage - C29 CH3

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
878	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
879		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
880	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
881		Mur (partie haute)			0,09	0,01	
882	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0	0,01	
883		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
884	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
885		Mur (partie haute)			0,1	0,01	
886		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
887		Plafond (mesure 2)			0,02	0,01	
888		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,08	0,01	
889		Plinthes (mesure 2)			0,01	0,01	
890	C	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
891		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
892	C	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
893		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
894	C	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
895		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
896	C	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
897		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
898	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	0,01	
899		Porte (partie haute)			0,03	0,01	
900	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	0,01	
901		Huisserie Porte (partie haute)			0	0,01	
902	C	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,06	0,01	
903		Canalisation (mesure 2)			0,09	0,01	
904	C	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,03	0,01	
905		Radiateur (mesure 2)			0,06	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 14							

3ème étage - C29 Débarras

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
906	A	Mur (partie basse)	Tapisserie		0,09	0,01	
907		Mur (partie haute)			0,04	0,01	
908	B	Mur (partie basse)	Tapisserie		0,08	0,01	
909		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
910	C	Mur (partie basse)	Tapisserie		0	0,01	
911		Mur (partie haute)			0	0,01	
912	D	Mur (partie basse)	Tapisserie		0,03	0,01	
913		Mur (partie haute)			0	0,01	
914		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
915		Plafond (mesure 2)			0,01	0,01	
916		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,03	0,01	
917		Plinthes (mesure 2)			0,09	0,01	
918	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	0,01	
919		Porte (partie haute)			0,09	0,01	
920	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
921		Huisserie Porte (partie haute)			0,01	0,01	
922	C	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,07	0,01	
923		Canalisation (mesure 2)			0,01	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 9							

3ème étage - C29 Débarras 2

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
924	A	Mur (partie basse)	Tapisserie		0,07	0,01	
925		Mur (partie haute)			0,09	0,01	
926	B	Mur (partie basse)	Tapisserie		0,03	0,01	
927		Mur (partie haute)			0,07	0,01	

928	C	Mur (partie basse)	Tapisserie		0,03	0,01	
929		Mur (partie haute)			0	0,01	
930	D	Mur (partie basse)	Tapisserie		0	0,01	
931		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
932		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
933		Plafond (mesure 2)			0,02	0,01	
934		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
935		Plinthes (mesure 2)			0,01	0,01	
936	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
937		Porte (partie haute)			0,01	0,01	
938	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
939		Huisserie Porte (partie haute)			0,05	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 8							

2ème étage - B17 DGT

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
940	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
941		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
942	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
943		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
944	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
945		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
946	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
947		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
948		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
949		Plafond (mesure 2)			0,08	0,01	
950		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
951		Plinthes (mesure 2)			0,02	0,01	
952	A	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
953		Porte d'entrée intérieure (partie haute)			0,08	0,01	
954	A	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0	0,01	
955		Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)			0,01	0,01	
956	A	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,1	0,01	
957		Porte d'entrée extérieure (partie haute)			0,07	0,01	
958	A	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	0,01	
959		Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)			0,06	0,01	
960	B	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,02	0,01	
961		Radiateur (mesure 2)			0,1	0,01	
962	B	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,09	0,01	
963		Canalisation (mesure 2)			0,02	0,01	
964		Huisserie (mesure 1)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
965		Huisserie (mesure 2)			0,02	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 13							

2ème étage - B17 Cuisine

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
966	A	Mur 1 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
967		Mur 1 (mesure 2)			0	0,01	
968	B	Mur 2 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0	0,01	
969		Mur 2 (mesure 2)			0,06	0,01	
970	C	Mur 3 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
971		Mur 3 (mesure 2)			0,09	0,01	
972	D	Mur 4 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
973		Mur 4 (mesure 2)			0,02	0,01	
974		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
975		Plafond (mesure 2)			0,09	0,01	
976		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		n.m		
977		Plinthes (mesure 2)			n.m		
978	C	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
979		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
980	C	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		

981		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
982	C	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
983		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
984	C	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
985		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
986	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
987		Porte (partie haute)			0,06	0,01	
988	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
989		Huisserie Porte (partie haute)			0,03	0,01	
990	B	Mur 5 (mesure 1)	Faïence		0,03	0,01	
991		Mur 5 (mesure 2)			0,04	0,01	
992	C	Mur 6 (mesure 1)	Faïence		0,02	0,01	
993		Mur 6 (mesure 2)			0,04	0,01	
994	D	Mur 7 (mesure 1)	Faïence		0,08	0,01	
995		Mur 7 (mesure 2)			0,05	0,01	
996	B	Huisserie (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
997		Huisserie (mesure 2)			0,05	0,01	
998	B	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,07	0,01	
999		Canalisation (mesure 2)			0,05	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 17							

2ème étage - B17 WC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
1000	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
1001		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
1002	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
1003		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
1004	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
1005		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
1006	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
1007		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
1008	E	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
1009		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
1010		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0	0,01	
1011		Plafond (mesure 2)			0,08	0,01	
1012		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		n.m		
1013		Plinthes (mesure 2)			n.m		
1014	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,08	0,01	
1015		Porte (partie haute)			0,03	0,01	
1016	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0	0,01	
1017		Huisserie Porte (partie haute)			0,1	0,01	
1018	B	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,09	0,01	
1019		Canalisation (mesure 2)			0,05	0,01	
1020	C	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,02	0,01	
1021		Canalisation (mesure 2)			0,06	0,01	
1022	D	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,07	0,01	
1023		Canalisation (mesure 2)			0,03	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 12							

2ème étage - B17 SDB

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
1024	A	Mur 1 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
1025		Mur 1 (mesure 2)			0,08	0,01	
1026	B	Mur 2 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
1027		Mur 2 (mesure 2)			0,03	0,01	
1028	C	Mur 3 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
1029		Mur 3 (mesure 2)			0,06	0,01	
1030	D	Mur 4 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0	0,01	
1031		Mur 4 (mesure 2)			0,05	0,01	
1032	E	Mur 5 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
1033		Mur 5 (mesure 2)			0,02	0,01	
1034	F	Mur 6 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
1035		Mur 6 (mesure 2)			0,02	0,01	
1036	D	Mur 7 (mesure 1)	Faïence		n.m		
1037		Mur 7 (mesure 2)			n.m		

1038	F	Mur 8 (mesure 1)	Faïence		n.m		
1039		Mur 8 (mesure 2)			n.m		
1040		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
1041		Plafond (mesure 2)			0,01	0,01	
1042		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,06	0,01	
1043		Plinthes (mesure 2)			0,04	0,01	
1044	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	0,01	
1045		Porte (partie haute)			0,02	0,01	
1046	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	0,01	
1047		Huisserie Porte (partie haute)			0	0,01	
1048	E	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1049		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
1050	E	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1051		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
1052	E	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1053		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
1054	E	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1055		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
1056	E	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,06	0,01	
1057		Radiateur (mesure 2)			0,03	0,01	
1058	E	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,04	0,01	
1059		Canalisation (mesure 2)			0,08	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 18							

2ème étage - B17 Séjour

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
1060	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
1061		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
1062	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
1063		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
1064	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
1065		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
1066	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
1067		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
1068	E	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
1069		Mur (partie haute)			0	0,01	
1070	F	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
1071		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
1072		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
1073		Plafond (mesure 2)			0,01	0,01	
1074		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,07	0,01	
1075		Plinthes (mesure 2)			0,08	0,01	
1076	C	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1077		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
1078	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1079		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
1080	C	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1081		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
1082	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1083		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
1084	E	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1085		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			n.m		
1086	E	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		

1087		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			n.m		
1088	E	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1089		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			n.m		
1090	E	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1091		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			n.m		
1092	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	0,01	
1093		Porte (partie haute)			0,02	0,01	
1094	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
1095		Huisserie Porte (partie haute)			0,05	0,01	
1096	E	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,07	0,01	
1097		Radiateur (mesure 2)			0,05	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 19							

2ème étage - B17 CH1

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
1098	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
1099		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
1100	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
1101		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
1102	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0	0,01	
1103		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
1104	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
1105		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
1106		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
1107		Plafond (mesure 2)			0,07	0,01	
1108		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,08	0,01	
1109		Plinthes (mesure 2)			0,02	0,01	
1110	C	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1111		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
1112	C	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1113		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
1114	C	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1115		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
1116	C	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1117		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
1118	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0	0,01	
1119		Porte (partie haute)			0	0,01	
1120	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	0,01	
1121		Huisserie Porte (partie haute)			0,09	0,01	
1122	D	Huisserie (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
1123		Huisserie (mesure 2)			0	0,01	
1124	C	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,08	0,01	
1125		Canalisation (mesure 2)			0,09	0,01	
1126	D	Porte fer (partie basse)	Métal	Peinture	0,06	0,01	
1127		Porte fer (partie haute)			0,04	0,01	
1128	D	Huisserie Porte fer (partie basse)	Métal	Peinture	0,07	0,01	
1129		Huisserie Porte fer (partie haute)			0,08	0,01	
1130	C	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,04	0,01	
1131		Radiateur (mesure 2)			0	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 17							

2ème étage - B17 CH2

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
1132	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
1133		Mur (partie haute)			0,03	0,01	

1134	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0	0,01	
1135		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
1136	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
1137		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
1138	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
1139		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
1140		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
1141		Plafond (mesure 2)			0,08	0,01	
1142		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,07	0,01	
1143		Plinthes (mesure 2)			0,08	0,01	
1144	C	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1145		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
1146	C	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1147		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
1148	C	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1149		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
1150	C	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1151		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
1152	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	0,01	
1153		Porte (partie haute)			0,08	0,01	
1154	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	0,01	
1155		Huisserie Porte (partie haute)			0,09	0,01	
1156	B	Huisserie (mesure 1)	Bois	Peinture	0	0,01	
1157		Huisserie (mesure 2)			0,05	0,01	
1158	C	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,02	0,01	
1159		Canalisation (mesure 2)			0,06	0,01	
1160	C	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01	0,01	
1161		Radiateur (mesure 2)			0,06	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 15							

2ème étage - B17 CH3

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
1162	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
1163		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
1164	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
1165		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
1166	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
1167		Mur (partie haute)			0,04	0,01	
1168	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
1169		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
1170		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0	0,01	
1171		Plafond (mesure 2)			0,07	0,01	
1172		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,08	0,01	
1173		Plinthes (mesure 2)			0,03	0,01	
1174	C	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1175		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
1176	C	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1177		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
1178	C	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1179		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
1180	C	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1181		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
1182	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	0,01	
1183		Porte (partie haute)			0,02	0,01	
1184	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	0,01	
1185		Huisserie Porte (partie haute)			0,04	0,01	

1186	D	Huisserie (mesure 1)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
1187		Huisserie (mesure 2)			0	0,01	
1188	C	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,03	0,01	
1189		Canalisation (mesure 2)			0,01	0,01	
1190		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,03	0,01	
1191		Radiateur (mesure 2)			0,06	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 15							

2ème étage - B17 CH4

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
1192	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,1	0,01	
1193		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
1194	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
1195		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
1196	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
1197		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
1198	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
1199		Mur (partie haute)			0,04	0,01	
1200		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
1201		Plafond (mesure 2)			0,08	0,01	
1202		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,03	0,01	
1203		Plinthes (mesure 2)			0,05	0,01	
1204	C	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1205		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
1206	C	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1207		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
1208	C	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1209		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
1210	C	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1211		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
1212	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
1213		Porte (partie haute)			0,04	0,01	
1214	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	0,01	
1215		Huisserie Porte (partie haute)			0,02	0,01	
1216	C	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,04	0,01	
1217		Canalisation (mesure 2)			0,08	0,01	
1218	C	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,05	0,01	
1219		Radiateur (mesure 2)			0,07	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 14							

2ème étage - B17 Débarras

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
1220	A	Mur (partie basse)	Tapisserie		0,06	0,01	
1221		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
1222	B	Mur (partie basse)	Tapisserie		0,09	0,01	
1223		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
1224	C	Mur (partie basse)	Tapisserie		0,04	0,01	
1225		Mur (partie haute)			0	0,01	
1226	D	Mur (partie basse)	Tapisserie		0,08	0,01	
1227		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
1228		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
1229		Plafond (mesure 2)			0,08	0,01	
1230		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,07	0,01	
1231		Plinthes (mesure 2)			0,04	0,01	
1232	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
1233		Porte (partie haute)			0,06	0,01	
1234	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	0,01	
1235		Huisserie Porte (partie haute)			0	0,01	
1236	C	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,09	0,01	
1237		Canalisation (mesure 2)			0,09	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 9							

2ème étage - B17 Débarras 2

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
1238	A	Mur (partie basse)	Tapisserie		0,07	0,01	
1239		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
1240	B	Mur (partie basse)	Tapisserie		0,05	0,01	
1241		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
1242	C	Mur (partie basse)	Tapisserie		0,04	0,01	
1243		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
1244	D	Mur (partie basse)	Tapisserie		0,06	0,01	
1245		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
1246		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
1247		Plafond (mesure 2)			0,03	0,01	
1248		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,02	0,01	
1249		Plinthes (mesure 2)			0	0,01	
1250	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	0,01	
1251		Porte (partie haute)			0,08	0,01	
1252	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
1253		Huisserie Porte (partie haute)			0,08	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 8							

Rez de chaussée - Hall entrée B

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
1254	A	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0	0,01	
1255		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
1256	B	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0	0,01	
1257		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
1258	C	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,07	0,01	
1259		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
1260	D	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0	0,01	
1261		Mur (partie haute)			0	0,01	
1262		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
1263		Plafond (mesure 2)			0,06	0,01	
1264		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		n.m		
1265		Plinthes (mesure 2)			n.m		
1266	A	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1267		Porte d'entrée intérieure (partie haute)			n.m		
1268	A	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1269		Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)			n.m		
1270	A	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1271		Porte d'entrée extérieure (partie haute)			n.m		
1272	A	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1273		Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)			n.m		
1274	C	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0	0,01	
1275		Porte (partie haute)			0	0,01	
1276	C	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
1277		Huisserie Porte (partie haute)			0,01	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 12							

Rez de chaussée - Local Cycle B

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
1278	A	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,02	0,01	
1279		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
1280	B	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,02	0,01	
1281		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
1282	C	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,06	0,01	
1283		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
1284	D	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,07	0,01	
1285		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
1286		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
1287		Plafond (mesure 2)			0,09	0,01	
1288	B	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1289		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		

1290	B	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1291		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
1292	B	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1293		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
1294	B	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1295		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
1296	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
1297		Porte (partie haute)			0,06	0,01	
1298	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	0,01	
1299		Huisserie Porte (partie haute)			0,03	0,01	
1300	C	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0	0,01	
1301		Canalisation (mesure 2)			0,07	0,01	
1302	D	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0	0,01	
1303		Canalisation (mesure 2)			0,01	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 13							

Rez de chaussée - Local B

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
1304	A	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,04	0,01	
1305		Mur (partie haute)			0	0,01	
1306	B	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,09	0,01	
1307		Mur (partie haute)			0,09	0,01	
1308	C	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,06	0,01	
1309		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
1310	D	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,08	0,01	
1311		Mur (partie haute)			0,04	0,01	
1312	E	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0	0,01	
1313		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
1314	F	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,06	0,01	
1315		Mur (partie haute)			0,04	0,01	
1316		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
1317		Plafond (mesure 2)			0,04	0,01	
1318	D	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1319		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
1320	D	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1321		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
1322	D	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1323		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
1324	D	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
1325		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
1326	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0	0,01	
1327		Porte (partie haute)			0,03	0,01	
1328	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
1329		Huisserie Porte (partie haute)			0,08	0,01	
1330		Support linge (mesure 1)	métal	peinture	0,06	0,01	
1331		Support linge (mesure 2)			0,03	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 14							

2ème étage - Cage d'escalier C

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
1332	A	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,09	0,01	
1333		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
1334	B	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,01	0,01	

1335		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
1336	C	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,04	0,01	
1337		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
1338	D	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0	0,01	
1339		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
1340		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
1341		Plafond (mesure 2)			0,09	0,01	
1342		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		n.m		
1343		Plinthes (mesure 2)			n.m		
1344		Garde corps (mesure 1)	Métal	Peinture	0,05	0,01	
1345		Garde corps (mesure 2)			0,03	0,01	
1346	D	Porte placard gaz (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	0,01	
1347		Porte placard gaz (partie haute)			0,09	0,01	
1348	D	Huisserie Porte placard gaz (partie basse)	Bois	Peinture	0,08	0,01	
1349		Huisserie Porte placard gaz (partie haute)			0,06	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 9							

3ème étage - Cage d'escalier C

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
1350	A	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,09	0,01	
1351		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
1352	B	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,03	0,01	
1353		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
1354	C	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,08	0,01	
1355		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
1356	D	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,07	0,01	
1357		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
1358		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
1359		Plafond (mesure 2)			0,01	0,01	
1360		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		n.m		
1361		Plinthes (mesure 2)			n.m		
1362		Garde corps (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01	0,01	
1363		Garde corps (mesure 2)			0,02	0,01	
1364	D	Porte placard gaz (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
1365		Porte placard gaz (partie haute)			0	0,01	
1366	D	Huisserie Porte placard gaz (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
1367		Huisserie Porte placard gaz (partie haute)			0,04	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 9							

Sous-Sol - Chaufferie

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
1368		Bloc chaufferie (mesure 1)	Métal	Peinture rouge	0,02	0,01	
1369		Bloc chaufferie (mesure 2)			0,01	0,01	
1370		Socle (mesure 1)	Béton	Peinture	0,06	0,01	
1371		Socle (mesure 2)			0,06	0,01	
1372		Vanne (mesure 1)	Métal	Peinture	0	0,01	
1373		Vanne (mesure 2)			0	0,01	
1374		Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture grise	0,02	0,01	
1375		Canalisation (mesure 2)			0,01	0,01	
1376		Ballon (mesure 1)	Métal	Peinture rouge	0,03	0,01	
1377		Ballon (mesure 2)			0,01	0,01	
1378		Canalisation ballon (mesure 1)	Métal	Peinture grise	0	0,01	
1379		Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture blanche	0,01	0,01	
1380		Canalisation (mesure 2)			0,01	0,01	
1381		Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture gris foncée	0,13	0,06	
1382		Canalisation (mesure 2)			0,21	0,09	
1383		Vanne (mesure 1)	Métal	Peinture bleue	11,28	1,32	
1384		Vanne (mesure 2)			12,46	1,39	
1385		Vanne (mesure 1)	Métal	Peinture or	9,66	1,22	
1386		Vanne (mesure 2)			8,05	1,12	

1387		Electro vanne (mesure 1)	Métal	Peinture verte	1,70	0,17	
1388		Electro vanne (mesure 1)	Métal	Peinture or	9	1,18	
1389		Canalisation chaufferie (mesure 1)	Métal	Peinture gris clair	0	0,01	
1390		Canalisation chaufferie (mesure 2)			0,01	0,01	
1391	A	Porte (partie basse)	Métal	Peinture	0,01	0,01	
1392		Porte (partie haute)			0,01	0,01	
1393	A	Huisserie Porte (partie basse)	Métal	Peinture	0,01	0,01	
1394		Huisserie Porte (partie haute)			0,1	0,01	
1395		Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture jaune	3	0,26	
-		Sol (mesure 1)	Béton		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
1396	A	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,08	0,01	
1397		Mur (partie haute)			0	0,01	
1398	B	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,05	0,01	
1399		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
1400	C	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,02	0,01	
1401		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
1402	D	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,07	0,01	
1403		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
1404		Plafond (mesure 1)	Enduit	Peinture	0,08	0,01	
1405		Plafond (mesure 2)			0,06	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 22							

Extérieur - Façades

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
1406	A	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,08	0,01	
1407		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
1408	B	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,09	0,01	
1409		Mur (partie haute)			0,09	0,01	
1410	C	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,03	0,01	
1411		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
1412	D	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,09	0,01	
1413		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
1414		Balcons (mesure 1)	Métal	Peinture	0	0,01	
1415		Balcons (mesure 2)			0,01	0,01	
1416		Garde corps (mesure 1)	Métal	Peinture	11,14	1,23	
1417		Garde corps (mesure 2)			12,36	1,53	
1418		Support extincteur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,27	0,03	
1419		Support extincteur (mesure 2)			0,87	0,08	
1420		Grille ext. chaufferie (mesure 1)	Métal	Peinture	5,41	0,72	
1421		Grille ext. chaufferie (mesure 2)			4,02	0,52	
1422		Canalisation ext. chaufferie (mesure 1)	Métal	Peinture jaune	0,18	0,02	
1423		Canalisation ext. chaufferie (mesure 2)			0,87	0,09	
Nombre d'unités de diagnostic : 9							

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la règlementation
* : à défaut d'avoir l'incertitude par mesure, la tolérance est fournie par les données constructrices de la machine utilisée.

Analyses chimiques du laboratoire
Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Constatations diverses :
Néant

Validité du constat :

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :
Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
Sans accompagnateur


Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ***I.Cert - Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE***

Fait à **TOULOUSE**, le **10/04/2026**


Par : FONTA Kevin




6. Localisation des mesures sur croquis de repérage

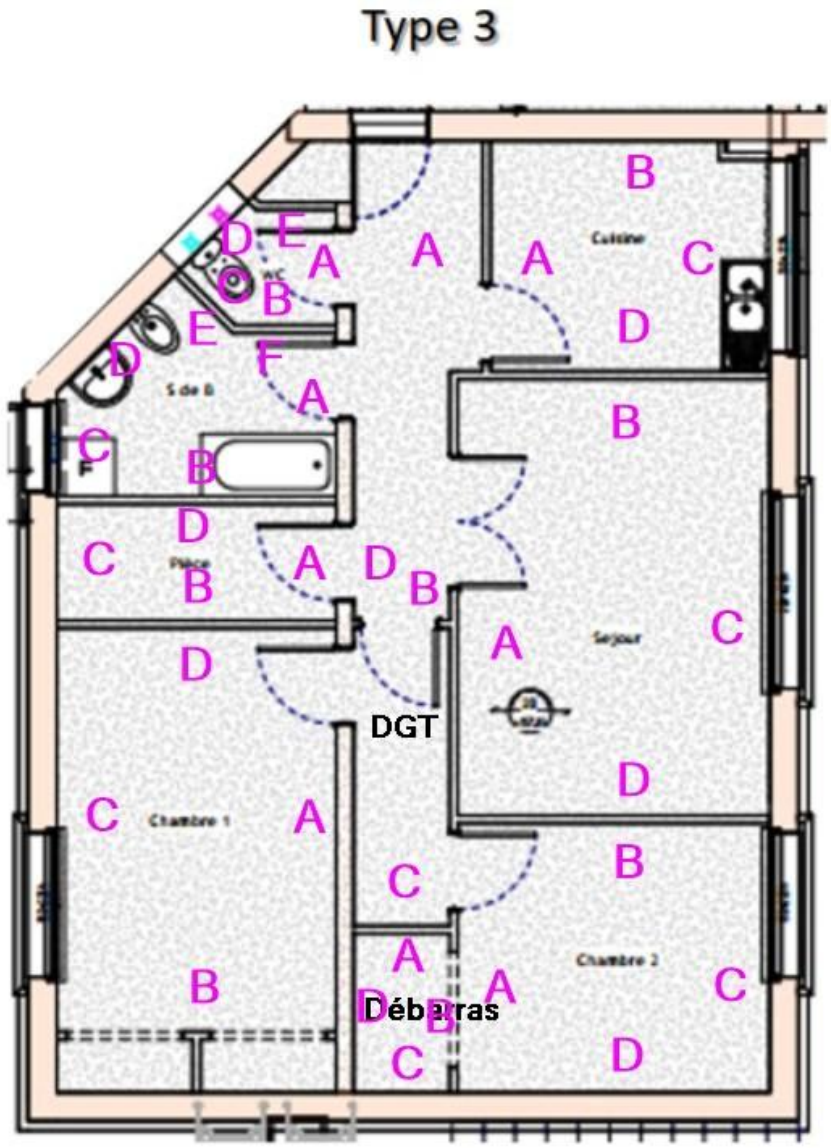


Type 4

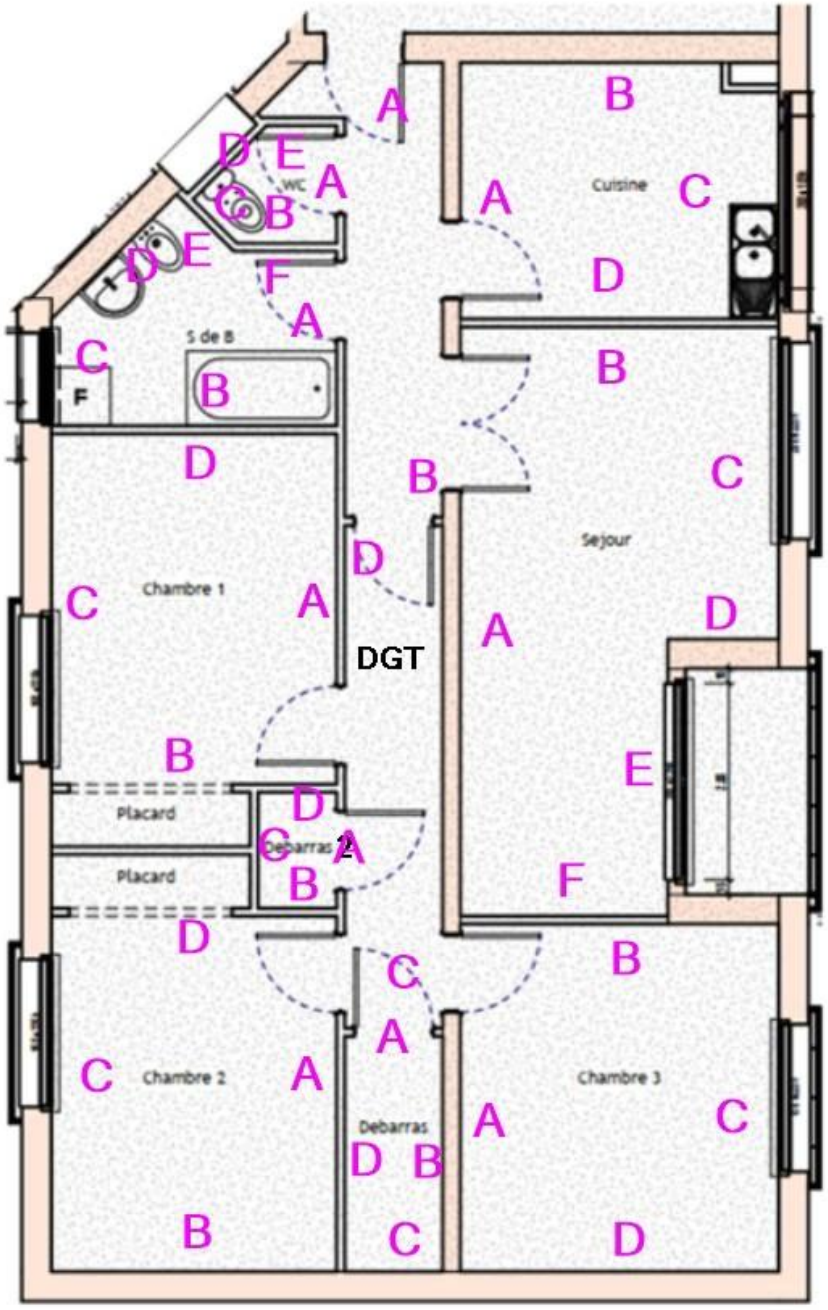
WC
S de B
F
Chambre 1
DGT
Placard
Placard
Debarras
Cuisine
Sejour
Chambre 2
Debarras
Chambre 3

Type 5

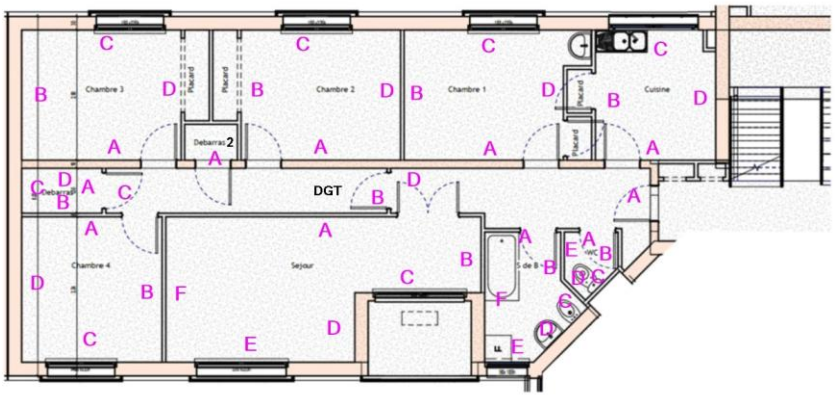


Bâtiments A – B – C : Rdc

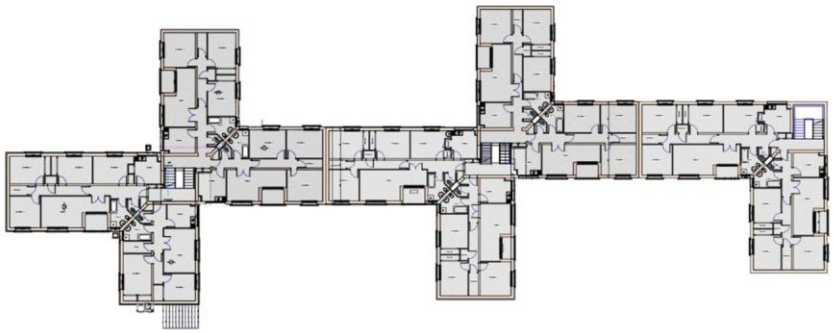


Bâtiments A – B – C : R+1





Bâtiments A – B – C : R+2

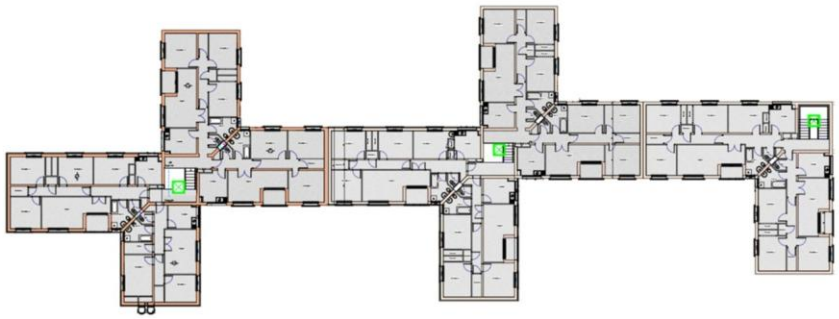

Bâtiments A – B – C : Couverture

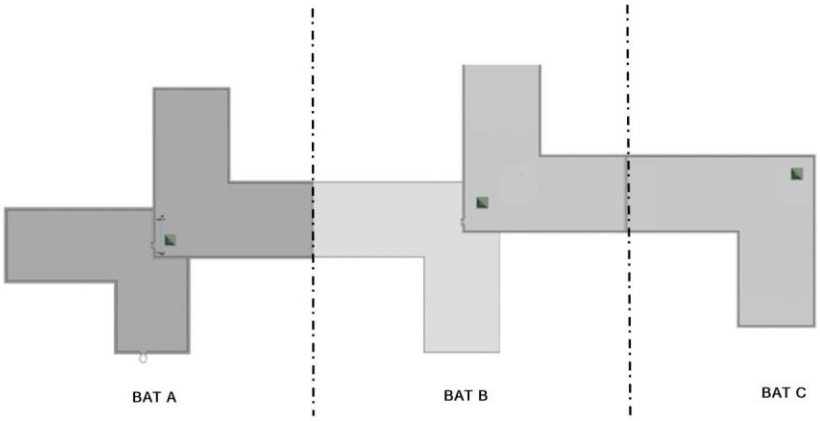

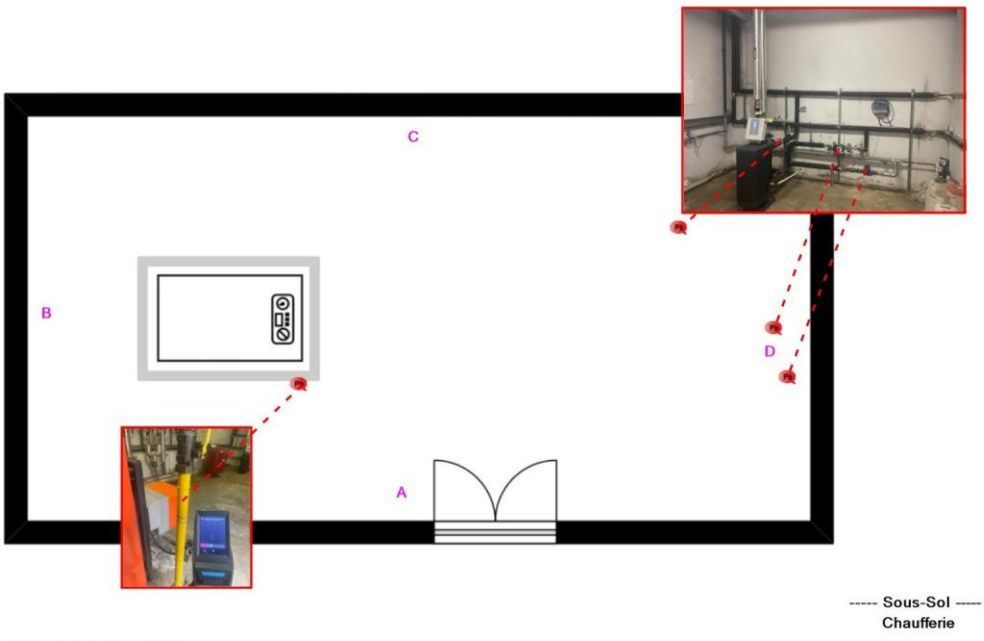

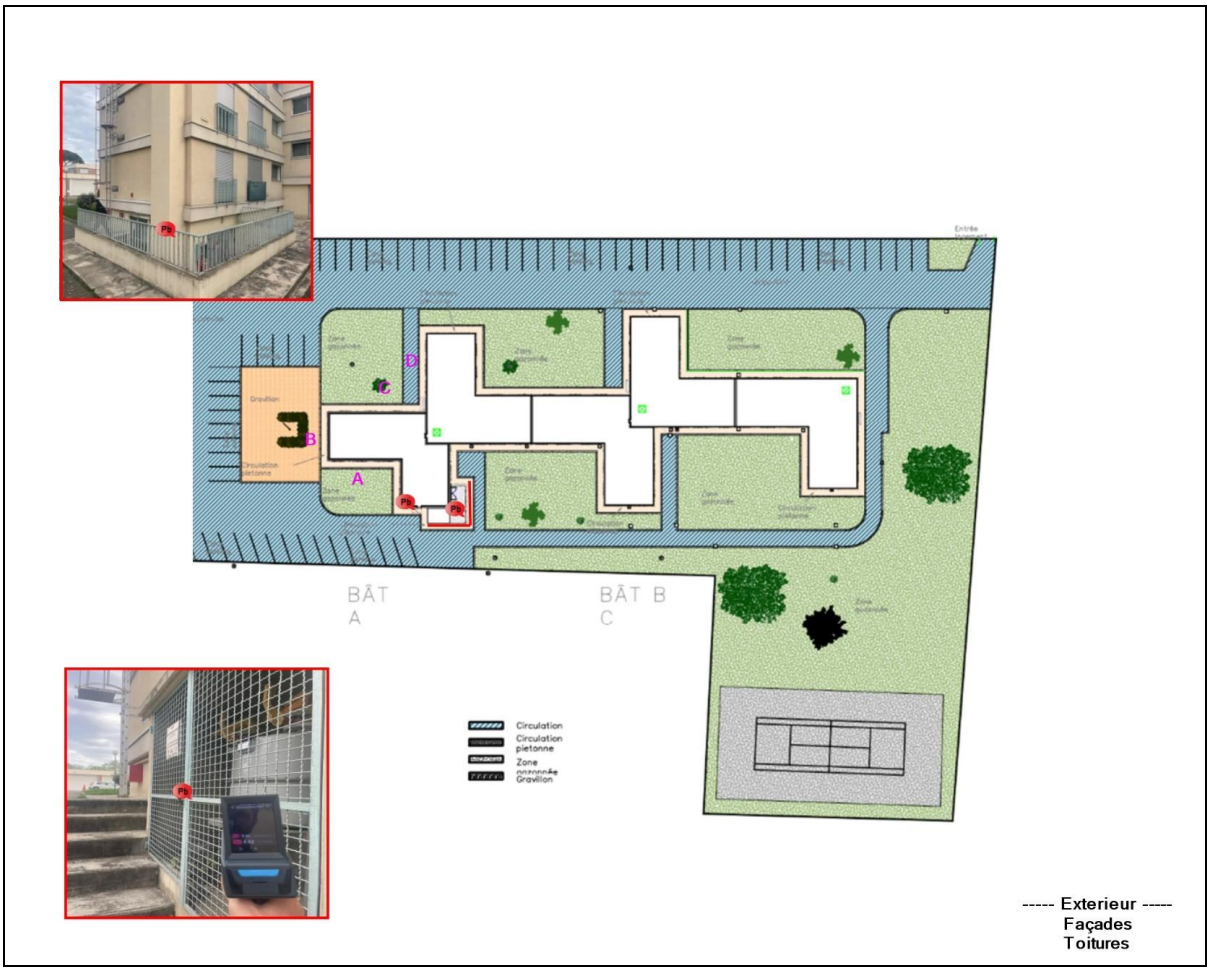

Légende

Pb : >1mg/cm²

Pb : <1mg/cm²

Illustrations

	Photo n° PhPb001 Localisation : Sous-Sol - Chaufferie UD : Bloc chaufferie (mesure 1) Métal - Revêtement : Peinture rouge - Mesure : 0,02
	Photo n° Ph Localisation : Sous-Sol - Chaufferie UD : Socle (mesure 1) Substrat : Béton - Revêtement : Peinture - Mesure : 0,06
	Photo n° PhPb003 Localisation : Sous-Sol - Chaufferie UD : Vanne (mesure 1) Substrat : Métal - Revêtement : Peinture - Mesure : 0
	Photo n° PhPb004 Localisation : Sous-Sol - Chaufferie UD : Canalisation (mesure 1) Substrat : Métal - Revêtement : Peinture grise - Mesure : 0,02

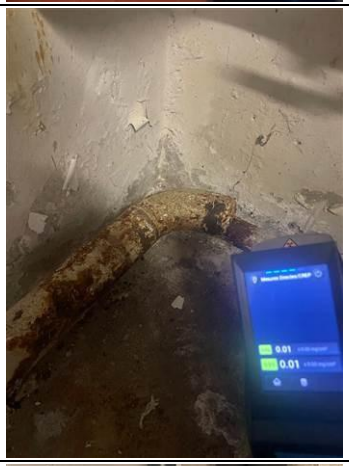
	Photo n° PhPb005 Localisation : Sous-Sol - Chaufferie UD : Ballon (mesure 1) Substrat : Métal - Revêtement : Peinture rouge - Mesure : 0,03
	Photo n° PhPb006 Localisation : Sous-Sol - Chaufferie UD : Canalisation ballon (mesure 1) Substrat : Métal - Revêtement : Peinture grise - Mesure : 0
	Photo n° PhPb004 Localisation : Sous-Sol - Chaufferie UD : Canalisation (mesure 1) Substrat : Métal - Revêtement : Peinture grise - Mesure : 0,02
	Photo n° PhPb004 Localisation : Sous-Sol - Chaufferie UD : Canalisation (mesure 1) Substrat : Métal - Revêtement : Peinture grise - Mesure : 0,02

	Photo n° PhPb003 Localisation : Sous-Sol - Chaufferie UD : Vanne (mesure 1) Substrat : Métal - Revêtement : Peinture - Mesure : 0
	Photo n° PhPb003 Localisation : Sous-Sol - Chaufferie UD : Vanne (mesure 1) Substrat : Métal - Revêtement : Peinture - Mesure : 0
	Photo n° PhPb007 Localisation : Sous-Sol - Chaufferie UD : Electro vanne (mesure 1) Substrat : Métal - Revêtement : Peinture verte - Mesure : 1,70
	Photo n° PhPb007 Localisation : Sous-Sol - Chaufferie UD : Electro vanne (mesure 1) Substrat : Métal - Revêtement : Peinture verte - Mesure : 1,70

	Photo n° PhPb008 Localisation : Sous-Sol - Chaufferie UD : Canalisation chaufferie (mesure 1) Substrat : Métal - Revêtement : Peinture gris clair - Mesure : 0
	Photo n° PhPb004 Localisation : Sous-Sol - Chaufferie UD : Canalisation (mesure 1) Substrat : Métal - Revêtement : Peinture grise - Mesure : 0,02
	Photo n° PhPb009 Localisation : Extérieur - Façades UD : Balcons (mesure 1) Substrat : Métal - Revêtement : Peinture - Mesure : 0
	Photo n° PhPb010 Localisation : Extérieur - Façades UD : Garde-corps (mesure 1) Substrat : Métal - Revêtement : Peinture - Mesure : 11,14

	Photo n° Ph Localisation : Extérieur - Façades UD : Support extincteur (mesure 1) Substrat : Métal - Revêtement : Peinture - Mesure : 0,27
	Photo n° Ph Localisation : Extérieur - Façades UD : Grille ext. chaufferie (mesure 1) Substrat : Métal - Revêtement : Peinture - Mesure : 5,41
	Photo n° Ph Localisation : Extérieur - Façades UD : Canalisation ext. chaufferie (mesure 1) Substrat : Métal - Revêtement : Peinture jaune - Mesure : 0,18

7. Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)

Notice d'information à remettre systématiquement aux donneurs d'ordre en annexe du diagnostic

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine –t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,

- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
    - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
    - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
    - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
    - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :
  Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

8. Autres documents et rapports antérieurs

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6128 Version 004

Je soussigné, Olivier Perez, Président d'I.Cert, atteste que :

Monsieur FONTA Kevin

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 29/09/2021 - Date d'expiration : 28/09/2028
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 29/09/2021 - Date d'expiration : 28/09/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 29/09/2021 - Date d'expiration : 28/09/2028
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (2) Date d'effet : 03/04/2025 - Date d'expiration : 02/04/2032

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 03/04/2025.

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

cofrac ACCREDITATION N° 4-0527 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CERTIFICATION DE PERSONNES

CPE DI FR 11 rev20

NOUS CONTACTER
Votre Agent Général
EI COURCELLE-LABROUSSE NICOLAS

2 RUE DES MONTS D OR
69450 ST CYR AU MONT D OR

04 72 85 32 32
agence.courcellelabrousse@axa.fr

N° ORIAS 10 058 094 (NICOLAS COURCELLE-LABROUSSE)
www.orias.fr/

Assurance et Banque

SAS CD ENVIRONNEMENT
SEMANET IV
1B ALLEE DE LA COMBE
69380 LISSIEU

LE **MERCREDI 17 DÉCEMBRE 2025**

VOS RÉFÉRENCES

Votre référence client
2900007204
Votre contrat
0000007444835104
Date d'effet
18/05/2017

IMPORTANT
Document à conserver
Cette attestation fait partie intégrante de votre contrat.

Votre attestation d'assurances

Responsabilité Civile Prestataire

AXA France, dont le siège social est situé **Terrasses de l'Arche 92000 Nanterre** atteste que :
SAS CD ENVIRONNEMENT
SEMANET IV
1B ALLEE DE LA COMBE
69380 LISSIEU

Est titulaire du contrat d'assurance n° **0000007444835104** ayant pris effet le **18/05/2017.**
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

Activités 1 :
- Contrôle périodique amiante
- Diagnostic amiante avant travaux ou démolition
- Diagnostic amiante avant-vente
- Dossier technique amiante
- Contrôle visuel après désamiantage
- Diagnostic gaz
- Diagnostic termites
- Etat parasitaire
- Exposition au plomb (CREP)
- Loi Carrez
- Recherche de plomb avant travaux
- Risques naturels et technologiques
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de l'électricité
- Mesurage Loi Boutin
- Assistance administrative et réglementaire consistant à communiquer et à veiller à la mise en application des textes de la loi et des obligations légales qui en découle pour ses clients
- Mesure d'empoussièrement en fibres amiantes dans les immeubles bâtis
- Mesurage des niveaux d'empoussièrement de fibres amiante au poste de travail
- Mesure d'empoussièrement de fibres amiante en environnement extérieur
- Diagnostic Technique Global (art L 731-1 du code de la construction)

AXA France IARD - S.A. au capital de 214 799 030 € - RCS Nanterre 722 057 460 - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460 - **AXA Assurances IARD Mutuelle** - Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309 - TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 - Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex. **Entreprises régies par le Code des assurances.**

A L'EXCLUSION DE TOUTES PRESTATION DE CONSEIL, PRECONICATION ET TOUTE MISSION DE BUREAU D'ETUDE
A L'EXCLUSION DE TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE L'EXERCICE DE PROFESSION REGLEMENTEE AUTRE TELLE QUE CONSEIL JURIDIQUE ET LA GESTION IMMOBILIERE
A L'EXCLUSION DES ACTIVITES LIEES AU BÂTIMENT ET SOUMISES A L'APPLICATION DES ARTICLES 1792 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL.

Activités 2 :
Conseils, préconisations en solutions de retrait, recouvrement d'amiante.

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.
La présente attestation est valable du **01/01/2026** au **01/01/2027** et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nanterre, le 17/12/2025
Mathieu Godart
Directeur IARD AXA France



2 / 3

Nature des garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties"ci-après)	**9 000 000 €** par année d'assurance
Dont :	
Dommages corporels	**9 000 000 €** par année d'assurance
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	**1 200 000 €** par année d'assurance

Autres garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	**500 000 €** par année d'assurance dont **500 000 €** par sinistre
Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales)	**300 000 €** par année d'assurance dont **300 000 €** par sinistre
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	**200 000 €** par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	**30 000 €** par sinistre

C.G. : Conditions Générales du contrat

3 / 3

GeA33 Fin du rapport n° 2026/04/14/0229
