2671PA0130 - Accord cadre de travaux pour la mise en place de stations de dépotage — PLANNING TYPE DES TRAVAUX

2671F0120 - Accord-cadre de fourniture de stations de dépotage

ANNEXE AU DCE — RACCORDEMENT DIRECT À L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Édition du : *15/09/2026* *Échelle relative : J1 = premier jour de travaux sur site après préparation.*


Une station par bon de commande. Durées indicatives en jours ouvrés, à adapter au site.

Accord cadre VRD (Accord cadre de travaux: 2671PA0130)

Accord cadre Station de dépotage (Accord-cadre de fourniture de stations de dépotage : 2671F0120)

Préparation	VRD	Équipement
Finitions	Contrôle	Jalon

N°	Catégorie	Tâche	Intervenant / lot	Début	Durée (j ouvrés)	Fin	Positionnement	Hypothèses / points de coordination
P1	Préparation	Bon de commande et réunion de préparation	VNF / MOE / VRD	—	—	—	Avant J1	Caler les accès, les emprises et le maintien de l'exploitation du port.
P2	Préparation	Études d'exécution et validation des interfaces	VRD / Fourniture	—	—	—	Avant J1	Implantation, niveaux, réservations et ancrages. Approvisionner réseaux, cuves et équipements.
P3	Préparation	DICT, autorisations et coordination exploitants	VRD / exploitants	—	—	—	Avant J1	Disposer des réponses et autorisations nécessaires avant travaux. Programmer les contrôles.
P4	Préparation	Validation du raccordement au réseau collectif	MOE / gestionnaire	—	—	—	Avant J1	Accord du gestionnaire sur les effluents, le point de raccordement et les modalités d'intervention.
TRAVAUX SUR SITE — enchaînement indicatif sans chevauchement								
1	VRD	Installation de chantier, marquage-piquetage et sécurisation	VRD	J1	1	J1	Installation	Constat initial, implantation et protection des accès. DICT traitée en préparation.
2	VRD	Tranchées, pose des réseaux et remblaiement compacté	VRD	J2	5	J6	Réseaux	Durée selon linéaires réels. Inclut pose et remblaiement. Contrôles et relevés avant fermeture.
3	VRD	Raccordement au réseau d'assainissement existant	VRD / exploitant	J7	2	J8	Collectif	Intervention coordonnée avec l'exploitant. Hypothèse retenue : 2 j, adaptable à 1 j selon le site.
4	VRD	Massifs, attentes et interface des bornes de dépotage	VRD	J9	2	J10	Interface bornes	Fourniture et pose des bornes hors lot VRD. Réservations et ancrages validés avec le fournisseur.
5	Contrôle	Essais et vérifications des ouvrages VRD	VRD / MOE	J11	1	J11	Essais VRD	Provision de 1 j. Essais selon CCTP ; contrôles avant remblaiement intégrés aux tâches concernées.
6	Équipement	Pose et raccordement de la stations de dépotage	Fourniture	J12	2	J13	Installation	Après réceptions inter-entreprises des travaux préparatoire à la pose et au raccordement de station de dépotage
7	Finitions	Reprise des revêtements, délimitations et espaces verts	VRD	J14	2	J15	Finitions	Après contrôles et accord sur le remblaiement. Coordonner les finitions avec les interventions hors lot.
8	Finitions	Remise en état finale, nettoyage et repli du chantier	VRD	J16	1	J16	Repli	Évacuation finale des déchets, retrait des installations et restitution des emprises.
TOTAL INDICATIF DES TRAVAUX VRD								**Hors préparation, attentes et interventions hors lot conditionnant la mise en service.**
JALONS ET INTERFACES — à caler dans le planning d'exécution de chaque bon de commande								
J1	Jalon	Contrôles avant remblaiement	MOE / exploitant	—	—	—	Pendant réseaux	Vérifier les réseaux et le raccordement avant fermeture. Programmer les essais selon CCTP.
J2	Jalon	Durcissement des massifs puis pose des bornes	VRD / Fourniture	—	—	—	Après massifs	Délai selon béton et ancrages, à confirmer. Fourniture et pose des bornes hors lot VRD.
J3	Jalon	Raccordements finaux et mise en service complète	Fourniture / MOE	—	—	—	Après pose bornes	Disponibilité des alimentations, raccordements finaux et essais communs avec les bornes.
J4	Jalon	Récolement, DOE et opérations préalables à la réception	VRD / Fourniture / MOE / VNF	—	—	—	Fin des prestations	Relevés au fil des travaux, DOE à remettre selon marché. OPR, réception et réserves à programmer.

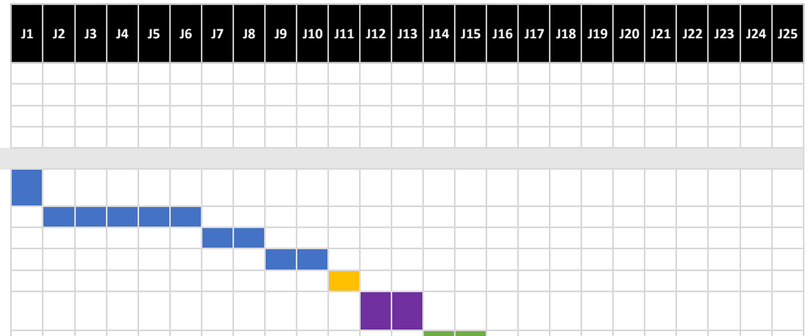

HYPOTHÈSES DE LECTURE ET D'ADAPTATION

Jours ouvrés de travaux effectifs. Les week-ends, jours fériés, intempéries, attentes et approvisionnements ne sont pas représentés dans les barres.

Le planning d'exécution sera adapté aux quantités, à la géotechnique, à la nappe, aux accès et à l'exploitation du site. Les contrôles peuvent interrompre les travaux.

Les durées jaunes sont modifiables ; début, fin et barres se recalculent. La préparation et les jalons sans durée chiffrée restent à programmer séparément.

Ce planning type décrit une station et ne fixe pas le délai global de déploiement de plusieurs sites ni le délai complet jusqu'à la mise en service.
