Rapport de repérage du plomb avant démolition

Version : V01

Numéro de dossier : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML
Norme employée : AFNOR NF X46-035
Date du repérage : 16/03/2026
Heure d'arrivée : 10 h 00
Date émission : 26/03/2026

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage des matériaux et produits contenant du plomb avant démolition conformément l'art. R4412-5 du Code du Travail.
Tous les éléments du bâti susceptibles de contenir du plomb doivent faire l'objet d'une mesure. Il est de la responsabilité du donneur d'ordre d'évaluer le risque lié au plomb éventuellement contenu dans les matériaux, en fonction du matériau et du type d'intervention prévue.
Le présent rapport n'est pas un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) et ne peut être utilisé dans le cadre de la vente ou la location d'un bien immobilier.
Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux éléments de la construction uniquement accessible lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **MAISON**
21 RUE DES ECOLES
29510 EDERN

Référence cadastrale : **29048-F0913**

Propriétaire

Nom : **EPF Bretagne**
Adresse : **14, Avenue Henri Fréville - CS90721-35207 RENNES**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre : **Propriétaire**
(*Sur déclaration de l'intéressé*)
Nom : **EPF Bretagne**
Adresse : **14, Avenue Henri Fréville - CS90721-35207 RENNES**

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, allée Pierre-Gilles de Gennes**
33700 MERIGNAC

Numéro SIRET : **840 795 348 00027**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité :
7627751904 / 01/07/2026

Opérateur(s) et signataire(s)

NOM Prénom	Organisme certification	Détail de la certification	Signature
COLLET Yann	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 25/09/2023 Échéance : 24/09/2030 N° de certification : 18-1262	

Liste de rapports antérieurs

Date	Objet
Néant	Néant

Sommaire

A. Références règlementaires..... 3
B. Renseignements complémentaires concernant la mission..... 3
B.1. Commanditaire de la mission..... 3
B.2. L'appareil à fluorescence X..... 3
B.3. Etalonnage de l'appareil à fluorescence X..... 3
B.4. Le bien objet de la mission..... 3
B.5. Liste des locaux visités :..... 4
B.6. Liste des locaux non visités (avec justification) :..... 4
C. Résultats des mesures..... 5
D. Commentaires et signature..... 16
E. Méthodologie d'intervention..... 17
F. Notice d'information à remettre au donneur d'ordre..... 18
G. Planches de repérage..... 20

A. Références règlementaires

- Principes généraux de prévention de l'article L4121-2 du code du travail
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
  Articles R4412-59 et suivants du code du travail

B. Renseignements complémentaires concernant la mission

B.1. Commanditaire de la mission

Nom et prénom: **EPF Bretagne (Propriétaire** - *Sur déclaration de l'intéressé)*
Adresse : **14, Avenue Henri Fréville - CS90721-**
35207 RENNES

B.2. L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil :	**Fondis Electronic**
Modèle de l'appareil :	**FENX2**
N° de série de l'appareil :	**24-1147**
Nature du radionucléide :	**109Cd**
Date du dernier chargement de la source :	**19/09/2024** (Activité à cette date : **909 MBq**)
Déclaration ASNR - N° :	**T350554**
Déclaration ASNR - Date :	**18/06/2025**
Précision de l'appareil :	**0,1 mg/cm²**

B.3. Etalonnage de l'appareil à fluorescence X

Etalon {Fab. : SRM; NIST : 2573; Concentration : 1,04 mg/cm²; Précision : 0,064 mg/cm²}

Vérification de la justesse de l'appareil	Date de la vérification	Concentration (mg/cm²)
Etalonnage entrée	16/03/2026	1,11
Etalonnage sortie	16/03/2026	1,01

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.
En début et en fin de chaque repérage une vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

B.4. Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier	**MAISON** **21 RUE DES ECOLES** **29510 EDERN**
Description de l'ensemble immobilier	**Habitation (maison individuelle)**
Année de construction	**1964**
Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes)	**EPF Bretagne** **14, Avenue Henri Fréville - CS90721-** **35207 RENNES**

B.5. Liste des locaux visités :

- RDC - Entrée
- RDC - Séjour
- RDC - Chambre 1
- RDC - Chambre 3
- RDC - WC
- RDC - Véranda
- Sous-sol - Pièce 2
- Sous-sol - Escalier
- Étage - Chambre 1
- Étage - SdE
- Étage - Combles 1
- Étage - Combles 3
- RDC - Cuisine
- RDC - Salon
- RDC - Chambre 2
- RDC - SdE
- RDC - Escalier
- Sous-sol - Pièce 1
- Sous-sol - Pièce 3
- Étage - Dégagement
- Étage - Chambre 2
- Étage - Placard
- Étage - Combles 2
- Étage 2 - Combles

B.6. Liste des locaux non visités (avec justification) :

Néant

C. Résultats des mesures

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	RDC - Entrée		1	Sol	Carrelage	Dalles plastiques	NM		Partie non visée par la règlementation
2	RDC - Entrée	A	2	Mur	Béton	Peinture	0,07	0,1	
3	RDC - Entrée	A	2	Mur	Béton	Peinture	0,05	0,1	
4	RDC - Entrée	B	3	Mur	Béton	Peinture	0,02	0,1	
5	RDC - Entrée	B	3	Mur	Béton	Peinture	0,03	0,1	
6	RDC - Entrée	C	4	Mur	Béton	Peinture	0,03	0,1	
7	RDC - Entrée	C	4	Mur	Béton	Peinture	0,03	0,1	
8	RDC - Entrée	D	5	Mur	Béton	Peinture	0,04	0,1	
9	RDC - Entrée	D	5	Mur	Béton	Peinture	0,08	0,1	
10	RDC - Entrée		6	Plafond	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
11	RDC - Entrée		6	Plafond	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Entrée		7	Plinthes	Carrelage	Plastique (lino)	NM		Partie non visée par la règlementation
-	RDC - Entrée		8	Porte d'entrée intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - Entrée		9	Porte d'entrée extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
12	RDC - Entrée		10	Radiateur	Métal	Peinture	0,06	0,1	
13	RDC - Entrée		10	Radiateur	Métal	Peinture	0,09	0,1	
14	RDC - Entrée		11	Tuyau	Métal	Peinture	0,09	0,1	
15	RDC - Entrée		11	Tuyau	Métal	Peinture	0,02	0,1	
-	RDC - Cuisine		12	Sol	Carrelage		NM		Absence de revêtement
16	RDC - Cuisine	A	13	Mur	Béton	Peinture	0,03	0,1	
17	RDC - Cuisine	A	13	Mur	Béton	Peinture	0,03	0,1	
18	RDC - Cuisine	B	14	Mur	Béton	Peinture	0,02	0,1	
19	RDC - Cuisine	B	14	Mur	Béton	Peinture	0,06	0,1	
20	RDC - Cuisine	C	15	Mur	Béton	Peinture	0,09	0,1	
21	RDC - Cuisine	C	15	Mur	Béton	Peinture	0,08	0,1	
22	RDC - Cuisine	D	16	Mur	Béton	Peinture	0,05	0,1	
23	RDC - Cuisine	D	16	Mur	Béton	Peinture	0,02	0,1	
24	RDC - Cuisine		17	Plafond	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
25	RDC - Cuisine		17	Plafond	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
-	RDC - Cuisine		18	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	RDC - Cuisine		19	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - Cuisine		20	Fenêtre volets	PVC		NM		Absence de revêtement

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	RDC - Cuisine		21	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
26	RDC - Cuisine		22	Porte	Bois	Peinture	0,02	0,1	
27	RDC - Cuisine		22	Porte	Bois	Peinture	0,02	0,1	
28	RDC - Cuisine		23	Radiateur	Métal	Peinture	0,05	0,1	
29	RDC - Cuisine		23	Radiateur	Métal	Peinture	0,04	0,1	
30	RDC - Cuisine		24	Tuyau	Métal	Peinture	0,01	0,1	
31	RDC - Cuisine		24	Tuyau	Métal	Peinture	0,04	0,1	
-	RDC - Séjour		25	Sol	Bois		NM		Absence de revêtement
32	RDC - Séjour	A	26	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
33	RDC - Séjour	A	26	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
34	RDC - Séjour	B	27	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
35	RDC - Séjour	B	27	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
36	RDC - Séjour	C	28	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
37	RDC - Séjour	C	28	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
38	RDC - Séjour	D	29	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
39	RDC - Séjour	D	29	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
40	RDC - Séjour		30	Plafond	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
41	RDC - Séjour		30	Plafond	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
42	RDC - Séjour		31	Plinthes	Bois	Peinture	0,06	0,1	
43	RDC - Séjour		31	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	RDC - Séjour		32	Fenêtre intérieure	Aluminium		NM		Absence de revêtement
-	RDC - Séjour		33	Fenêtre volets	Aluminium		NM		Absence de revêtement
-	RDC - Séjour		34	Fenêtre extérieure	Aluminium		NM		Absence de revêtement
44	RDC - Séjour		35	Porte 1	Bois	Peinture	0,03	0,1	
45	RDC - Séjour		35	Porte 1	Bois	Peinture	0,02	0,1	
46	RDC - Séjour		36	Porte 2	Bois	Peinture	0,05	0,1	
47	RDC - Séjour		36	Porte 2	Bois	Peinture	0,03	0,1	
48	RDC - Séjour		37	Radiateur	Métal	Peinture	0,06	0,1	
49	RDC - Séjour		37	Radiateur	Métal	Peinture	0,04	0,1	
50	RDC - Séjour		38	Tuyau	Métal	Peinture	0,06	0,1	
51	RDC - Séjour		38	Tuyau	Métal	Peinture	0,07	0,1	
-	RDC - Salon		39	Sol	Bois		NM		Absence de revêtement
52	RDC - Salon	A	40	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
53	RDC - Salon	A	40	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
54	RDC - Salon	B	41	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
55	RDC - Salon	B	41	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
56	RDC - Salon	C	42	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
57	RDC - Salon	C	42	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
58	RDC - Salon	D	43	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
59	RDC - Salon	D	43	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
60	RDC - Salon		44	Plafond	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
61	RDC - Salon		44	Plafond	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
62	RDC - Salon		45	Plinthes	Bois	Peinture	0,07	0,1	
63	RDC - Salon		45	Plinthes	Bois	Peinture	0,04	0,1	
64	RDC - Salon		46	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
65	RDC - Salon		46	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
66	RDC - Salon		47	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
67	RDC - Salon		47	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
68	RDC - Salon		48	Porte 1	Bois	Peinture	0,04	0,1	
69	RDC - Salon		48	Porte 1	Bois	Peinture	0,04	0,1	
70	RDC - Salon		49	Porte 2	Bois	Peinture	0,04	0,1	
71	RDC - Salon		49	Porte 2	Bois	Peinture	0,03	0,1	
-	RDC - Salon		50	Volet	PVC		NM		Absence de revêtement
72	RDC - Salon		51	Radiateur	Métal	Peinture	0,04	0,1	
73	RDC - Salon		51	Radiateur	Métal	Peinture	0,02	0,1	
74	RDC - Salon		52	Tuyau	Métal	Peinture	0,03	0,1	
75	RDC - Salon		52	Tuyau	Métal	Peinture	0,04	0,1	
-	RDC - Chambre 1		53	Sol	Bois		NM		Absence de revêtement
76	RDC - Chambre 1	A	54	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
77	RDC - Chambre 1	A	54	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
78	RDC - Chambre 1	B	55	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
79	RDC - Chambre 1	B	55	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
80	RDC - Chambre 1	C	56	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
81	RDC - Chambre 1	C	56	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
82	RDC - Chambre 1	D	57	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
83	RDC - Chambre 1	D	57	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
84	RDC - Chambre 1		58	Plafond	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
85	RDC - Chambre 1		58	Plafond	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
86	RDC - Chambre 1		59	Plinthes	Bois	Peinture	0,08	0,1	
87	RDC - Chambre 1		59	Plinthes	Bois	Peinture	0,05	0,1	
-	RDC - Chambre 1		60	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - Chambre 1		61	Fenêtre volets	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - Chambre 1		62	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
88	RDC - Chambre 1		63	Porte	Bois	Peinture	0,03	0,1	
89	RDC - Chambre 1		63	Porte	Bois	Peinture	0,06	0,1	
90	RDC - Chambre 1		64	Radiateur	Métal	Peinture	0,05	0,1	
91	RDC - Chambre 1		64	Radiateur	Métal	Peinture	0,03	0,1	
92	RDC - Chambre 1		65	Tuyau	Métal	Peinture	0,05	0,1	
93	RDC - Chambre 1		65	Tuyau	Métal	Peinture	0,07	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	RDC - Chambre 2		66	Sol	Bois		NM		Absence de revêtement
94	RDC - Chambre 2	A	67	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
95	RDC - Chambre 2	A	67	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
96	RDC - Chambre 2	B	68	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
97	RDC - Chambre 2	B	68	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
98	RDC - Chambre 2	C	69	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
99	RDC - Chambre 2	C	69	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
100	RDC - Chambre 2	D	70	Mur	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
101	RDC - Chambre 2	D	70	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
102	RDC - Chambre 2		71	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
103	RDC - Chambre 2		71	Plafond	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
104	RDC - Chambre 2		72	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
105	RDC - Chambre 2		72	Plinthes	Bois	Peinture	0,04	0,1	
-	RDC - Chambre 2		73	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - Chambre 2		74	Fenêtre volets	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - Chambre 2		75	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
106	RDC - Chambre 2		76	Porte	Bois	Peinture	0,06	0,1	
107	RDC - Chambre 2		76	Porte	Bois	Peinture	0,04	0,1	
108	RDC - Chambre 2		77	Radiateur	Métal	Peinture	0,04	0,1	
109	RDC - Chambre 2		77	Radiateur	Métal	Peinture	0,03	0,1	
110	RDC - Chambre 2		78	Tuyau	Métal	Peinture	0,06	0,1	
111	RDC - Chambre 2		78	Tuyau	Métal	Peinture	0,05	0,1	
-	RDC - Chambre 3		79	Sol	Bois		NM		Absence de revêtement
112	RDC - Chambre 3	A	80	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
113	RDC - Chambre 3	A	80	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
114	RDC - Chambre 3	B	81	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
115	RDC - Chambre 3	B	81	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
116	RDC - Chambre 3	C	82	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
117	RDC - Chambre 3	C	82	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
118	RDC - Chambre 3	D	83	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
119	RDC - Chambre 3	D	83	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
120	RDC - Chambre 3		84	Plafond	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
121	RDC - Chambre 3		84	Plafond	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
122	RDC - Chambre 3		85	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
123	RDC - Chambre 3		85	Plinthes	Bois	Peinture	0,06	0,1	
124	RDC - Chambre 3		86	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
125	RDC - Chambre 3		86	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
126	RDC - Chambre 3		87	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
127	RDC - Chambre 3		87	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
128	RDC - Chambre 3		88	Porte	Bois	Peinture	0,08	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
129	RDC - Chambre 3		88	Porte	Bois	Peinture	0,02	0,1	
-	RDC - Chambre 3		89	Volet	PVC		NM		Absence de revêtement
130	RDC - Chambre 3		90	Radiateur	Métal	Peinture	0,04	0,1	
131	RDC - Chambre 3		90	Radiateur	Métal	Peinture	0,02	0,1	
132	RDC - Chambre 3		91	Tuyau	Métal	Peinture	0,07	0,1	
133	RDC - Chambre 3		91	Tuyau	Métal	Peinture	0,06	0,1	
-	RDC - SdE		92	Sol	Carrelage	Dalles plastiques	NM		Partie non visée par la règlementation
134	RDC - SdE	A	93	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
135	RDC - SdE	A	93	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
136	RDC - SdE	B	94	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
137	RDC - SdE	B	94	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
138	RDC - SdE	C	95	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
139	RDC - SdE	C	95	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
140	RDC - SdE	D	96	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
141	RDC - SdE	D	96	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
142	RDC - SdE		97	Plafond	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
143	RDC - SdE		97	Plafond	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
-	RDC - SdE		98	Plinthes	Carrelage		NM		Absence de revêtement
-	RDC - SdE		99	Fenêtre intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	RDC - SdE		100	Fenêtre extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
144	RDC - SdE		101	Porte	Bois	Peinture	0,06	0,1	
145	RDC - SdE		101	Porte	Bois	Peinture	0,07	0,1	
146	RDC - SdE		102	Radiateur	Métal	Peinture	0,05	0,1	
147	RDC - SdE		102	Radiateur	Métal	Peinture	0,10	0,1	
148	RDC - SdE		103	Tuyau	Métal	Peinture	0,06	0,1	
149	RDC - SdE		103	Tuyau	Métal	Peinture	0,02	0,1	
-	RDC - WC		104	Sol	Carrelage	Dalles plastiques	NM		Partie non visée par la règlementation
150	RDC - WC	A	105	Mur	Béton	Peinture	0,08	0,1	
151	RDC - WC	A	105	Mur	Béton	Peinture	0,07	0,1	
152	RDC - WC	B	106	Mur	Béton	Peinture	0,06	0,1	
153	RDC - WC	B	106	Mur	Béton	Peinture	0,09	0,1	
154	RDC - WC	C	107	Mur	Béton	Peinture	0,07	0,1	
155	RDC - WC	C	107	Mur	Béton	Peinture	0,06	0,1	
156	RDC - WC	D	108	Mur	Béton	Peinture	0,08	0,1	
157	RDC - WC	D	108	Mur	Béton	Peinture	0,10	0,1	
158	RDC - WC		109	Plafond	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
159	RDC - WC		109	Plafond	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
160	RDC - WC		110	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
161	RDC - WC		110	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
162	RDC - WC		111	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
163	RDC - WC		111	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
164	RDC - WC		112	Porte	Bois	Peinture	0,04	0,1	
165	RDC - WC		112	Porte	Bois	Peinture	0,07	0,1	
166	RDC - Escalier	A	113	Mur	Béton	Peinture	0,03	0,1	
167	RDC - Escalier	A	113	Mur	Béton	Peinture	0,06	0,1	
168	RDC - Escalier	B	114	Mur	Béton	Peinture	0,04	0,1	
169	RDC - Escalier	B	114	Mur	Béton	Peinture	0,05	0,1	
170	RDC - Escalier	C	115	Mur	Béton	Peinture	0,09	0,1	
171	RDC - Escalier	C	115	Mur	Béton	Peinture	0,07	0,1	
172	RDC - Escalier	D	116	Mur	Béton	Peinture	0,07	0,1	
173	RDC - Escalier	D	116	Mur	Béton	Peinture	0,06	0,1	
174	RDC - Escalier		117	Porte	Bois	Peinture	0,09	0,1	
175	RDC - Escalier		117	Porte	Bois	Peinture	0,08	0,1	
176	RDC - Escalier		118	Marches	Bois	Moquette	0,03	0,1	
177	RDC - Escalier		118	Marches	Bois	Moquette	0,07	0,1	
178	RDC - Escalier		119	Contre-marches	Bois	Moquette	0,02	0,1	
179	RDC - Escalier		119	Contre-marches	Bois	Moquette	0,03	0,1	
-	RDC - Escalier		120	Main courante	Bois		NM		Absence de revêtement
-	RDC - Véranda		121	Sol	Béton	Carrelage	NM		Partie non visée par la règlementation
-	RDC - Véranda	B	122	Mur	Aluminium		NM		Absence de revêtement
-	RDC - Véranda	C	123	Mur	Aluminium		NM		Absence de revêtement
-	RDC - Véranda	D	124	Mur	Aluminium		NM		Absence de revêtement
-	RDC - Véranda		125	Plafond	Aluminium		NM		Absence de revêtement
-	RDC - Véranda		126	Fenêtre intérieure	Aluminium		NM		Absence de revêtement
-	RDC - Véranda		127	Fenêtre extérieure	Aluminium		NM		Absence de revêtement
-	RDC - Véranda		128	Porte	Aluminium		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 1		129	Sol	Béton		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 1	A	130	Mur	Pierre		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 1	B	131	Mur	Pierre		NM		Absence de revêtement

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Sous-sol - Pièce 1	C	132	Mur	Pierre		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 1	D	133	Mur	Pierre		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 1		134	Plafond	Béton		NM		Absence de revêtement
180	Sous-sol - Pièce 1		135	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	2,03	0,1	
181	Sous-sol - Pièce 1		136	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	2,69	0,1	
182	Sous-sol - Pièce 1		137	Porte garage	Bois	Peinture	2,74	0,1	
-	Sous-sol - Pièce 2		138	Sol	Béton		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 2	A	139	Mur	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 2	B	140	Mur	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 2	C	141	Mur	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 2	D	142	Mur	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 2		143	Plafond	Béton		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 3		144	Sol	Béton		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 3	A	145	Mur	Pierre		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 3	B	146	Mur	Pierre		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 3	C	147	Mur	Pierre		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 3	D	148	Mur	Pierre		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Pièce 3		149	Plafond	Béton		NM		Absence de revêtement
-	Sous-sol - Escalier		150	Sol	Béton		NM		Absence de revêtement
183	Sous-sol - Escalier		151	Main courante	Métal	Peinture	0,03	0,1	
184	Sous-sol - Escalier		151	Main courante	Métal	Peinture	0,05	0,1	
185	Étage - Dégagement		152	Sol	Bois	Moquette collée	0,05	0,1	
186	Étage - Dégagement		152	Sol	Bois	Moquette collée	0,08	0,1	
187	Étage - Dégagement	A	153	Mur	Bois	Tapisserie	0,02	0,1	
188	Étage - Dégagement	A	153	Mur	Bois	Tapisserie	0,03	0,1	
189	Étage - Dégagement	B	154	Mur	Bois	Tapisserie	0,04	0,1	
190	Étage - Dégagement	B	154	Mur	Bois	Tapisserie	0,06	0,1	
191	Étage - Dégagement	C	155	Mur	Bois	Tapisserie	0,05	0,1	
192	Étage - Dégagement	C	155	Mur	Bois	Tapisserie	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
193	Étage - Dégagement	D	156	Mur	Bois	Tapisserie	0,04	0,1	
194	Étage - Dégagement	D	156	Mur	Bois	Tapisserie	0,07	0,1	
-	Étage - Dégagement		157	Plafond	Lambris bois		NM		Absence de revêtement
195	Étage - Dégagement		158	Plinthes	Bois	Peinture	0,02	0,1	
196	Étage - Dégagement		158	Plinthes	Bois	Peinture	0,05	0,1	
197	Étage - Chambre 1		159	Sol	Bois	Moquette collée	0,04	0,1	
198	Étage - Chambre 1		159	Sol	Bois	Moquette collée	0,02	0,1	
199	Étage - Chambre 1	A	160	Mur	Bois	Tapisserie	0,08	0,1	
200	Étage - Chambre 1	A	160	Mur	Bois	Tapisserie	0,09	0,1	
201	Étage - Chambre 1	B	161	Mur	Bois	Tapisserie	0,09	0,1	
202	Étage - Chambre 1	B	161	Mur	Bois	Tapisserie	0,09	0,1	
203	Étage - Chambre 1	C	162	Mur	Bois	Tapisserie	0,10	0,1	
204	Étage - Chambre 1	C	162	Mur	Bois	Tapisserie	0,07	0,1	
205	Étage - Chambre 1	D	163	Mur	Bois	Tapisserie	0,06	0,1	
206	Étage - Chambre 1	D	163	Mur	Bois	Tapisserie	0,07	0,1	
-	Étage - Chambre 1		164	Plafond	Lambris bois		NM		Absence de revêtement
207	Étage - Chambre 1		165	Plinthes	Bois	Peinture	0,04	0,1	
208	Étage - Chambre 1		165	Plinthes	Bois	Peinture	0,06	0,1	
209	Étage - Chambre 1		166	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
210	Étage - Chambre 1		166	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
211	Étage - Chambre 1		167	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
212	Étage - Chambre 1		167	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
-	Étage - Chambre 1		168	Volet	PVC		NM		Absence de revêtement
213	Étage - Chambre 1		169	Radiateur	Métal	Peinture	0,08	0,1	
214	Étage - Chambre 1		169	Radiateur	Métal	Peinture	0,03	0,1	
215	Étage - Chambre 1		170	Tuyau	Métal	Peinture	0,06	0,1	
216	Étage - Chambre 1		170	Tuyau	Métal	Peinture	0,05	0,1	
217	Étage - Chambre 2		171	Sol	Bois	Moquette collée	0,02	0,1	
218	Étage - Chambre 2		171	Sol	Bois	Moquette collée	0,08	0,1	
219	Étage - Chambre 2	A	172	Mur	Bois	Tapisserie	0,08	0,1	
220	Étage - Chambre 2	A	172	Mur	Bois	Tapisserie	0,03	0,1	
221	Étage - Chambre 2	B	173	Mur	Bois	Tapisserie	0,08	0,1	
222	Étage - Chambre 2	B	173	Mur	Bois	Tapisserie	0,09	0,1	
223	Étage - Chambre 2	C	174	Mur	Bois	Tapisserie	0,02	0,1	
224	Étage - Chambre 2	C	174	Mur	Bois	Tapisserie	0,04	0,1	
225	Étage - Chambre 2	D	175	Mur	Bois	Tapisserie	0,07	0,1	
226	Étage - Chambre 2	D	175	Mur	Bois	Tapisserie	0,10	0,1	
-	Étage - Chambre 2		176	Plafond	Lambris bois		NM		Absence de revêtement
227	Étage - Chambre 2		177	Plinthes	Bois	Peinture	0,08	0,1	
228	Étage - Chambre 2		177	Plinthes	Bois	Peinture	0,05	0,1	
229	Étage - Chambre 2		178	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
230	Étage - Chambre 2		178	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
231	Étage - Chambre 2		179	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
232	Étage - Chambre 2		179	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
-	Étage - Chambre 2		180	Volet	PVC		NM		Absence de revêtement
233	Étage - Chambre 2		181	Radiateur	Métal	Peinture	0,06	0,1	
234	Étage - Chambre 2		181	Radiateur	Métal	Peinture	0,09	0,1	
235	Étage - Chambre 2		182	Tuyau	Métal	Peinture	0,07	0,1	
236	Étage - Chambre 2		182	Tuyau	Métal	Peinture	0,08	0,1	
237	Étage - SdE		183	Sol	Bois	Plastique (lino)	0,03	0,1	
238	Étage - SdE		183	Sol	Bois	Plastique (lino)	0,08	0,1	
239	Étage - SdE	A	184	Mur	Bois	Tapisserie	0,10	0,1	
240	Étage - SdE	A	184	Mur	Bois	Tapisserie	0,08	0,1	
241	Étage - SdE	B	185	Mur	Bois	Tapisserie	0,03	0,1	
242	Étage - SdE	B	185	Mur	Bois	Tapisserie	0,02	0,1	
243	Étage - SdE	C	186	Mur	Bois	Tapisserie	0,06	0,1	
244	Étage - SdE	C	186	Mur	Bois	Tapisserie	0,10	0,1	
245	Étage - SdE	D	187	Mur	Bois	Tapisserie	0,05	0,1	
246	Étage - SdE	D	187	Mur	Bois	Tapisserie	0,04	0,1	
-	Étage - SdE		188	Plafond	Lambris bois		NM		Absence de revêtement
247	Étage - SdE		189	Plinthes	Bois	Peinture	0,03	0,1	
248	Étage - SdE		189	Plinthes	Bois	Peinture	0,05	0,1	
249	Étage - SdE		190	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
250	Étage - SdE		190	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
251	Étage - SdE		191	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
252	Étage - SdE		191	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
253	Étage - SdE		192	Porte	Bois	Peinture	0,05	0,1	
254	Étage - SdE		192	Porte	Bois	Peinture	0,09	0,1	
-	Étage - SdE		193	Volet	PVC		NM		Absence de revêtement
255	Étage - SdE		194	Radiateur	Métal	Peinture	0,08	0,1	
256	Étage - SdE		194	Radiateur	Métal	Peinture	0,04	0,1	
257	Étage - SdE		195	Tuyau	Métal	Peinture	0,04	0,1	
258	Étage - SdE		195	Tuyau	Métal	Peinture	0,01	0,1	
-	Étage - Placard		196	Sol	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Étage - Placard	A	197	Mur	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Étage - Placard	B	198	Mur	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Étage - Placard	C	199	Mur	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Étage - Placard	D	200	Mur	Bois		NM		Absence de revêtement

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Étage - Placard		201	Plafond	Bois		NM		Absence de revêtement
259	Étage - Placard		202	Porte 1	Bois	Peinture	0,05	0,1	
260	Étage - Placard		202	Porte 1	Bois	Peinture	0,05	0,1	
261	Étage - Placard		203	Porte 2	Bois	Peinture	0,07	0,1	
262	Étage - Placard		203	Porte 2	Bois	Peinture	0,05	0,1	
263	Étage - Placard		204	Porte 3	Bois	Peinture	0,02	0,1	
264	Étage - Placard		204	Porte 3	Bois	Peinture	0,03	0,1	
-	Étage - Combles 1		205	Sol	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Étage - Combles 1	A	206	Mur	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Étage - Combles 1	B	207	Mur	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Étage - Combles 1	C	208	Mur	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Étage - Combles 1	D	209	Mur	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Étage - Combles 1		210	Plafond	Bois		NM		Absence de revêtement
265	Étage - Combles 1		211	Porte	Bois	Peinture	0,03	0,1	
266	Étage - Combles 1		211	Porte	Bois	Peinture	0,03	0,1	
-	Étage - Combles 2		212	Sol	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Étage - Combles 2	A	213	Mur	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Étage - Combles 2	B	214	Mur	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Étage - Combles 2	C	215	Mur	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Étage - Combles 2	D	216	Mur	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Étage - Combles 2		217	Plafond	Bois		NM		Absence de revêtement
267	Étage - Combles 2		218	Porte	Bois	Peinture	0,04	0,1	
268	Étage - Combles 2		218	Porte	Bois	Peinture	0,08	0,1	
-	Étage - Combles 3		219	Sol	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Étage - Combles 3	A	220	Mur	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Étage - Combles 3	B	221	Mur	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Étage - Combles 3	C	222	Mur	Bois		NM		Absence de revêtement

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	Étage - Combles 3	D	223	Mur	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Étage - Combles 3		224	Plafond	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Étage - Combles 3		225	Fenêtre 1 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage - Combles 3		226	Fenêtre 1 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage - Combles 3		227	Fenêtre 2 intérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
-	Étage - Combles 3		228	Fenêtre 2 extérieure	PVC		NM		Absence de revêtement
269	Étage - Combles 3		229	Porte 1	Bois	Peinture	0,09	0,1	
270	Étage - Combles 3		229	Porte 1	Bois	Peinture	0,01	0,1	
271	Étage - Combles 3		230	Porte 2	Bois	Peinture	0,06	0,1	
272	Étage - Combles 3		230	Porte 2	Bois	Peinture	0,09	0,1	
-	Étage 2 - Combles		231	Sol	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - Combles	A	232	Mur	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - Combles	B	233	Mur	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - Combles	C	234	Mur	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - Combles	D	235	Mur	Bois		NM		Absence de revêtement
-	Étage 2 - Combles		236	Plafond	Bois		NM		Absence de revêtement
273	Exterieur		237	Balustrade	Metal	Peinture	0,09	0,1	
274	Exterieur		237	Balustrade	Metal	Peinture	0,02	0,1	

D. Commentaires et signature

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : **Aucun document n'a été remis**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : **Aucun accompagnateur**

Fait à **EDERN**, le **26/03/2026**
Par : **COLLET Yann**



E. Méthodologie d'intervention

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage.

Identification des locaux et des zones

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Le local est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.
L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux concernés par la démolition. Il dresse la liste détaillée des locaux visités. Si des locaux concernés par la démolition n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités.
Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux concernés par la démolition et reporte sur le croquis la désignation de chaque local.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction. Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.
Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.
D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Si le bâtiment à démolir comporte des faïences, le repérage est nécessaire.

Identification des matériaux

Les matériaux susceptibles de contenir du plomb doivent faire l'objet d'un repérage par le diagnostiqueur.

Choix des points de mesures

Toutes les unités de diagnostic impactées par la démolition font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

F. Notice d'information à remettre au donneur d'ordre

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine –t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- Exploiter le diagnostic plomb avant démolition pour construire le projet de démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant démolition aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage
- mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
  - ✓ interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
  - ✓ rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
  - ✓ interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
  - ✓ ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

CARSAT du Centre
www.carsat-centre.fr
Tél 02 38 81 50 00
prev@carsat-centre.fr

OPPBTP Centre
www.preventionbtp.fr
Tél 02 38 83 60 21
orleans@oppbtp.fr


RSI région Centre
www.rsi.fr/centre
Tél 08 20 20 96 26

Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre :
www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.
Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :
  - ✓ Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
  - ✓ Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

G. Planches de repérage

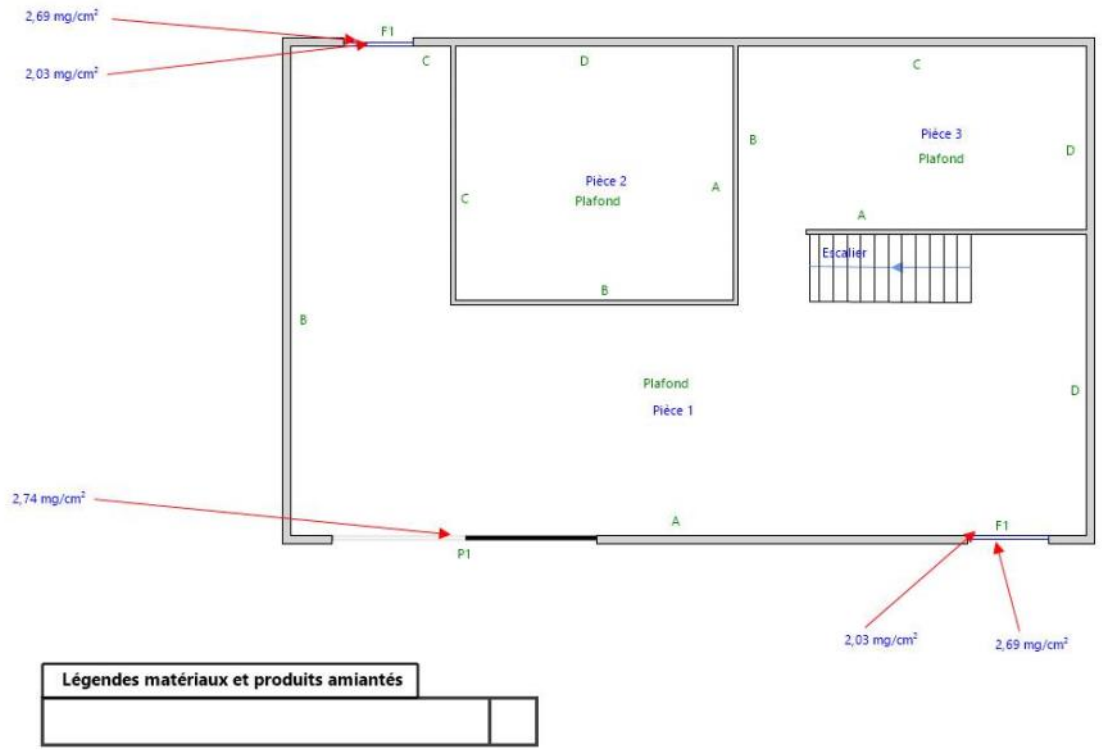

Annexe au rapport : **EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML**						Croquis 1 / 3	
Propriétaire :	EPF Bretagne 14, Avenue Henri Fréville - CS90721- 35207 RENNES	Bien :	MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN	Etabli par : Société : Le :	COLLET Yann AED Groupe 26/03/2026	Version : du :	V01 26/03/2026




Légendes matériaux et produits amiantés	

Rez-de-chaussée

Annexe au rapport : **EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML** — Croquis 2 / 3

Propriétaire :	EPF Bretagne 14, Avenue Henri Fréville - CS90721- 35207 RENNES	Bien :	MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN	Etabli par : Société : Le :	COLLET Yann AED Groupe 26/03/2026	Version : du :	V01 26/03/2026

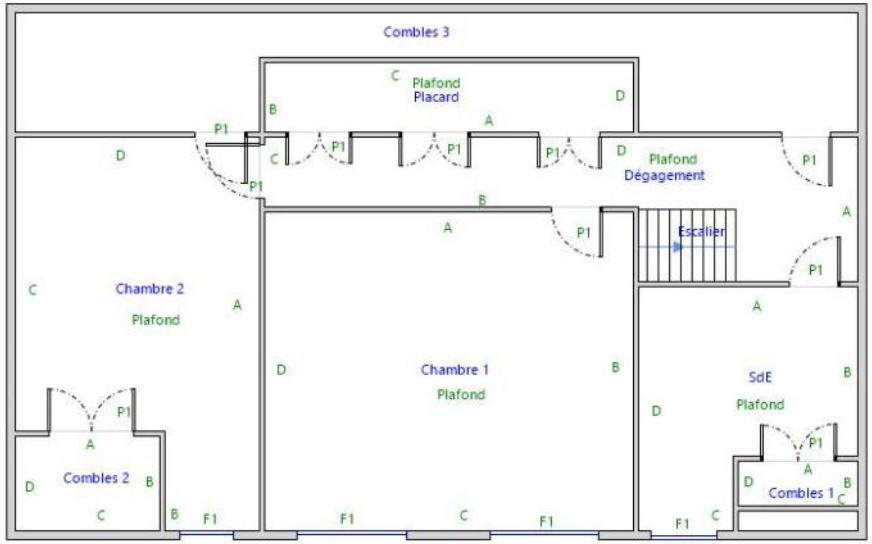

Légendes matériaux et produits amiantés	

1er Etage

Annexe au rapport : **EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML** — Croquis 3 / 3

Propriétaire :	EPF Bretagne 14, Avenue Henri Fréville - CS90721- 35207 RENNES	Bien :	MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN	Etabli par : Société : Le :	COLLET Yann AED Groupe 26/03/2026	Version : du :	V01 26/03/2026

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI5542 Version 005

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur COLLET Yann

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 23/12/2024 - Date d'expiration : 22/12/2031
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 23/12/2024 - Date d'expiration : 22/12/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 23/12/2024.

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

cofrac
ACCREDITATION N° 4-0522 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PERSONNES

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CERTIFIE

abcidia
CERTIFICATION

opérateur de diagnostics immobiliers

La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

COLLET Yann

sous le numéro 18-1262

Cette certification concerne la spécialité de diagnostics immobiliers suivante :

☑ **CREP** Prise d'effet : 25/09/2023 Validité : 24/09/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

18-1262 - v4 - 26/09/2023

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

ABCIDIA CERTIFICATION

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES

Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

Votre Assurance

▸ RCE PRESTATAIRES

Assurance et Banque

ATTESTATION

SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC FR

AGENT

EI- DE LA CHAPELLE, STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES
Tél : 0557341313
Fax : 05 57 34 06 62
Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR
Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904
Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC

Ainsi que :

AED EXPERTISES
4 Allée Pierre Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC

AED SERVICES
4 Allée Pierre Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **01/07/2024** garantissant sa responsabilité civile et professionnelle pour les activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :
1/ En cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1 à 7 de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation ;
2/ En cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée
• Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L 1334-5 et L 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
• L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
• L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
• L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
• L'état des risques naturels, miniers et technologiques prévu à l'article L 125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article ;
• Le diagnostic de performance énergétique (DPE) prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;

1D052620241120

• L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
• L'information sur la présence d'un risque de mérule prévu à l'article L 133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

- Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique,
- Repérages et examens visuels avant travaux, avant démolitions dans les différents types d'établissements tels que ERP Catégories 1 à 4, IGH....) comme le prévoit le code du travail
- Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.
- Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.
- Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.
- Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

AUDIT REGLEMENTAIRE ENERGETIQUE

DIAGNOSTICS PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX

Les garanties s'exercent à concurrence des montants de garanties du tableau ci-après.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2025** au **01/07/2026** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 12 juin 2025
Pour la société :

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	**10 000 000** € **par année** d'assurance
Dont : • **Dommages corporels**	**10 000 000** € **par année** d'assurance
• **Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus**	**2 000 000** € **par année** d'assurance
• **Dommages immatériels non consécutifs**	**150 000** € par année d'assurance
• **Dommages aux biens confiés**	**150 000** € par sinistre
Autres garanties :	
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	**2 000 000 €** par année d'assurance dont **1 000 000** € par sinistre
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	**1 500 000** € par année d'assurance dont **1 500 000** € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) **:** **Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont :** Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	**1.000.000** € par année d'assurance **100.000** € par année d'assurance
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	**20.000** € par litige
