
CONSTRUCTION D'UN BATIMENT D'HEBERGEMENT - PROJET DIDPPT 23016

PLANNING DES TRAVAUX TCE - PHASE DCE

Tâches	Durée	Date Début	Date Fin
DEMARRAGE DES TRAVAUX	5,00	19/04/2027	23/04/2027
PERIODE DE PREPARATION	65,00	19/04/2027	16/07/2027
Plans d'exécution	25,00	19/04/2027	21/05/2027
Fiches FAM - PPSPS	25,00	03/05/2027	04/06/2027
VISA Maîtrise d'Oeuvre et Bureau de Contrôle	15,00	17/05/2027	04/06/2027
Mise à jour documents d'exécution	15,00	07/06/2027	25/06/2027
VISA Maîtrise d'Oeuvre et Bureau de Contrôle	15,00	28/06/2027	16/07/2027
TRAVAUX PREPARATOIRES	25,00	14/06/2027	16/07/2027
Commande matériel et matériux	220,00	17/05/2027	07/04/2028
Débroussaillage terrain	5,00	19/04/2027	23/04/2027
Décapage terre végétale	5,00	26/04/2027	30/04/2027
Terrassements - plateforme - enrochement	15,00	03/05/2027	21/05/2027
Remblai - préchargement - déblais	80,00	24/05/2027	10/09/2027
Installation de chantier gros oeuvre	10,00	13/09/2027	24/09/2027
TRAVAUX GO - HORS D'EAU - HORS D'AIR	206,00	27/09/2027	31/07/2028
TRAVAUX GROS OEUVRE	155,00	27/09/2027	19/05/2028
Fondation	130,00	27/09/2027	14/04/2028
Fondation	25,00	27/09/2027	29/10/2027
Dallage RdC	25,00	01/11/2027	03/12/2027
Voiles RdC	25,00	15/11/2027	17/12/2027
PH RdC compris poutres	30,00	06/12/2027	04/02/2028
Voiles R+1	20,00	17/01/2028	11/02/2028
PH R+1	25,00	07/02/2028	10/03/2028
Voiles R+2	20,00	21/02/2028	17/03/2028
PH R+2	25,00	13/03/2028	14/04/2028
Voiles des Combles sous charpente	15,00	03/04/2028	21/04/2028
Finitions Gros oeuvre	40,00	03/04/2028	26/05/2028
TRAVAUX HORS D'EAU - HORS D'AIR	81,00	27/03/2028	17/07/2028
Charpente - Couverture métallique	35,00	17/04/2028	02/06/2028
Structure charpente	25,00	05/06/2028	07/07/2028
HORS D'EAU	1,00	10/07/2028	10/07/2028
Menuiseries extérieures RdC	20,00	08/05/2028	02/06/2028
Menuiseries extérieures R+1	15,00	05/06/2028	23/06/2028
Menuiseries extérieures R+2	15,00	26/06/2028	14/07/2028
Appareillage et finition	15,00	17/07/2028	04/08/2028
HORS D'AIR	1,00	07/08/2028	07/08/2028
TRAVAUX DE FACADES	95,00	16/10/2028	16/03/2029
Enduits - Peintures de façades	45,00	16/10/2028	15/12/2028
Bardage sur pignons	25,00	08/01/2029	09/02/2029
Brises soleil	20,00	12/02/2029	09/03/2029
TRAVAUX DE SECOND OEUVRE	165,00	19/06/2028	23/02/2029
Cloisons RdC - GT, cloison et bande à joint	10,00	19/06/2028	30/06/2028
Cloisons R+1 - GT, cloison et bande à joint	20,00	03/07/2028	28/07/2028
Cloisons R+2 - GT, cloison et bande à joint	20,00	31/07/2028	25/08/2028
Enduits intérieures RdC	10,00	31/07/2028	11/08/2028
Enduits intérieures R+1	15,00	14/08/2028	01/09/2028
Enduits intérieures R+2	15,00	04/09/2028	22/09/2028
Chape chambres RdC	5,00	04/09/2028	08/09/2028
Carrelage chambres RdC	15,00	25/09/2028	13/10/2028
Faïence chambres RdC	10,00	16/10/2028	27/10/2028
Chape chambres R+1	10,00	11/09/2028	22/09/2028
Carrelage chambres R+1	25,00	16/10/2028	17/11/2028
Faïence chambres R+1	20,00	30/10/2028	24/11/2028
Chape chambres R+2	10,00	25/09/2028	06/10/2028
Carrelage chambres R+2	25,00	20/11/2028	12/01/2029
Faïence chambres R+2	20,00	08/01/2029	02/02/2029
	4011,00		

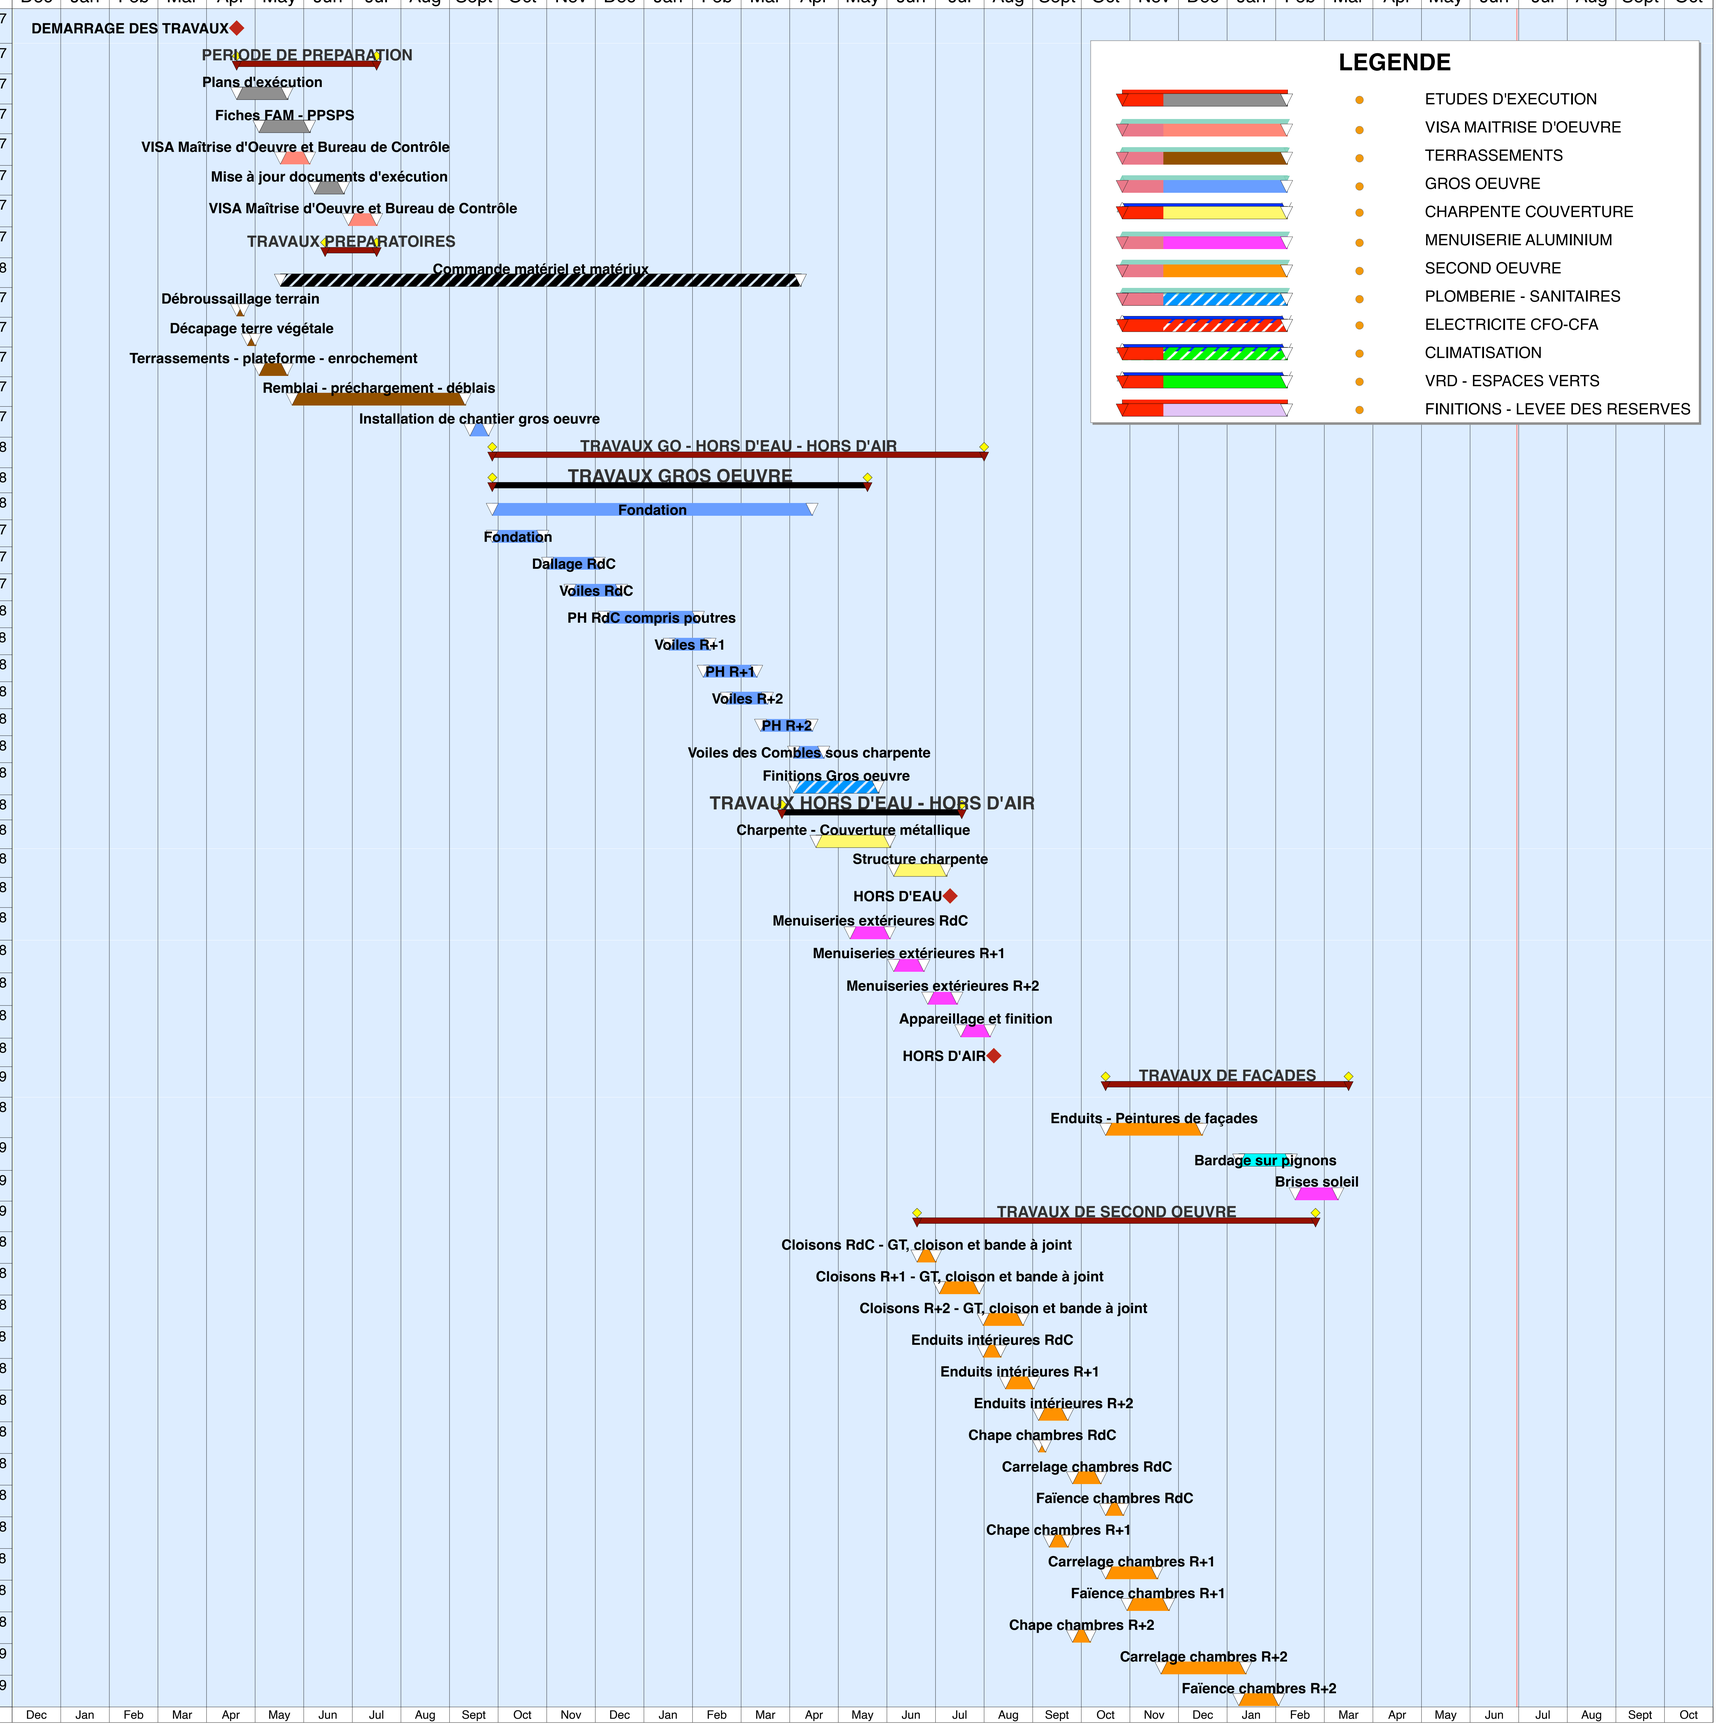

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT D'HEBERGEMENT - PROJET DIDPPT 23016

PLANNING DES TRAVAUX TCE - PHASE DCE

Tâches	Durée	Date Début	Date Fin
Etanchéité SEL douches RdC	5,00	09/10/2028	13/10/2028
Etanchéité SEL douches R+1	10,00	23/10/2028	03/11/2028
Etanchéité SEL douches R+2	10,00	20/11/2028	01/12/2028
Menuiserie bois intérieur RdC	10,00	16/10/2028	27/10/2028
Menuiserie bois intérieur R+1	10,00	20/11/2028	01/12/2028
Menuiserie bois intérieur R+2	10,00	15/01/2029	26/01/2029
Peintures chambres RdC	10,00	30/10/2028	10/11/2028
Peintures chambres R+1	25,00	13/11/2028	15/12/2028
Peintures chambres R+2	25,00	08/01/2029	09/02/2029
Aménagements placards, meubles de salles de bain et kitchenettes RdC	15,00	13/11/2028	01/12/2028
Aménagements placards, meubles de salles de bain et kitvhenettes R+1	20,00	08/01/2029	02/02/2029
Aménagements placards, meubles de salles de bain et kitchenettes R+2	20,00	05/02/2029	02/03/2029
Cloisons RdC - GT, cloison et bande à joint - locaux commun	5,00	25/09/2028	29/09/2028
Faux-plancher technique	5,00	09/10/2028	13/10/2028
Enduits coursives et locaux communs	15,00	16/10/2028	03/11/2028
Chape hall d'entrée RdC	5,00	11/12/2028	15/12/2028
Etanchéité locaux communs humide	5,00	08/01/2029	12/01/2029
Carrelage coursives et locaux communs	20,00	08/01/2029	02/02/2029
Faïence locaux communs	5,00	22/01/2029	26/01/2029
Peintures coursive et locaux communs	30,00	22/01/2029	02/03/2029
Garde-corps et Serrurerie	20,00	12/02/2029	09/03/2029
TRAVAUX DES LOTS TECHNIQUES	360,00	13/09/2027	09/03/2029
Réseaux sous dallage Plomberie - Sanitaire	50,00	27/09/2027	03/12/2027
Incorporation Plomberie - Sanitaire	75,00	06/12/2027	07/04/2028
Réseaux verticaux (Chute EU/EV)	75,00	15/05/2028	25/08/2028
Nourrices - Essais	70,00	12/06/2028	15/09/2028
Panneaux ECS - Chaufferie	70,00	18/09/2028	12/01/2029
Appareillage Plomberie - Sanitaire	60,00	27/11/2028	09/03/2029
Esais et mise en service Plomberie - Sanitaire	10,00	26/02/2029	09/03/2029
Electricité CFO-CFA	345,00	13/09/2027	16/02/2029
Réseaux sous dallage Electricité CFO-CFA	50,00	27/09/2027	03/12/2027
Incorporation Electricité CFO-CFA	75,00	06/12/2027	07/04/2028
Passage réseaux électricité CFO-CFA en cloisons	95,00	15/05/2028	22/09/2028
Appareillage électricité CFO-CFA	60,00	27/11/2028	09/03/2029
Essais et mise en service CFO-CFA	10,00	26/02/2029	09/03/2029
Réseaux Climatisation	5,00	02/10/2028	06/10/2028
Appareillage Climatisation	5,00	19/02/2029	23/02/2029
TRAVAUX D'AMENAGEMENTS EXTERIEURS	55,00	20/11/2028	23/02/2029
VRD	45,00	20/11/2028	09/02/2029
Espaces verts	20,00	12/02/2029	09/03/2029
OPR - CONFORMITE - RECEPTION	80,00	12/03/2029	29/06/2029
Nettoyage avant OPR	5,00	05/03/2029	09/03/2029
OPR	5,00	12/03/2029	16/03/2029
Levée des réserves	20,00	19/03/2029	13/04/2029
Nettoyage avant réception	5,00	16/04/2029	20/04/2029
Conformité	1,00	23/04/2029	23/04/2029
Réception	1,00	23/04/2029	23/04/2029
Levée des réserves et DOE	25,00	23/04/2029	25/05/2029
	4 011,00		

