
N°	Nom de la tâche	Durée	Lot concerné	Début	Fin
1	**PROJET DE RENOVATION DE L'AILE EST**	**320 jrs**		**Lun 04/01/27**	**Lun 29/05/28**
2	**Notification**	**11 jrs**	**AN**	**Lun 04/01/27**	**Mer 20/01/27**
3	Notifications	0 jr	AN	Lun 04/01/27	Lun 04/01/27
4	Délai post-notifications	11 jrs	AN	Lun 04/01/27	Mer 20/01/27
5	**ETUDES**	**45 jrs**		**Mer 20/01/27**	**Jeu 01/04/27**
6	Etudes TCE	5 sem.	TCE	Mer 20/01/27	Mar 02/03/27
7	Fourniture des plans "bon pour synthèse" TCE	0 jr	TCE	Mar 02/03/27	Mar 02/03/27
8	Synthèse technique	4 sem.	TCE	Mar 02/03/27	Jeu 01/04/27
9	Synthèse terminées TCE	0 jr	TCE	Jeu 01/04/27	Jeu 01/04/27
10	**TRAVAUX**	**279 jrs**	**TCE**	**Ven 05/02/27**	**Mer 26/04/28**
11	**CURAGE - DEMOLITION**	**79 jrs**	**Lots 1;8;9;10**	**Ven 05/02/27**	**Ven 11/06/27**
12	Installations de chantier extérieure: palissade, bennes…	10 jrs	Lot 1	Lun 01/03/27	Mar 16/03/27
13	Installation de chantier intérieure: coffrets de chantier, éclairage provisoire	1 sem.	Lot 1	Lun 08/03/27	Mar 16/03/27
14	Consignations	2 jrs	Lots 8; 9; 10	Mar 16/03/27	Jeu 18/03/27
15	Curage CFO / CFA / DI / tableaux TD	4 sem.	Lots 8;10	Mar 16/03/27	Ven 16/04/27
16	Curage C.V.C.	4 sem.	Lot 9	Ven 05/02/27	Mar 09/03/27
17	Dépose cloisons / plafonds	4 sem.	Lot 1	Ven 16/04/27	Mer 19/05/27
18	Dépose sols (compris faux-plancher)	3 sem.	Lot 1	Mer 19/05/27	Ven 11/06/27
19	**Fin curage et démolition existant**	**0 jr**	**Lots 1;8;9;10**	**Ven 11/06/27**	**Ven 11/06/27**
20	**GO - MACONNERIE**	**30 jrs**	**Lot 1**	**Ven 11/06/27**	**Jeu 29/07/27**
21	Poutres de reprise de porteurs	2 sem.	Lot 1	Ven 11/06/27	Lun 28/06/27
22	Ouvertures dans voiles	2 sem.	Lot 1	Lun 28/06/27	Mer 14/07/27
23	Réalisation de chape, socle bétons	2 sem.	Lot 1	Mer 14/07/27	Jeu 29/07/27
24	**Jalon fin de GO**	**0 jr**	**Lot 1**	**Jeu 29/07/27**	**Jeu 29/07/27**
25	**CLOISONS / FAUX PLAFONDS**	**90 jrs**		**Jeu 29/07/27**	**Mar 21/12/27**
26	Ossatures cloisons	4 sem.	Lot 2	Jeu 29/07/27	Mar 31/08/27
27	**Bons à fermer cloisons**	**0 jr**	TCE	**Jeu 23/09/27**	**Jeu 23/09/27**
28	Parements cloisons	4 sem.	Lot 2	Jeu 23/09/27	Mar 26/10/27
29	Ossatures faux-plafonds	3 sem.	Lot 2	Mar 26/10/27	Jeu 18/11/27
30	**Bons à fermer faux plafonds**	0 jr	TCE	Jeu 18/11/27	Jeu 18/11/27
31	Parements Faux-plafonds	4 sem.	Lot 2	Jeu 18/11/27	Mar 21/12/27
32	**METALLERIE**	**10 jrs**	**Lot 7**	**Jeu 29/07/27**	**Ven 13/08/27**
33	Rénovation des barreaudages, soupiraux	2 sem.	Lot 7	Jeu 29/07/27	Ven 13/08/27
34	**MENUISERIES EXT / STORES**	**40 jrs**	**Lots 47;5**	**Jeu 29/07/27**	**Ven 01/10/27**
35	Réfection des fenêtres in situ et intégration des capteurs d'ouverture	6 sem.	Lot 4	Jeu 29/07/27	Mer 15/09/27



N°	Nom de la tâche	Durée	Lot concerné	Début	Fin
36	Stores	2 sem.	Lot 5	Mer 15/09/27	Ven 01/10/27
37	**MENUISERIES INT**	**150 jrs**	**Lot 3**	**Mar 31/08/27**	**Mer 26/04/28**
38	Pose des B.P.	2 sem.	Lot 3	Mar 31/08/27	Mer 15/09/27
39	Pose mobilier sur mesure	2 sem.	Lot 3	Mar 11/04/28	Mer 26/04/28
40	Plinthes	2 jrs	Lot 3	Mer 01/03/28	Lun 06/03/28
41	**LOTS COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI**	**170 jrs**	**Lots 8;10**	**Jeu 29/07/27**	**Mer 26/04/28**
42	Cheminement	2 sem.	Lots 8;10	Jeu 29/07/27	Ven 13/08/27
43	Armoires	2 sem.	Lots 8;11	Lun 16/08/27	Mar 31/08/27
44	Câblage	5 sem.	Lots 8;10	Lun 16/08/27	Jeu 23/09/27
45	Appareillages	1 sem.	Lots 8;10	Mar 11/04/28	Mer 19/04/28
46	**Jalon mise en service des lots ELEC**	0 jr	Lots 8;10	Mer 19/04/28	Mer 19/04/28
47	Tests et autocontrôle	1 sem.	Lots 8;10	Mer 19/04/28	Mer 26/04/28
48	**LOT C.V.C.**	**160 jrs**	**Lot 9**	**Jeu 29/07/27**	**Mar 11/04/28**
49	Réseaux hydraulique EG/EC	5 sem.	Lot 9	Jeu 29/07/27	Mer 08/09/27
50	Réseaux évacuation et alim PB	5 sem.	Lot 9	Ven 06/08/27	Mer 15/09/27
51	Réseaux aérauliques	5 sem.	Lot 9	Ven 06/08/27	Mer 15/09/27
52	Raccordements hydraulique et aéraulique	1 sem.	Lot 9	Mer 08/09/27	Mer 15/09/27
53	Pose des extracteurs	3 sem.	Lot 9	Mer 08/09/27	Ven 01/10/27
54	Travaux électrique C.V.C./Plomberie	4 sem.	Lot 9	Jeu 23/09/27	Mar 26/10/27
55	Tests et autocontrôles réseaux	1 sem.	Lot 9	Mar 26/10/27	Mer 03/11/27
56	Calorifuge	2 sem.	Lot 9	Mer 03/11/27	Jeu 18/11/27
57	Pose ventilo-convecteurs	4 sem.	Lot 9	Jeu 18/11/27	Mar 21/12/27
58	Pose appareils sanitaires	2 sem.	Lot 9	Mer 01/03/28	Ven 17/03/28
59	Mise en service et essais	2 sem.	Lot 9	Jeu 18/11/27	Ven 03/12/27
60	Remontée de l'installation à la supervision, claquage de points	1 sem.	Lot 9	Lun 06/12/27	Lun 13/12/27
61	**Jalon mise en service du lot C.V.C.**	**0 jr**	Lot 9	**Lun 13/12/27**	**Lun 13/12/27**
62	**LOT PEINTURE/MOQUETTE**	**70 jrs**	**Lot 6**	**Mar 21/12/27**	**Mar 11/04/28**
63	Préparations des supports	4 sem.	Lot 6	Mar 21/12/27	Ven 21/01/28
64	Carrelage, Faïences sanitaires	2 sem.	Lot 6	Ven 17/03/28	Lun 03/04/28
65	Peinture	6 sem.	Lot 6	Jeu 13/01/28	Mer 01/03/28
66	Ragréage	2 sem.	Lot 6	Mer 01/03/28	Ven 17/03/28
67	Moquette	2 sem.	Lot 6	Ven 17/03/28	Lun 03/04/28
68	Finitions	1 sem.	Lot 6	Lun 03/04/28	Mar 11/04/28
69	**RECEPTION**	**20 jrs**	**TCE**	**Mer 26/04/28**	**Lun 29/05/28**
70	**LEVEE DES RESERVES**	**4 sem.**	**TCE**	**Mer 26/04/28**	**Lun 29/05/28**

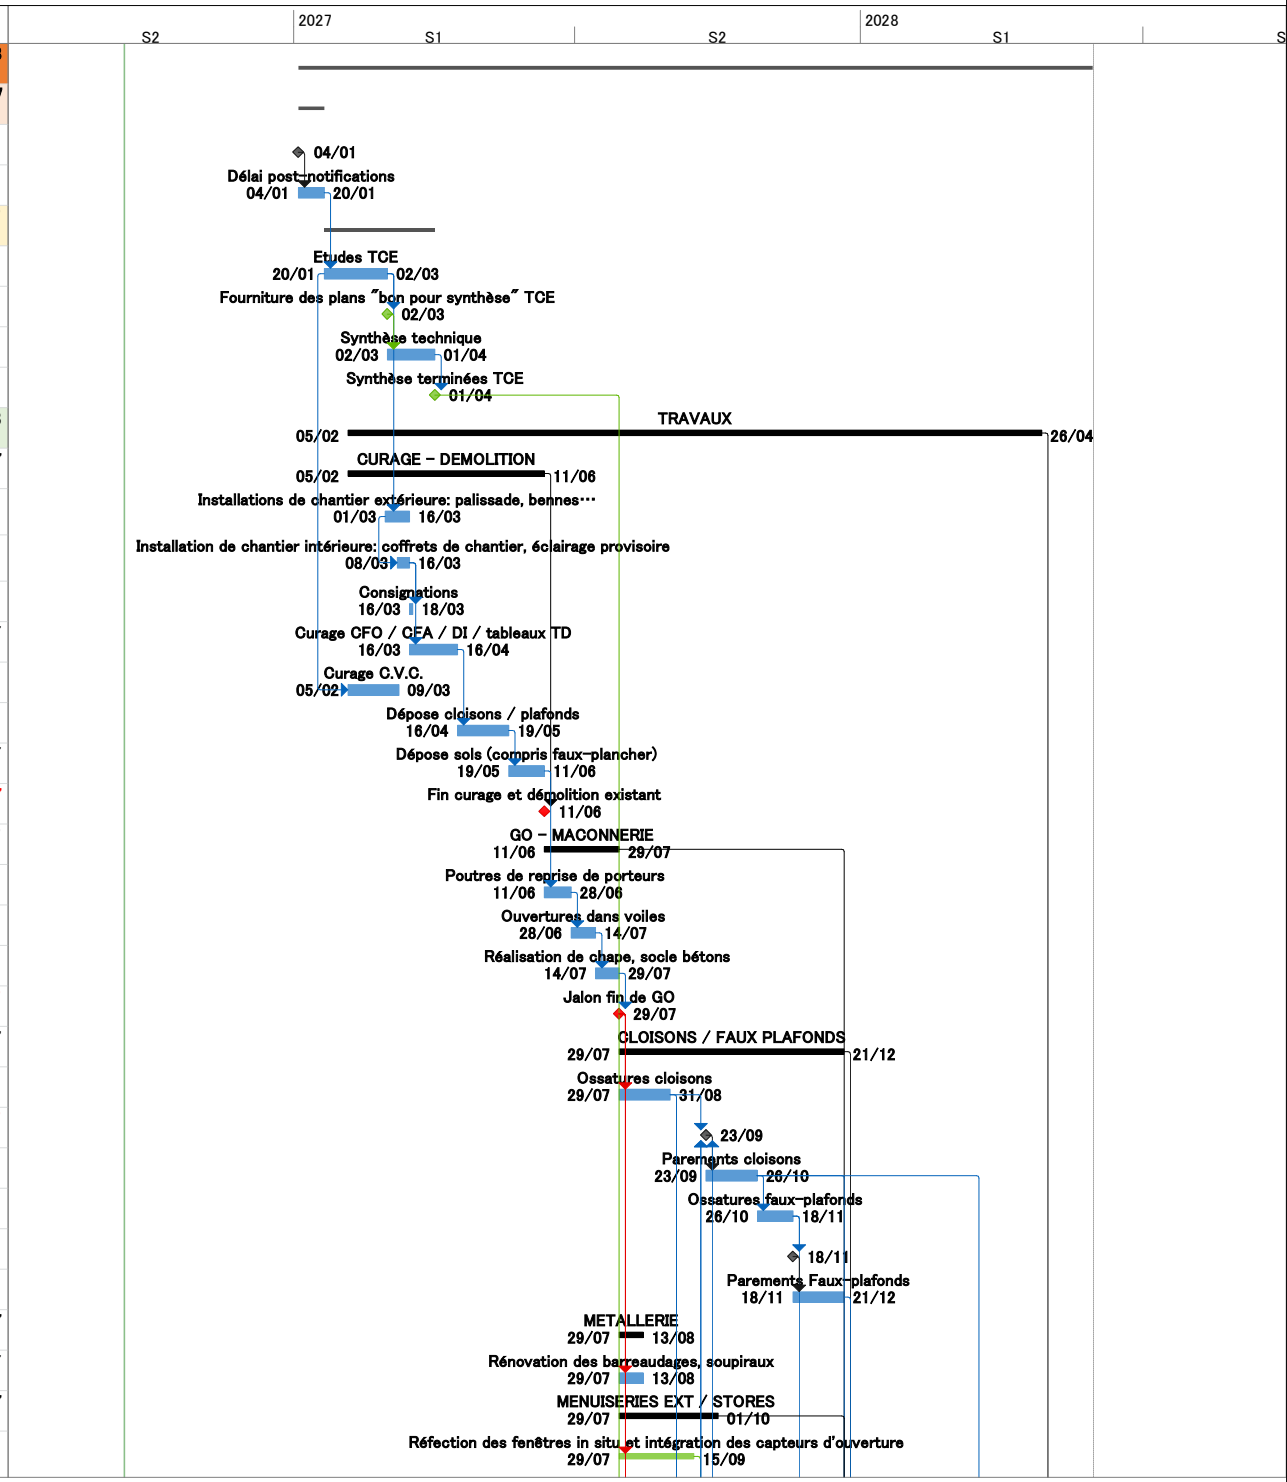
