Centre Administratif Départemental des Hauts-de-Seine

MAÎTRISE D'OUVRAGE :

PRÉFET
DES HAUTS-DE-SEINE
Liberté
Égalité
Fraternité

167-177 Av. Frederic et Irene Joliot Curie 92000 Nanterre - France

MANDATAIRE :

VINCI CONSTRUCTION

CONSTRUCTEURS : VINCI CONSTRUCTION
VINCI ENERGIES
MAINTENEUR : VINCI FACILITIES


MAÎTRISE D'OEUVRE :

ARCHITECTES : PCA-STREAM
CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE
LAGNEAU ARCHITECTES

COORDINATEUR :	CORELO	BET STRUCTURE :	VCSP
PAYSAGISTE :	LA COMPAGNIE DU PAYSAGE	BIM MANAGER :	CBC
		ENVIRONNEMENT :	TRIBU ENERGIE
FLUIDES :	EGIS	ACOUSTIQUE :	ACOUSTB
ECONOMISTE :	EGIS	CUISINISTE :	SYSTAL
SURETE :	CSD & ASSOCIES	ACCESSIBILITE :	ACCESSMETRIE
SSI :	CSD & ASSOCIES	SIGNALETIQUE :	.
BET FACADES :	ELIOTH	COLORIMETRIE :	.

EMETTEUR DU DOCUMENT

PCA-STREAM
Philippe Chiambaretta Architecte
56/58 rue Vieille du Temple - 75003 PARIS - FRANCE
Tel : +33 (0)1 44 93 90 00

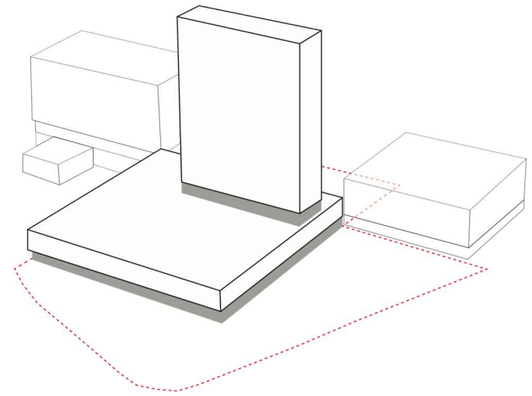

PHASE

APD

TITRE

CALENDRIER ENVELOPPE DES TRAVAUX


AFFAIRE : P170 Date : Mars 2026 Echelle :

VCF	CAD	APD	ORG	-	-	CAL	020705	0
EMETTEUR	PROJET	PHASE	LOT	ZONE	IDENT.	TYPE	NUMERO	INDICE

CENTRE ADMINISTRATIF DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE

VCF_CAD_APD_ORG_CAL_CALENDRIER ENVELOPPE DES TRAVAUX_020705_0


N°	Nom	Durée	Début	Fin
1	**DIALOGUE COMPETITIF**	36 jours	01/08/2025	22/09/2025
2	REMISE OFFRE FINALE APS+	0 jour	01/08/2025	01/08/2025
3	LAURÉAT PRESSENTI	0 jour	22/09/2025	22/09/2025
10	**OPÉRATION: CAD DES HAUTS-DE-SEINE**	454,88 jour	01/09/2025	19/09/2031
12	**FINALISATION APS- MISE AU POINT DE MARCHÉ**	47 jours	23/09/2025	27/11/2025
14	NOTIFICATION DU MARCHE	0 jour	28/11/2025	28/11/2025
15	OS PREPARATION, TRAVAUX PREALABLES & INSTALLATION DE CHANTIER - MODULAIRS	0 jour	17/07/2026	17/07/2026
16	OS PREPARATION, TRAVAUX DE REHABILITATION DU CAD	0 jour	01/09/2026	01/09/2026
19	OS TRAVAUX TCE	0 jour	30/11/2026	30/11/2026
20	MISE A DISPOSITION TOUR ET SOCLE LIBRE DE TOUT OCCUPANTS DTSP HORS DMI/LRA/ARMURERIE	0 jour	30/11/2026	30/11/2026
23	**SERVICES EN FONCTIONNEMENT**	977,88 jours	01/09/2025	03/10/2029
24	**DTSP RDC ET DTSP RDC BIS ET DTSP R+1 ET DTSP R+2 ET DTSP R-1 ET DTSP R-2 - ZONE A**	239 jours	28/11/2025	30/11/2026
27	**ARMURERIE**	915 jours	28/11/2025	02/10/2029
30	**LRA R-1 - ZONE A DANS L'EXISTANT**	62,88 jours	01/09/2025	28/11/2025
33	**DTSP DANS LE BATIMENT MODULAIRE**	676 jours	30/11/2026	03/10/2029
36	**PARKING AGENTS - SS-2**	407 jours	15/07/2026	28/03/2028
39	**PARKING AGENTS - SS-1 DEFINITIF**	357 jours	28/03/2028	03/10/2029
42	**LIBERATION DES ZONES**	319 jours	30/11/2026	28/03/2028
43	LIBÉRATION ANCIENNE ZONES DTSP POUR TRAVAUX DÉFINITIFS	0 jour	30/11/2026	30/11/2026
44	LIBERATION ANCIENNE ZONE DMI POUR TRAVAUX DEFINITIFS	0 jour	28/03/2028	28/03/2028
45	**PHASE ETUDES DE CONCEPTION**	278 jours	01/10/2025	27/11/2026
46	**CONCEPTION APD**	129 jours	28/11/2025	05/06/2026
47	ETABLISSEMENT DOSSIER APD	89 jours	28/11/2025	03/04/2026
48	DOSSIER APD FINALISÉ	0 jour	03/04/2026	03/04/2026
49	ANALYSE DOSSIER APD PAR MOA	20 jours	07/04/2026	05/05/2026
50	TRANSMISSION RICT APD PAR MOA	0 jour	21/04/2026	21/04/2026
51	REPRISE SELON RETOUR MOA	30 jours	21/04/2026	05/06/2026
52	VALIDATION APD PAR OS	0 jour	05/06/2026	05/06/2026
53	**CONCEPTION PRO**	163 jours	07/04/2026	27/11/2026
54	ETABLISSEMENT DOSSIER PRO	121 jours	07/04/2026	29/09/2026
55	DOSSIER PRO FINALISÉ	0 jour	29/09/2026	29/09/2026
56	ANALYSE DOSSIER PRO PAR MOA	22 jours	30/09/2026	29/10/2026
57	TRANSMISSION RICT PRO PAR MOA	0 jour	16/10/2026	16/10/2026
58	REPRISE SELON RETOUR MOA	30 jours	16/10/2026	27/11/2026
59	VALIDATION PRO PAR OS	0 jour	27/11/2026	27/11/2026
60	**DIAGNOSTICS COMPLEMENTAIRES**	38 jours	06/03/2026	30/04/2026
61	RECEPTION RAPPORT - DIAGNOSTICS COMPLEMENTAIRES - GEORADAR-RESEAUX	0 jour	06/03/2026	06/03/2026
62	RECEPTION RAPPORT - DIAGNOSTICS COMPLEMENTAIRES - POLLUTION DU SOL	0 jour	16/03/2026	16/03/2026
63	RECEPTION RAPPORT - DIAGNOSTICS COMPLEMENTAIRES - STRUCTURE	0 jour	30/04/2026	30/04/2026
64	RECEPTION RAPPORT - DIAGNOSTICS COMPLEMENTAIRES - SONDAGES GEOTECHNIQUE G2	0 jour	30/04/2026	30/04/2026
68	**CONCEPTION CONTINUITE DES RESEAUX**	120 jours	23/01/2026	17/07/2026
70	REPERAGE/RECOLEMENT DES RESEAUX	60 jours	23/01/2026	17/04/2026
71	PROPOSITION DEVOIEMENTS	40 jours	20/04/2026	18/06/2026
72	VALIDATION DEVOIEMENT MOA (MAINTENEUR EN PLACE)	20 jours	19/06/2026	17/07/2026
74	**PRE INSTRUCTION PC**	130 jours	01/10/2025	07/04/2026
77	**PHASE DEMARCHES ADMINISTRATIVES**	240 jours	28/11/2025	01/12/2026
78	**ICPE**	83 jours	28/11/2025	01/04/2026
79	ELABORATION DU DOSSIER ICPE (REGIME DE DECLARATION)	33 jours	28/11/2025	21/01/2026
81	TRANSMISSION A LA MOA	0 jour	21/01/2026	21/01/2026
82	ECHANGES ET VALIDATION MOA	21 jours	07/01/2026	04/02/2026
83	DECLARATION EN LIGNE AU SERVICE INSTRUCTEUR	0 jour	04/02/2026	04/02/2026
84	INSTRUCTION ICPE	40 jours	05/02/2026	01/04/2026
85	**DOSSIER LOI SUR EAU - DECLARATIF**	150 jours	06/03/2026	23/10/2026
86	DIFFUSION AMENAGEMENTS EXTERIEURS - PC A LA MOA	0 jour	06/03/2026	06/03/2026
87	DIFFUSION NOTE DE GESTION DES EP - PC A LA MOA	0 jour	06/03/2026	06/03/2026
88	RECEPTION RESULTATS SONDAGES POLLUTION SOLS	0 jour	16/03/2026	16/03/2026
89	ETUDES DLE A CHARGE MOA	25 jours	16/03/2026	20/04/2026
90	DEPOT DU DOSSIER LOI SUR EAU A CHARGE MOA	0 jour	20/04/2026	20/04/2026
91	INSTRUCTION DLE	40 jours	21/04/2026	19/06/2026
92	COMPLETUDE DLE	20 jours	22/06/2026	20/07/2026
93	INSTRUCTION DLE COMPLETEE	39 jours	21/07/2026	25/09/2026
94	ACCORD DLE	20 jours	28/09/2026	23/10/2026
95	**GH 65**	100 jours	02/03/2026	27/07/2026
96	ELABORATION DU DOSSIER GH65	30 jours	02/03/2026	13/04/2026
97	ECHANGES ET VALIDATION MOA	10 jours	14/04/2026	27/04/2026
98	INSTRUCTION	3 mois	28/04/2026	27/07/2026
99	DEBUT DES TRAVAUX	0 jour	27/07/2026	27/07/2026
100	**PERMIS DE CONSTRUIRE PRECAIRE - MODULAIRES**	192 jours	05/01/2026	07/10/2026
101	PREPARATION DOSSIER	32 jours	05/01/2026	17/02/2026
102	VALIDATION DOSSIER PAR CAD	10 jours	18/02/2026	03/03/2026
103	DEPOSE EN MAIRIE	0 jour	03/03/2026	03/03/2026
104	DEMANDE COMPLEMENTS	20 jours	04/03/2026	31/03/2026

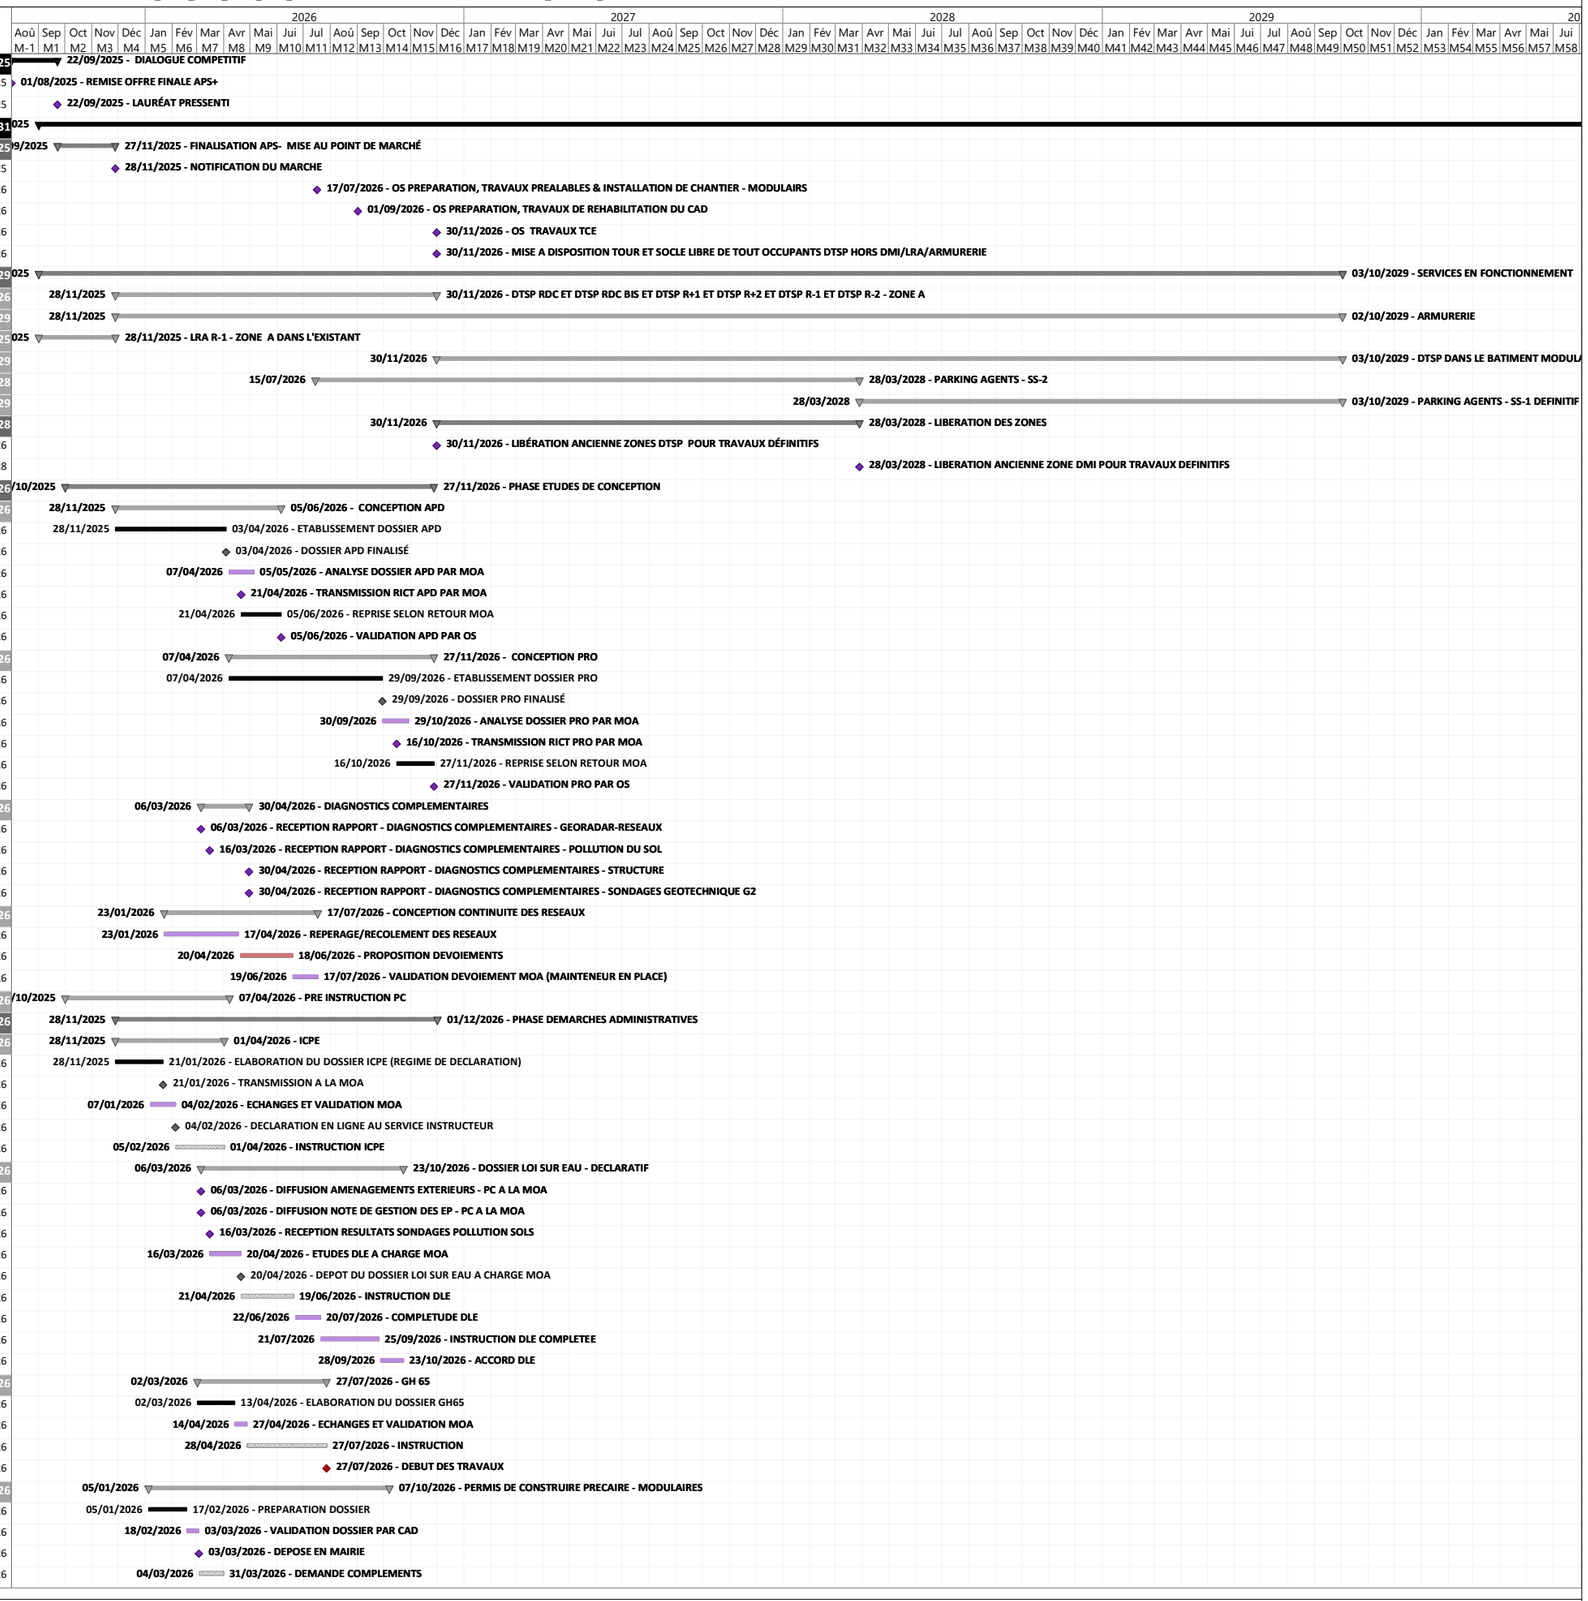

CENTRE ADMINISTRATIF DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE

VCF_CAD_APD_ORG_CAL_CALENDRIER ENVELOPPE DES TRAVAUX_020705_0


N°	Nom	Durée	Début	Fin
105	COMPLÉTUDE	10 jours	01/04/2026	15/04/2026
106	INSTRUCTION	3 mois	16/04/2026	15/07/2026
107	OBTENTION PC	0 jour	15/07/2026	15/07/2026
108	RECOURS DE TIERS	2 mois	16/07/2026	09/09/2026
109	RETRAIT ADMINISTRATIF	3 mois	16/07/2026	07/10/2026
110	DEBUT INSTALLATION MODULAIRES (SANS RECOURS , SANS RETRAIT)	0 jour	17/07/2026	17/07/2026
111	**PERMIS DE CONSTRUIRE PROJET CAD - MODIF DP**	**254 jours**	**28/11/2025**	**01/12/2026**
113	**PREPARATION DOSSIER**	**86 jours**	**28/11/2025**	**07/04/2026**
114	RÉALISATION DOSSIERS ADM - PC	69 jours	28/11/2025	06/03/2026
115	ENVOI DES DOSSIERS ADM-PC À LA MOA	0 jour	06/03/2026	06/03/2026
116	ECHANGES/ VALIDATION DES DOSSIERS ADM-PC PAR LA MOA	20 jours	09/03/2026	03/04/2026
117	MISE A JOUR SUITE REMARQUES	15 jours	17/03/2026	07/04/2026
118	DÉPOSE DOSSIER EN MAIRIE	0 jour	07/04/2026	07/04/2026
121	INSTRUCTION ADM-PC SANS PPVE	5 mois	08/04/2026	01/09/2026
122	OBTENTION ADM-PC	0 jour	01/09/2026	01/09/2026
123	RÉCEPTION AUTORISATION DE TRAVAUX	0 jour	01/09/2026	01/09/2026
124	RECOURS DE TIERS	43 jours	02/09/2026	30/10/2026
125	RETRAIT ADMINISTRATIF	64 jours	02/09/2026	01/12/2026
126	PC PURGÉ	0 jour	01/12/2026	01/12/2026
131	**PHASE DES ETUDES ET TRAVAUX PREALABLES**	**633 jours**	**28/11/2025**	**19/07/2028**
132	**CONSULTATIONS ENTREPRISES POUR TRAVAUX PREALABLES**	**125 jours**	**28/11/2025**	**05/06/2026**
136	**ETUDES - CURAGE ET DEPOLLUTION**	**35 jours**	**08/06/2026**	**27/07/2026**
140	**ETUDES -DEVOIEMENTS ET CONSIGNATIONS**	**95 jours**	**20/04/2026**	**18/09/2026**
155	**INSTALLATION STRUCTURES MODULAIRES COUR PRADINES POUR DTSP**	**216 jours**	**08/01/2026**	**30/11/2026**
160	COMMANDE MODULAIRES	60 jours	17/04/2026	17/07/2026
162	INSTALLATIONS DE CHANTIER	11 jours	17/07/2026	31/07/2026
163	DEMOLITION/CURAGE	11 jours	17/07/2026	31/07/2026
164	TERRASSEMENT ET FONDATION	20 jours	20/07/2026	14/08/2026
165	ALIMENTATION DES MODULAIRES DEPUIS LE CAD	20 jours	20/07/2026	14/08/2026
166	INSTALLATION DES MODULAIRES	21 jours	03/08/2026	04/09/2026
167	TRAVAUX CET/CEA DANS LES MODULAIRES	45 jours	04/09/2026	06/11/2026
170	RECEPTION	0 jour	09/11/2026	09/11/2026
171	LEVEE DES RESERVES	4 jours	09/11/2026	13/11/2026
172	DÉMENAGEMENT SERVICES DTSP DANS LES MODULAIRES	11 jours	16/11/2026	30/11/2026
173	INSTALLATION BASE VIE CURAGE ET DEPOLLUTION	40 jours	22/09/2026	18/11/2026
174	DEVOIEMENTS ET CONSIGNATION DES 1ERS RESEAUX	60 jours	21/09/2026	14/12/2026
175	TRAVAUX ISOLEMENT DMI-CHANTIER	20 jours	18/11/2026	15/12/2026
176	**IGH -CURAGE ET DÉPOLLUTION**	**276 jours**	**01/12/2026**	**27/01/2028**
177	**IGH - CURAGE**	**156 jours**	**01/12/2026**	**20/07/2027**
181	**IGH - DESAMIANTAGE**	**260 jours**	**30/12/2026**	**27/01/2028**
187	**SOCLE -ZONES HORS DMI**	**221 jours**	**01/12/2026**	**03/11/2027**
188	**SOCLE HORS DMI - CURAGE**	**206 jours**	**01/12/2026**	**12/10/2027**
204	**SOCLE HORS DMI - DESAMIANTAGE**	**211 jours**	**15/12/2026**	**03/11/2027**
219	**SOCLE HORS DMI - CURAGE FACADE**	**100 jours**	**01/06/2027**	**03/11/2027**
224	**SOCLE -ZONES DMI +ZONES ADJACENTES**	**75 jours**	**29/03/2028**	**19/07/2028**
225	**SOCLE - ZONE DMI - CURAGE**	**40 jours**	**29/03/2028**	**29/05/2028**
230	**SOCLE - ZONE DMI - DESAMIANTAGE**	**60 jours**	**20/04/2028**	**19/07/2028**
236	**PHASE DES ETUDES ET TRAVAUX DEFINITIFS**	**831 jours**	**31/03/2026**	**27/09/2029**
237	**INSTALLATION DE CHANTIER**	**140 jours**	**09/10/2026**	**04/05/2027**
248	**ETUDES D'EXECUTION**	**572 jours**	**30/06/2026**	**24/11/2028**
250	**STRUCTURE**	**537 jours**	**02/09/2026**	**24/11/2028**
258	**CET**	**517 jours**	**30/09/2026**	**23/11/2028**
269	**PLANS DE SYNTHESE TECHNIQUE**	**420 jours**	**09/02/2027**	**09/11/2028**
274	**MENUISERIES EXTERIEURES**	**260 jours**	**09/09/2026**	**06/10/2027**
275	**PROTOTYPE**	**130 jours**	**09/09/2026**	**18/03/2027**
286	**ETUDES ASCENSEURS**	**200 jours**	**30/06/2026**	**30/04/2027**
291	**TRAVAUX DE REHABILITATION**	**631 jours**	**05/02/2027**	**27/09/2029**
294	**TRAVAUX TOUR**	**538 jours**	**05/02/2027**	**02/05/2029**
295	**TRAVAUX DE GO**	**183 jours**	**20/07/2027**	**26/04/2028**
304	**TRAVAUX DE C&C**	**160 jours**	**22/09/2027**	**16/05/2028**
307	**TOUR CES**	**538 jours**	**05/02/2027**	**02/05/2029**
308	**COLONNES MONTANTES**	**100 jours**	**08/03/2028**	**02/08/2028**
315	**ETAGE TOUR R+23**	**127 jours**	**29/12/2027**	**29/06/2028**
329	**ETAGE TOUR R+22**	**127 jours**	**13/01/2028**	**18/07/2028**
343	**ETAGE TOUR R+21**	**127 jours**	**13/01/2028**	**18/07/2028**
357	**ETAGE TOUR R+20**	**127 jours**	**13/01/2028**	**18/07/2028**
371	**ETAGE TOUR R+19**	**127 jours**	**13/01/2028**	**18/07/2028**
385	**ETAGE TOUR R+18**	**139 jours**	**13/01/2028**	**03/08/2028**
399	**ETAGE TOUR R+17**	**139 jours**	**13/01/2028**	**03/08/2028**
413	**ETAGE TOUR R+16**	**139 jours**	**13/01/2028**	**03/08/2028**
427	**ETAGE TOUR R+15**	**139 jours**	**13/01/2028**	**03/08/2028**
441	**ETAGE TOUR R+14**	**127 jours**	**17/02/2028**	**04/09/2028**

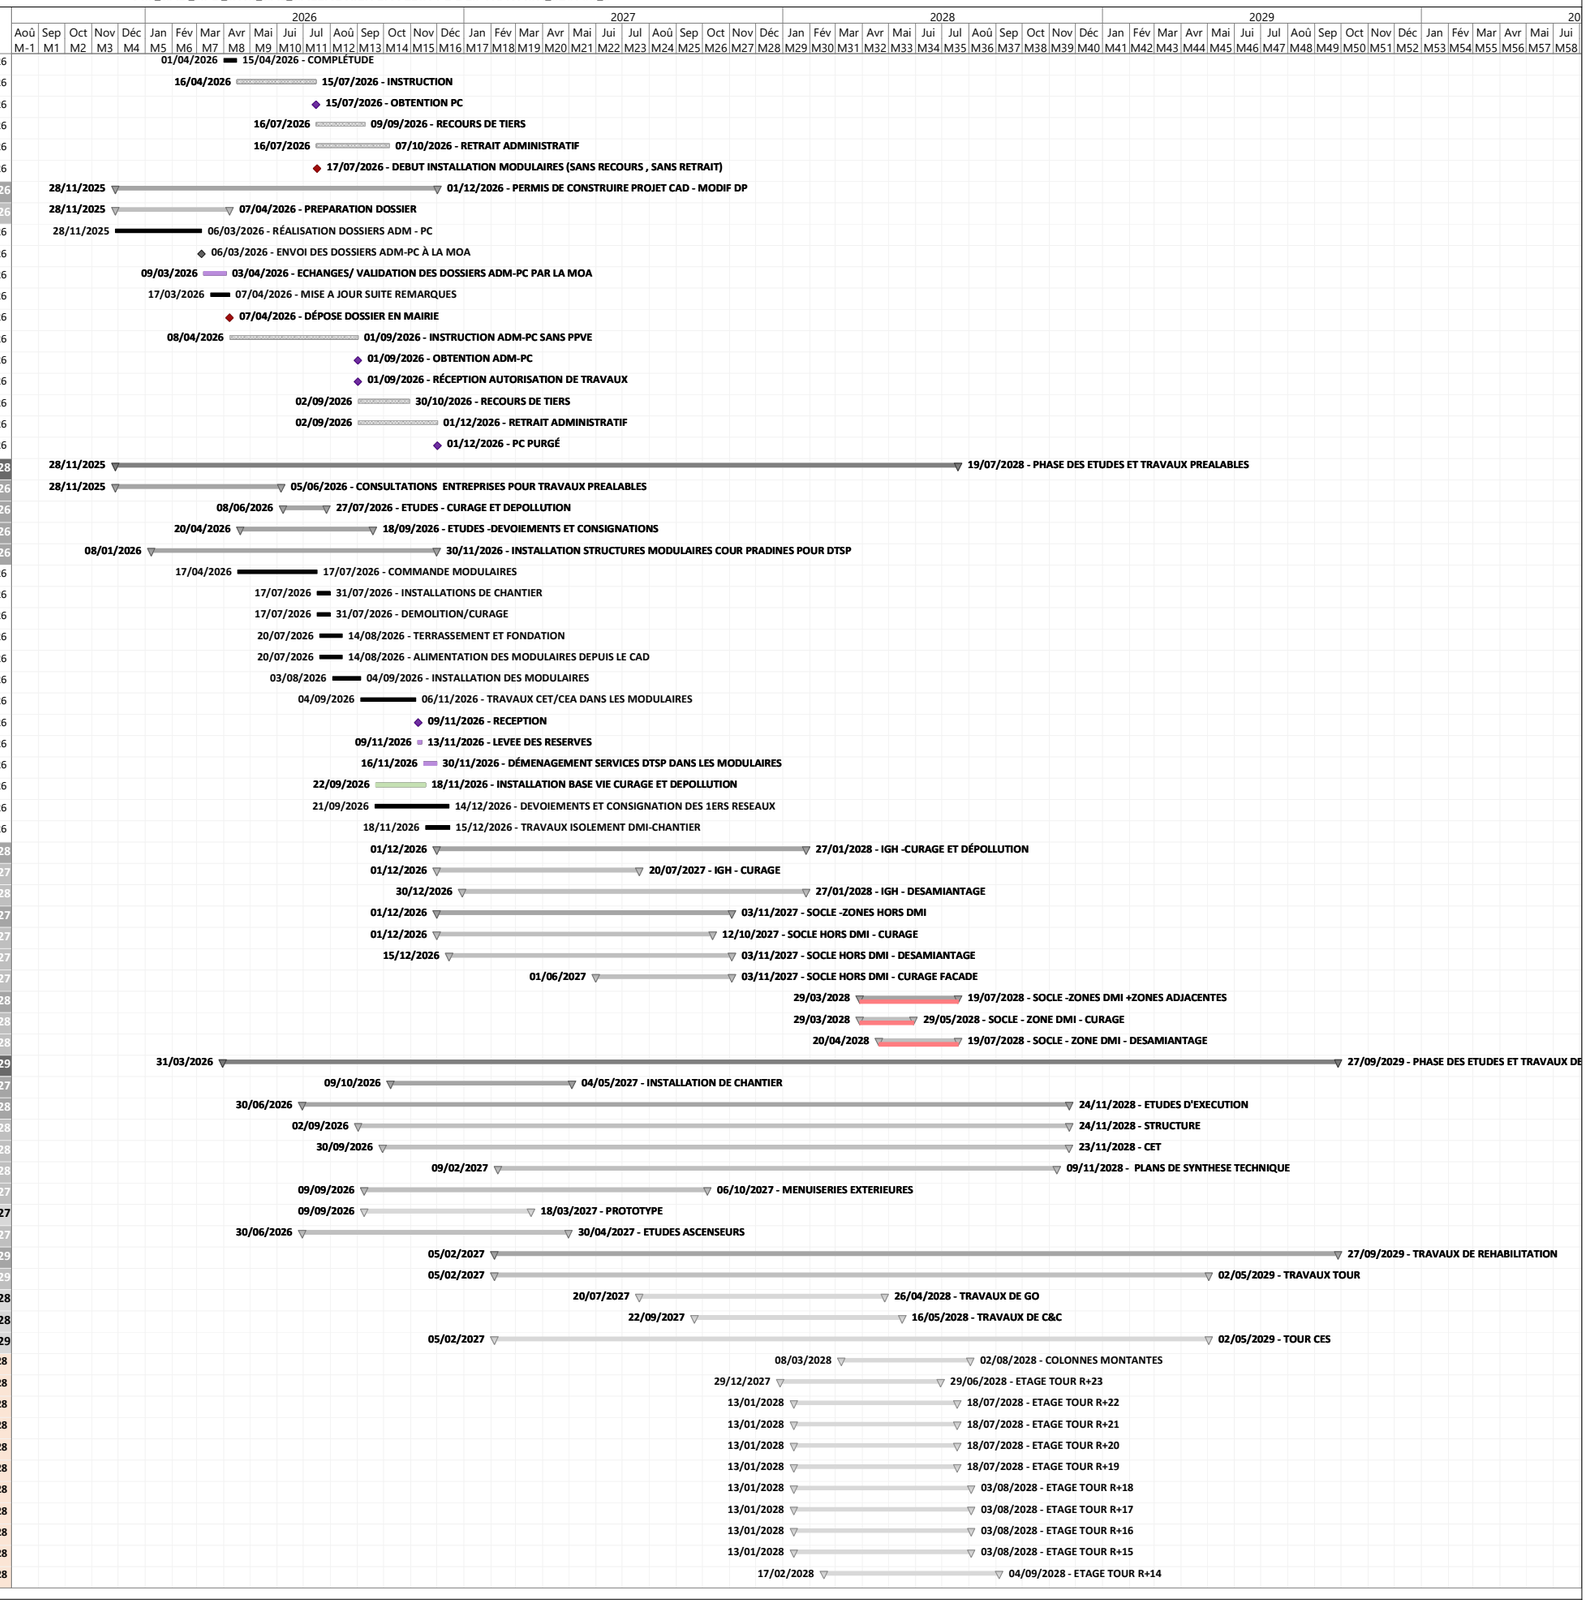

CENTRE ADMINISTRATIF DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE

VCF_CAD_APD_ORG_CAL_CALENDRIER ENVELOPPE DES TRAVAUX_020705_0

N°	Nom	Durée	Début	Fin
455	**ETAGE TOUR R+13**	**127 jours**	**09/02/2028**	**11/08/2028**
469	**ETAGE TOUR R+12**	**127 jours**	**09/02/2028**	**11/08/2028**
483	**ETAGE TOUR R+11**	**127 jours**	**23/02/2028**	**08/09/2028**
497	**ETAGE TOUR R+10**	**127 jours**	**23/02/2028**	**08/09/2028**
511	**ETAGE TOUR R+09**	**127 jours**	**23/02/2028**	**08/09/2028**
525	**ETAGE TOUR R+08**	**127 jours**	**23/02/2028**	**08/09/2028**
539	**ETAGE TOUR R+07**	**127 jours**	**27/04/2028**	**13/11/2028**
553	**ETAGE TOUR R+06**	**127 jours**	**27/04/2028**	**13/11/2028**
567	**ETAGE TOUR R+05**	**127 jours**	**27/04/2028**	**13/11/2028**
581	**ETAGE TOUR R+04**	**127 jours**	**27/04/2028**	**13/11/2028**
595	**ETAGE TOUR R+24**	**127 jours**	**27/04/2028**	**13/11/2028**
610	**CIRCULATIONS VERTICALES**	**520 jours**	**05/02/2027**	**05/04/2029**
612	**BATTERIE HAUTE R+14 AU R 27**	**410 jours**	**05/04/2027**	**27/12/2028**
620	**PALIERS BATTERIE HAUTE DU R+14 AU R+27**	**70 jours**	**24/10/2028**	**08/02/2029**
626	**BATTERIE BASSE RDC AU R+14**	**280 jours**	**22/11/2027**	**25/01/2029**
634	**PALIERS BATTERIE BASE DU RDC AU R+14**	**80 jours**	**06/12/2028**	**05/04/2029**
640	ETAGE TOUR R+26 - ESPACE POLYVALENT	80 jours	18/07/2028	21/11/2028
641	TRAVAUX ETAGES TECHNIQUES R+25 -R+26	200 jours	29/06/2028	02/05/2029
642	**TRAVAUX SOCLE**	**547 jours**	**08/06/2027**	**27/09/2029**
643	**ZONE A SOCLE**	**547 jours**	**08/06/2027**	**27/09/2029**
644	**ZONE A SURFACES NON -IMPACTÉES PAR LA DMI ET LES ACCÈS**	**547 jours**	**08/06/2027**	**27/09/2029**
645	**GO-ZONE A HORS DMI**	**243 jours**	**03/11/2027**	**09/11/2028**
647	**ESCALIER FILES 10-11/M-L -HORS DMI**	**95 jours**	**04/11/2027**	**23/03/2028**
651	**ESCALIER FILES 8-9/M-L HORS DMI**	**95 jours**	**26/11/2027**	**13/04/2028**
656	**C&C -ZONE A HORS ZONE DMI**	**312 jours**	**28/07/2027**	**22/11/2028**
672	**CES -ZONE A HORS DMI**	**508 jours**	**08/06/2027**	**20/07/2029**
673	**SS-3**	**275 jours**	**08/06/2027**	**28/07/2028**
681	**SS-2**	**296 jours**	**14/09/2027**	**05/12/2028**
703	**SS-1**	**403 jours**	**03/11/2027**	**06/07/2029**
726	**R+2 HORS HALL**	**443 jours**	**08/09/2027**	**06/07/2029**
748	**R+1 HORS HALL**	**433 jours**	**06/10/2027**	**20/07/2029**
770	**RDC HORS HALL**	**151 jours**	**09/11/2028**	**25/06/2029**
791	**RDC BIS HORS HALL**	**122 jours**	**09/11/2028**	**14/05/2029**
812	ETAGE TOUR R+03	80 jours	06/12/2028	05/04/2029
813	TRAVAUX DE FINITIONS CEA NON IMPACTANT POUR LES ESSAIS	39 jours	23/07/2029	27/09/2029
814	**ZONE A -ANCIENNE DMI - RDC ET RDCBIS**	**282 jours**	**12/07/2028**	**25/09/2029**
815	**GO- ZONE A ZONE DMI**	**165 jours**	**12/07/2028**	**26/03/2029**
818	**PATIO FILE 1-2 / K'-L'**	**70 jours**	**20/07/2028**	**09/11/2028**
822	**ESCALIER FILES 5-6/M-L**	**95 jours**	**20/07/2028**	**14/12/2028**
826	**ESCALIER FILES 2-3/M-L**	**130 jours**	**10/08/2028**	**05/03/2029**
830	**AJOUT PLANCHERS**	**83 jours**	**12/07/2028**	**21/11/2028**
836	**OUVRAGES DIVERS**	**100 jours**	**26/10/2028**	**26/03/2029**
839	**C&C - ZONE A DMI**	**33 jours**	**04/10/2028**	**20/11/2028**
843	**CET - COLONNES MONTANTES -ZONE A DMI**	**90 jours**	**15/12/2028**	**30/04/2029**
846	**CES- ZONE A DMI**	**159 jours**	**22/11/2028**	**17/07/2029**
888	TRAVAUX DE FINITIONS CEA NON IMPACTANT POUR LES ESSAIS	40 jours	18/07/2029	25/09/2029
889	**ZONE B SOCLE**	**457 jours**	**14/09/2027**	**02/08/2029**
891	**ZONE B - TRAVAUX GO**	**215 jours**	**14/09/2027**	**28/07/2028**
892	**GO -ZONE B**	**195 jours**	**14/09/2027**	**29/06/2028**
893	**ZONE B1**	**175 jours**	**14/09/2027**	**31/05/2028**
912	**ZONE B2**	**130 jours**	**14/09/2027**	**23/03/2028**
927	**GO - ZONE PARKING HORS SS-2**	**215 jours**	**14/09/2027**	**28/07/2028**
929	**ZONE RAMPE**	**50 jours**	**15/09/2027**	**25/11/2027**
933	**ZONE PB R-3**	**145 jours**	**26/11/2027**	**29/06/2028**
939	**OUVRAGES DIVERS**	**105 jours**	**25/02/2028**	**28/07/2028**
943	C&C - ZONE B	120 jours	01/06/2028	04/12/2028
944	**CES - ZONE B**	**250 jours**	**17/05/2028**	**05/06/2029**
963	TRAVAUX DE FINITIONS CEA NON IMPACTANT POUR LES ESSAIS	42 jours	06/06/2029	02/08/2029
964	**TRAVAUX SOCLE ACCES HALL**	**188 jours**	**28/09/2028**	**04/07/2029**
1003	**PHASE PREPARATION A LA RECEPTION**	**224 jours**	**24/10/2028**	**02/10/2029**
1004	**PREREQUIS COMMISSION DE SECURITE**	**192 jours**	**24/10/2028**	**03/08/2029**
1050	**PERIODE DE RECEPTION**	**116 jours**	**04/04/2029**	**02/10/2029**
1076	RECEPTION HORS ZONE MODULAIRES DE LA COUR PRADINES	0 jour	02/10/2029	02/10/2029
1077	LEVEE DE RESERVES	40 jours	03/10/2029	28/11/2029
1078	**TRAVAUX COUR PRADINES - APRÈS LA RECEPTION**	**105 jours**	**03/10/2029**	**01/03/2030**
1079	DEMENAGEMENT DTSP	5 jours	03/10/2029	09/10/2029
1080	DEPOSE ET EVACUATION STRUCTURES MODULAIRES	20 jours	10/10/2029	07/11/2029
1081	TRAVAUX DE REPRISE AU NIVEAUX DE LA COUR PRADINES	80 jours	08/11/2029	01/03/2030
1082	**GPA**	**496 jours**	**02/10/2029**	**19/09/2031**
1085	**COMMISSIONNEMENT**	**882 jours**	**03/04/2026**	**02/10/2029**
1092	PHASE D'EXPOITATION ET MAINTENANCE	1974 jours	02/10/2029	21/07/2038

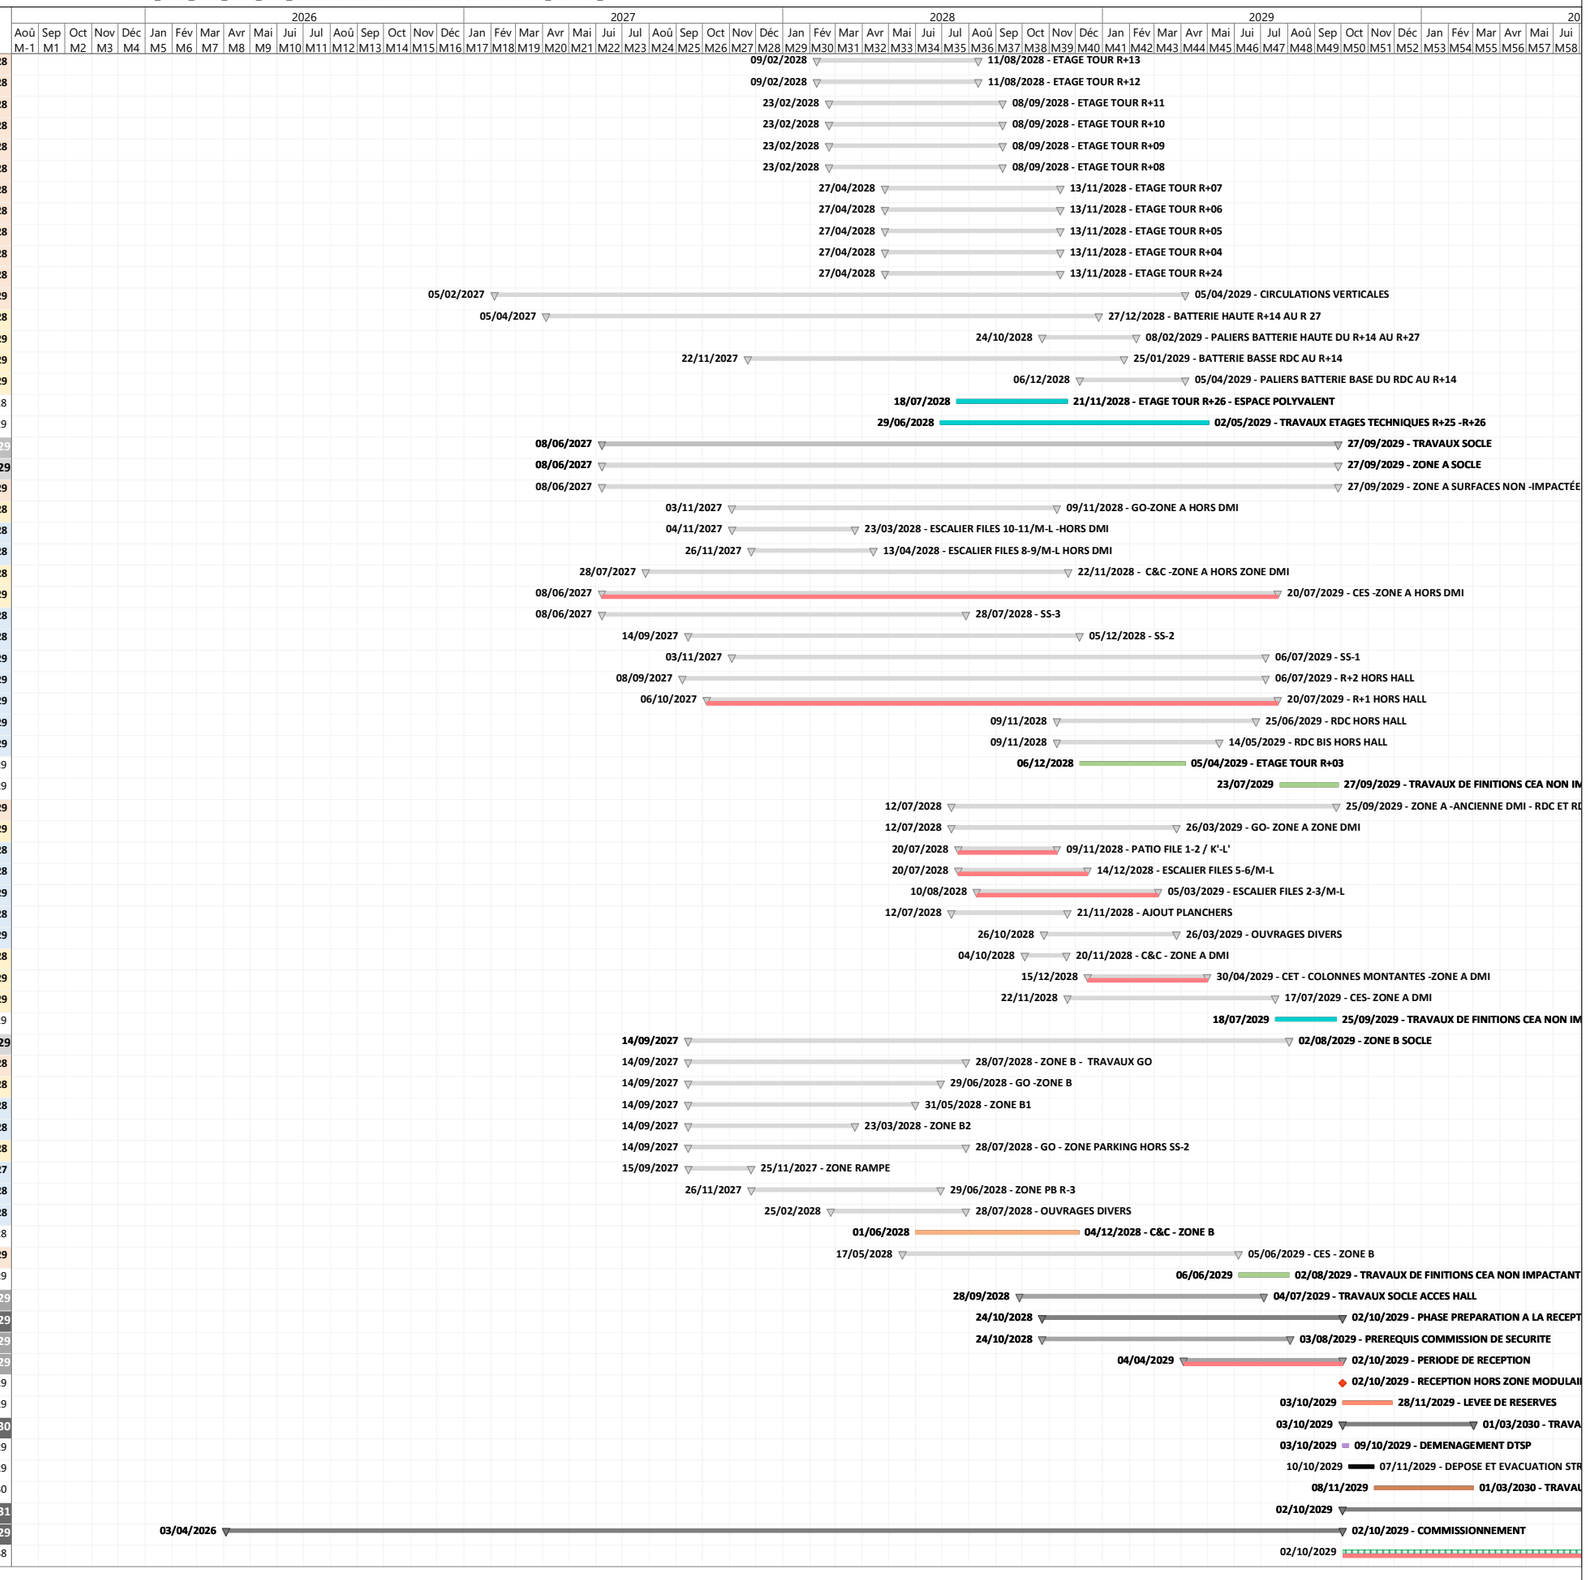

Projet : Gabarit
Date : 03/04/2026

Jalon	CEA	OPR - RECEPTION	VRD - Jalon	HL - CLI - Jalon	GO - Récap	Indicateur Libre 15 - Récap	Tâches externes
Récapitulatif	VRD	HL - CLI	MOE - MOA - Jalon	Récapitulatif du projet	CC - Récap	Indicateur Libre 16 - Récap	Jalons externes
Tâche	MOE - MOA	DEM-CUR - Jalon	TVX-SYN-BE - Jalon	Niveau 1	CES - Récap	Indicateur Libre 17 - Récap	Échéance
DEM-CUR	TVX-SYN-BE	GO - Jalon	Indicateur Libre 15 - Jalon	Niveau 2	CET - Récap	ESSAIS - Récap	Balise
GO	CURAGE - DESAMIANTAGE	CC - Jalon	Indicateur Libre 16 - Jalon	Niveau 3	CEA - Récap	OPR-REC - Récap	Fractionnement
CC	Indicateur Libre 16	CES - Jalon	Indicateur Libre 17 - Jalon	Niveau 4	VRD - Récap	HL-CLI - Récap	Jalon critique - ORDO
CES	Indicateur Libre 17	CET - Jalon	ESSAIS - Jalon	Niveau 5	MOE-MOA - Récap	Avancement Recap	Récapitulatif critique - ORDO
CET	ESSAIS	CEA - Jalon	OPR - RECEPTION - Jalon	DEM-CUR - Récap	TVX-SYN-BE - Récap	Avancement	Tâches critiques - ORDO
