ENVIRONNEMENT

AGENCE NORMANDIE

611 bis rue Paul Boucherot
14123 IFS
Tel : 0261535142
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

PREFECTURE DE LA REGION NORMANDIE
7 PLACE DE LA MADELEINE
76000 ROUEN

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX520789
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 25/09/2026
Reférence mandataire : Hôtel des douanes

DÉSIGNATION DU BIEN

Hôtel des douanes
13 Avenue du Mont Riboudet
76000 ROUEN

PROPRIÉTAIRE

PREFECTURE DE LA REGION NORMANDIE
7 PLACE DE LA MADELEINE
76000 ROUEN

Diagnostics

Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. — Présence

ENVIRONNEMENT

AGENCE NORMANDIE

611 bis rue Paul Boucherot
14123 IFS
Tel : 0261535142
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

PREFECTURE DE LA REGION NORMANDIE
7 PLACE DE LA MADELEINE
76000 ROUEN

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX520789
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 25/09/2026
Reférence mandataire : Hôtel des douanes

DÉSIGNATION DU BIEN

Hôtel des douanes
13 Avenue du Mont Riboudet
76000 ROUEN

PROPRIÉTAIRE

PREFECTURE DE LA REGION NORMANDIE
7 PLACE DE LA MADELEINE
76000 ROUEN

Diagnostics

Note de synthèse


AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. — Présence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 13 Avenue du Mont Riboudet 76000 ROUEN

Référence client : Hôtel des douanes

Désignation : Hôtel des douanes

Date de construction : Avant 1997

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
PREFECTURE DE LA REGION NORMANDIE
7 PLACE DE LA MADELEINE
76000 ROUEN

Donneur d'ordre :
PREFECTURE DE LA REGION NORMANDIE
7 PLACE DE LA MADELEINE
76000 ROUEN

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : BOURGOGNON Cyril

Accompagnateur : M. LINOT ()

Date de repérage 25/09/2026

Numéro attestation : CPDI5722

Délivré le : 27/07/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 13/10/2026

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 13/10/2026

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R+1 - Vol 1 (Bureau 1)	R+1 - Vol 2 (Bureau 2)
R+1 - Vol 3 (Bureau 3)	R+1 - Vol 4 (Bureau 4)
R+1 - Vol 5 (Bureau 5)	R+1 - Vol 6 (Bureau 6)
R+1 - Vol 7 (Bureau 7)	R+1 - Vol 8 (Bureau 8)
R+1 - Vol 9 (Dégagement)	R+1 - Vol 10 (Salle de réunion)
Rdc - Vol 11 (Archives)	Rdc - Vol 12 (Hall)
Rdc - Vol 13 (Vestiaire)	Rdc - Vol 14 (Extérieur 1)
Facade 1 - Vol 15 (Extérieur 2)	Facade 2 - Vol 16 (Extérieur 3)
Facade 3 - Vol 17	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
murs rideaux - Facades	Inaccessible sans sondage destructif	joint compribande

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Réfection complete : Selon plan fournis par le client

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Extension : Selon plan fournis par le client

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 1 (Bureau 1) - Vol 2 (Bureau 2) - Vol 3 (Bureau 3) - Vol 5 (Bureau 5) - Vol 6 (Bureau 6) - Vol 7 (Bureau 7) - Vol 8 (Bureau 8) - Vol 9 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 1 (Bureau 1) - Vol 3 (Bureau 3) - Vol 4 (Bureau 4) - Vol 5 (Bureau 5) - Vol 6 (Bureau 6) - Vol 7 (Bureau 7) - Vol 8 (Bureau 8) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 10 (Salle de réunion)	
Revêtement de sol	R+1	Vol 1 (Bureau 1) - Vol 2 (Bureau 2) - Vol 3 (Bureau 3) - Vol 4 (Bureau 4) - Vol 5 (Bureau 5) - Vol 6 (Bureau 6) - Vol 7 (Bureau 7) - Vol 8 (Bureau 8) - Vol 9 (Dégagement)	
Façades	R+1	Vol 2 (Bureau 2) - Vol 6 (Bureau 6)	
Parois verticales intérieures et enduits	Rdc	Vol 11 (Archives) - Vol 12 (Hall) - Vol 13 (Vestiaire)	
Plafond et faux-plafonds	Rdc	Vol 11 (Archives) - Vol 12 (Hall) - Vol 13 (Vestiaire) - Vol 14 (Extérieur 1)	
Revêtement de mur	Rdc	Vol 11 (Archives) - Vol 12 (Hall) - Vol 13 (Vestiaire)	

Revêtement de sol	Rdc	Vol 11 (Archives) - Vol 13 (Vestiaire) - Vol 14 (Extérieur 1)
Façades	Rdc	Vol 14 (Extérieur 1)
Voies et réseaux divers	Rdc	Vol 14 (Extérieur 1)
Façades	Facade 1	Vol 15 (Extérieur 2)
Parois verticales intérieures et enduits	Facade 1	Vol 15 (Extérieur 2)
Façades	Facade 2	Vol 16 (Extérieur 3)
Façades	Facade 3	Vol 17

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 3 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P15 Phase 1
Vol 3 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P15 Phase 2
Vol 3 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P16
Vol 6 (Bureau 6)	Façades	Menuiseries	Joint de structure	P29
Vol 15 (Extérieur 2)	Façades	Menuiseries	Joint de structure	P29
Vol 16 (Extérieur 3)	Façades	Menuiseries	Joint de structure	P29
Vol 17	Façades	Menuiseries	Joint de structure	P29
Vol 6 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P33 Phase 1
Vol 8 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P33 Phase 1
Vol 7 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P33 Phase 1
Vol 5 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P33 Phase 1
Vol 4 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P33 Phase 1
Vol 3 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P33 Phase 1
Vol 2 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P33 Phase 1
Vol 6 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P33 Phase 2
Vol 8 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P33 Phase 2
Vol 7 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P33 Phase 2
Vol 5 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P33 Phase 2
Vol 4 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P33 Phase 2
Vol 3 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P33 Phase 2
Vol 2 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P33 Phase 2
Vol 6 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P34
Vol 5 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P34
Vol 7 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P34
Vol 8 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P34
Vol 4 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P34
Vol 3 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P34
Vol 2 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P34
Vol 12 (Hall)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	P43
Vol 15 (Extérieur 2)	Façades	Menuiseries	Isolant + colle bitumineuse	S66

Vol 16 (Extérieur 3)	Façades	Menuiseries	Isolant + colle bitumineuse	S67
Vol 17	Façades	Menuiseries	Isolant + colle bitumineuse	S68

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Materiau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'acces à mettre en oeuvre
murs rideaux - Facades		Inaccessible sans sondage destructif	joint compribande	

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Commentaire n°1 : Le bâtiment étant en activité, le sondage destructif pour la recherche d'un joint compribande entre la maçonnerie et le mur rideau en façade n'est pas réalisable avant le démarrage des travaux, les allèges et un joint de strucure étants déjà positifs, nous préconisons de considéré également la présence d'un joint compribande amianté sur la périphérie des murs rideau en attendant cette investiguation.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Façades

2 - Parois verticales intérieures et enduits

3 - Plafond et faux-plafonds

4 - Revêtement de sol

5 - Revêtement de mur

6 - Voies et réseaux divers

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 2 (Bureau 2)	Menuiseries	Joint de structure	P11	Réalisation d'un prélevement		002EX 52078 9 n°11 - 1	P11	Matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Bureau 2)	Menuiseries	Joint de structure	P12	Réalisation d'un prélevement		002EX 52078 9 n°12 - 1	P12	Matériau souple incolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Bureau 2)	Appui de fenêtre	Ciment	P24	Réalisation d'un prélevement			P24	Peinture + enduit compact gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Bureau 6)	Menuiseries	Joint de structure	P29	Réalisation d'un prélevement			P29	Peinture + matériau compact gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Facade 1	Vol 15 (Extérieur 2)	Menuiseries	Joint de structure	S65 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29			P29	Peinture + matériau compact gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Facade 2	Vol 16 (Extérieur 3)	Menuiseries	Joint de structure	S63 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29			P29	Peinture + matériau compact gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Facade 3	Vol 17	Menuiseries	Joint de structure	S64 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29			P29	Peinture + matériau compact gris non séparable	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 6 (Bureau 6)	Menuiseries	Joint de structure	P30	Réalisation d'un prélevement			P30	Peinture + matériau souple blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14 (Extérieur 1)	Murs	Enduit ciment	P57	Réalisation d'un prélevement		002EX52078 9 n°57 - 1	P57	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14 (Extérieur 1)	Murs	Enduit ciment	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002EX52078 9 n°57 - 1	P57	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facade 1	Vol 15 (Extérieur 2)	Murs	Enduit ciment	P58	Réalisation d'un prélevement		002EX52078 9 n°58 - 1	P58	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facade 3	Vol 17	Murs	Enduit ciment	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002EX52078 9 n°58 - 1	P58	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 14 (Extérieur 1)	Murs	Enduit ciment	P59	Réalisation d'un prélevement		002EX 52078 9 n°59 - 1 - 002EX 52078 9 n°59 - 2	P59	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14 (Extérieur 1)	Murs	Enduit ciment	P59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002EX 52078 9 n°59 - 1 - 002EX 52078 9 n°59 - 2	P59	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facade 1	Vol 15 (Extérieur 2)	Murs	Joint de scellement	P60	Réalisation d'un prélevement			P60	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Facade 3	Vol 17	Murs	Joint de scellement	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60			P60	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Facade 1	Vol 15 (Extérieur 2)	Murs	Enduit ciment	P61	Réalisation d'un prélevement			P61	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Facade 1	Vol 15 (Extérieur 2)	Menuiseries	Joint de structure	P62	Réalisation d'un prélevement			P62	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facade 1	Vol 15 (Extérieur 2)	Murs	Enduit ciment	P65	Réalisation d'un prélevement		002EX 52078 9 n°65 - 1	P65	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facade 3	Vol 17	Murs	Enduit ciment	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EX 52078 9 n°65 - 1	P65	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facade 1	Vol 15 (Extérieur 2)	Menuiseries	Reprise d'étanchéïté	P66	Réalisation d'un prélevement		002EX 52078 9 n°66 - 1	P66	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Facade 1	Vol 15 (Extérieur 2)	Menuiseries	Reprise d'étanchéïté	P66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EX 52078 9 n°66 - 1	P66	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Facade 2	Vol 16 (Extérieur 3)	Menuiseries	Reprise d'étanchéïté	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EX 52078 9 n°66 - 1	P66	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Facade 3	Vol 17	Menuiseries	Reprise d'étanchéïté	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EX 52078 9 n°66 - 1	P66	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facade 1	Vol 15 (Extérieur 2)	Murs	Étanchéité	P67	Réalisation d'un prélevement		002EX 52078 9 n°67 - 1	P67	Matériau bitumineux noir + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facade 3	Vol 17	Murs	Étanchéité	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EX 52078 9 n°67 - 1	P67	Matériau bitumineux noir + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facade 2	Vol 16 (Extérieur 3)	Murs	Enduit ciment	P68	Réalisation d'un prélevement			P68	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facade 2	Vol 16 (Extérieur 3)	Murs	Enduit ciment	P68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68			P68	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facade 2	Vol 16 (Extérieur 3)	Murs	Joint de scellement	P69	Réalisation d'un prélevement			P69	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Facade 1	Vol 15 (Extérieur 2)	Menuiseries	Isolant + colle bitumineuse	S66	Réalisation d'un sondage	allège menuiserie					Présence sur document
Facade 1	Vol 15 (Extérieur 2)	Menuiseries	Isolant + colle bitumineuse	S66	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S66	allège menuiserie					Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facade 2	Vol 16 (Extérieur 3)	Menuiseries	Isolant + colle bitumineuse	S67	Réalisation d'un sondage	allège menuiserie					Présence sur document
Facade 2	Vol 16 (Extérieur 3)	Menuiseries	Isolant + colle bitumineuse	S67	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S67	allège menuiserie					Présence sur document
Facade 3	Vol 17	Menuiseries	Isolant + colle bitumineuse	S68	Réalisation d'un sondage	allège menuiserie					Présence sur document
Facade 3	Vol 17	Menuiseries	Isolant + colle bitumineuse	S68	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S68	allège menuiserie					Présence sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 9 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3	Réalisation d'un prélevement		002EX520789 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 1 (Bureau 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX520789 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 1 (Bureau 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX520789 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 1 (Bureau 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX520789 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 1 (Bureau 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX520789 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Bureau 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX520789 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX520789 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 1 (Bureau 1) - Vol 8 (Bureau 8) - Vol 9 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S43 - S44 - S45 - S46 - S47 - S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX520789 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Dégagement)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P6	Réalisation d'un prélevement		002EX520789 n°6 - 1	P6	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Dégagement)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX520789 n°6 - 1	P6	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Bureau 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P9	Réalisation d'un prélevement		002EX520789 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Bureau 2)	Menuiseries	Joint à lèvre	P10	Réalisation d'un prélevement		002EX520789 n°10 - 1	P10	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P13	Réalisation d'un prélevement		002EX520789 n°13 - 1	P13	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 2 (Bureau 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P14	Réalisation d'un prélevement		002EX520789 n°14 - 1	P14	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Bureau 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX520789 n°14 - 1	P14	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (Bureau 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	P19	Réalisation d'un prélevement			P19	Matériau fibreux avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (Bureau 5)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P20	Réalisation d'un prélevement			P20	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (Bureau 5)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20			P20	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (Bureau 7)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20			P20	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 9 (Dégagement)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20			P20	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (Bureau 5) - Vol 7 (Bureau 7) - Vol 9 (Dégagement)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P20 - S51 - S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20			P20	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (Bureau 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P21	Réalisation d'un prélevement			P21	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Bureau 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21			P21	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (Bureau 7)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21			P21	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 3 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21			P21	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Bureau 8) - Vol 7 (Bureau 7) - Vol 3 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S53 - S54 - S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21			P21	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 6 (Bureau 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P27	Réalisation d'un prélevement			P27	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Bureau 6)	Menuiseries	Joint à lèvre	P31	Réalisation d'un prélevement			P31	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Bureau 6)	Menuiseries	Mastic vitrier	P32	Réalisation d'un prélevement			P32	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Bureau 6)	Menuiseries	Mastic vitrier	P36	Réalisation d'un prélevement			P36	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 12 (Hall)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P40	Réalisation d'un prélevement			P40	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 12 (Hall)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40			P40	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 12 (Hall)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40			P40	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 12 (Hall)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S19 - S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40			P40	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 12 (Hall)	Menuiseries	Reprise d'étanchéïté	P42	Réalisation d'un prélevement		002EX 52078 9 n°42 - 1	P42	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 12 (Hall)	Menuiseries	Mastic vitrier	P43	Réalisation d'un prélevement		002EX 52078 9 n°43 - 1	P43	Matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
Rdc	Vol 12 (Hall)	Menuiseries	Joint de scellement	P44	Réalisation d'un prélevement		002EX 52078 9 n°44 - 1	P44	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 12 (Hall)	Menuiseries	Joint de scellement	P44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EX 52078 9 n°44 - 1	P44	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 13 (Vestiaire)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P45	Réalisation d'un prélevement		002EX 52078 9 n°45 - 1	P45	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 13 (Vestiaire)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EX 52078 9 n°45 - 1	P45	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 13 (Vestiaire)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EX 52078 9 n°45 - 1	P45	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 13 (Vestiaire)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EX 52078 9 n°45 - 1	P45	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11 (Archives)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EX 52078 9 n°45 - 1	P45	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11 (Archives)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EX 52078 9 n°45 - 1	P45	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11 (Archives)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EX 52078 9 n°45 - 1	P45	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 11 (Archives)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EX 52078 9 n°45 - 1	P45	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 13 (Vestiaire) - Vol 11 (Archives)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EX 52078 9 n°45 - 1	P45	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 13 (Vestiaire)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P47	Réalisation d'un prélevement		002EX 52078 9 n°47 - 1	P47	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11 (Archives)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P51	Réalisation d'un prélevement		002EX 52078 9 n°51 - 1	P51	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facade 1	Vol 15 (Extérieur 2)	Menuiseries	Joint à lèvre	P63	Réalisation d'un prélevement			P63	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Facade 1	Vol 15 (Extérieur 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P64	Réalisation d'un prélevement			P64	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 5 (Bureau 5)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	P22	Réalisation d'un prélevement		002EX 52078 9 n°22 - 2	P22	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (Bureau 5)	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P23	Réalisation d'un prélevement			P23	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Bureau 6)	Plafonds	Enduits ciment	P25	Réalisation d'un prélevement			P25	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (Bureau 5)	Plafonds	Enduits ciment	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25			P25	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Bureau 6)	Plafonds	Enduits ciment	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25			P25	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Salle de réunion)	Plafonds	Enduits ciment	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25			P25	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Bureau 8)	Plafonds	Enduits ciment	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25			P25	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 9 (Dégagement)	Plafonds	Enduits ciment	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25			P25	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 3 (Bureau 3)	Plafonds	Enduits ciment	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25			P25	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 4 (Bureau 4)	Plafonds	Enduits ciment	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25			P25	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (Bureau 5) - Vol 6 (Bureau 6) - Vol 10 (Salle de réunion) - Vol 8 (Bureau 8) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 3 (Bureau 3) - Vol 4 (Bureau 4)	Plafonds	Enduits ciment	S56 - S57 - S58 - S59 - S60 - S61 - S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25			P25	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Bureau 6)	Plafonds	Enduits ciment	P26	Réalisation d'un prélevement			P26	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (Bureau 5)	Plafonds	Enduits ciment	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26			P26	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 7 (Bureau 7)	Plafonds	Enduits ciment	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26			P26	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 1 (Bureau 1)	Plafonds	Enduits ciment	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26			P26	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (Bureau 5) - Vol 7 (Bureau 7) - Vol 1 (Bureau 1)	Plafonds	Enduits ciment	S40 - S41 - S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26			P26	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Bureau 6)	Plafonds	Enduit de rebouchage	P28	Réalisation d'un prélevement			P28	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Bureau 6)	Poutrelles	Enduits ciment	P37	Réalisation d'un prélevement			P37	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 3 (Bureau 3)	Poutrelles	Enduits ciment	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37			P37	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 4 (Bureau 4)	Poutrelles	Enduits ciment	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37			P37	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 5 (Bureau 5)	Poutrelles	Enduits ciment	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37			P37	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (Bureau 7)	Poutrelles	Enduits ciment	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37			P37	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Bureau 8)	Poutrelles	Enduits ciment	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37			P37	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Salle de réunion)	Poutrelles	Enduits ciment	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37			P37	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Dégagement)	Poutrelles	Enduits ciment	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37			P37	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 3 (Bureau 3) - Vol 4 (Bureau 4) - Vol 5 (Bureau 5) - Vol 7 (Bureau 7) - Vol 8 (Bureau 8) - Vol 10 (Salle de réunion) - Vol 9 (Dégagement)	Poutrelles	Enduits ciment	S21 - S22 - S23 - S24 - S25 - S26 - S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37			P37	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 12 (Hall)	Plafonds	Enduits plâtre	P41	Réalisation d'un prélevement		002EX520789 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 13 (Vestiaire)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	P46	Réalisation d'un prélevement		002EX520789 n°46 - 1	P46	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11 (Archives)	Plafonds	Enduits plâtre	P49	Réalisation d'un prélevement		002EX520789 n°49 - 1	P49	Enduit blanc + matériau fibreux beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 13 (Vestiaire)	Plafonds	Enduits plâtre	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EX520789 n°49 - 1	P49	Enduit blanc + matériau fibreux beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 11 (Archives)	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P50	Réalisation d'un prélevement		002EX 52078 9 n°50 - 1	P50	Peinture + enduit plâtreux en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 13 (Vestiaire)	Poutres et charpentes	Enduits ciment	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EX 52078 9 n°50 - 1	P50	Peinture + enduit plâtreux en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14 (Extérieur 1)	Plafonds	Enduits plâtre	P56	Réalisation d'un prélevement		002EX 52078 9 n°56 - 1	P56	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 1 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P1	Réalisation d'un prélevement		002EX 52078 9 n°1 - 1	P1	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 1 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P2	Réalisation d'un prélevement		002EX 52078 9 n°2 - 1	P2	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P4	Réalisation d'un prélevement		002EX 52078 9 n°4 - 1	P4	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P5	Réalisation d'un prélevement		002EX 52078 9 n°5 - 1	P5	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 1 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EX 52078 9 n°5 - 1	P5	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P7	Réalisation d'un prélevement		002EX 52078 9 n°7 - 1	P7	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P8	Réalisation d'un prélevement		002EX 52078 9 n°8 - 1	P8	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 3 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P15	Réalisation d'un prélevement		002EX 52078 9 n°15 - 1 - 002EX 52078 9 n°15 - 2	P15 Phase 1	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 3 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P15	Réalisation d'un prélevement		002EX520789 n°15 - 1 - 002EX520789 n°15 - 2	P15 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 3 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P16	Réalisation d'un prélevement		002EX520789 n°16 - 1	P16	Matériau compact gris hétérogène non séparable + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 4 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P17	Réalisation d'un prélevement		002EX520789 n°17 - 1	P17	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 4 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Chape maigre	P18	Réalisation d'un prélevement		002EX520789 n°18 - 1	P18	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P33	Réalisation d'un prélevement			P33 Phase 1	Dalle dure cassante grise	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 8 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S34 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33			P33 Phase 1	Dalle dure cassante grise	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 7 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S35 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33			P33 Phase 1	Dalle dure cassante grise	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 5 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S36 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33			P33 Phase 1	Dalle dure cassante grise	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 4 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S37 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33			P33 Phase 1	Dalle dure cassante grise	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 3 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S38 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33			P33 Phase 1	Dalle dure cassante grise	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 2 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S39 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33			P33 Phase 1	Dalle dure cassante grise	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 6 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P33	Réalisation d'un prélevement			P33 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 8 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S34 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33			P33 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 7 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S35 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33			P33 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 5 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S36 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33			P33 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 4 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S37 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33			P33 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 3 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S38 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33			P33 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 2 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S39 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33			P33 Phase 2	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 6 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P34	Réalisation d'un prélevement			P34	Matériau compact gris non séparable + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 5 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S28 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34			P34	Matériau compact gris non séparable + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 7 (Bureau 7)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S29 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34			P34	Matériau compact gris non séparable + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 8 (Bureau 8)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S30 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34			P34	Matériau compact gris non séparable + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 4 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S31 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34			P34	Matériau compact gris non séparable + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 3 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S32 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34			P34	Matériau compact gris non séparable + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 2 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S33 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34			P34	Matériau compact gris non séparable + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 3 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P35	Réalisation d'un prélevement		002EX520789 n°35 - 1	P35	Moquette grise + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P38	Réalisation d'un prélevement		002EX520789 n°38 - 2	P38	Matériau blanc + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 13 (Vestiaire)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P48	Réalisation d'un prélevement		002EX520789 n°48 - 1	P48	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11 (Archives)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EX520789 n°48 - 1	P48	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14 (Extérieur 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P53	Réalisation d'un prélevement		002EX520789 n°53 - 1	P53	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 12 (Hall)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P39	Réalisation d'un prélevement		002EX520789 n°39 - 1	P39	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11 (Archives)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P52	Réalisation d'un prélevement		002EX520789 n°52 - 1	P52	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11 (Archives)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EX520789 n°52 - 1	P52	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 13 (Vestiaire)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EX520789 n°52 - 1	P52	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11 (Archives) - Vol 13 (Vestiaire)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P52 - S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EX520789 n°52 - 1	P52	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers


Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 14 (Extérieur 1)	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	P70	Réalisation d'un prélevement		002EX520789 n°54 - 1	P70	Bitume couche et sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14 (Extérieur 1)	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	P71	Réalisation d'un prélevement		002EX520789 n°55 - 1	P71	Bitume couche et sous-couche	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1	R+1 - MPCA Façades
	R+1	R+1 - MPCA Revêtement de sol
	Rdc	Rdc - Plan de repérage - Actions menées
	Rdc	Rdc - MPCA Toutes catégories confondues
	Rdc	Rdc - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Facade 1	Facade 1 - Plan de repérage - Actions menées
	Facade 1	Facade 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	Facade 1	Facade 1 - MPCA Façades
	Facade 2	Facade 2 - Plan de repérage - Actions menées
	Facade 2	Facade 2 - MPCA Toutes catégories confondues
	Facade 2	Facade 2 - MPCA Façades
	Facade 3	Facade 3 - Plan de repérage - Actions menées
	Facade 3	Facade 3 - MPCA Toutes catégories confondues
	Facade 3	Facade 3 - MPCA Façades

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX520789

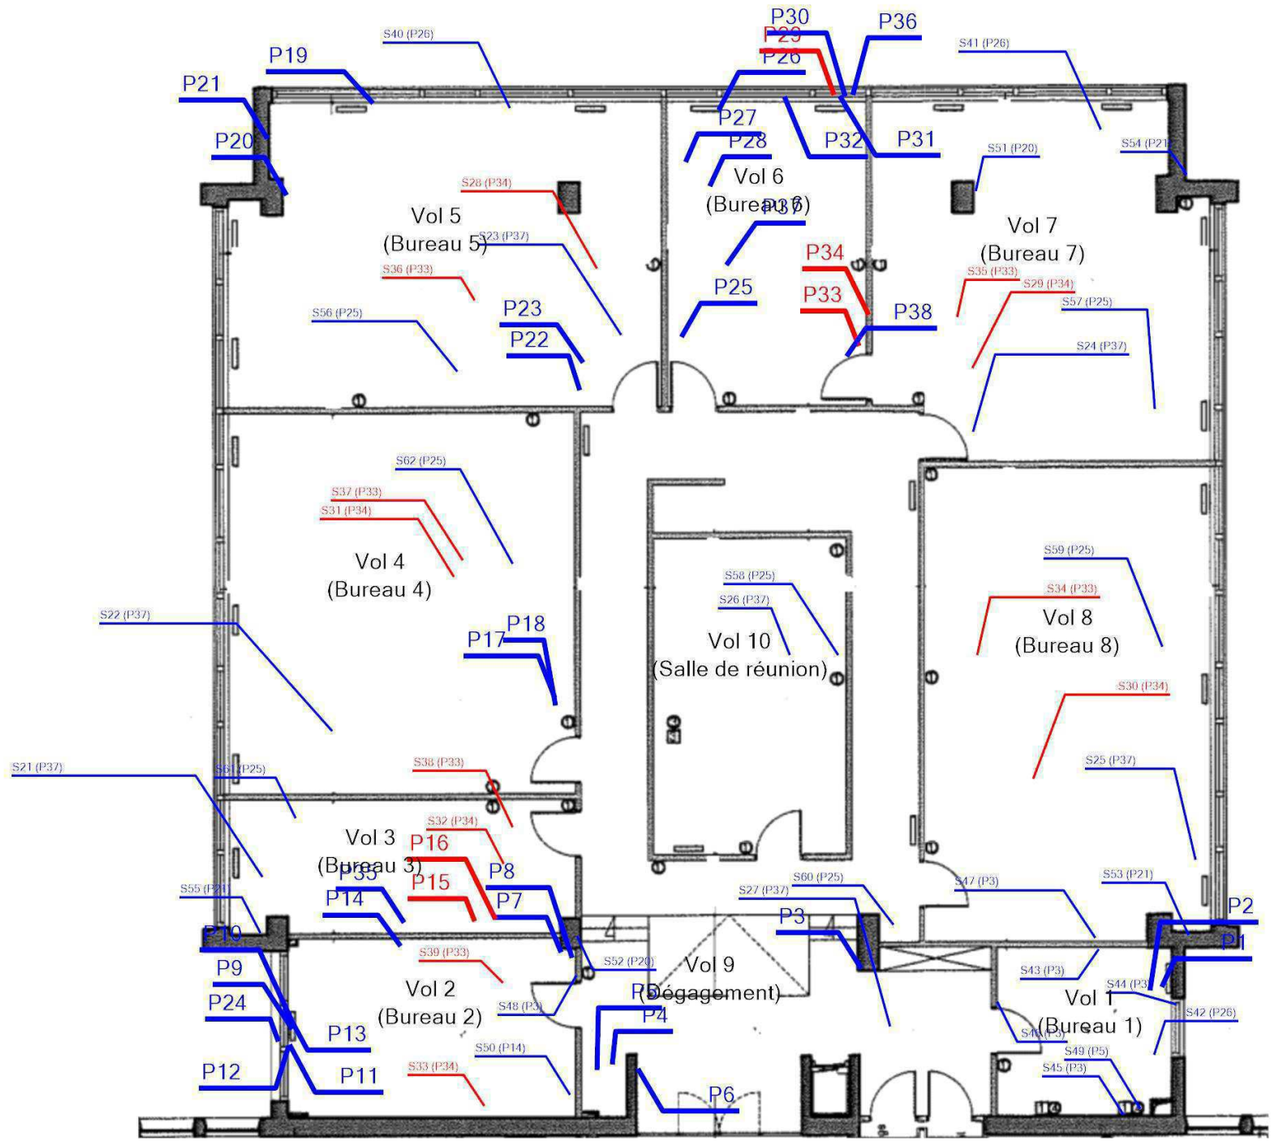

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
13 Avenue du Mont Riboudet 76000 ROUEN	Hôtel des douanes	25/09/2026	BOURGOGNON Cyril

R+1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EX520789




Légende

	P34 : Colles de revêtement de sol
	P15 : Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune, Colle bitumineuse noire
	P33 : Dalle dure cassante grise, Colle bitumineuse noire
	P29 : Joint de structure
	P16 : Colles de revêtement de sol

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
13 Avenue du Mont Riboudet 76000 ROUEN	Hôtel des douanes	25/09/2026	BOURGOGNON Cyril

R+1 - MPCA FAÇADES

Référence:
002EX520789

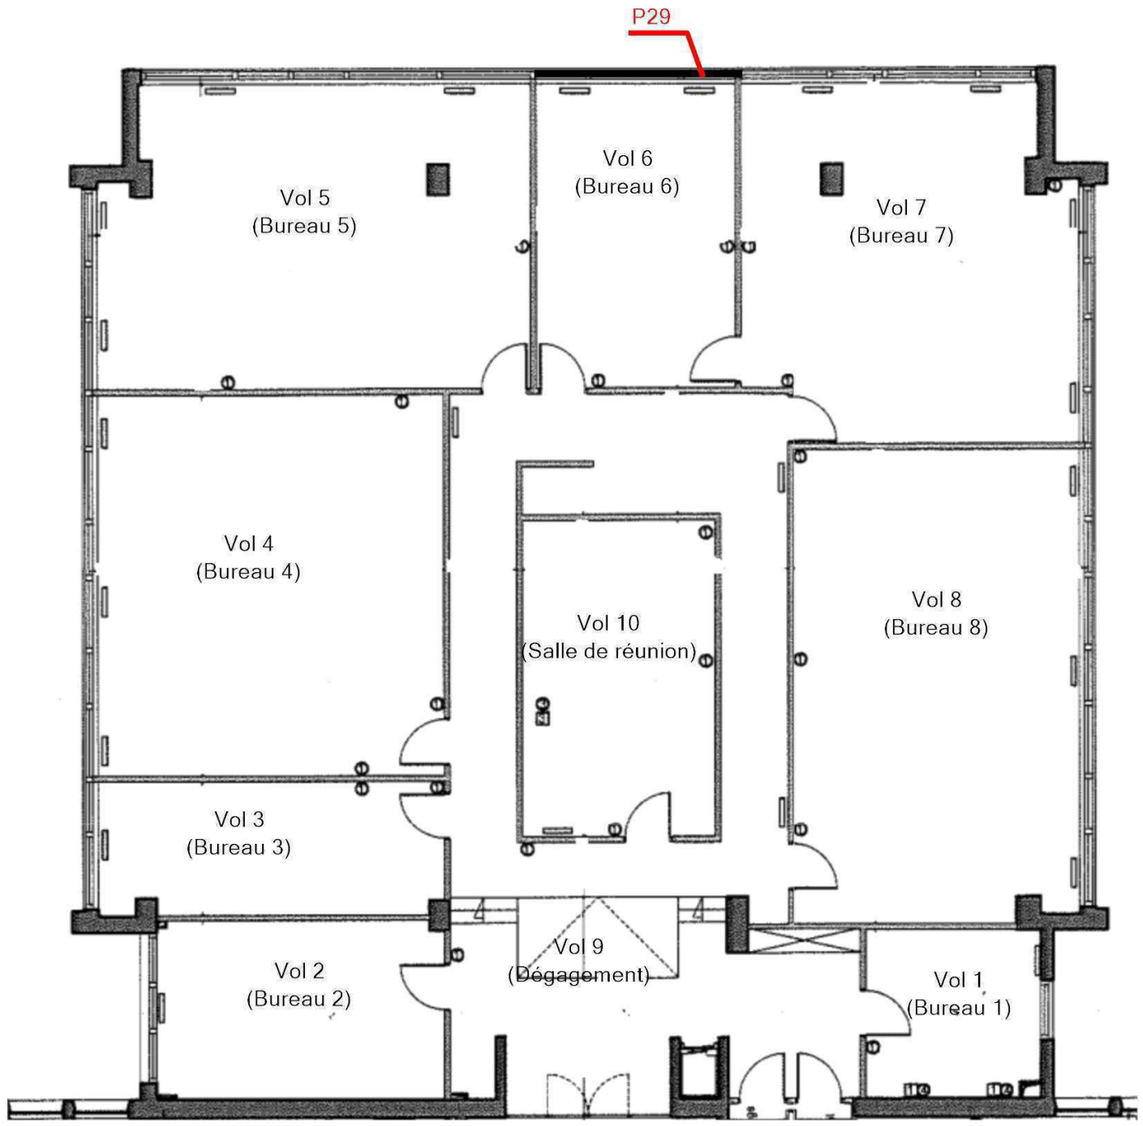

Légende

	P29 : Joint de structure

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
13 Avenue du Mont Riboudet 76000 ROUEN	Hôtel des douanes	25/09/2026	BOURGOGNON Cyril

R+1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EX520789




Légende

	P34 : Colles de revêtement de sol
	P15 : Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune, Colle bitumineuse noire
	P33 : Dalle dure cassante grise, Colle bitumineuse noire
	P16 : Colles de revêtement de sol

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
13 Avenue du Mont Riboudet 76000 ROUEN	Hôtel des douanes	25/09/2026	BOURGOGNON Cyril

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX520789

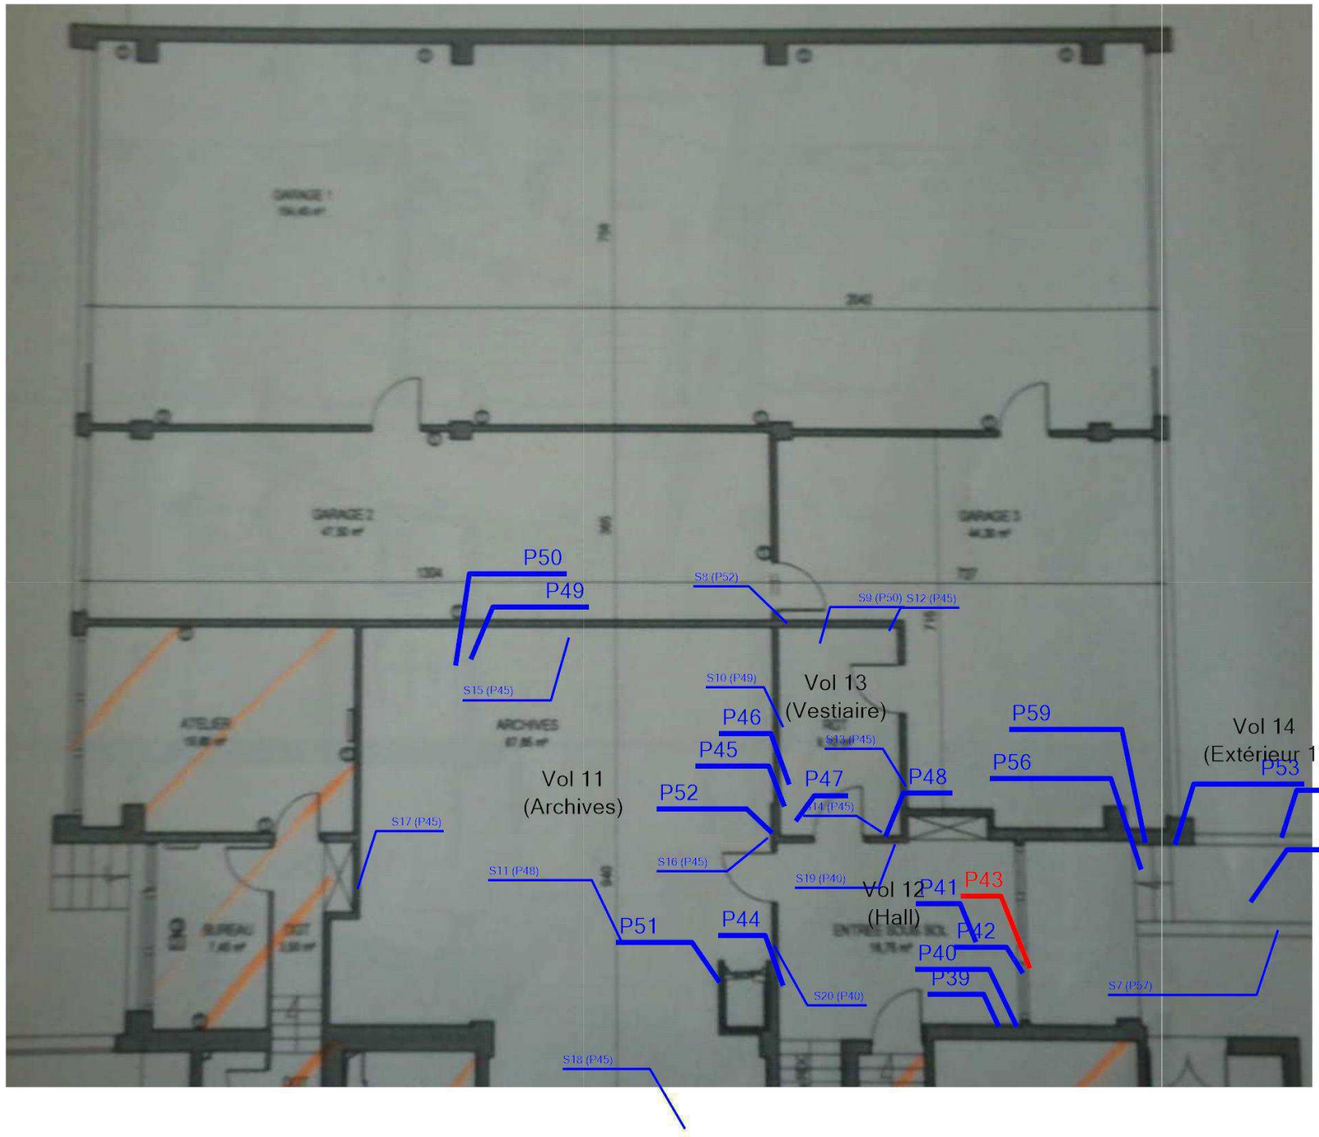


Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
13 Avenue du Mont Riboudet 76000 ROUEN	Hôtel des douanes	25/09/2026	BOURGOGNON Cyril

Référence:
002EX520789

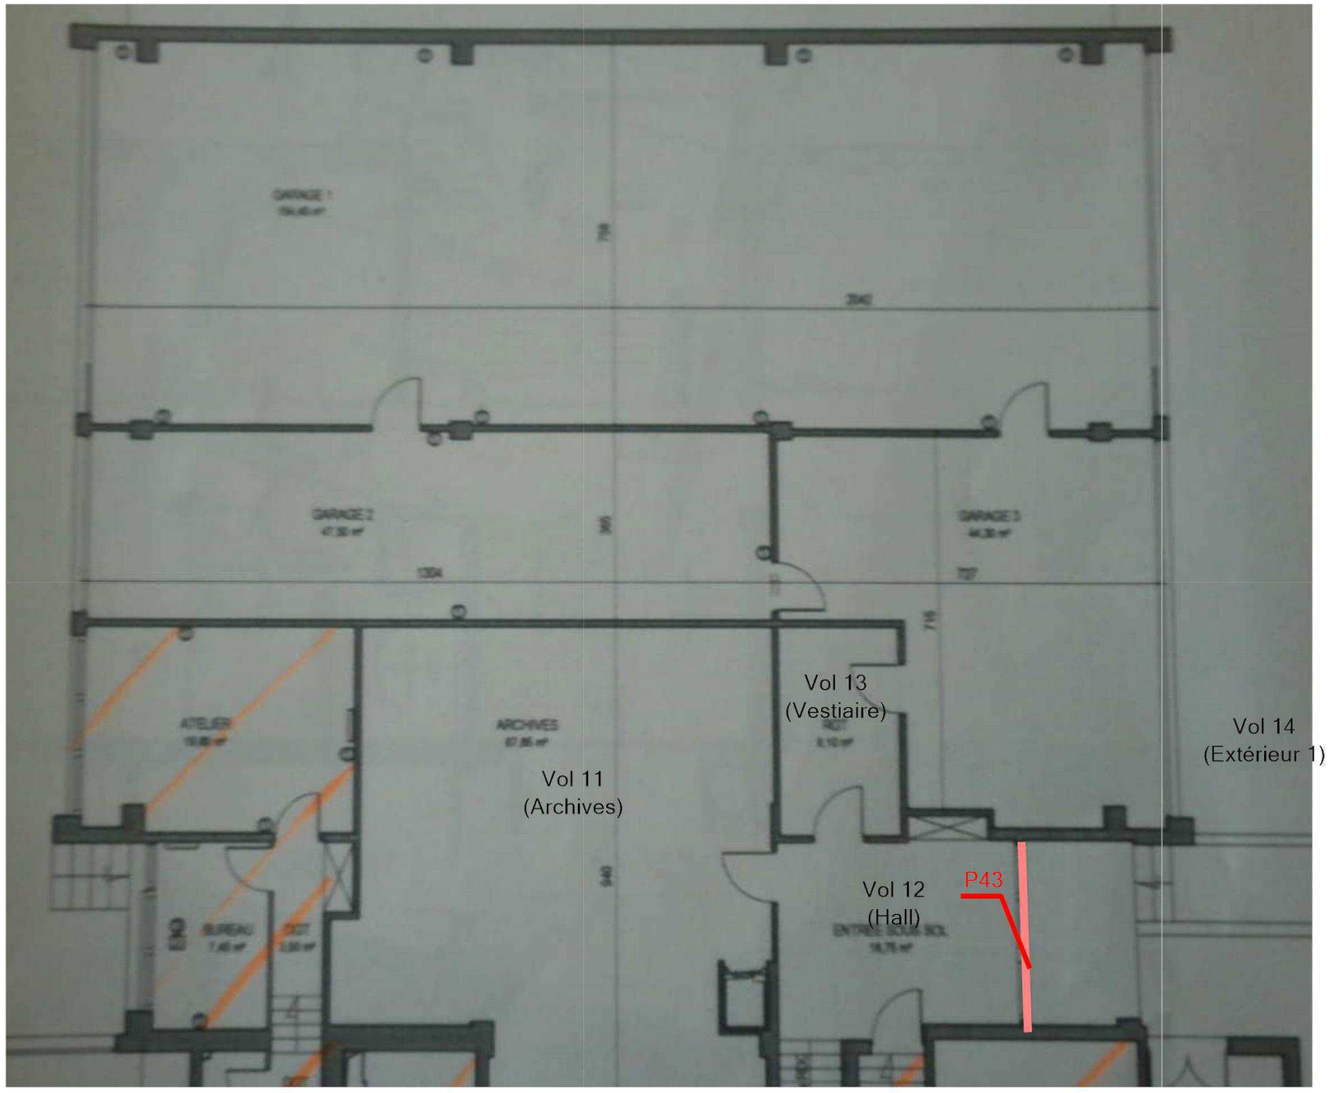


Légende	
	P43 : Mastic vitrier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
13 Avenue du Mont Riboudet 76000 ROUEN	Hôtel des douanes	25/09/2026	BOURGOGNON Cyril

RDC - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002EX520789

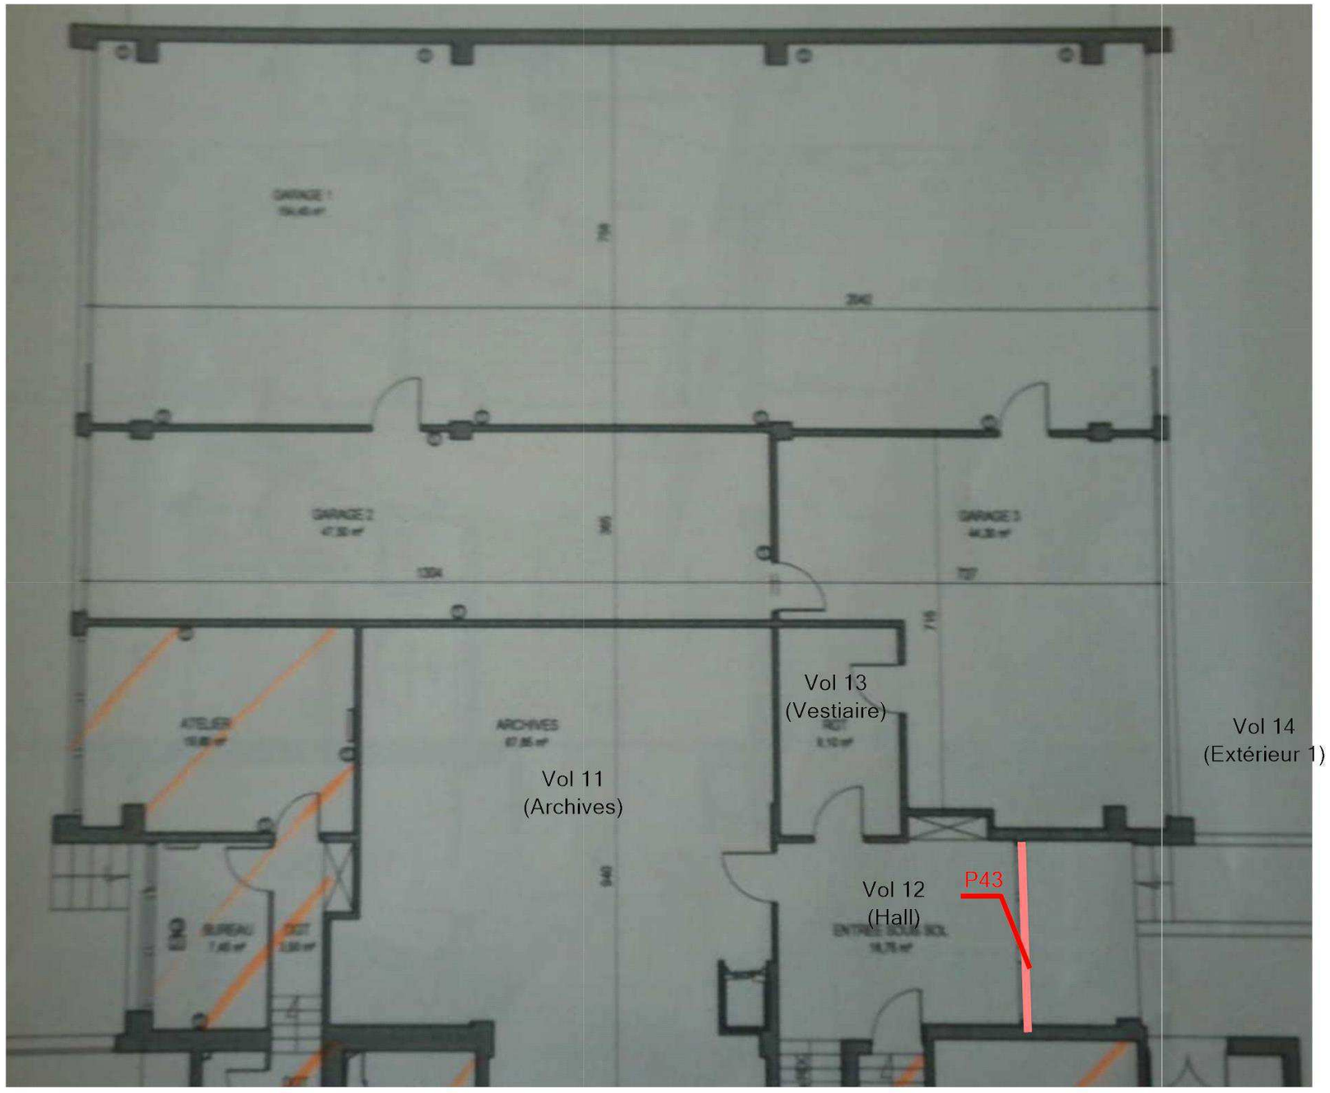


Légende	
	P43 : Mastic vitrier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
13 Avenue du Mont Riboudet 76000 ROUEN	Hôtel des douanes	25/09/2026	BOURGOGNON Cyril

FACADE 1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX520789

Vol 15
(Extérieur 2)

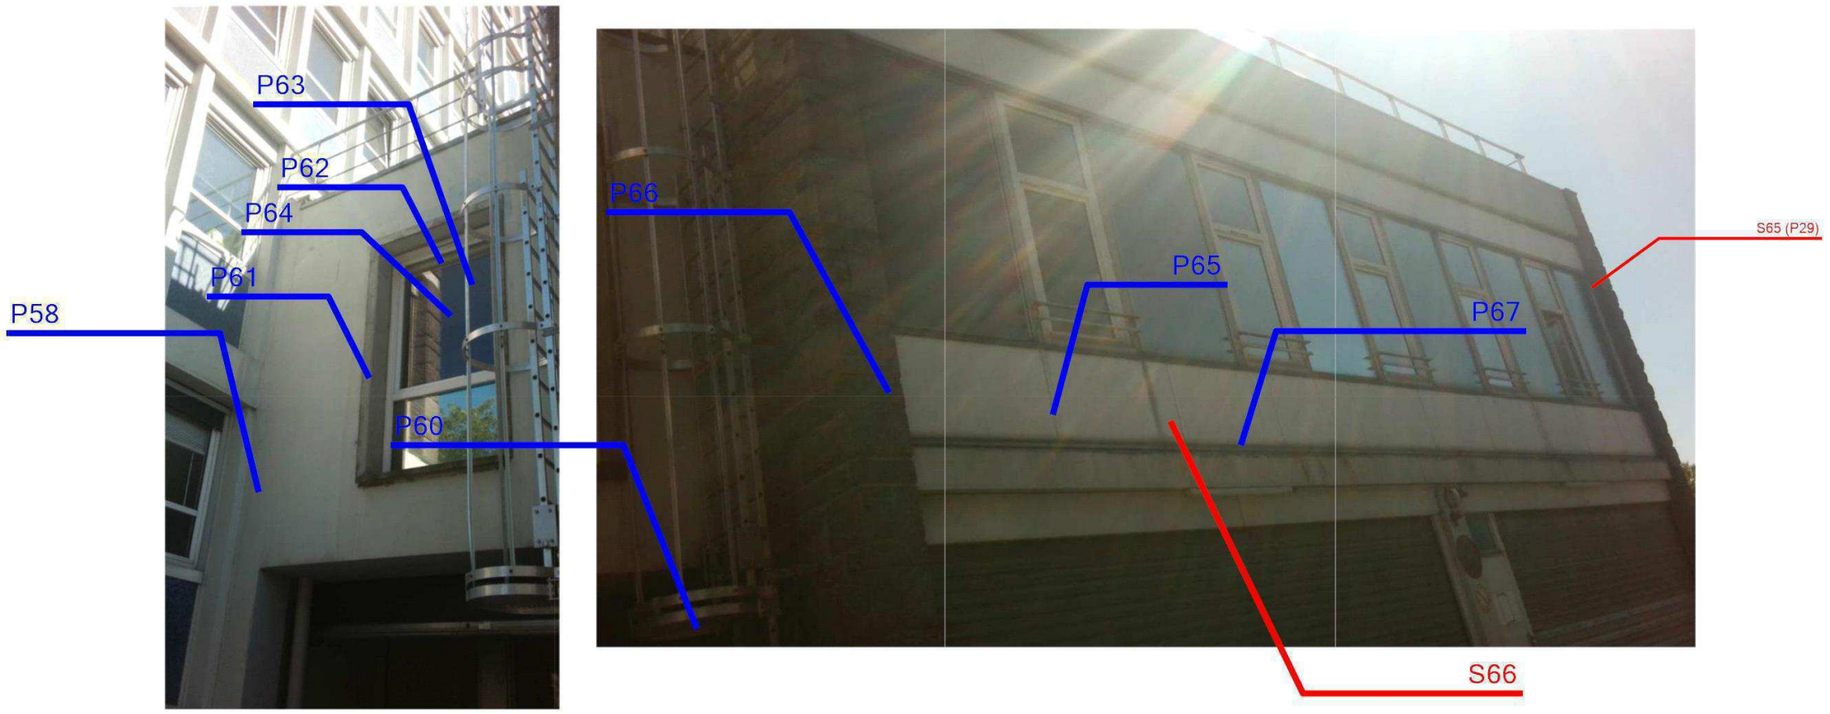

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage positif


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
13 Avenue du Mont Riboudet 76000 ROUEN	Hôtel des douanes	25/09/2026	BOURGOGNON Cyril

FACADE 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EX520789

Vol 15
(Extérieur 2)



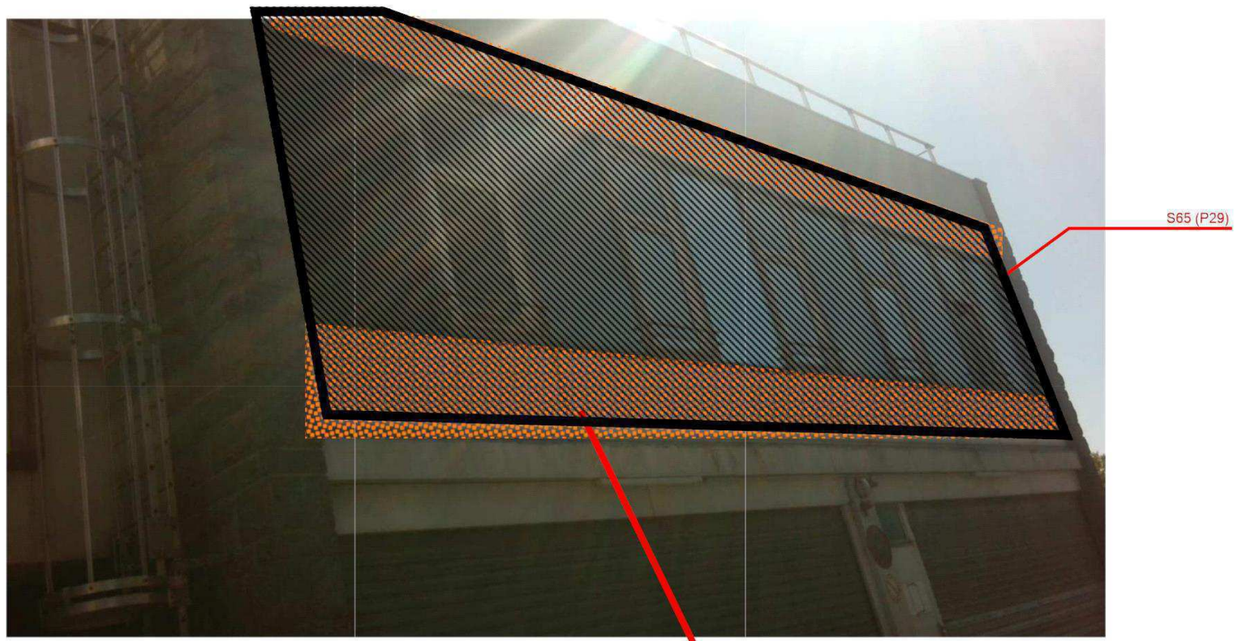

Légende	
	P29 : Joint de structure
	S66: Isolant + colle bitumineuse


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
13 Avenue du Mont Riboudet 76000 ROUEN	Hôtel des douanes	25/09/2026	BOURGOGNON Cyril

FACADE 1 - MPCA FAÇADES

Référence:
002EX520789

Vol 15
(Extérieur 2)



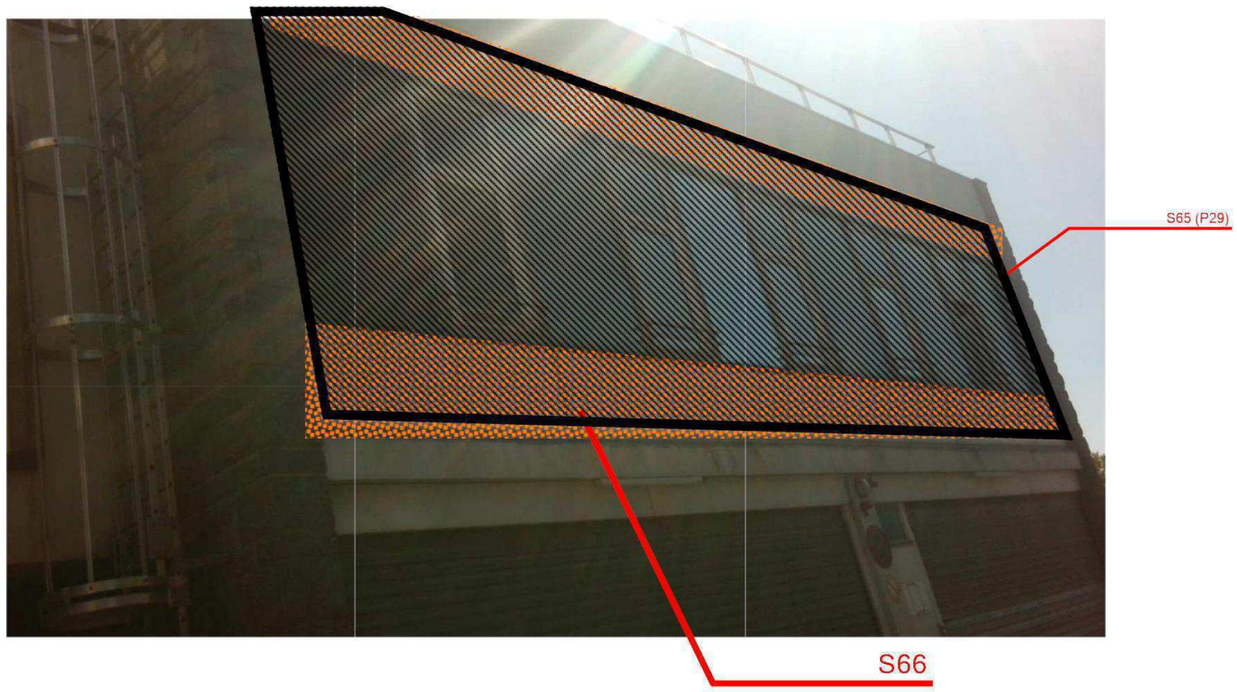


Légende	
	P29 : Joint de structure
	S66: Isolant + colle bitumineuse

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
13 Avenue du Mont Riboudet 76000 ROUEN	Hôtel des douanes	25/09/2026	BOURGOGNON Cyril

FACADE 2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX520789

Vol 16
(Extérieur 3)

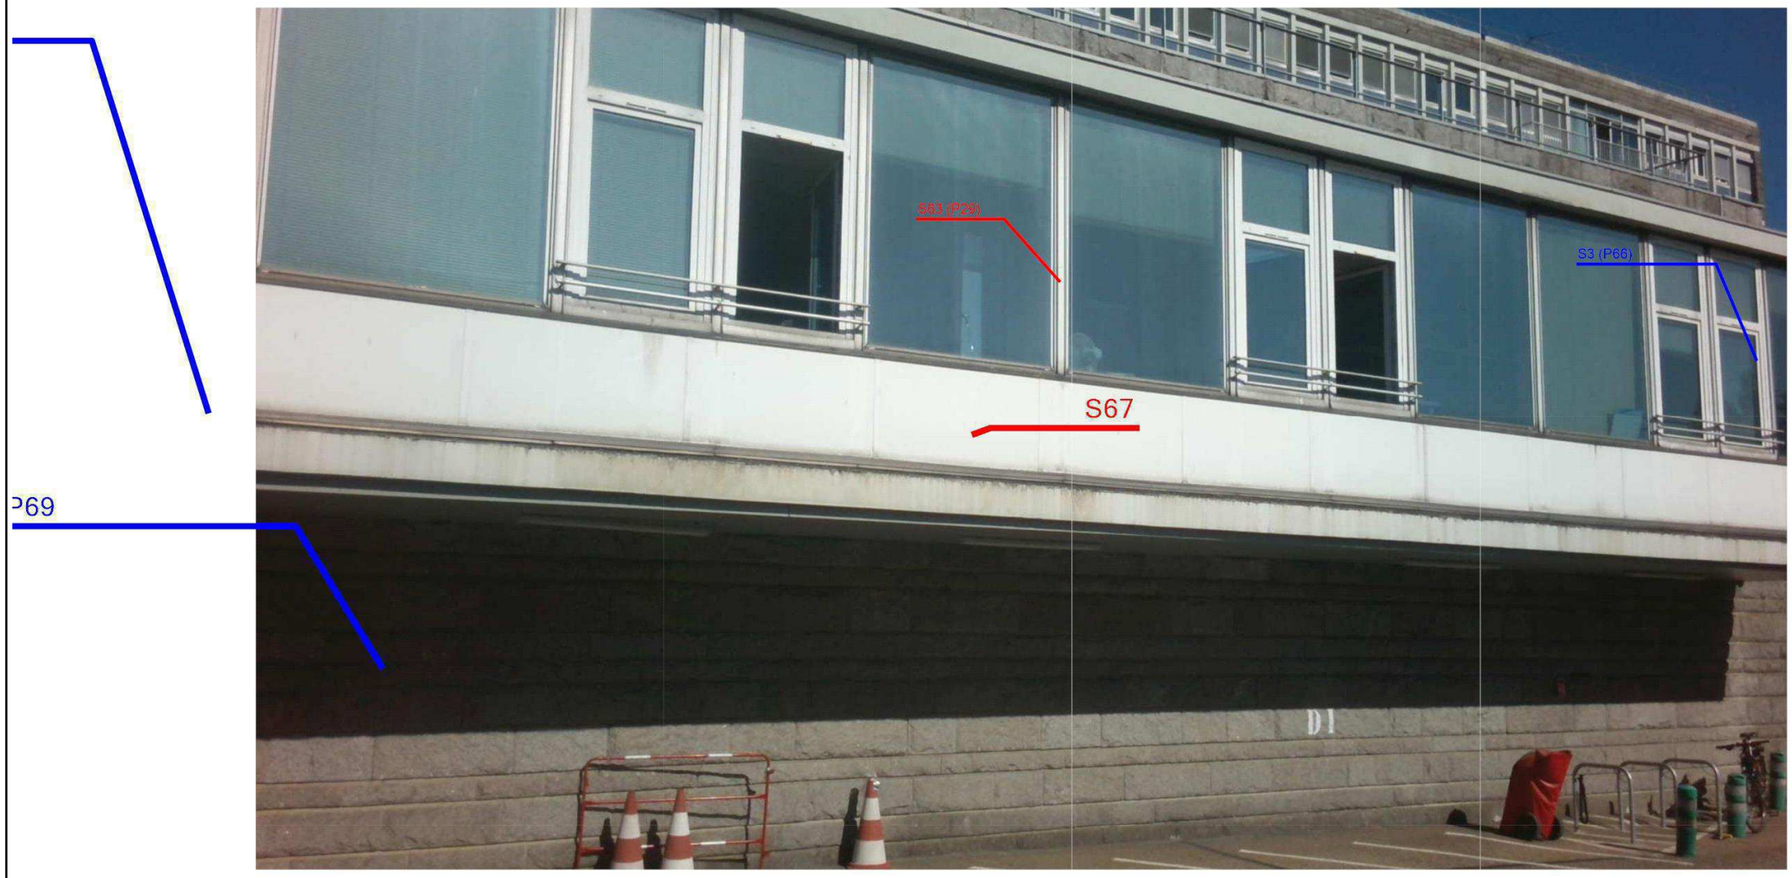


Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
13 Avenue du Mont Riboudet 76000 ROUEN	Hôtel des douanes	25/09/2026	BOURGOGNON Cyril

FACADE 2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EX520789

Vol 16
(Extérieur 3)

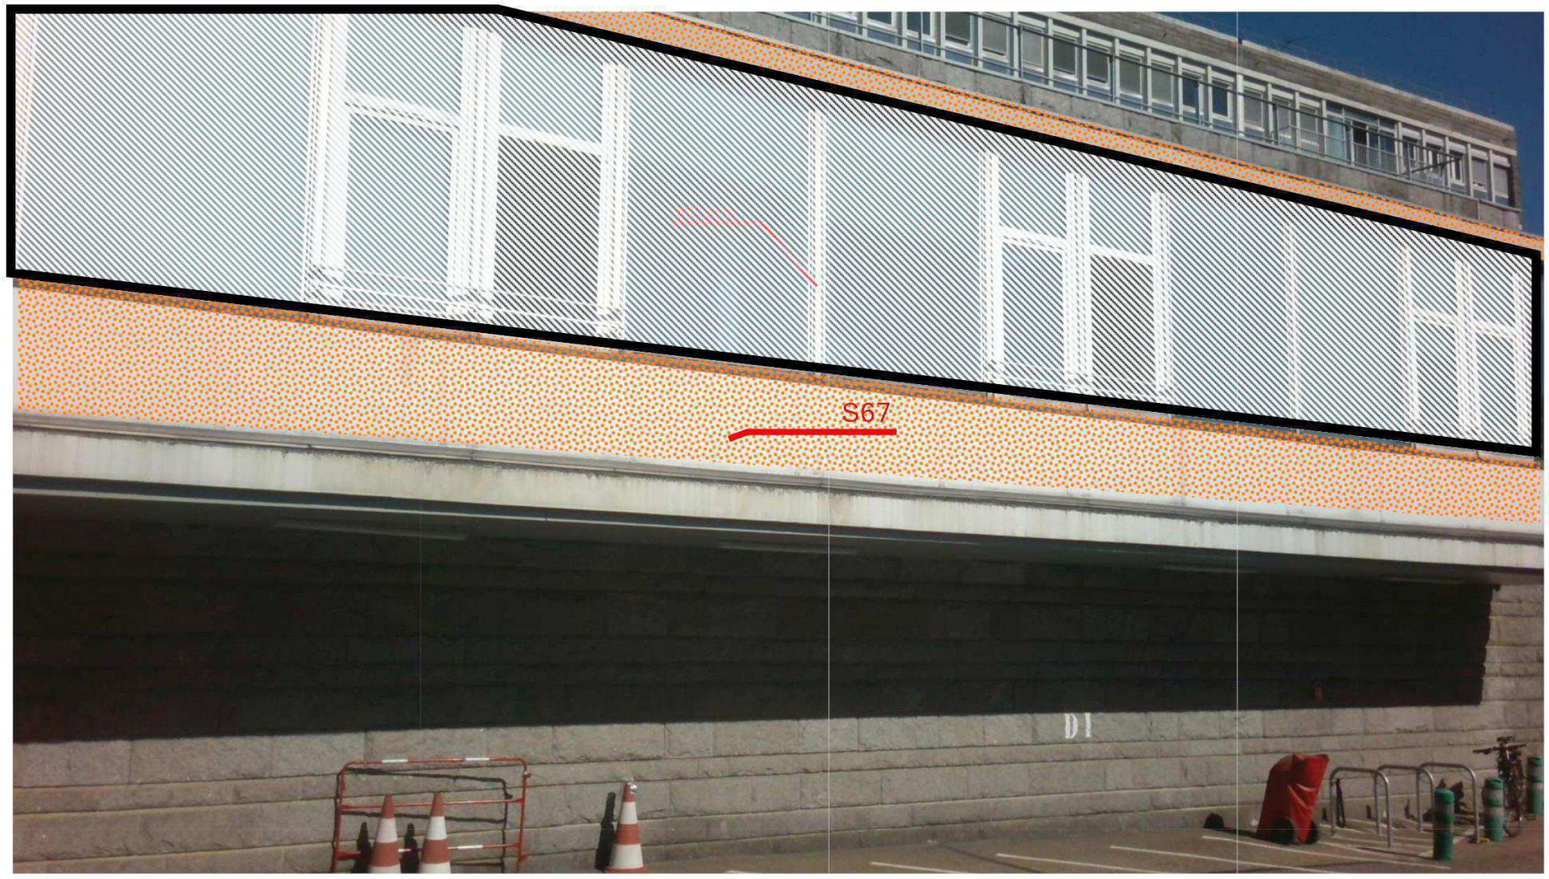


Légende	
	P29 : Joint de structure
	S67: Isolant + colle bitumineuse

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
13 Avenue du Mont Riboudet 76000 ROUEN	Hôtel des douanes	25/09/2026	BOURGOGNON Cyril

FACADE 2 - MPCA FAÇADES

Référence:
002EX520789

Vol 16
(Extérieur 3)

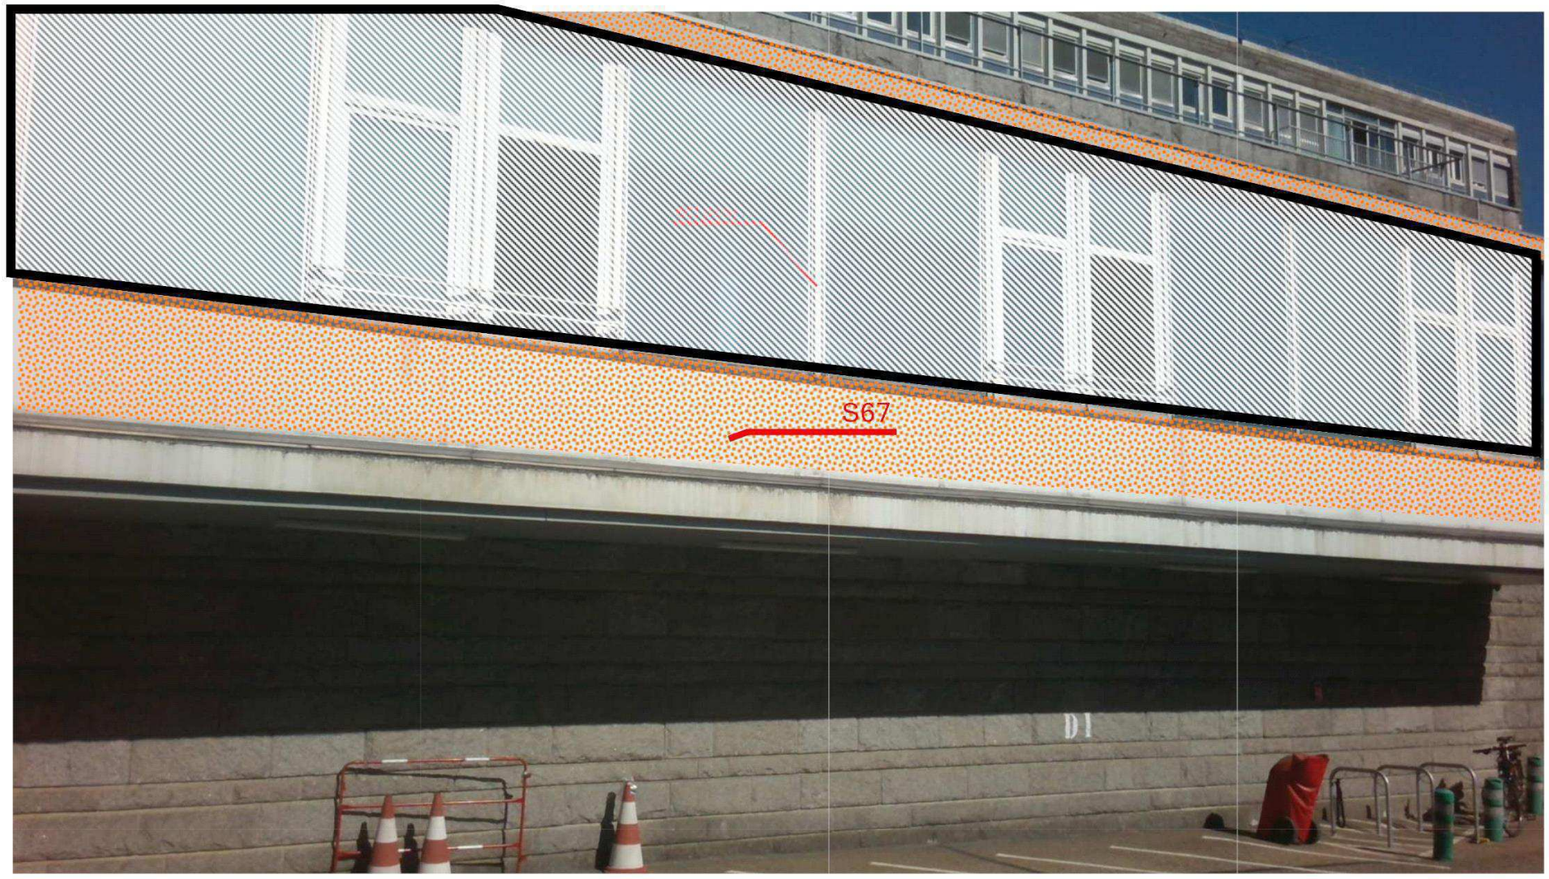

Légende	
	P29 : Joint de structure
	S67: Isolant + colle bitumineuse

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
13 Avenue du Mont Riboudet 76000 ROUEN	Hôtel des douanes	25/09/2026	BOURGOGNON Cyril

FACADE 3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX520789

Vol 17



Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
13 Avenue du Mont Riboudet 76000 ROUEN	Hôtel des douanes	25/09/2026	BOURGOGNON Cyril

FACADE 3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EX520789

Vol 17



Légende	
	S68: Isolant + colle bitumineuse
	P29 : Joint de structure

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
13 Avenue du Mont Riboudet 76000 ROUEN	Hôtel des douanes	25/09/2026	BOURGOGNON Cyril

FACADE 3 - MPCA FAÇADES

Référence:
002EX520789

Vol 17



Légende	
	S68: Isolant + colle bitumineuse
	P29 : Joint de structure

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
13 Avenue du Mont Riboudet 76000 ROUEN	Hôtel des douanes	25/09/2026	BOURGOGNON Cyril

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EX520789 n°58 - 1 (P58)	Facade 1 - Vol 15 (Extérieur 2)	Prélevement négatif
002EX520789 n°65 - 1 (P65)	Facade 1 - Vol 15 (Extérieur 2)	Prélevement négatif
002EX520789 n°66 - 1 (P66)	Facade 1 - Vol 15 (Extérieur 2)	Prélevement négatif
002EX520789 n°67 - 1 (P67)	Facade 1 - Vol 15 (Extérieur 2)	Prélevement négatif
002EX520789 n°1 - 1 (P1)	R+1 - Vol 1 (Bureau 1)	Prélevement négatif
002EX520789 n°2 - 1 (P2)	R+1 - Vol 1 (Bureau 1)	Prélevement négatif
002EX520789 n°3 - 2 (P3)	R+1 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement négatif
002EX520789 n°4 - 1 (P4)	R+1 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement négatif
002EX520789 n°5 - 1 (P5)	R+1 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement négatif
002EX520789 n°6 - 1 (P6)	R+1 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement négatif
002EX520789 n°7 - 1 (P7)	R+1 - Vol 2 (Bureau 2)	Prélevement négatif
002EX520789 n°8 - 1 (P8)	R+1 - Vol 2 (Bureau 2)	Prélevement négatif
002EX520789 n°9 - 1 (P9)	R+1 - Vol 2 (Bureau 2)	Prélevement négatif
002EX520789 n°10 - 1 (P10)	R+1 - Vol 2 (Bureau 2)	Prélevement négatif
002EX520789 n°11 - 1 (P11)	R+1 - Vol 2 (Bureau 2)	Prélevement négatif
002EX520789 n°12 - 1 (P12)	R+1 - Vol 2 (Bureau 2)	Prélevement négatif
002EX520789 n°13 - 1 (P13)	R+1 - Vol 2 (Bureau 2)	Prélevement négatif
002EX520789 n°14 - 1 (P14)	R+1 - Vol 2 (Bureau 2)	Prélevement négatif
002EX520789 n°15 - 1 (P15)	R+1 - Vol 3 (Bureau 3)	Prélevement positif
002EX520789 n°15 - 2 (P15)	R+1 - Vol 3 (Bureau 3)	Prélevement positif
002EX520789 n°16 - 1 (P16)	R+1 - Vol 3 (Bureau 3)	Prélevement positif
002EX520789 n°17 - 1 (P17)	R+1 - Vol 4 (Bureau 4)	Prélevement négatif
002EX520789 n°18 - 1 (P18)	R+1 - Vol 4 (Bureau 4)	Prélevement négatif
002EX520789 n°22 - 2 (P22)	R+1 - Vol 5 (Bureau 5)	Prélevement négatif
002EX520789 n°35 - 1 (P35)	R+1 - Vol 3 (Bureau 3)	Prélevement négatif
002EX520789 n°38 - 2 (P38)	R+1 - Vol 6 (Bureau 6)	Prélevement négatif
002EX520789 n°39 - 1 (P39)	Rdc - Vol 12 (Hall)	Prélevement négatif

002EX520789 n°41 - 1 (P41)	Rdc - Vol 12 (Hall)	Prélevement négatif
002EX520789 n°42 - 1 (P42)	Rdc - Vol 12 (Hall)	Prélevement négatif
002EX520789 n°43 - 1 (P43)	Rdc - Vol 12 (Hall)	Prélevement positif
002EX520789 n°44 - 1 (P44)	Rdc - Vol 12 (Hall)	Prélevement négatif
002EX520789 n°45 - 1 (P45)	Rdc - Vol 13 (Vestiaire)	Prélevement négatif
002EX520789 n°46 - 1 (P46)	Rdc - Vol 13 (Vestiaire)	Prélevement négatif
002EX520789 n°47 - 1 (P47)	Rdc - Vol 13 (Vestiaire)	Prélevement négatif
002EX520789 n°48 - 1 (P48)	Rdc - Vol 13 (Vestiaire)	Prélevement négatif
002EX520789 n°49 - 1 (P49)	Rdc - Vol 11 (Archives)	Prélevement négatif
002EX520789 n°50 - 1 (P50)	Rdc - Vol 11 (Archives)	Prélevement négatif
002EX520789 n°51 - 1 (P51)	Rdc - Vol 11 (Archives)	Prélevement négatif
002EX520789 n°52 - 1 (P52)	Rdc - Vol 11 (Archives)	Prélevement négatif
002EX520789 n°53 - 1 (P53)	Rdc - Vol 14 (Extérieur 1)	Prélevement négatif
002EX520789 n°56 - 1 (P56)	Rdc - Vol 14 (Extérieur 1)	Prélevement négatif
002EX520789 n°57 - 1 (P57)	Rdc - Vol 14 (Extérieur 1)	Prélevement négatif
002EX520789 n°59 - 1 (P59)	Rdc - Vol 14 (Extérieur 1)	Prélevement négatif
002EX520789 n°59 - 2 (P59)	Rdc - Vol 14 (Extérieur 1)	Prélevement négatif
002EX520789 n°54 - 1 (P70)	Rdc - Vol 14 (Extérieur 1)	Prélevement négatif
002EX520789 n°55 - 1 (P71)	Rdc - Vol 14 (Extérieur 1)	Prélevement négatif



002EX520789 n°1 - 1 (P1) - R+1 - Vol 1 (Bureau 1)



002EX520789 n°2 - 1 (P2) - R+1 - Vol 1 (Bureau 1)



002EX520789 n°3 - 2 (P3) - R+1 - Vol 9 (Dégagement)



002EX520789 n°4 - 1 (P4) - R+1 - Vol 9 (Dégagement)



002EX520789 n°5 - 1 (P5) - R+1 - Vol 9 (Dégagement)



002EX520789 n°6 - 1 (P6) - R+1 - Vol 9 (Dégagement)



002EX520789 n°7 - 1 (P7) - R+1 - Vol 2 (Bureau 2)



002EX520789 n°8 - 1 (P8) - R+1 - Vol 2 (Bureau 2)




002EX520789 n°9 - 1 (P9) - R+1 - Vol 2 (Bureau 2)



002EX520789 n°10 - 1 (P10) - R+1 - Vol 2 (Bureau 2)



002EX520789 n°11 - 1 (P11) - R+1 - Vol 2 (Bureau 2)

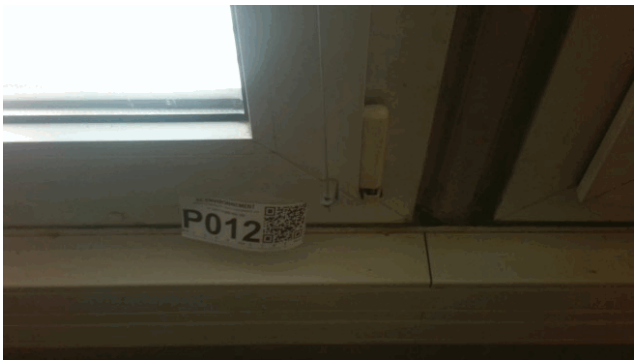

002EX520789 n°12 - 1 (P12) - R+1 - Vol 2 (Bureau 2)



002EX520789 n°13 - 1 (P13) - R+1 - Vol 2 (Bureau 2)



002EX520789 n°14 - 1 (P14) - R+1 - Vol 2 (Bureau 2)




002EX520789 n°15 - 1 (P15) - R+1 - Vol 3 (Bureau 3)




002EX520789 n°15 - 2 (P15) - R+1 - Vol 3 (Bureau 3)



002EX520789 n°16 - 1 (P16) - R+1 - Vol 3 (Bureau 3)

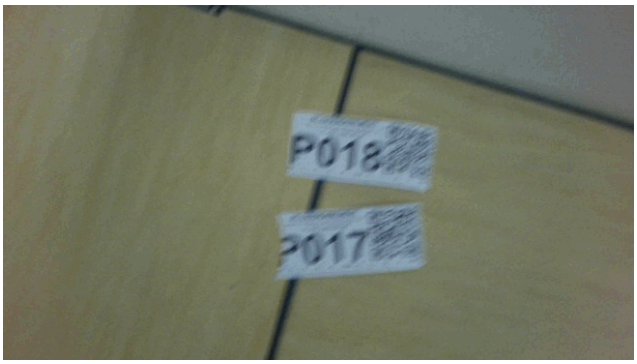

002EX520789 n°17 - 1 (P17) - R+1 - Vol 4 (Bureau 4)

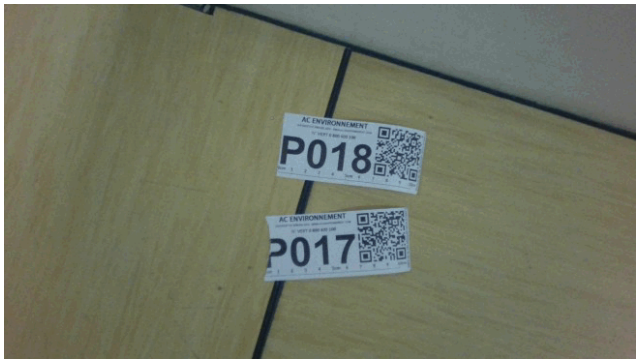

002EX520789 n°18 - 1 (P18) - R+1 - Vol 4 (Bureau 4)



002EX520789 n°22 - 2 (P22) - R+1 - Vol 5 (Bureau 5)




002EX520789 n°35 - 1 (P35) - R+1 - Vol 3 (Bureau 3)



002EX520789 n°38 - 2 (P38) - R+1 - Vol 6 (Bureau 6)



002EX520789 n°39 - 1 (P39) - Rdc - Vol 12 (Hall)

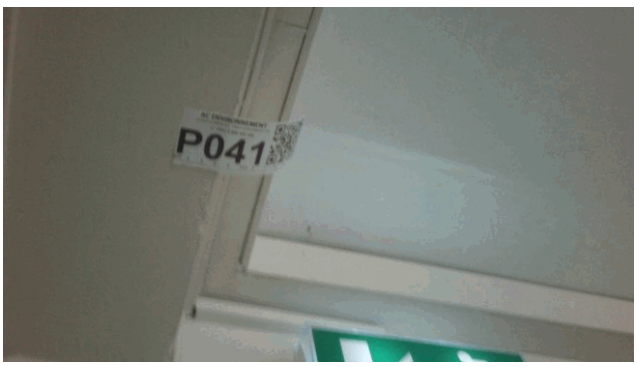

002EX520789 n°41 - 1 (P41) - Rdc - Vol 12 (Hall)




002EX520789 n°42 - 1 (P42) - Rdc - Vol 12 (Hall)



002EX520789 n°43 - 1 (P43) - Rdc - Vol 12 (Hall)



002EX520789 n°44 - 1 (P44) - Rdc - Vol 12 (Hall)

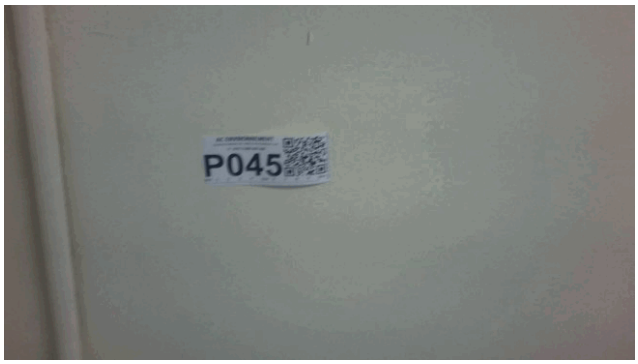

002EX520789 n°45 - 1 (P45) - Rdc - Vol 13 (Vestiaire)



002EX520789 n°46 - 1 (P46) - Rdc - Vol 13 (Vestiaire)




002EX520789 n°47 - 1 (P47) - Rdc - Vol 13 (Vestiaire)



002EX520789 n°48 - 1 (P48) - Rdc - Vol 13 (Vestiaire)



002EX520789 n°49 - 1 (P49) - Rdc - Vol 11 (Archives)

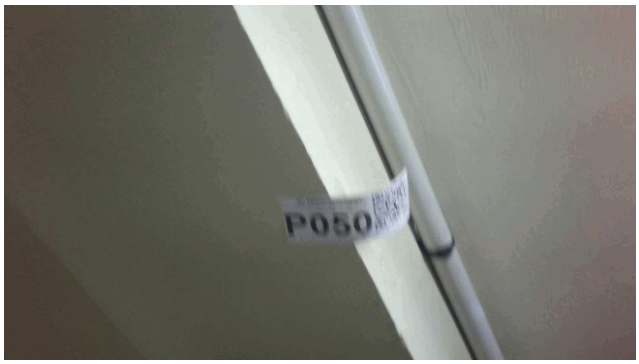

002EX520789 n°50 - 1 (P50) - Rdc - Vol 11 (Archives)



002EX520789 n°51 - 1 (P51) - Rdc - Vol 11 (Archives)



002EX520789 n°52 - 1 (P52) - Rdc - Vol 11 (Archives)



002EX520789 n°53 - 1 (P53) - Rdc - Vol 14 (Extérieur 1)



002EX520789 n°56 - 1 (P56) - Rdc - Vol 14 (Extérieur 1)



002EX520789 n°57 - 1 (P57) - Rdc - Vol 14 (Extérieur 1)



002EX520789 n°58 - 1 (P58) - Facade 1 - Vol 15 (Extérieur 2)



002EX520789 n°59 - 1 (P59) - Rdc - Vol 14 (Extérieur 1)



002EX520789 n°59 - 2 (P59) - Rdc - Vol 14 (Extérieur 1)



002EX520789 n°65 - 1 (P65) - Facade 1 - Vol 15 (Extérieur 2)



002EX520789 n°66 - 1 (P66) - Facade 1 - Vol 15 (Extérieur 2)



002EX520789 n°67 - 1 (P67) - Facade 1 - Vol 15 (Extérieur 2)



002EX520789 n°54 - 1 (P70) - Rdc - Vol 14 (Extérieur 1)



002EX520789 n°55 - 1 (P71) - Rdc - Vol 14 (Extérieur 1)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	R+1 - Vol 1 (Bureau 1)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène	R+1 - Vol 1 (Bureau 1)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	R+1 - Vol 9 (Dégagement)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	R+1 - Vol 9 (Dégagement)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable	R+1 - Vol 9 (Dégagement)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène	R+1 - Vol 9 (Dégagement)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige	R+1 - Vol 2 (Bureau 2)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	R+1 - Vol 2 (Bureau 2)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau souple noir	R+1 - Vol 2 (Bureau 2)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir	R+1 - Vol 2 (Bureau 2)	
P11	Façades	Menuiseries	Matériau souple blanc	R+1 - Vol 2 (Bureau 2)	
P12	Façades	Menuiseries	Matériau souple incolore	R+1 - Vol 2 (Bureau 2)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	R+1 - Vol 2 (Bureau 2)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable	R+1 - Vol 2 (Bureau 2)	
P15 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune	R+1 - Vol 3 (Bureau 3)	
P15 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire	R+1 - Vol 3 (Bureau 3)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène non séparable + colle bitumineuse noire	R+1 - Vol 3 (Bureau 3)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène	R+1 - Vol 4 (Bureau 4)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène	R+1 - Vol 4 (Bureau 4)	

P19	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau fibreux avec couche cartonnée	R+1 - Vol 5 (Bureau 5)
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	R+1 - Vol 5 (Bureau 5)
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	R+1 - Vol 5 (Bureau 5)
P22	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	R+1 - Vol 5 (Bureau 5)
P23	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Matériau compact gris hétérogène	R+1 - Vol 5 (Bureau 5)
P24	Façades	Appui de fenêtre	Peinture + enduit compact gris non séparable	R+1 - Vol 2 (Bureau 2)
P25	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau compact gris hétérogène	R+1 - Vol 6 (Bureau 6)
P26	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau compact gris hétérogène	R+1 - Vol 6 (Bureau 6)
P27	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	R+1 - Vol 6 (Bureau 6)
P28	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau compact gris hétérogène	R+1 - Vol 6 (Bureau 6)
P29	Façades	Menuiseries	Peinture + matériau compact gris non séparable	R+1 - Vol 6 (Bureau 6)
P30	Façades	Menuiseries	Peinture + matériau souple blanc non séparable	R+1 - Vol 6 (Bureau 6)
P31	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir	R+1 - Vol 6 (Bureau 6)
P32	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir	R+1 - Vol 6 (Bureau 6)
P33 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante grise	R+1 - Vol 6 (Bureau 6)
P33 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire	R+1 - Vol 6 (Bureau 6)
P34	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris non séparable + colle bitumineuse noire	R+1 - Vol 6 (Bureau 6)
P35	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette grise + colle polymère jaune non séparable	R+1 - Vol 3 (Bureau 3)
P36	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir	R+1 - Vol 6 (Bureau 6)
P37	Plafond et faux-plafonds	Poutrelles	Matériau compact gris hétérogène	R+1 - Vol 6 (Bureau 6)
P38	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau blanc + matériau gris non séparable	R+1 - Vol 6 (Bureau 6)
P39	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise	Rdc - Vol 12 (Hall)

P40	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Rdc - Vol 12 (Hall)
P41	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Rdc - Vol 12 (Hall)
P42	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Rdc - Vol 12 (Hall)
P43	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau compact gris	Rdc - Vol 12 (Hall)
P44	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau compact gris hétérogène	Rdc - Vol 12 (Hall)
P45	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Rdc - Vol 13 (Vestiaire)
P46	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Rdc - Vol 13 (Vestiaire)
P47	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Rdc - Vol 13 (Vestiaire)
P48	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène	Rdc - Vol 13 (Vestiaire)
P49	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit blanc + matériau fibreux beige non séparable	Rdc - Vol 11 (Archives)
P50	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture + enduit plâtreux en vrac non séparable	Rdc - Vol 11 (Archives)
P51	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Rdc - Vol 11 (Archives)
P52	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise	Rdc - Vol 11 (Archives)
P53	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène	Rdc - Vol 14 (Extérieur 1)
P56	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Rdc - Vol 14 (Extérieur 1)
P57	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Rdc - Vol 14 (Extérieur 1)
P58	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Facade 1 - Vol 15 (Extérieur 2)
P59	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Rdc - Vol 14 (Extérieur 1)
P60	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène	Facade 1 - Vol 15 (Extérieur 2)
P61	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène	Facade 1 - Vol 15 (Extérieur 2)

P62	Façades	Menuiseries	Matériau souple gris	Facade 1 - Vol 15 (Extérieur 2)
P63	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple gris	Facade 1 - Vol 15 (Extérieur 2)
P64	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple gris	Facade 1 - Vol 15 (Extérieur 2)
P65	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Facade 1 - Vol 15 (Extérieur 2)
P66	Façades	Menuiseries	Matériau compact gris hétérogène	Facade 1 - Vol 15 (Extérieur 2)
P67	Façades	Murs	Matériau bitumineux noir + peinture non séparable	Facade 1 - Vol 15 (Extérieur 2)
P68	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Facade 2 - Vol 16 (Extérieur 3)
P69	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène	Facade 2 - Vol 16 (Extérieur 3)
P70	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	Rdc - Vol 14 (Extérieur 1)
P71	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	Rdc - Vol 14 (Extérieur 1)

72 rue Aristide Briand
76650 PETIT-COURONNE
Tel : 02.76.61.25.74
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6304

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT8826-2727 EN DATE DU 02/10/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT8826-2727 Réf. Commande Client : 002EX520789

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 30/09/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes Réf échantillon client : 002EX520789001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 1 (Bureau 1)		Réf échantillon ITGA : IT882609-4853 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
1 Colle polymère jaune + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO (4)
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes Réf échantillon client : 002EX520789002 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1 (Bureau 1)		Réf échantillon ITGA : IT882609-4854 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
1 Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT8826-2727 EN DATE DU 02/10/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4855	
Réf échantillon client : 002EX520789003 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 9 (Dégagement)		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
1 Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO (3)
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4856	
Réf échantillon client : 002EX520789004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 9 (Dégagement)		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
1 Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris (1)	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO (4)
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4857	
Réf échantillon client : 002EX520789005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 9 (Dégagement)		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune	
1 Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable (1)	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO (4)
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4858	
Réf échantillon client : 002EX520789006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 9 (Dégagement)		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
1 Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4859	
Réf échantillon client : 002EX520789007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 2 (Bureau 2)		Description ITGA : Revêtement souple beige	
1 Revêtement souple beige	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT8826-2727 EN DATE DU 02/10/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4860	
Réf échantillon client : 002EX520789008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 2 (Bureau 2)		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
1 Colle polymère jaune + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO (4)
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4861	
Réf échantillon client : 002EX520789009 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 2 (Bureau 2)		Description ITGA : Peinture / Matériau souple noir	
1 Peinture non séparable + Matériau souple noir (1)	META (B) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO (4)
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4862	
Réf échantillon client : 002EX520789010 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 2 (Bureau 2)		Description ITGA : Matériau souple noir	
1 Matériau souple noir	META (B) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4863	
Réf échantillon client : 002EX520789011 / Façades / Menuiseries / Joint de structure / Vol 2 (Bureau 2)		Description ITGA : Matériau souple blanc	
1 Matériau souple blanc	META (B) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4864	
Réf échantillon client : 002EX520789012 / Façades / Menuiseries / Joint de structure / Vol 2 (Bureau 2)		Description ITGA : Matériau souple incolore	
1 Matériau souple incolore	META (B) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT8826-2727 EN DATE DU 02/10/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4865	
Réf échantillon client : 002EX520789013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 2 (Bureau 2)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
1 Peinture + Matériau plâtreux blanc non séparable (1)	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO (4)
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4866	
Réf échantillon client : 002EX520789014 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (Bureau 2)		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
1 Peinture + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable (1)	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO (3)
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4867	
Réf échantillon client : 002EX520789015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 3 (Bureau 3)		Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Colle polymère jaune	
1 Dalle dure cassante grise + Colle polymère jaune	META (B) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NOO
1 Colle bitumineuse noire	MOLP le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RNU
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4868	
Réf échantillon client : 002EX520789016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 3 (Bureau 3)		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Colle bitumineuse noire	
1 Matériau compact gris hétérogène non séparable + Colle bitumineuse noire (1)	MOLP le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RNU (4)
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4869	
Réf échantillon client : 002EX520789017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 4 (Bureau 4)		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
1 Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT8826-2727 EN DATE DU 02/10/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4870	
Réf échantillon client : 002EX520789018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 4 (Bureau 4)		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
1 Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4871	
Réf échantillon client : 002EX520789019 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Isolant intérieur / Vol 5 (Bureau 5)		Description ITGA : Matériau fibreux avec couche cartonnée	
1 Matériau fibreux avec couche cartonnée	MOLP + META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4872	
Réf échantillon client : 002EX520789020 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits plâtre / Vol 5 (Bureau 5)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
1 Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc (1)	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO (4)
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4873	
Réf échantillon client : 002EX520789021 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 5 (Bureau 5)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
1 Peinture + Matériau plâtreux blanc non séparable (1)	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO (4)
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4874	
Réf échantillon client : 002EX520789022 / Plafond et faux-plafonds / Poutres et charpentes / Enduits plâtre / Vol 5 (Bureau 5)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
1 Peinture + Matériau plâtreux blanc non séparable (1)	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT8826-2727 EN DATE DU 02/10/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4875	
Réf échantillon client : 002EX520789023 / Plafond et faux-plafonds / Poutres et charpentes / Enduits ciment / Vol 5 (Bureau 5)		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
1 Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4876	
Réf échantillon client : 002EX520789024 / Façades / Appui de fenêtre / Ciment / Vol 2 (Bureau 2)		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
1 Peinture + Enduit compact gris non séparable (1)	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO (3)
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4877	
Réf échantillon client : 002EX520789025 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 6 (Bureau 6)		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
1 Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4878	
Réf échantillon client : 002EX520789026 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 6 (Bureau 6)		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
1 Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4879	
Réf échantillon client : 002EX520789027 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 6 (Bureau 6)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
1 Peinture + Matériau plâtreux blanc non séparable (1)	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT8826-2727 EN DATE DU 02/10/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes Réf échantillon client : 002EX520789028 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit de rebouchage / Vol 6 (Bureau 6)		Réf échantillon ITGA : IT882609-4880 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
1 Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes Réf échantillon client : 002EX520789029 / Façades / Menuiseries / Joint de structure / Vol 6 (Bureau 6)		Réf échantillon ITGA : IT882609-4881 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
1 Peinture + Matériau compact gris non séparable (1)	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NOO (4)
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes Réf échantillon client : 002EX520789030 / Façades / Menuiseries / Joint de structure / Vol 6 (Bureau 6)		Réf échantillon ITGA : IT882609-4882 Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc	
1 Peinture + Matériau souple blanc non séparable (1)	META (B) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO (4)
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes Réf échantillon client : 002EX520789031 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 6 (Bureau 6)		Réf échantillon ITGA : IT882609-4883 Description ITGA : Matériau souple noir	
1 Matériau souple noir	META (B) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes Réf échantillon client : 002EX520789032 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 6 (Bureau 6)		Réf échantillon ITGA : IT882609-4884 Description ITGA : Matériau souple noir	
1 Matériau souple noir	META (B) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT8826-2727 EN DATE DU 02/10/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4885	
Réf échantillon client : 002EX520789033 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 6 (Bureau 6)		Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire	
1 Dalle dure cassante grise	META (B) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NOO
1 Colle bitumineuse noire	MOLP le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RNU
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4886	
Réf échantillon client : 002EX520789034 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 6 (Bureau 6)		Description ITGA : Matériau compact gris / Colle bitumineuse noire	
1 Matériau compact gris non séparable + Colle bitumineuse noire (1)	MOLP le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RNU (4)
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4887	
Réf échantillon client : 002EX520789035 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche / Vol 3 (Bureau 3)		Description ITGA : Moquette grise / Colle polymère jaune	
1 Moquette grise + Colle polymère jaune non séparable (1)	META (B) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO (4)
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4888	
Réf échantillon client : 002EX520789036 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 6 (Bureau 6)		Description ITGA : Matériau souple noir	
1 Matériau souple noir	META (B) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4889	
Réf échantillon client : 002EX520789037 / Plafond et faux-plafonds / Poutrelles / Enduits ciment / Vol 6 (Bureau 6)		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
1 Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT8826-2727 EN DATE DU 02/10/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4890	
Réf échantillon client : 002EX520789038 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 6 (Bureau 6)		Description ITGA : Matériau blanc / Matériau gris	
1 Matériau blanc + Matériau gris non séparable (1)	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO (4)
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4891	
Réf échantillon client : 002EX520789039 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 12 (Hall)		Description ITGA : Colle grise	
1 Colle grise	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4892	
Réf échantillon client : 002EX520789040 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 12 (Hall)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
1 Peinture + Matériau plâtreux blanc non séparable (1)	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO (4)
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4893	
Réf échantillon client : 002EX520789041 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 12 (Hall)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
1 Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc (1)	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO (4)
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4894	
Réf échantillon client : 002EX520789042 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 12 (Hall)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
1 Peinture + Matériau plâtreux blanc non séparable (1)	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT8826-2727 EN DATE DU 02/10/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes Réf échantillon client : 002EX520789043 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 12 (Hall)		Réf échantillon ITGA : IT882609-4895 Description ITGA : Matériau compact gris	
1 Matériau compact gris	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NOO
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes Réf échantillon client : 002EX520789044 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint de scellement / Vol 12 (Hall)		Réf échantillon ITGA : IT882609-4896 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
1 Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes Réf échantillon client : 002EX520789045 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 13 (Vestiaire)		Réf échantillon ITGA : IT882609-4897 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture	
1 Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable (1)	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO (4)
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes Réf échantillon client : 002EX520789046 / Plafond et faux-plafonds / Poutres et charpentes / Enduits plâtre / Vol 13 (Vestiaire)		Réf échantillon ITGA : IT882609-4898 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
1 Peinture + Matériau plâtreux blanc non séparable (1)	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO (4)
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes Réf échantillon client : 002EX520789047 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits plâtre / Vol 13 (Vestiaire)		Réf échantillon ITGA : IT882609-4899 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
1 Peinture + Matériau plâtreux blanc non séparable (1)	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT8826-2727 EN DATE DU 02/10/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes Réf échantillon client : 002EX520789048 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 13 (Vestiaire)		Réf échantillon ITGA : IT882609-4900 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
1 Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes Réf échantillon client : 002EX520789049 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 11 (Archives)		Réf échantillon ITGA : IT882609-4901 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
1 Enduit blanc + Matériau fibreux beige non séparable (1)	MOLP + META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO (4)
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes Réf échantillon client : 002EX520789050 / Plafond et faux-plafonds / Poutres et charpentes / Enduits ciment / Vol 11 (Archives)		Réf échantillon ITGA : IT882609-4902 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux en vrac	
1 Peinture + Enduit plâtreux en vrac non séparable (1)	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO (3)
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes Réf échantillon client : 002EX520789051 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 11 (Archives)		Réf échantillon ITGA : IT882609-4903 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
1 Peinture + Matériau plâtreux blanc non séparable (1)	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO (4)
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes Réf échantillon client : 002EX520789052 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 11 (Archives)		Réf échantillon ITGA : IT882609-4904 Description ITGA : Colle grise	
1 Colle grise	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT8826-2727 EN DATE DU 02/10/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4905	
Réf échantillon client : 002EX520789053 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 14 (Extérieur 1)		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
1 Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4908	
Réf échantillon client : 002EX520789056 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 14 (Extérieur 1)		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
1 Peinture + Matériau plâtreux blanc non séparable (1)	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO (4)
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4909	
Réf échantillon client : 002EX520789057 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 14 (Extérieur 1)		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture	
1 Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable (1)	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NOO (4)
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4910	
Réf échantillon client : 002EX520789058 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 15 (Extérieur 2)		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture	
1 Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : NOO
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4911	
Réf échantillon client : 002EX520789059 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 14 (Extérieur 1)		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture	
1 Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : NOO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT8826-2727 EN DATE DU 02/10/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4912	
Réf échantillon client : 002EX520789060 / Façades / Murs / Joint de scellement / Vol 15 (Extérieur 2)		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
1 Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : NOO
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4913	
Réf échantillon client : 002EX520789061 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 15 (Extérieur 2)		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
1 Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : NOO
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4914	
Réf échantillon client : 002EX520789062 / Façades / Menuiseries / Joint de structure / Vol 15 (Extérieur 2)		Description ITGA : Matériau souple gris	
1 Matériau souple gris	META (B) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : NOO
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4915	
Réf échantillon client : 002EX520789063 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 15 (Extérieur 2)		Description ITGA : Matériau souple gris	
1 Matériau souple gris	META (B) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : NOO
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4916	
Réf échantillon client : 002EX520789064 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 15 (Extérieur 2)		Description ITGA : Matériau souple gris	
1 Matériau souple gris	META (B) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : NOO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT8826-2727 EN DATE DU 02/10/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4917	
Réf échantillon client : 002EX520789065 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 15 (Extérieur 2)		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture	
1 Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : NOO
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4918	
Réf échantillon client : 002EX520789066 / Façades / Menuiseries / Reprise d'étanchéïté / Vol 15 (Extérieur 2)		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
1 Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : NOO
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4919	
Réf échantillon client : 002EX520789067 / Façades / Murs / Étanchéité / Vol 15 (Extérieur 2)		Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Peinture	
1 Matériau bitumineux noir + Peinture non séparable	META (B) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : NOO
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4920	
Réf échantillon client : 002EX520789068 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 16 (Extérieur 3)		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture	
1 Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : NOO
Réf dossier client : Hôtel des douanes 13 Avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN Hôtel des douanes		Réf échantillon ITGA : IT882609-4921	
Réf échantillon client : 002EX520789069 / Façades / Murs / Joint de scellement / Vol 16 (Extérieur 3)		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
1 Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : NOO

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

1.accréditation n° 1-6304

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT8826-2727 EN DATE DU 02/10/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)


Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques

Validé par : Nousayba OUATTARA Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2

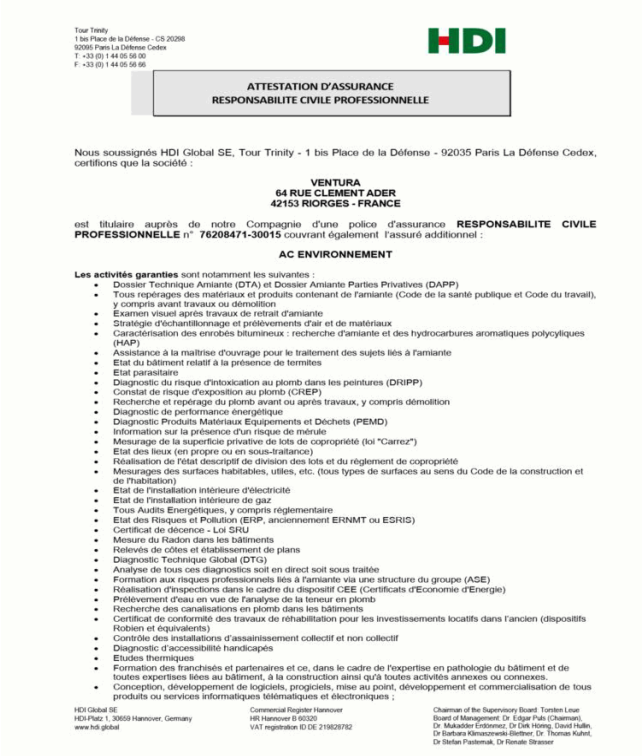

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T +33 (0) 1 44 05 58 00
F +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :


- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maitrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de côtes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'Inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puhl (Chairman), Dr. Mukadder Erdönmez, Dr Dirk Hönig, David Hullin, Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt, Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Assurance 2026 AC 2/2

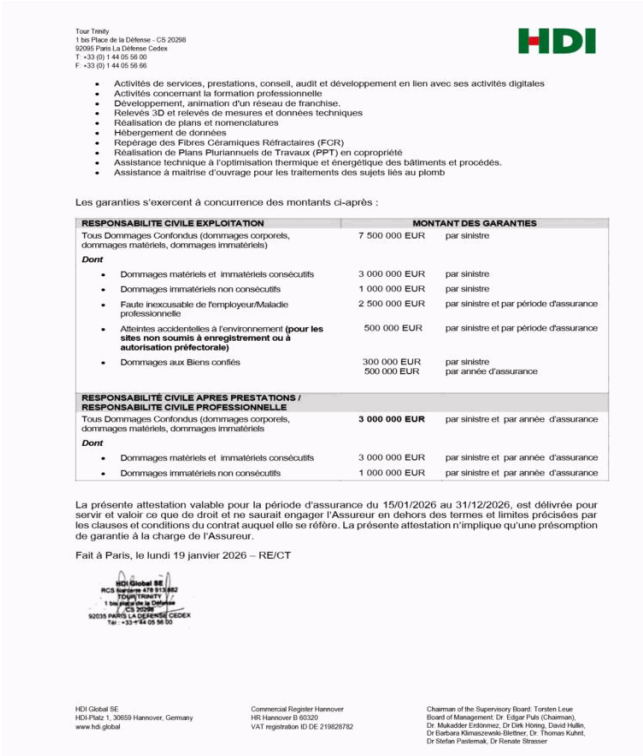

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T +33 (0) 1 44 05 58 00
F +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique et énergétique des bâtiments et procédés.
- Assistance à maitrise d'ouvrage pour les traitements des sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	300 000 EUR 500 000 EUR	par sinistre par année d'assurance
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 15/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engagor l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 19 janvier 2026 – RE/CT


HDI Global SE
RCS Nanterre 479 513 882
TOUR TRINITY
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92035 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Tel : +33 1 44 05 58 00

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puhl (Chairman), Dr. Mukadder Erdönmez, Dr Dirk Hönig, David Hullin, Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt, Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Attestation sur l'honneur

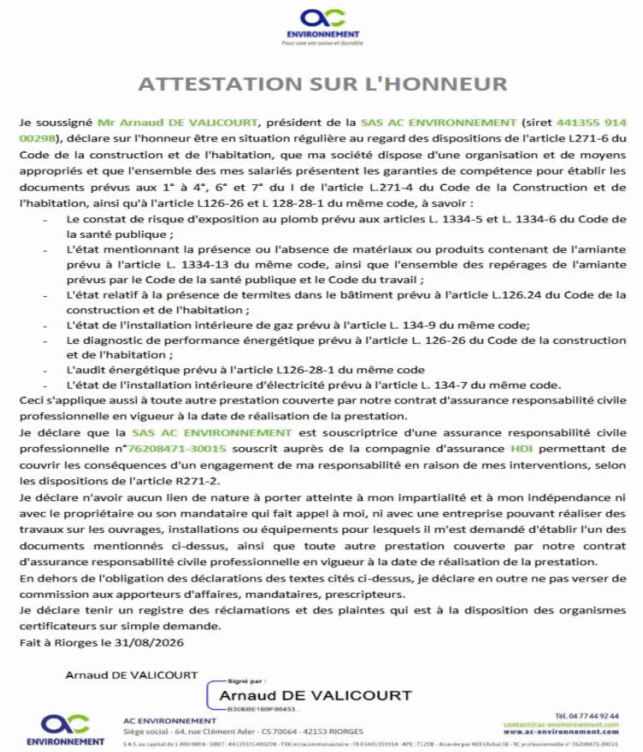

ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mr Arnaud DE VALICOURT, président de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 31/08/2026

Arnaud DE VALICOURT

Signé par :
Arnaud DE VALICOURT
B30B8E1B9F86453...

ENVIRONNEMENT
AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
Tél. 04 77 44 92 44
contact@ac-environnement.com
www.ac-environnement.com

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI5722



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI5722 Version 009

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BOURGOGNON Cyril

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 27/07/2020 - Date d'expiration : 26/07/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 27/07/2020 - Date d'expiration : 26/07/2027
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 03/12/2025 - Date d'expiration : 02/12/2032
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 26/10/2020 - Date d'expiration : 25/10/2027
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 22/10/2020 - Date d'expiration : 21/10/2027
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 22/10/2020 - Date d'expiration : 21/10/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée en scannant le QR code ou à l'adresse suivante : https://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/
Valide à partir du 31/03/2026.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 1er juillet 2020 modifié définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs du diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev23
