BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
GEP Lorraine Bourgogne (Nancy)
5 rue Pablo Picasso
CS 20111
57365 ENNERY

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 24083331/S1/6/AM-RTV_V1

Rédigé le : 28/01/2025

Référence au programme de travaux :
N°ECATALOG1_2495_0004579280 réalisé le 21/10/2024 par

DONNEUR D'ORDRE

HUSSEIN KABA
1 RUE DU MARECHAL LYAUTEY
57044 METZ

SITE D'INTERVENTION

3eRH Quartier Séré de Rivières GEP
3 AVENUE DE BLIDA
57000 METZ

BAT 06



SYNTHESE DE CONCLUSION

SANS AMIANTE repéré

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence
SOLENE LIPIEC	Diagnostiqueuse	22/08/2022

Signataire du rapport
SOLENE LIPIEC


Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION **3**
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 5

2. CONCLUSIONS **6**
2.1. Obligations réglementaires 7

3. INFORMATIONS GENERALES **8**
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 8
3.2. Parties prenantes 8


4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE **8**
4.1. Références réglementaires 8

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE **9**
5.1. Date(s) de visite(s) 9
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 9
5.3. Conditions spécifiques 9
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 9

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **10**
6.1. Matériaux et produits repérés 10
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante 39

7. ANNEXES **39**
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 39
7.2. Photos prélèvements 43
7.3. Photos observations 45
7.4. Attestation d'assurance 46
7.5. Certificat de compétence 48
7.6. Croquis de repérage 49
7.7. Rapport d'analyse du laboratoire 55

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets

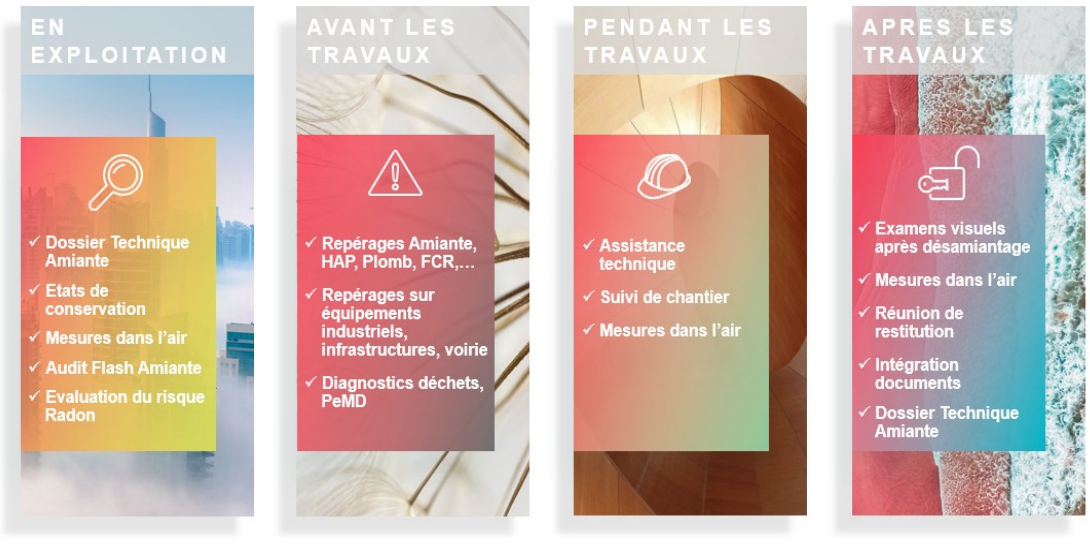

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Changement des menuiserie extérieures, Remplacement des colonnes de douches sur tous les niveaux ainsi que des sanitaires communs

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la façade	Conduits, Elements ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Primaires d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints d'écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre

1.3. Périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Menuiseries extérieurs, salles de bains et sanitaires communs sur tous les étages

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : 3eRH Quartier Séré de Rivières GEP
3 AVENUE DE BLIDA
57000 METZ

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
3eRH Quartier Séré de Rivières GEP	Autres	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
HUSSEIN KABA	Donneur d'ordre	/	1 RUE DU MARECHAL LYAUTEY 57044 METZ	0326222851 - 0672486869

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 13/01/2025 au 15/01/2025

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / ECATALOG1_2495_0004579280	/	21/10/2024	ECATALOG1_2495_0004579280	/
DOE	/	03/02/2008	Dossier des ouvrages exécutés	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
RDC -> Douches	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	2	/	S3	DC	Autre - DOE - 03/02/2008	Non
RDC -> Douches	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Clair	1	/	S2	DC	Autre - DOE - 03/02/2008	Non
RDC -> Douches	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
RDC -> Douches	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> Douches	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
RDC -> Sanitaires femmes	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
RDC -> Sanitaires femmes	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Sanitaires femmes	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
RDC -> Sanitaires hommes	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
RDC -> Sanitaires hommes	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> Sanitaires hommes	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 15	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	P6* N	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 15	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	P4* N	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 15	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	P5* N	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 15	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	P9* N	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 15	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	6	/	S4	DC	2008 Autre - DOE - 03/02/2008	Non
RDC -> Chambre 15	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Fibreux	Noir	8	/	S5	DC	Autre - DOE - 03/02/2008	Non
RDC -> Chambre 15	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Clair	1	/	S1	DC	Autre - DOE - 03/02/2008	Non
RDC -> Chambre 1	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Chambre 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 1	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 2	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 2	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 3	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 3	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 4	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 4	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 4	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 4	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Chambre 5	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 5	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 6	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 6	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 6	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 6	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 7	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 7	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 7	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 7	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 8	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 8	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Chambre 8	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 8	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 9	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 9	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 9	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 9	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 10	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 10	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 10	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 10	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 11	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 11	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 11	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 11	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Chambre 12	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 12	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 12	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 12	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 13	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 13	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 13	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 13	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 14	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 14	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 14	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 14	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 16	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 16	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Chambre 16	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 16	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 17	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 17	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 17	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 17	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 18	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 18	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 18	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> Chambre 18	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
RDC -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc	14	/	/	AN	/	A revoir
RDC -> Circulation	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R1	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 101	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R1 -> Chambre 101	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 101	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 101	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 102	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 102	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 102	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 102	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 103	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 103	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 103	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 103	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 104	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 104	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 104	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R1 -> Chambre 104	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 105	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 105	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 105	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 105	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 106	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 106	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 106	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 106	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 107	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 107	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 107	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 107	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 108	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R1 -> Chambre 108	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 108	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 108	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 109	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 109	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 109	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 109	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 110	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 110	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 110	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 110	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 111	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 111	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 111	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R1 -> Chambre 111	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 112	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 112	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 112	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 112	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 113	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 113	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 113	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 113	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 114	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 114	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 114	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 114	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 115	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R1 -> Chambre 115	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 115	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 115	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 116	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 116	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 116	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 116	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 117	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 117	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 117	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 117	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 118	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 118	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R1 -> Chambre 118	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R1 -> Chambre 118	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R1 -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc	14	/	/	AN	/	A revoir
R1 -> Circulation	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R1 -> Local détente	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R1 -> Local détente	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R1 -> Local détente	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R1 -> Local entretien	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R1 -> Local entretien	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R1 -> Local entretien	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R1 -> Sanitaires	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R1 -> Sanitaires	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R1 -> Sanitaires	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R2	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R2 -> Chambre 220	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	P15 N	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 220	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 220	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 220	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 201	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 201	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 201	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 201	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 202	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 202	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 202	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 202	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 203	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 203	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R2 -> Chambre 203	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 203	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 204	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 204	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 204	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 204	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 205	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 205	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 205	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 205	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 206	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 206	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 206	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 206	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R2 -> Chambre 207	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 207	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 207	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 207	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 208	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 208	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 208	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 208	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 209	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 209	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 209	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 209	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 210	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 210	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R2 -> Chambre 210	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 210	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 212	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 212	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 212	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 212	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 213	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 213	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 213	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 213	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 214	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 214	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 214	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 214	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R2 -> Chambre 215	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 215	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 215	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 215	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 216	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 216	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 216	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 216	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 217	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 217	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 217	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 217	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 218	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 218	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R2 -> Chambre 218	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R2 -> Chambre 218	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R2 -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc	14	/	/	AN	/	A revoir
R2 -> Circulation	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R2 -> Local détente	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R2 -> Local détente	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R2 -> Local détente	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R2 -> Local entretien	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R2 -> Local entretien	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R2 -> Local entretien	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R2 -> Sanitaires	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R2 -> Sanitaires	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R2 -> Sanitaires	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R3	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R3 -> Circulation	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Jaune	13	P16* N	/	AN	/	Non
R3 -> Circulation	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Jaune	13	P17 N	/	AN	/	Non
R3 -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc	14	P18* N	/	AN	/	A revoir
R3 -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc	14	P19 N	/	AN	/	A revoir
R3 -> Circulation	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 301	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 301	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 301	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 301	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 302	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 302	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R3 -> Chambre 302	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 302	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 303	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 303	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 303	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 303	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 304	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 304	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 304	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 304	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 305	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 305	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 305	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 305	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R3 -> Chambre 306	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 306	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 306	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 306	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 307	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 307	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 307	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 307	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 308	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 308	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 308	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 308	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 309	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 309	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R3 -> Chambre 309	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 309	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 310	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 310	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 310	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 310	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 311	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 311	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 311	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 311	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 312	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 312	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 312	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 312	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R3 -> Chambre 313	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 313	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 313	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 313	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 314	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 314	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 314	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 314	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 315	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 315	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 315	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 315	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 316	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 316	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R3 -> Chambre 316	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 316	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 317	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 317	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 317	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 317	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 318	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 318	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 318	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R3 -> Chambre 318	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R3 -> Local bagagerie	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R3 -> Local bagagerie	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R3 -> Local bagagerie	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R3 -> Local entretien	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R3 -> Local entretien	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R3 -> Local entretien	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
R3 -> Sanitaires	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
R3 -> Sanitaires	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R3 -> Sanitaires	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
COMBLES	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 401	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 401	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 401	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 401	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 402	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 402	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 402	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
COMBLES -> Chambre 402	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 403	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 403	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 403	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 403	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 404	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 404	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 404	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 404	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 405	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 405	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 405	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 405	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 406	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
COMBLES -> Chambre 406	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 406	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 406	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 407	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 407	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 407	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 407	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 408	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 408	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 408	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 408	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 409	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 409	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 409	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
COMBLES -> Chambre 409	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 410	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 410	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre	Jaune	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 410	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
COMBLES -> Chambre 410	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
COMBLES -> Circulation	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
COMBLES -> Sanitaires	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
COMBLES -> Sanitaires	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
COMBLES -> Sanitaires	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
COMBLES -> Local détente	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
COMBLES -> Local détente	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
COMBLES -> Local détente	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Gris	7	Idem P 9	/	AN	/	Non

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.


Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
RDC	/
RDC -> Douches	/
RDC -> Sanitaires femmes	/
RDC -> Sanitaires hommes	/
RDC -> Chambre 15	/
RDC -> Chambre 1	/
RDC -> Chambre 2	/
RDC -> Chambre 3	/
RDC -> Chambre 4	/
RDC -> Chambre 5	/
RDC -> Chambre 6	/
RDC -> Chambre 7	/
RDC -> Chambre 8	/
RDC -> Chambre 9	/
RDC -> Chambre 10	/
RDC -> Chambre 11	/
RDC -> Chambre 12	/
RDC -> Chambre 13	/
RDC -> Chambre 14	/
RDC -> Chambre 16	/
RDC -> Chambre 17	/
RDC -> Chambre 18	/
RDC -> Circulation	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R1	/
R1 -> Chambre 101	/
R1 -> Chambre 102	/
R1 -> Chambre 103	/
R1 -> Chambre 104	/
R1 -> Chambre 105	/
R1 -> Chambre 106	/
R1 -> Chambre 107	/
R1 -> Chambre 108	/
R1 -> Chambre 109	/
R1 -> Chambre 110	/
R1 -> Chambre 111	/
R1 -> Chambre 112	/
R1 -> Chambre 113	/
R1 -> Chambre 114	/
R1 -> Chambre 115	/
R1 -> Chambre 116	/
R1 -> Chambre 117	/
R1 -> Chambre 118	/
R1 -> Circulation	/
R1 -> Local détente	/
R1 -> Local entretien	/
R1 -> Sanitaires	/
R2	/
R2 -> Chambre 220	/
R2 -> Chambre 201	/
R2 -> Chambre 202	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R2 -> Chambre 203	/
R2 -> Chambre 204	/
R2 -> Chambre 205	/
R2 -> Chambre 206	/
R2 -> Chambre 207	/
R2 -> Chambre 208	/
R2 -> Chambre 209	/
R2 -> Chambre 210	/
R2 -> Chambre 212	/
R2 -> Chambre 213	/
R2 -> Chambre 214	/
R2 -> Chambre 215	/
R2 -> Chambre 216	/
R2 -> Chambre 217	/
R2 -> Chambre 218	/
R2 -> Circulation	/
R2 -> Local détente	/
R2 -> Local entretien	/
R2 -> Sanitaires	/
R3	/
R3 -> Circulation	/
R3 -> Chambre 301	/
R3 -> Chambre 302	/
R3 -> Chambre 303	/
R3 -> Chambre 304	/
R3 -> Chambre 305	/
R3 -> Chambre 306	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R3 -> Chambre 307	/
R3 -> Chambre 308	/
R3 -> Chambre 309	/
R3 -> Chambre 310	/
R3 -> Chambre 311	/
R3 -> Chambre 312	/
R3 -> Chambre 313	/
R3 -> Chambre 314	/
R3 -> Chambre 315	/
R3 -> Chambre 316	/
R3 -> Chambre 317	/
R3 -> Chambre 318	/
R3 -> Local bagagerie	/
R3 -> Local entretien	/
R3 -> Sanitaires	/
COMBLES	/
COMBLES -> Chambre 401	/
COMBLES -> Chambre 402	/
COMBLES -> Chambre 403	/
COMBLES -> Chambre 404	/
COMBLES -> Chambre 405	/
COMBLES -> Chambre 406	/
COMBLES -> Chambre 407	/
COMBLES -> Chambre 408	/
COMBLES -> Chambre 409	/
COMBLES -> Chambre 410	/
COMBLES -> Circulation	/
COMBLES -> Sanitaires	/
COMBLES -> Local détente	/

7.2. Photos prélèvements

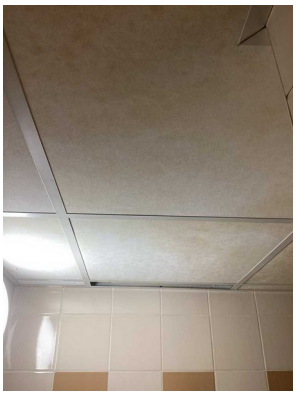P6	ZPSO 5
RDC -> Chambre 15	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P4	ZPSO 3
RDC -> Chambre 15	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Isolants intérieurs fibreux	

P5	ZPSO 4
RDC -> Chambre 15	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P9	ZPSO 7
RDC -> Chambre 15	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P15	ZPSO 4
R2 -> Chambre 220	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P16	ZPSO 13
R3 -> Circulation	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P17	ZPSO 13
R3 -> Circulation	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P18	ZPSO 14
R3 -> Circulation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

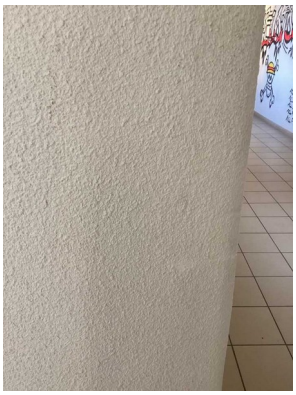P19	ZPSO 14
R3 -> Circulation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

7.3. Photos observations

R3 -> Circulation	OBS 1
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Menuiseries extérieures	
	**Observation :** 2000

7.4. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Allianz

Autres missions :
- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Signé par: Juliette Allavoine
E-mail: juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature: 07-01-2025 10:12:02
Adresse IP: 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.5. Certificat de compétence

cesi CERTIFICATION

Tour PB5
1 av. du Général De Gaulle
92074 PARIS LA DEFENSE

CERTIFICAT
N° ODI-00452
Version 01

Nous attestons que :
LIPIEC Solène

Né(e) le : 17/10/1995 A : ST AVOLD

Répond aux exigences de compétences de certification de personnes « Opérateurs en Diagnostics Immobiliers » pour les domaines techniques suivants :

Domaine(s) Technique(s)	***Validité du Certificat***
Amiante sans mention	*Du 22/08/2022 au 21/08/2029*
Amiante avec mention	*Du 22/08/2022 au 21/08/2029*

Les évaluations des opérateurs en diagnostics immobiliers sont réalisées conformément aux dispositions définies dans les référentiels de certification.

- Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Paris,

Le 22/08/2022

Le Directeur

Sébastien MAURICE

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
Accréditation
n° 4-0556
portée disponible sur www.cofrac.fr

7.6. Croquis de repérage


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	3eRH Quartier Séré de Rivières GEP 3 AVENUE DE BLIDA 57000 METZ	
Localisation RDC	Date visite	Du 13/01/2025 au 15/01/2025
	Auteur	SOLENE LIPIEC
	N° dossier	24083331/S1/6
	Planche	1 / 5
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

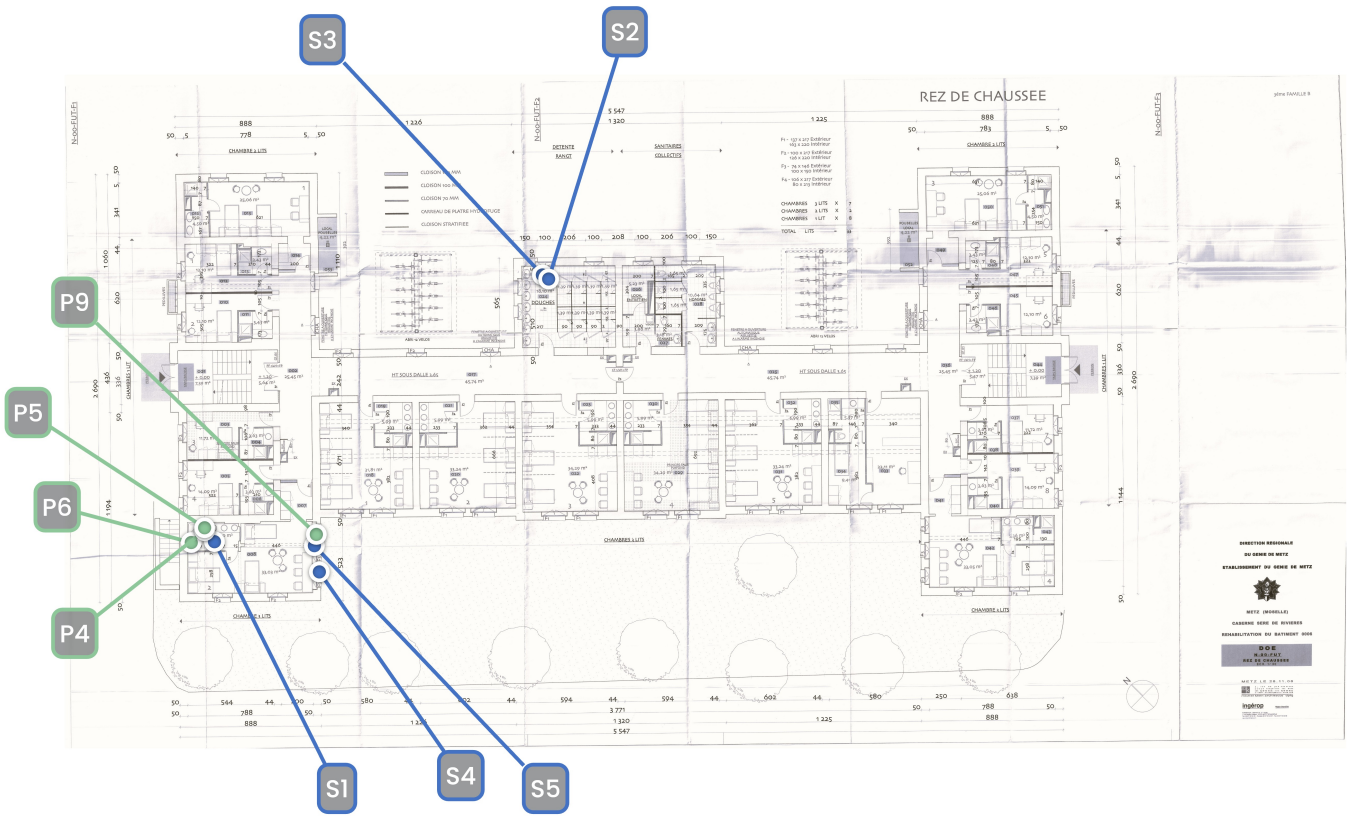

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	3eRH Quartier Séré de Rivières GEP 3 AVENUE DE BLIDA 57000 METZ	
Localisation R1	Date visite	Du 13/01/2025 au 15/01/2025
	Auteur	SOLENE LIPIEC
	N° dossier	24083331/S1/6
	Planche	2 / 5
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

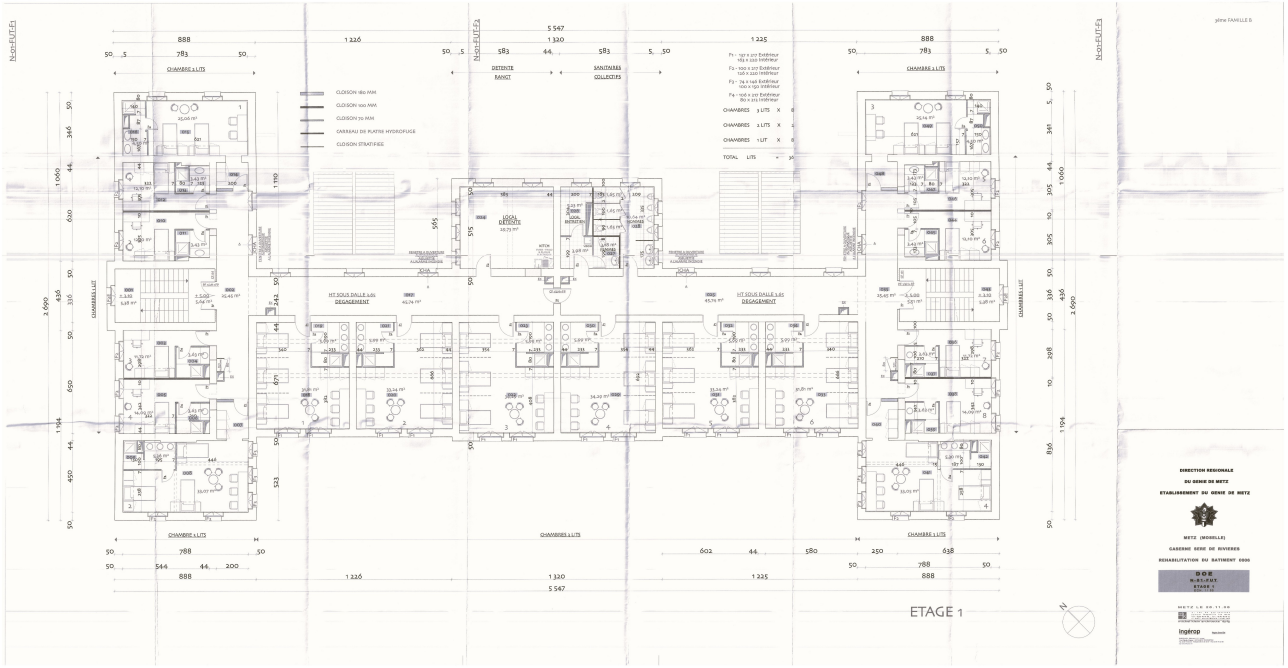

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	3eRH Quartier Séré de Rivières GEP 3 AVENUE DE BLIDA 57000 METZ	
Localisation R2	Date visite	Du 13/01/2025 au 15/01/2025
	Auteur	SOLENE LIPIEC
	N° dossier	24083331/S1/6
	Planche	3 / 5
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

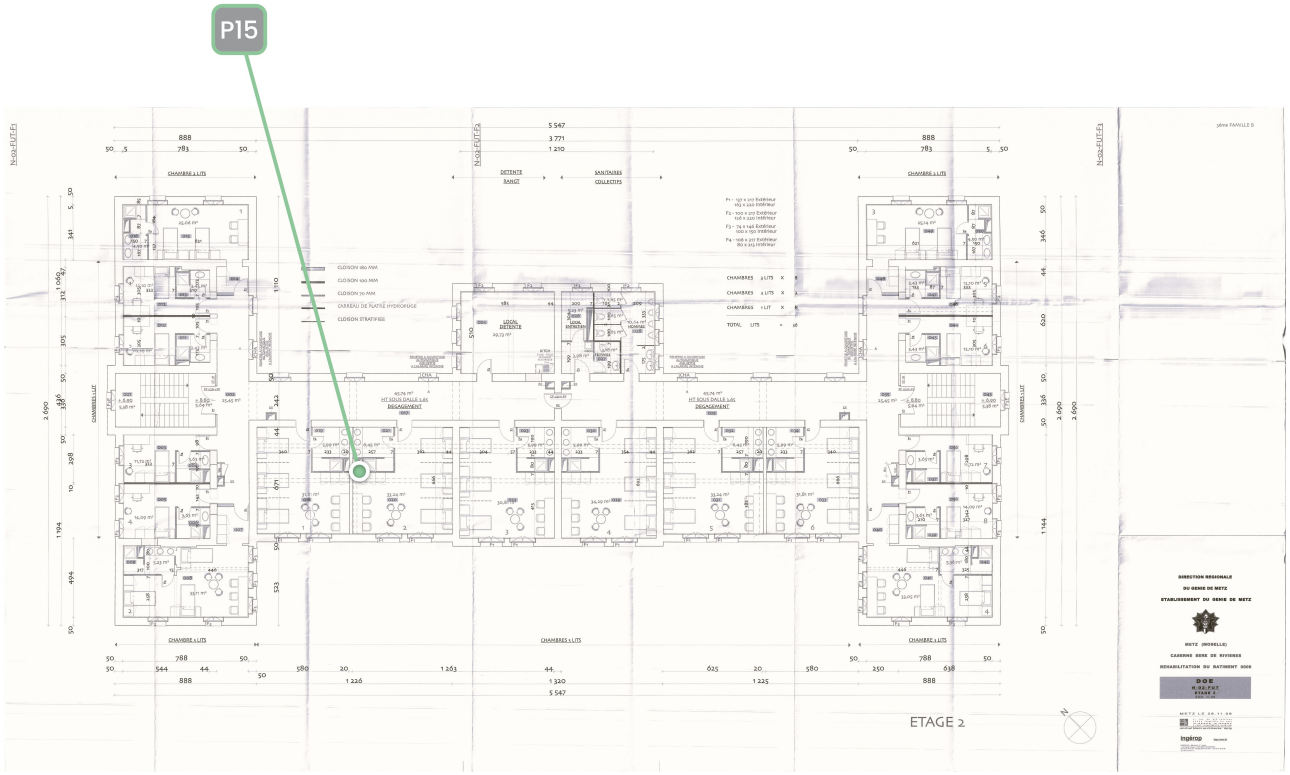

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	3eRH Quartier Séré de Rivières GEP 3 AVENUE DE BLIDA 57000 METZ	
Localisation R3	Date visite	Du 13/01/2025 au 15/01/2025
	Auteur	SOLENE LIPIEC
	N° dossier	24083331/S1/6
	Planche	4 / 5
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

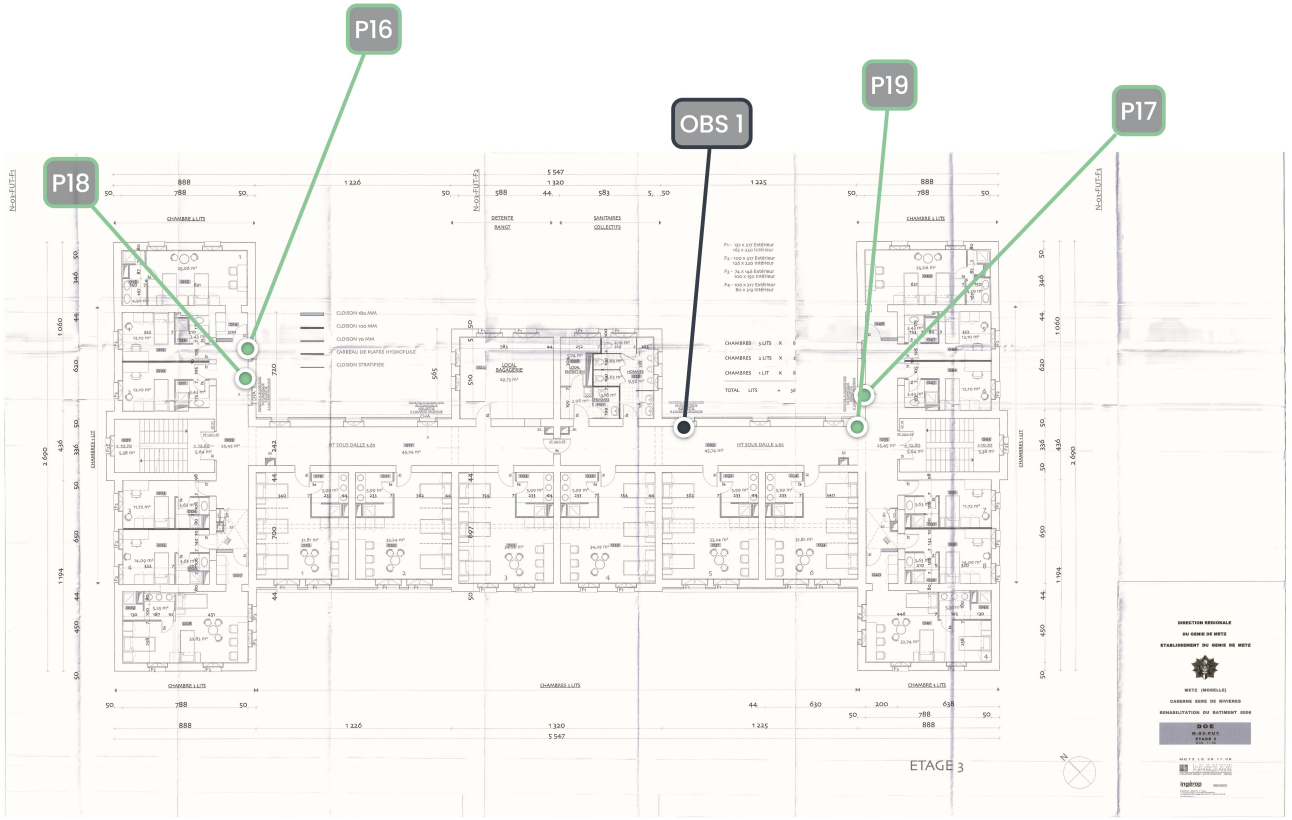

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	3eRH Quartier Séré de Rivières GEP 3 AVENUE DE BLIDA 57000 METZ	
Localisation COMBLES	Date visite	Du 13/01/2025 au 15/01/2025
	Auteur	SOLENE LIPIEC
	N° dossier	24083331/S1/6
	Planche	5 / 5
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

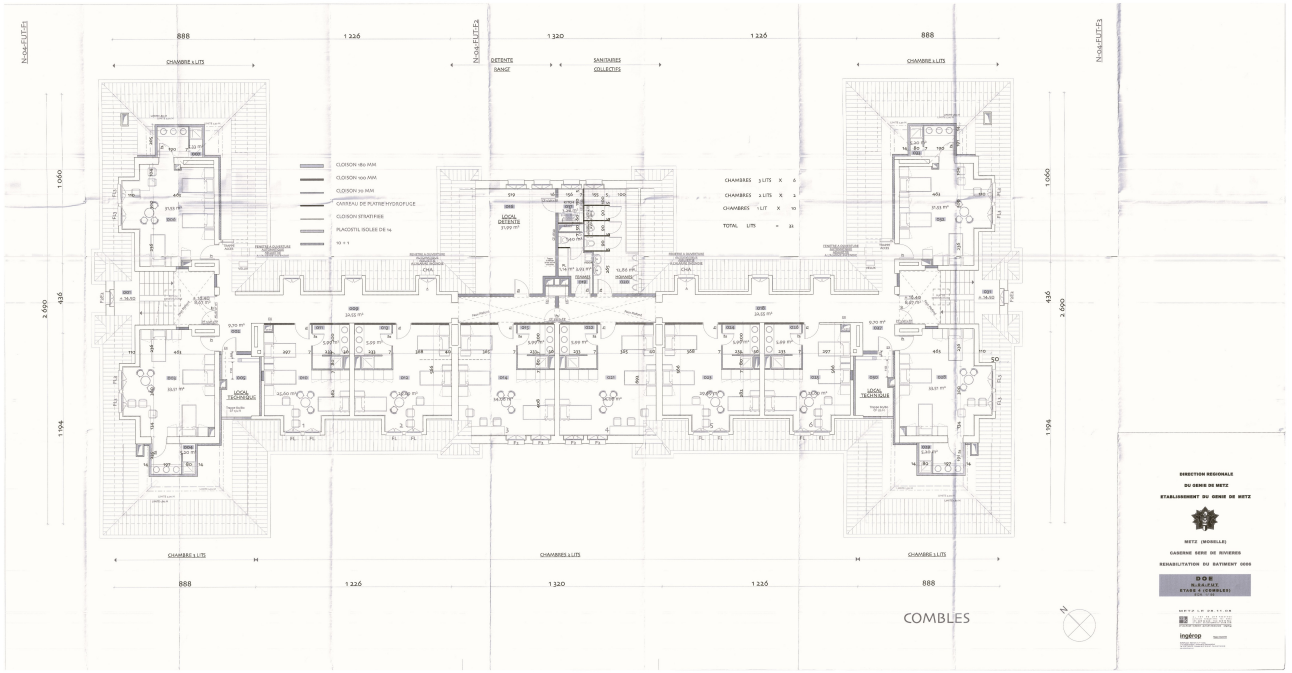

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

7.7. Rapport d'analyse du laboratoire

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Madame Solene LIPIEC
5 Rue Pablo Picasso
57365 ENNERY

Notre référence : AR-25-LE-004096-01

Numéro de dossier : 25A001471
Référence de dossier : 1510797887/24083331/S1/6/1_24083331/6/7

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25A001471-001 - Référence *BV3MU9819 Réf. Prel : P4 RDC - Chambre 15/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Laine de verre/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A001471-002 - Référence *BV3MU9820 Réf. Prel : P5 RDC - Chambre 15/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A001471-003 - Référence *BV3MU9821 Réf. Prel : P6 RDC - Chambre 15/Faux plafonds - (Laine de verre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A001471-004 - Référence *BV3MU9824 Réf. Prel : P9 RDC - Chambre 15/Menuiseries extérieures - (Silicone/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A001471-005 - Référence *BV3MU9830 Réf. Prel : P15 R2 - Chambre 220/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A001471-006 - Référence *BV3MU9833 Réf. Prel : P16 R3 - Circulation/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A001471-007 - Référence *BV3MU9834 Réf. Prel : P17 R3 - Circulation/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A001471-008 - Référence *BV3MU9831 Réf. Prel : P18 R3 - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Peint/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A001471-009 - Référence *BV3MU9832 Réf. Prel : P19 R3 - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Peint/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

eurofins

acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

P-RS-FRM8220

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS
Laboratoire Analyses Saverne
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-002005-01 | Date d'émission de rapport : 28/01/2025 4:32 |
Référence laboratoire N° : 25RB001888 | Référence de suivi du dossier N° : 25A001471
Reçu au laboratoire le : 23/01/2025 | Date de réception :22/01/2025
Date d'analyse : 27/01/2025
Référence dossier Client:25A001471 - 1510797887/24083331/S1/6/1_24083331/6/7

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25A001471-001 - BV3MU9819 Réf. Prel : P4 RDC - Chambre 15/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Laine de verre/Jaune)	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (gris)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
002	25A001471-002 - BV3MU9820 Réf. Prel : P5 RDC - Chambre 15/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert)	**MOLP** / R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	25A001471-003 - BV3MU9821 Réf. Prel : P6 RDC - Chambre 15/Faux plafonds - (Laine de verre/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-002005-01 | Date d'émission de rapport : 28/01/2025 4:32 |
Référence laboratoire N° : 25RB001888 | Référence de suivi du dossier N° : 25A001471
Reçu au laboratoire le : 23/01/2025 | Date de réception :22/01/2025
Date d'analyse : 27/01/2025
Référence dossier Client:25A001471 - 1510797887/24083331/S1/6/1_24083331/6/7

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	25A001471-004 - BV3MU9824 Réf. Prel : P9 RDC - Chambre 15/Menuiseries extérieures - (Silicone/Gris)	Matériau souple (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	25A001471-005 - BV3MU9830 Réf. Prel : P15 R2 - Chambre 220/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)	Matériau semi-dur (beige)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25A001471-006 - BV3MU9833 Réf. Prel : P16 R3 - Circulation/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Jaune)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25A001471-007 - BV3MU9834 Réf. Prel : P17 R3 - Circulation/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Jaune)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	25A001471-008 - BV3MU9831 Réf. Prel : P18 R3 - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Peint/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-002005-01 | Date d'émission de rapport : 28/01/2025 4:32 | Page3/4
Référence laboratoire N° : 25RB001888 | Référence de suivi du dossier N° : 25A001471
Reçu au laboratoire le : 23/01/2025 | Date de réception :22/01/2025
Date d'analyse : 27/01/2025
Référence dossier Client:25A001471 - 1510797887/24083331/S1/6/1_24083331/6/7

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	25A001471-009 - BV3MU9832 Réf. Prel : P19 R3 - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Peint/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-002005-01 | Date d'émission de rapport : 28/01/2025 4:32 | Page4/4
Référence laboratoire N° : 25RB001888 | Référence de suivi du dossier N° : 25A001471
Reçu au laboratoire le : 23/01/2025 | Date de réception :22/01/2025
Date d'analyse : 27/01/2025
Référence dossier Client:25A001471 - 1510797887/24083331/S1/6/1_24083331/6/7

Validé et approuvé par :



Vicentiu Stoica
Sef serviciu CRO 007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România
