BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
GEP Lorraine Bourgogne (Nancy)
29 rue Antoine de St Exupery
ZAC de Frocourt
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 27550707/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 19/09/2025

Référence au programme de travaux :
Devis amiante et plomb avant travaux - METZ - Caserne Séré de Rivières - Bâts 006 et 008 Mail du 04/10 2024 à 8H38 réalisé le 04/10/2024 par MARTIN-SISTERON Juana

DONNEUR D'ORDRE

Juana MARTIN SISTERON
139 RUE DE BERCY
75572 PARIS CEDEX 12

SITE D'INTERVENTION

CASERNE SERE

AVENUE DE BLIDA
57000 METZ

008

Latitude : 49.129700 / Longitude : 6.189300

Date(s) d'intervention(s) :
Le 12/08/2025




SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence
Olivier JEANSON	Responsable opérationnel	Certification N° B2C 0763
Pascale CHENY	Responsable d'opérations	Certification N° 13778270

Signataire du rapport
Olivier JEANSON


Le présent rapport comporte 92 pages, dont 62 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

Copyright BUREAU VERITAS

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION **3**
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 5

2. CONCLUSIONS **6**
2.1. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre 7
2.2. Obligations réglementaires 9

3. INFORMATIONS GENERALES **10**
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 10
3.2. Parties prenantes 10

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE **10**
4.1. Références réglementaires 10

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE **11**
5.1. Date(s) de visite(s) 11
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 11
5.3. Conditions spécifiques 11
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 11

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **12**
6.1. Matériaux et produits repérés 12
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante 31

7. ANNEXES **31**
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 31
7.2. Photos prélèvements 38
7.3. Photos sondages 47
7.4. Photos inaccessibilités 49
7.5. Attestation d'assurance 59
7.6. Certificat de compétence 61
7.7. Croquis de repérage 62
7.8. Rapport d'analyse du laboratoire 68

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Remplacement des menuiseries extérieures (fenêtres et impostes mobiles) Remplacement des menuiseries intérieures des chambres et des paliers Remplacement des menuiseries des cages d'escaliers Remises en peintures des chambre du RDC du R+1 du R+2 et R+3 Remplacement des portes d'entrées Remplacement des Cabines de douches sur les 3 étages l'intégralité du pignon

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la façade	Conduits, Elements ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Primaires d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Peintures, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints d'écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous-couches des revêtements souples

1.3. Périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

L’opérateur de repérage n’ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d’ordre doit mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l’amiante.

2.1. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
RDC -> 036 (MA 2)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
RDC -> 040 (MA 1)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+1 -> 001 (MA 26)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+1 -> 004 (MA 27)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+1 -> 009 (MA 28)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+1 -> 010 (MA 29)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+1 -> 035 (MA 22)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+1 -> 040 (MA 23)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+1 -> 041 (MA 25)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+1 -> 043 (MA 24)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+2 -> 004 (MA 13)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+2 -> 009 (MA 14)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+2 -> 010 (MA 15)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+2 -> 036 (MA 17)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+2 -> 037 (MA 16)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+2 -> 038 (MA 18)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

R+2 -> 041 (MA 19)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+2 -> 042 (MA 20)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+2 -> 044 (MA 21)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+3 -> 003 (MA 3)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+3 -> 005 (MA 4)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+3 -> 016 (MA 6)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+3 -> 018 (MA 7)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+3 -> 024 (MA 8)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+3 -> 029 (MA 11)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+3 -> 030 (MA 9)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+3 -> 031 (MA 10)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+3 -> 034 (MA 12)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
R+3 -> 006 (MA 5)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : CASERNE SERE
AVENUE DE BLIDA
57000 METZ

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
CASERNE SERE	Administrations, bureaux	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Juana MARTIN SISTERON	Donneur d'ordre	/	139 RUE DE BERCY 75572 PARIS CEDEX 12	/
Juana MARTIN-SISITERON	Accompagnateur	/	/	+33 3 87 15 58 22 - juana.martin-sisteron@intradef.gouv.fr

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 12/08/2025

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)
- Les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / Devis amiante et plomb avant travaux - METZ - Caserne Séré de Rivières - Bâts 006 et 008	MARTIN-SISTERON Juana	04/10/2024	Mail du 04/10 2024 à 8H38	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 001	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 001	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> 001	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC -> 002	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	/	16	P25* N	/	AN	/	Non
RDC -> 002	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	/	16	P26 N	/	AN	/	Non
RDC -> 002	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 002	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 002	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC -> 003	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> 003	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC -> 004	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 004	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> 004	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC -> 005	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 005	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> 005	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC -> 006	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 006	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 006	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC -> 007	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 007	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> 007	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC -> 008	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 008	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> 008	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC -> 009	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 009	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> 009	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC -> 013	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	/	14	P23* N	/	AN	de Dalles plombantes	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 013	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	15	P24* N	/	AN	/	Non
RDC -> 013	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	15	P55 N	/	AN	/	Non
RDC -> 013	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 014	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 014	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC -> 015	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	P20* N	/	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 015	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Noir, Gris	4	P19* N	/	AN	/	Non
RDC -> 015	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux, Plâtre	Rose	5	P21* N	/	AN	/	Non
RDC -> 015	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Compact, Dur	Rose	1	P22* N	/	AN	/	Non
RDC -> 017	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 017	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 017	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC -> 018	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 018	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> 018	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC -> 019	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 019	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> 019	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC -> 020	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	/	S15	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 020	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> 020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC -> 021	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 021	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> 021	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC -> 022	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 022	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> 022	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC -> 023	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	/	S11	AN	/	Non
RDC -> 023	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	/	S12	AN	/	Non
RDC -> 023	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	/	S10	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 023	Grilles	Peintures	Décoratif	Gris	13	P18* N	/	AN	/	Non
RDC -> 024	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	/	11	/	S14	PN	2010	Non
RDC -> 024	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 024	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 024	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC -> 025	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	/	11	/	S8	PN	2010	Non
RDC -> 025	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	/	8	P14* N	/	AN	/	Non
RDC -> 025	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	12	P17* N	/	AN	carrelage blanc douches	Non
RDC -> 025	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	12	P54 N	/	AN	carrelage blanc douches	Non
RDC -> 025	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mortier	/	9	P15* N	/	AN	/	Non
RDC -> 025	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Gris	6	P16* N	/	AN	/	Non
RDC -> 025	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> 026	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	/	11	/	S9	PN	2010	Non
RDC -> 026	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	/	8	P11 N	/	AN	/	Non
RDC -> 026	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Gris	6	P9 N	/	AN	/	Non
RDC -> 026	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Beige, Blanc, Gris	7	P10* N	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 026	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mortier	/	9	P12 N	/	AN	/	Non
RDC -> 026	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> 027	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	P8* N	/	AN	/	Non
RDC -> 027	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 027	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC -> 028	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	/	S6	AN	/	Non
RDC -> 028	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	/	S13	AN	/	Non
RDC -> 028	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	/	S7	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 029	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	/	S4	AN	/	Non
RDC -> 029	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	/	S5	AN	/	Non
RDC -> 029	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 030	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	/	S3	AN	/	Non
RDC -> 030	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 030	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC -> 031	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 031	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> 031	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC -> 032	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 032	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> 032	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC -> 033	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 033	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 033	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC -> 034	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	/	S2	AN	/	Non
RDC -> 034	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 034	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC -> 035	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 035	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC -> 037	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	/	S1	AN	/	Non
RDC -> 037	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 037	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC -> 016	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	P13 N	/	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 016	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	P7 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 038	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 038	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> 038	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC -> 039	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	P4 N	/	AN	/	Non
RDC -> 039	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 039	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC -> 041	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
RDC -> 041	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> 041	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC -> 042	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Noir, Gris	4	P5 N	/	AN	/	Non
RDC -> 042	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux, Plâtre	Rose	5	P6 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 042	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> 043	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Compact, Dur	Rose	1	P1 N	/	AN	/	Non
RDC -> 043	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	P2* N	/	AN	/	Non
RDC -> 043	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	P3 N	/	AN	/	Non
RDC -> 043	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
R+1 -> 011	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	/	17	P32* N	/	AN	/	Non
R+1 -> 011	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	/	18	P33* N	/	AN	/	Non
R+1 -> 012	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Noir, Gris	4	Idem P 19	/	AN	/	Non
R+1 -> 012	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux, Plâtre	Rose	5	Idem P 21	/	AN	/	Non
R+1 -> 013	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Plâtre	/	19	P31* N	/	AN	/	Non
R+1 -> 031	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	P30 N	/	AN	/	Non
R+1 -> 034	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	/	17	P28 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 034	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	/	18	P27 N	/	AN	/	Non
R+1 -> 034	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Plâtre	/	19	P29 N	/	AN	/	Non
R+1 -> 044	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Noir, Gris	4	Idem P 19	/	AN	/	Non
R+1 -> 044	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux, Plâtre	Rose	5	Idem P 21	/	AN	/	Non
R+2 -> 013	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Noir, Gris	4	/	S23	AN	/	Non
R+2 -> 013	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux, Plâtre	Rose	5	/	S25	AN	/	Non
R+2 -> 013	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	/	S28	AN	carrelages rose	Non
R+2 -> 014	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	/	18	/	S17	AN	/	Non
R+2 -> 014	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	/	17	/	S16	AN	/	Non
R+2 -> 014	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Plâtre	/	19	P34 N	/	AN	/	Non
R+2 -> 014	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Compact, Dur	Rose	1	P35 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> 014	Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	Dur	/	20	P36* N	/	AN	beton appui de fenêtre en béton	Non
R+2 -> 032	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Plâtre	/	19	P37 N	/	AN	/	Non
R+2 -> 045	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Noir, Gris	4	/	S24	AN	/	Non
R+2 -> 045	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux, Plâtre	Rose	5	/	S26	AN	/	Non
R+2 -> 045	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	/	S27	AN	carrelages rose	Non
R+3 -> 001	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Noir, Gris	4	Idem P 19	/	AN	/	Non
R+3 -> 002	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
R+3 -> 002	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+3 -> 002	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
R+3 -> 008	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mortier	/	9	/	S19	AN	/	Non
R+3 -> 008	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	/	8	Idem P 14	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+3 -> 009	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mortier	/	9	/	S20	AN	/	Non
R+3 -> 009	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	/	8	Idem P 14	/	AN	/	Non
R+3 -> 010	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
R+3 -> 010	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+3 -> 010	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
R+3 -> 011	Ardoises	Ardoises en fibres-ciment	/	/	21	P41* N	/	AN	/	Non
R+3 -> 011	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
R+3 -> 011	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+3 -> 011	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
R+3 -> 013	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Noir	22	P43* N	/	AN	dans douches	Non
R+3 -> 013	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Noir	22	P44 N	/	AN	dans douches	Non
R+3 -> 013	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Bleu	23	P45* N	/	AN	devant les douches	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+3 -> 013	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	/	23	P45* N	/	AN	devant les douches	Non
R+3 -> 013	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Bleu	23	P46 N	/	AN	devant les douches	Non
R+3 -> 013	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	/	23	P46 N	/	AN	devant les douches	Non
R+3 -> 013	Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	Dur	/	20	P42 N	/	AN	beton	Non
R+3 -> 013	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	/	8	Idem P 14	/	AN	/	Non
R+3 -> 013	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	/	16	Idem P 25	/	AN	/	Non
R+3 -> 014	Faux plafonds	Plaques	Rigide	/	27	/	S18	PN	faux plafond	Non
R+3 -> 014	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Beige, Blanc, Gris	7	P47 N	/	AN	/	Non
R+3 -> 014	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	/	8	Idem P 14	/	AN	/	Non
R+3 -> 014	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	/	16	Idem P 25	/	AN	/	Non
R+3 -> 016	Ardoises	Ardoises en fibres-ciment	/	/	21	Idem P 41	/	AN	/	Non
R+3 -> 018	Ardoises	Ardoises en fibres-ciment	/	/	21	Idem P 41	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+3 -> 020	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
R+3 -> 020	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+3 -> 020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
R+3 -> 022	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
R+3 -> 022	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+3 -> 022	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
R+3 -> 024	Ardoises	Ardoises en fibres-ciment	/	/	21	Idem P 41	/	AN	/	Non
R+3 -> 026	Ardoises	Ardoises en fibres-ciment	/	/	21	Idem P 41	/	AN	/	Non
R+3 -> 026	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+3 -> 028	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	P38 N	/	AN	carrelages rose	Non
R+3 -> 028	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	P39 N	/	AN	/	Non
R+3 -> 028	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	P40 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+3 -> 032	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
R+3 -> 032	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+3 -> 032	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
R+3 -> 035	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	10	Idem P 20	/	AN	carrelages rose	Non
R+3 -> 035	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	2	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+3 -> 035	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
R+3 -> 037	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Noir, Gris	4	Idem P 19	/	AN	/	Non
R-1 -> 003	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	/	25	P52* N	/	AN	/	Non
R-1 -> 003	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	/	24	P53* N	/	AN	/	Non
R-1 -> 003	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	26	P51* N	/	AN	/	Non
R-1 -> 004	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	/	24	P48 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R-1 -> 004	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	/	25	P49 N	/	AN	/	Non
R-1 -> 004	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	26	P50 N	/	AN	/	Non

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
RDC	/
RDC -> 001	/
RDC -> 002	/
RDC -> 003	/
RDC -> 004	/
RDC -> 005	/
RDC -> 006	/
RDC -> 007	/
RDC -> 008	/
RDC -> 009	/
RDC -> 010	/
RDC -> 011	/
RDC -> 012	/
RDC -> 013	/
RDC -> 014	/
RDC -> 015	/
RDC -> 017	/
RDC -> 018	/
RDC -> 019	/
RDC -> 020	/
RDC -> 021	/
RDC -> 022	/
RDC -> 023	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
RDC -> 024	/
RDC -> 025	/
RDC -> 026	/
RDC -> 027	/
RDC -> 028	/
RDC -> 029	/
RDC -> 030	/
RDC -> 031	/
RDC -> 032	/
RDC -> 033	/
RDC -> 034	/
RDC -> 035	/
RDC -> 037	/
RDC -> 016	/
RDC -> 038	/
RDC -> 039	/
RDC -> 041	/
RDC -> 042	/
RDC -> 043	/
R+1	/
R+1 -> 002	/
R+1 -> 003	/
R+1 -> 005	/
R+1 -> 006	/
R+1 -> 007	/
R+1 -> 008	/
R+1 -> 011	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+1 -> 012	/
R+1 -> 013	/
R+1 -> 014	/
R+1 -> 015	/
R+1 -> 016	/
R+1 -> 017	/
R+1 -> 018	/
R+1 -> 019	/
R+1 -> 020	/
R+1 -> 021	/
R+1 -> 022	/
R+1 -> 023	/
R+1 -> 024	/
R+1 -> 025	/
R+1 -> 026	/
R+1 -> 027	/
R+1 -> 028	/
R+1 -> 029	/
R+1 -> 030	/
R+1 -> 031	/
R+1 -> 032	/
R+1 -> 033	/
R+1 -> 034	/
R+1 -> 036	/
R+1 -> 037	/
R+1 -> 038	/
R+1 -> 039	/
R+1 -> 042	/

R+1 -> 044	/
R+2	/
R+2 -> 001	/
R+2 -> 002	/
R+2 -> 003	/
R+2 -> 005	/
R+2 -> 006	/
R+2 -> 007	/
R+2 -> 008	/
R+2 -> 011	/
R+2 -> 012	/
R+2 -> 013	/
R+2 -> 014	/
R+2 -> 015	/
R+2 -> 016	/
R+2 -> 017	/
R+2 -> 018	/
R+2 -> 019	/
R+2 -> 020	/
R+2 -> 021	/
R+2 -> 022	/
R+2 -> 023	/
R+2 -> 024	/
R+2 -> 025	/
R+2 -> 026	/
R+2 -> 027	/
R+2 -> 028	/
R+2 -> 029	/
R+2 -> 030	/

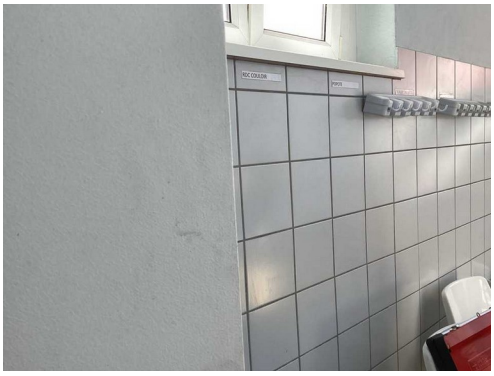
Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+2 -> 031	/
R+2 -> 032	/
R+2 -> 033	/
R+2 -> 034	/
R+2 -> 035	/
R+2 -> 039	/
R+2 -> 040	/
R+2 -> 043	/
R+2 -> 045	/
R+3	/
R+3 -> 001	/
R+3 -> 002	/
R+3 -> 004	/
R+3 -> 007	/
R+3 -> 008	/
R+3 -> 009	/
R+3 -> 010	/
R+3 -> 011	/
R+3 -> 012	/
R+3 -> 013	/
R+3 -> 014	/
R+3 -> 015	/
R+3 -> 017	/
R+3 -> 019	/
R+3 -> 020	/
R+3 -> 021	/
R+3 -> 022	/
R+3 -> 023	/

R+3 -> 025	/
R+3 -> 026	/
R+3 -> 027	/
R+3 -> 028	/
R+3 -> 032	/
R+3 -> 033	/
R+3 -> 035	/
R+3 -> 037	/
R+3 -> 036	/
R-1	/
R-1 -> 001	/
R-1 -> 002	/
R-1 -> 003	/
R-1 -> 004	/
R-1 -> 005	/
R-1 -> 006	/
R-1 -> 007	/
R-1 -> 008	/
R-1 -> 009	/
R-1 -> 010	/
R-1 -> 011	/
R-1 -> 012	/
R-1 -> 013	/
R-1 -> 014	/
R-1 -> 015	/
R-1 -> 016	/
R-1 -> 017	/
R-1 -> 018	/
R-1 -> 019	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R-1 -> 020	/
R-1 -> 021	/
R-1 -> 022	/
R-1 -> 023	/
R-1 -> 024	/
R-1 -> 025	/
R-1 -> 026	/
R-1 -> 027	/
R-1 -> 028	/
R-1 -> 029	/
R-1 -> 030	/
R-1 -> 031	/
R-1 -> 032	/
R-1 -> 033	/
R-1 -> 034	/
R-1 -> 035	/
R-1 -> 036	/
R-1 -> 037	/

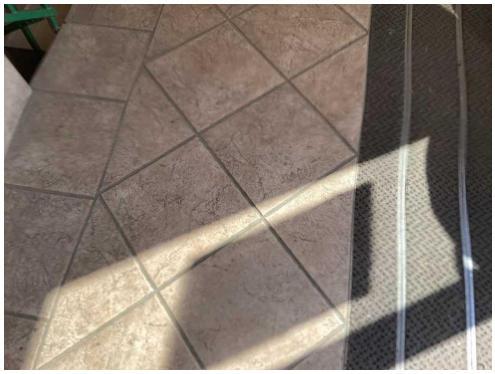
7.2. Photos prélèvements

P25	ZPSO 16
RDC -> 002	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

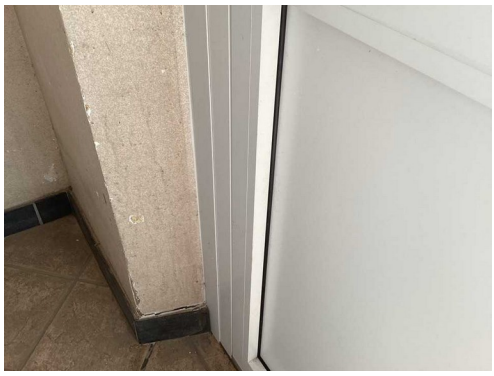
P26	ZPSO 16
RDC -> 002	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P23	ZPSO 14
RDC -> 013	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

P24	ZPSO 15
RDC -> 013	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P20	ZPSO 10
RDC -> 015	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

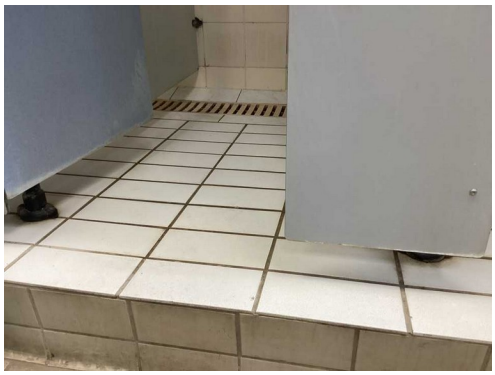
P19	ZPSO 4
RDC -> 015	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P21	ZPSO 5
RDC -> 015	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P22	ZPSO 1
RDC -> 015	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P18	ZPSO 13
RDC -> 023	
	
Grilles -> Peintures	

P14	ZPSO 8
RDC -> 025	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P17	ZPSO 12
RDC -> 025	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P54	ZPSO 12
RDC -> 025	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P15	ZPSO 9
RDC -> 025	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P16	ZPSO 6
RDC -> 025	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P11	ZPSO 8
RDC -> 026	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P9	ZPSO 6
RDC -> 026	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

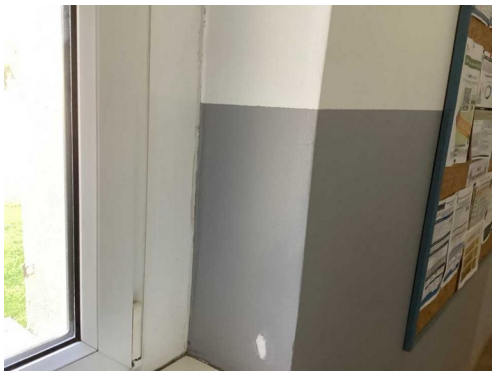
P10	ZPSO 7
RDC -> 026	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

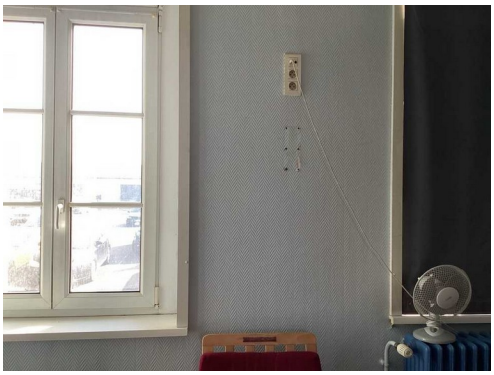
P12	ZPSO 9
RDC -> 026	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

Copyright BUREAU VERITAS

P8	ZPSO 2
RDC -> 027	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P13	ZPSO 10
RDC -> 016	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

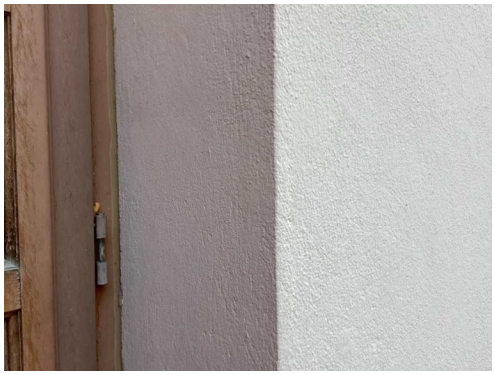
P7	ZPSO 2
RDC -> 016	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P4	ZPSO 2
RDC -> 039	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

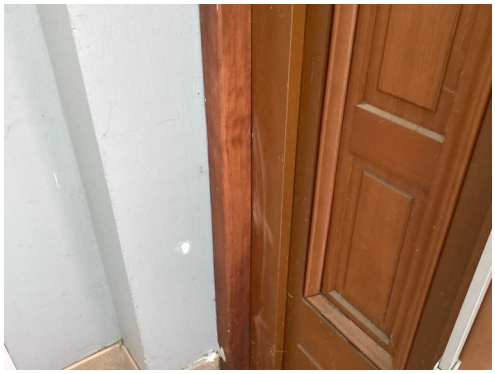
P5	ZPSO 4
RDC -> 042	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P6	ZPSO 5
RDC -> 042	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

Copyright BUREAU VERITAS

P1	ZPSO 1
RDC -> 043	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P2	ZPSO 3
RDC -> 043	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P3	ZPSO 2
RDC -> 043	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P32	ZPSO 17
R+1 -> 011	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P33	ZPSO 18
R+1 -> 011	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

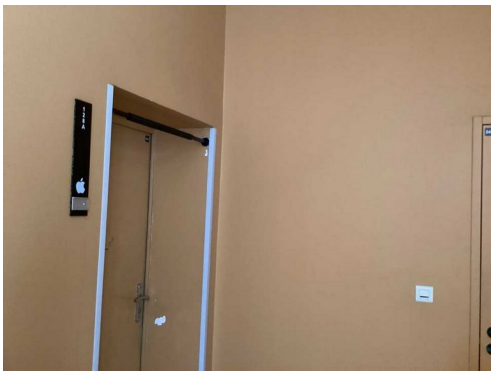
P31	ZPSO 19
R+1 -> 013	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

Copyright BUREAU VERITAS

P30	ZPSO 2
R+1 -> 031	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P28	ZPSO 17
R+1 -> 034	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P27	ZPSO 18
R+1 -> 034	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P29	ZPSO 19
R+1 -> 034	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P34	ZPSO 19
R+2 -> 014	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P35	ZPSO 1
R+2 -> 014	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

Copyright BUREAU VERITAS

P36	ZPSO 20
R+2 -> 014	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Appuis de fenêtres en fibres-ciment	

P37	ZPSO 19
R+2 -> 032	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P43	ZPSO 22
R+3 -> 013	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol	

P44	ZPSO 22
R+3 -> 013	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol	

P45	ZPSO 23
R+3 -> 013	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol | Colles de carrelage	

P46	ZPSO 23
R+3 -> 013	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol | Colles de carrelage	

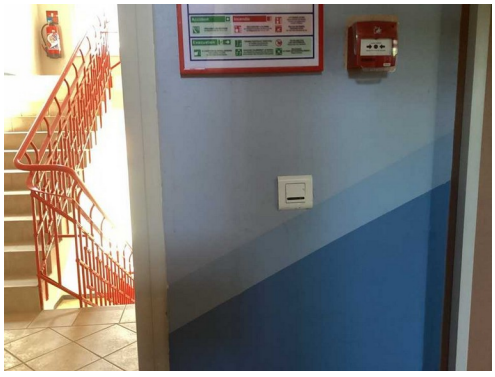
Copyright BUREAU VERITAS

P42	ZPSO 20
R+3 -> 013	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Appuis de fenêtres en fibres-ciment	

P47	ZPSO 7
R+3 -> 014	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P38	ZPSO 10
R+3 -> 028	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P39	ZPSO 3
R+3 -> 028	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P40	ZPSO 2
R+3 -> 028	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P52	ZPSO 25
R-1 -> 003	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P53	ZPSO 24
R-1 -> 003	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P51	ZPSO 26
R-1 -> 003	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P48	ZPSO 24
R-1 -> 004	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

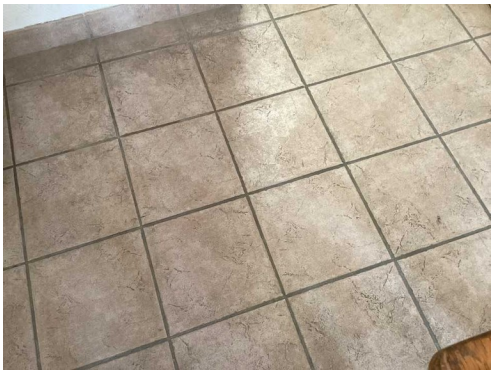
P49	ZPSO 25
R-1 -> 004	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

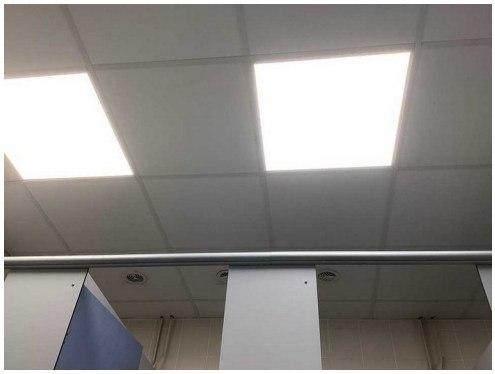
P50	ZPSO 26
R-1 -> 004	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

7.3. Photos sondages

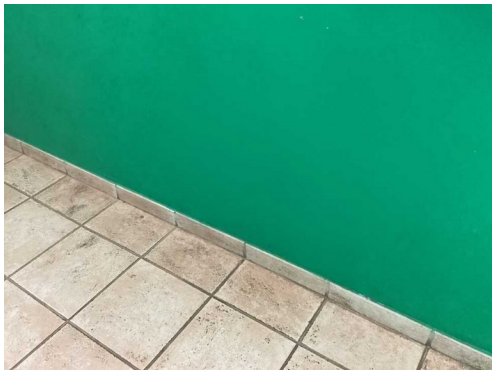
S11	ZPSO 3
RDC -> 023	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

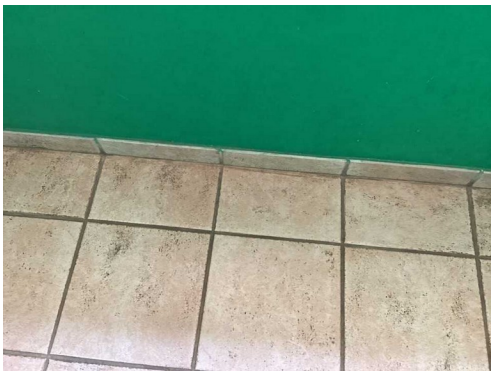
S12	ZPSO 2
RDC -> 023	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S10	ZPSO 10
RDC -> 023	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

S8	ZPSO 11
RDC -> 025	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S2	ZPSO 2
RDC -> 034	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S17	ZPSO 18
R+2 -> 014	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

S16	ZPSO 17
R+2 -> 014	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

7.4. Photos inaccessibilités

RDC -> 036	MA 2
Local complet	
Fermé à clé, pas de clef disponible	
	**Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :** Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

RDC -> 040	MA 1
Local complet	
Fermé à clé, pas de clef disponible	
	**Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :** Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

R+1 -> 001	MA 26
Local complet	
Fermé à clé, pas de clef disponible	
	**Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :** Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

R+1 -> 004	MA 27
Local complet	
Fermé à clé, pas de clef disponible	
	**Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :** Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

R+1 -> 009	MA 28
Local complet	
Fermé à clé, pas de clef disponible	
	**Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :** Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

R+1 -> 010	MA 29
Local complet	
Fermé à clé, pas de clef disponible	
	**Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :** Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

R+1 -> 035	MA 22
Local complet	
Fermé à clé, pas de clef disponible	
	**Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :** Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

R+1 -> 040	MA 23
Local complet	
Fermé à clé, pas de clef disponible	
	**Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :** Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

R+1 -> 041	MA 25
Local complet	
Fermé à clé, pas de clef disponible	
	**Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :** Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

R+1 -> 043	MA 24
Local complet	
Fermé à clé, pas de clef disponible	
	**Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :** Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

R+2 -> 004	MA 13
Local complet	
Fermé à clé, pas de clef disponible	
	**Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :** Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

R+2 -> 009	MA 14
Local complet	
Fermé à clé, pas de clef disponible	
	**Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :** Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

R+2 -> 010	MA 15
Local complet	
Fermé à clé, pas de clef disponible	
	**Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :** Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

R+2 -> 036	MA 17
Local complet	
Fermé à clé, pas de clef disponible	
	**Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :** Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

R+2 -> 037	MA 16
Local complet	
Fermé à clé, pas de clef disponible	
	**Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :** Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

R+2 -> 038	MA 18
Local complet	
Fermé à clé, pas de clef disponible	
	**Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :** Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

R+2 -> 041	MA 19
Local complet	
Fermé à clé, pas de clef disponible	
	**Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :** Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

R+2 -> 042	MA 20
Local complet	
Fermé à clé, pas de clef disponible	
	**Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :** Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

R+2 -> 044	MA 21
Local complet	
Fermé à clé, pas de clef disponible	
	**Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :** Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

R+3 -> 003	MA 3
Local complet	
Fermé à clé, pas de clef disponible	
	**Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :** Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

R+3 -> 005	MA 4
Local complet	
Fermé à clé, pas de clef disponible	
	**Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :** Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

R+3 -> 016	MA 6
Local complet	
Fermé à clé, pas de clef disponible	
	**Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :** Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

R+3 -> 018	MA 7
Local complet	
Fermé à clé, pas de clef disponible	
	**Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :** Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

R+3 -> 024	MA 8
Local complet	
Fermé à clé, pas de clef disponible	
	**Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :** Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

R+3 -> 029	MA 11
Local complet	
Fermé à clé, pas de clef disponible	
	**Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :** Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

R+3 -> 030	MA 9
Local complet	
Fermé à clé, pas de clef disponible	
	**Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :** Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

R+3 -> 031	MA 10
Local complet	
Fermé à clé, pas de clef disponible	
	**Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :** Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

R+3 -> 034	MA 12
Local complet	
Fermé à clé, pas de clef disponible	
	**Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :** Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

R+3 -> 006	MA 5
Local complet	
Fermé à clé, pas de clef disponible	
	**Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :** Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

7.5. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :
- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :
- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Allianz

Autres missions :
- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Signé par: Juliette Allavoine
E-mail: juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature: 07-01-2025 10:12:02
Adresse IP: 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.6. Certificat de compétence

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
Accréditation n°4-0557 PORTÉE DISPONIBLE SUR www.cofrac.fr

B2C
Bureau Contrôle Certification

N° de certification
B2C 0763

CERTIFICATION DE PERSONNES

attribuée à :

Olivier JEANSON

Dans les domaines suivants :

Amiante sans mention : Secteur B : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Obtenue le : 17/05/2024	Valable jusqu'au : 22/05/2026*

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Amiante avec mention : Secteur Bbis : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Obtenue le : 17/05/2024	Valable jusqu'au : 22/05/2026*

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Certification Plomb : Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP).

Obtenue le : 28/06/2019	Valable jusqu'au : 27/06/2024*

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Fait à STRASBOURG, le 17 mai 2024

Responsable qualité,
Sandrine SCHNEIDER

*Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveillance.
La conformité de cette certification peut être vérifiée sur le site : www.b2c-france.com

24 rue des Prés • 67380 LINGOLSHEIM • Tél : 03 88 22 21 97 • e-mail : b.2.c@orange.fr • www.b2c-france.com

7.7. Croquis de repérage

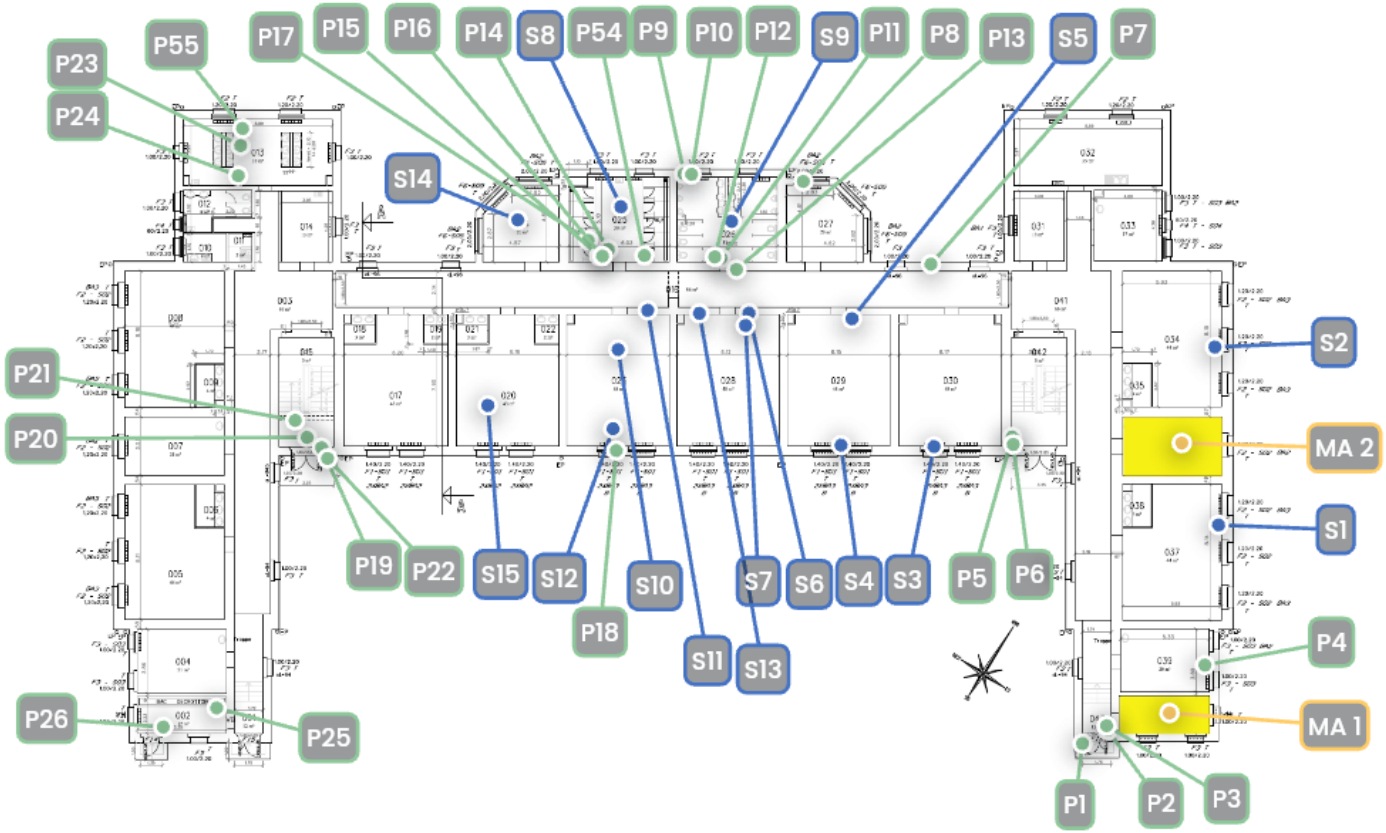
PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	CASERNE SERE AVENUE DE BLIDA 57000 METZ	
Localisation RDC	Date visite	Le 12/08/2025
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	27550707/S1/1
	Planche	1 / 5
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

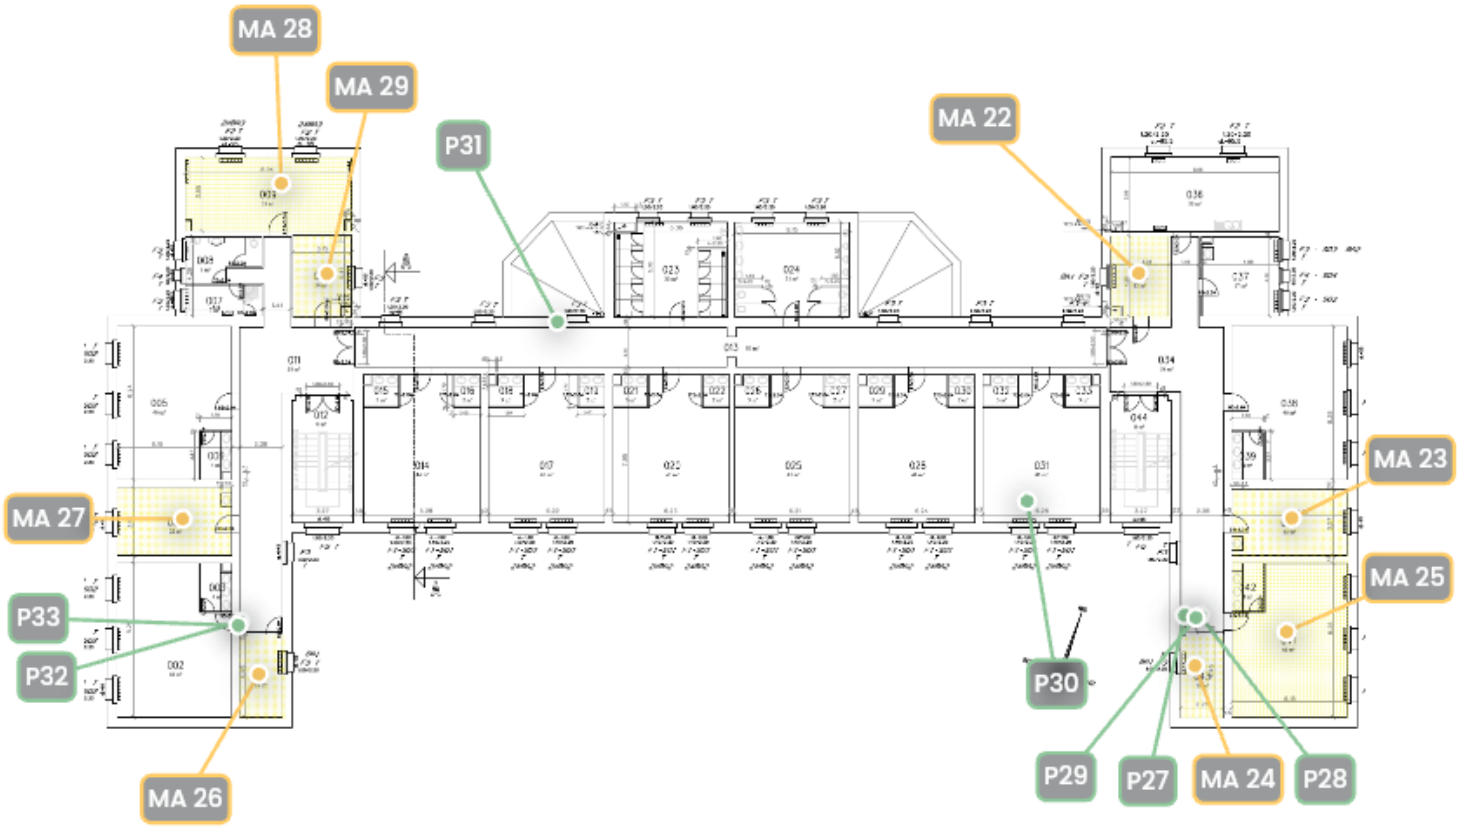
PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	CASERNE SERE AVENUE DE BLIDA 57000 METZ	
Localisation R+1	Date visite	Le 12/08/2025
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	27550707/S1/1
	Planche	2 / 5
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

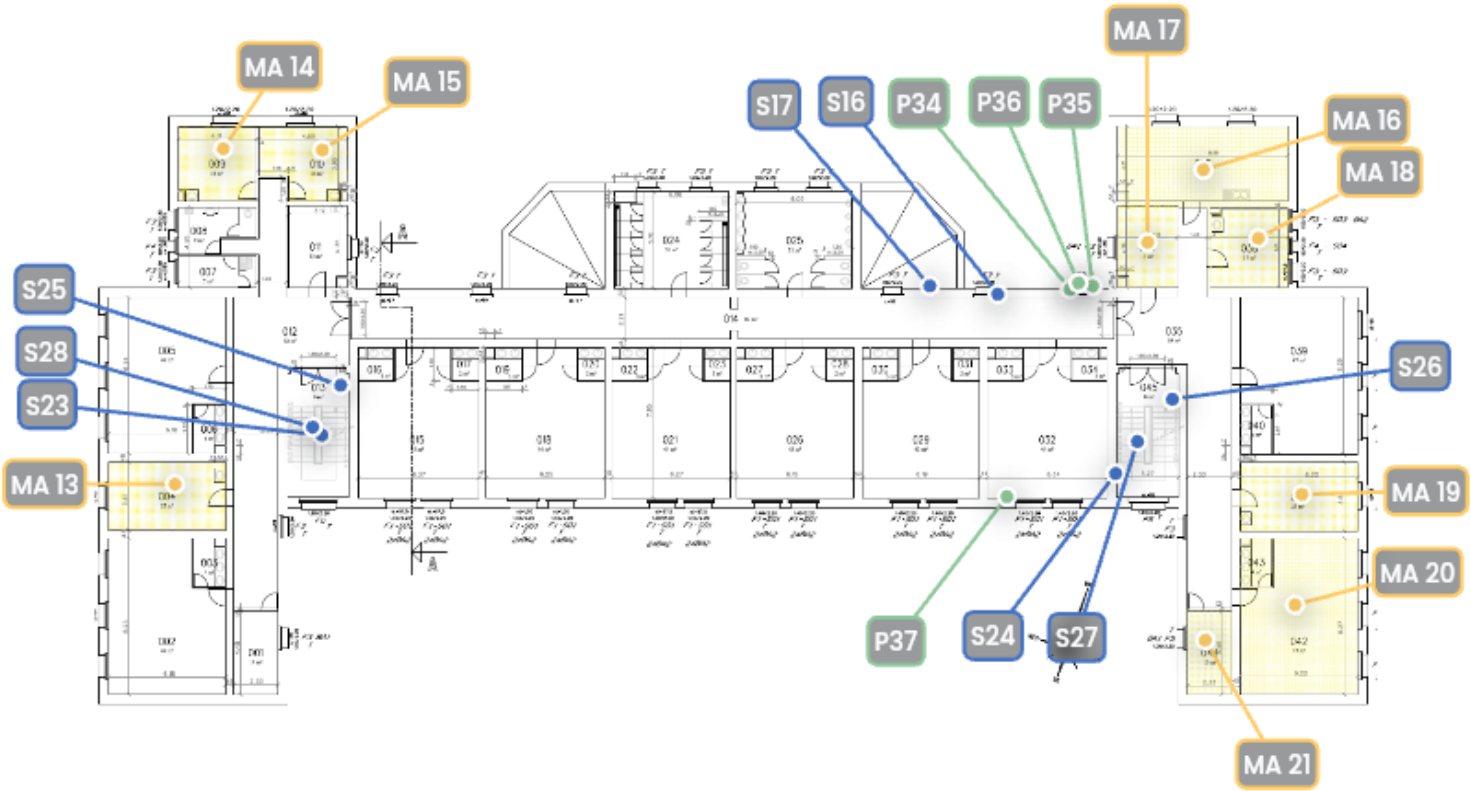
PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	CASERNE SERE AVENUE DE BLIDA 57000 METZ	
Localisation R+2	Date visite	Le 12/08/2025
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	27550707/S1/1
	Planche	3 / 5
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

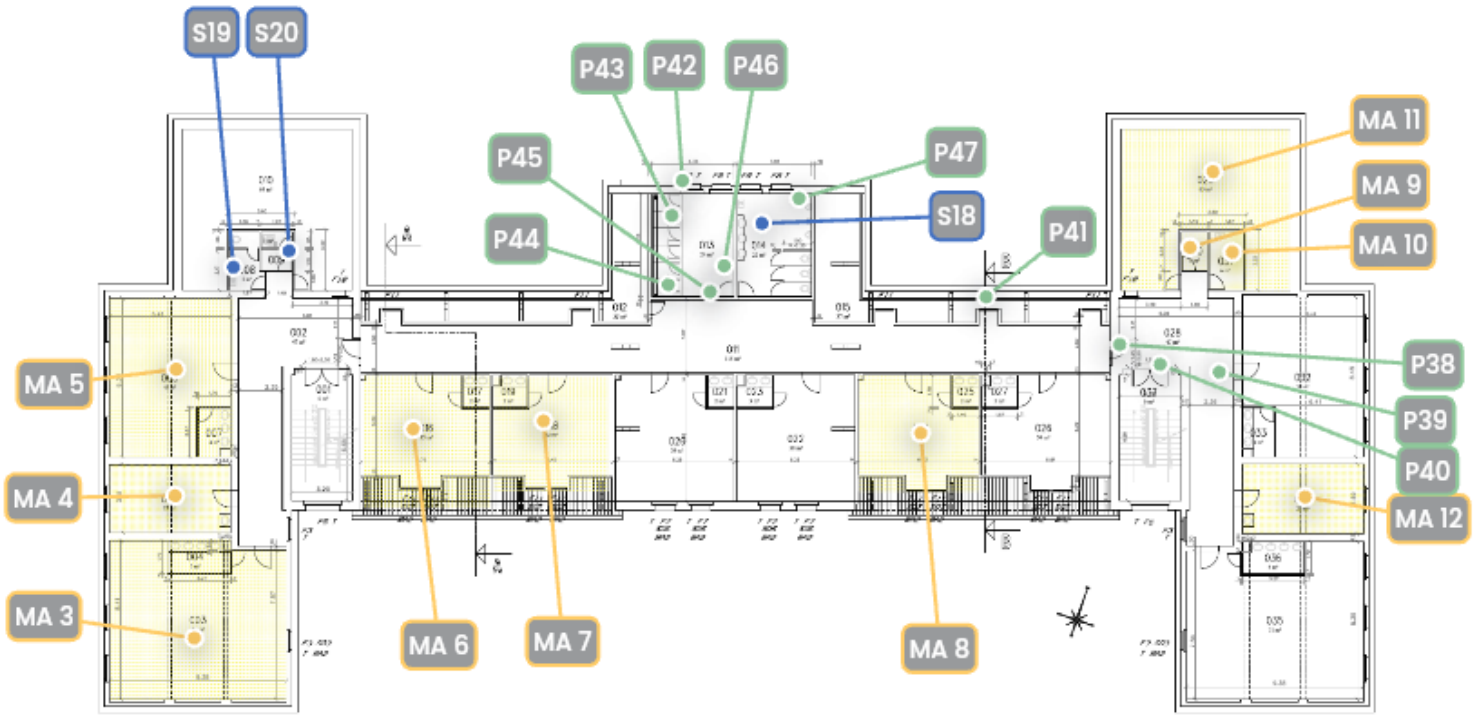
PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	CASERNE SERE AVENUE DE BLIDA 57000 METZ	
Localisation R+3	Date visite	Le 12/08/2025
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	27550707/S1/1
	Planche	4 / 5
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS

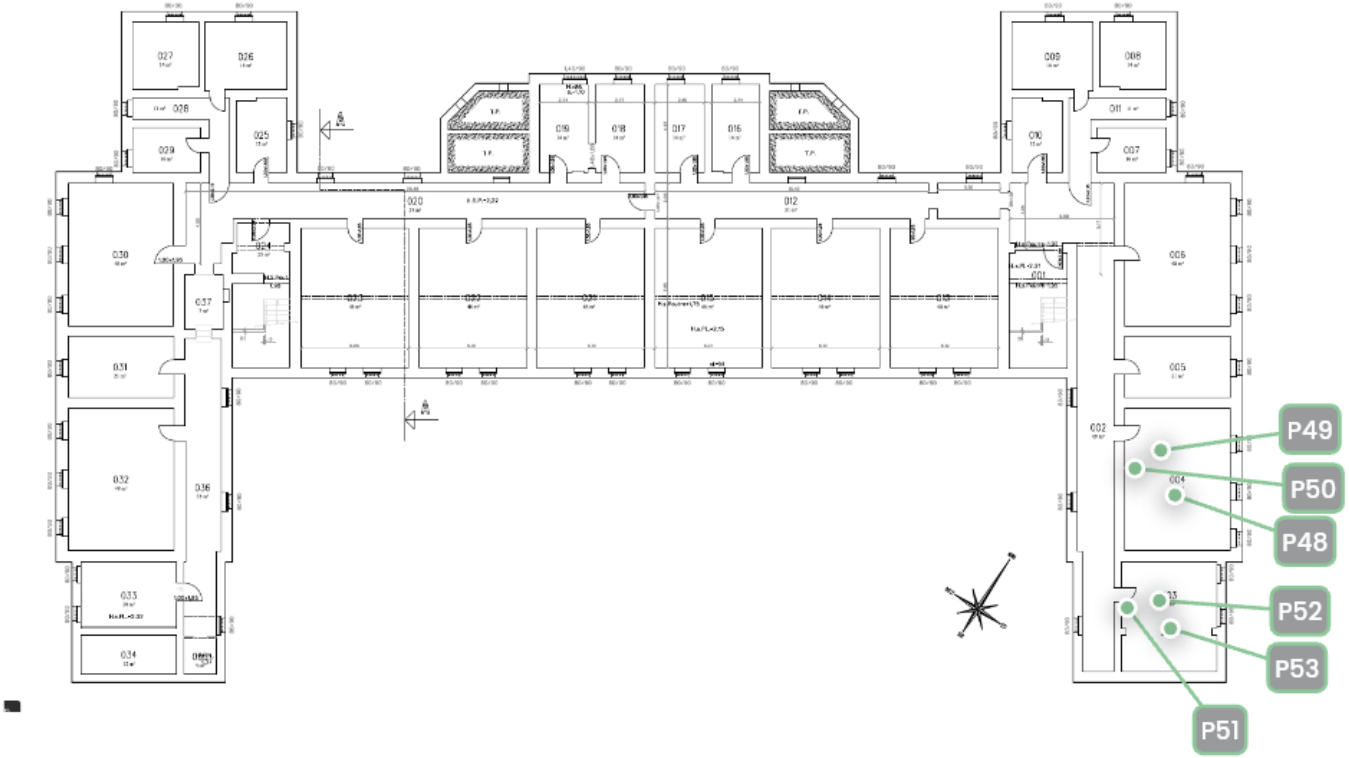
PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	CASERNE SERE AVENUE DE BLIDA 57000 METZ	
Localisation R-1	Date visite	Le 12/08/2025
	Auteur	Olivier JEANSON
	N° dossier	27550707/S1/1
	Planche	5 / 5
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

7.8. Rapport d'analyse du laboratoire

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Olivier JEANSON
29 rue Antoine de St Exupéry - ZAC de Frocourt
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Notre référence : AR-25-LE-091022-01

Numéro de dossier : 25A028245
Référence de dossier : 1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25A028245-001 - Référence *EUROFINS240000016081 Réf. Prel : P1 RDC - 043/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur, Compact, Ciment/Rose)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-002 - Référence *EUROFINS240000016082 Réf. Prel : P2 RDC - 043/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur, Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-003 - Référence *EUROFINS240000016083 Réf. Prel : P3 RDC - 043/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-004 - Référence *EUROFINS240000016084 Réf. Prel : P4 RDC - 039/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-005 - Référence *EUROFINS240000016096 Réf. Prel : P5 RDC - 042/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris, Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-006 - Référence *EUROFINS240000016085 Réf. Prel : P6 RDC - 042/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Granuleux/Rose)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-007 - Référence *EUROFINS240000016086 Réf. Prel : P7 RDC - 016/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-008 - Référence *EUROFINS240000016087 Réf. Prel : P8 RDC - 027/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-009 - Référence *EUROFINS240000016088 Réf. Prel : P9 RDC - 026/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-010 - Référence *EUROFINS240000016089 Réf. Prel : P10 RDC - 026/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-011 - Référence *EUROFINS240000016121 Réf. Prel : P11 RDC - 026/Revêtements de sol - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-012 - Référence *EUROFINS240000016122 Réf. Prel : P12 RDC - 026/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mortier/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-013 - Référence *EUROFINS240000016124 Réf. Prel : P13 RDC - 016/Revêtements de sol - (Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-014 - Référence *EUROFINS240000016125 Réf. Prel : P14 RDC - 025/Revêtements de sol - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-015 - Référence *EUROFINS240000016126 Réf. Prel : P15 RDC - 025/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mortier/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-016 - Référence *EUROFINS240000016127 Réf. Prel : P16 RDC - 025/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-017 - Référence *EUROFINS240000016128 Réf. Prel : P17 RDC - 025/Revêtements de sol - (Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-018 - Référence *EUROFINS240000016129 Réf. Prel : P18 RDC - 023/Grilles - (Décoratif/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-019 - Référence *EUROFINS240000016090 Réf. Prel : P19 RDC - 015/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris, Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-020 - Référence *EUROFINS240000016091 Réf. Prel : P20 RDC - 015/Revêtements de sol - (Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-021 - Référence *EUROFINS240000016092 Réf. Prel : P21 RDC - 015/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Granuleux/Rose)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-022 - Référence *EUROFINS240000016094 Réf. Prel : P22 RDC - 015/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur, Compact, Ciment/Rose)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-023 - Référence *EUROFINS240000016097 Réf. Prel : P23 RDC - 013/Revêtements de sol - (Plastique/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-024 - Référence *EUROFINS240000016095 Réf. Prel : P24 RDC - 013/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-025 - Référence *EUROFINS240000016098 Réf. Prel : P25 RDC - 002/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-026 - Référence *EUROFINS240000016099 Réf. Prel : P26 RDC - 002/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-027 - Référence *EUROFINS240000016100 Réf. Prel : P27 R+1 - 034/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-028 - Référence *EUROFINS240000016101 Réf. Prel : P28 R+1 - 034/Revêtements de sol - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-029 - Référence *EUROFINS240000016102 Réf. Prel : P29 R+1 - 034/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-030 - Référence *EUROFINS240000016103 Réf. Prel : P30 R+1 - 031/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-031 - Référence *EUROFINS240000016104 Réf. Prel : P31 R+1 - 013/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-032 - Référence *EUROFINS240000016105 Réf. Prel : P32 R+1 - 011/Revêtements de sol - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-033 - Référence *EUROFINS240000016093 Réf. Prel : P33 R+1 - 011/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-034 - Référence *EUROFINS240000015949 Réf. Prel : P34 R+2 - 014/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-035 - Référence *EUROFINS240000015948 Réf. Prel : P35 R+2 - 014/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur, Compact, Ciment/Rose)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-036 - Référence *EUROFINS240000015947 Réf. Prel : P36 R+2 - 014/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-037 - Référence *EUROFINS240000016115 Réf. Prel : P37 R+2 - 032/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-038 - Référence *EUROFINS240000015946 Réf. Prel : P38 R+3 - 028/Revêtements de sol - (Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-039 - Référence *EUROFINS240000015945 Réf. Prel : P39 R+3 - 028/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur, Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-040 - Référence *EUROFINS240000015944 Réf. Prel : P40 R+3 - 028/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-041 - Référence *EUROFINS240000015943 Réf. Prel : P41 R+3 - 011/Ardoises*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-042 - Référence *EUROFINS240000015942 Réf. Prel : P42 R+3 - 013/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-043 - Référence *EUROFINS240000015941 Réf. Prel : P43 R+3 - 013/Revêtements de sol - (Décoratif/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-044 - Référence *EUROFINS240000015937 Réf. Prel : P44 R+3 - 013/Revêtements de sol - (Décoratif/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-045 - Référence *EUROFINS240000015940 Réf. Prel : P45 R+3 - 013/Revêtements de sol - (Décoratif/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-046 - Référence *EUROFINS240000015939 Réf. Prel : P46 R+3 - 013/Revêtements de sol - (Décoratif/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-047 - Référence *EUROFINS240000015938 Réf. Prel : P47 R+3 - 014/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-048 - Référence *EUROFINS240000015936 Réf. Prel : P48 R-1 - 004/Poutres - (Ciment, Peint/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-049 - Référence *EUROFINS240000015935 Réf. Prel : P49 R-1 - 004/Plafonds - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-050 - Référence *EUROFINS240000015934 Réf. Prel : P50 R-1 - 004/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-051 - Référence *EUROFINS240000015931 Réf. Prel : P51 R-1 - 003/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-052 - Référence *EUROFINS240000015932 Réf. Prel : P52 R-1 - 003/Plafonds - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A028245-053 - Référence *EUROFINS240000015933 Réf. Prel : P53 R-1 - 003/Poutres - (Ciment, Peint/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-015959-01 — Date d'émission de rapport : 21/08/2025 16:42 — Page1/15
Dossier N° : 25GE007756 — Date de réception : 19/08/2025 — Date d'analyse : 21/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE007756 — Référence de suivi du dossier N° : 25A028245
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 — Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 21/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25A028245-001 - EUROFINS24000001 6081 Réf. Prel : P1 RDC - 043/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur, Compact, Ciment/Rose)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (rose)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002 (1)	25A028245-002 - EUROFINS24000001 6082 Réf. Prel : P2 RDC - 043/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur, Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	25A028245-003 - EUROFINS24000001 6083 Réf. Prel : P3 RDC - 043/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Gris, Blanc)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur (jaune)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-015959-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2025 16:42 Page2/15
Dossier N° : 25GE007756 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 21/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE007756 Référence de suivi du dossier N° : 25A028245
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 21/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	25A028245-004 - EUROFINS240000016084 Réf. Prel : P4 RDC - 039/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Gris, Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005	25A028245-005 - EUROFINS240000016096 Réf. Prel : P5 RDC - 042/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris, Noir)	Matériau semi-dur (cémenteux) (gris) (clair)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	25A028245-006 - EUROFINS240000016085 Réf. Prel : P6 RDC - 042/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Granuleux/Rose)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur (jaune) en traces	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-015959-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2025 16:42
Dossier N° : 25GE007756 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 21/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE007756 Référence de suivi du dossier N° : 25A028245
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 21/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	25A028245-007 - EUROFINS240000016086 Réf. Prel : P7 RDC - 016/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Gris, Blanc)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008 (1)	25A028245-008 - EUROFINS240000016087 Réf. Prel : P8 RDC - 027/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Gris, Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009 (2)	25A028245-009 - EUROFINS240000016088 Réf. Prel : P9 RDC - 026/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010	25A028245-010 - EUROFINS240000016089 Réf. Prel : P10 RDC - 026/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) (clair)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-015959-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2025 16:42 Page4/15
Dossier N° : 25GE007756 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 21/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE007756 Référence de suivi du dossier N° : 25A028245
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 21/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011 (2)	25A028245-011 - EUROFINS240000016121 Réf. Prel : P11 RDC - 026/Revêtements de sol - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
012 (2)	25A028245-012 - EUROFINS240000016122 Réf. Prel : P12 RDC - 026/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mortier/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013 (2)	25A028245-013 - EUROFINS240000016124 Réf. Prel : P13 RDC - 016/Revêtements de sol - (Dur/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau de type peinture (bleu)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014 (2)	25A028245-014 - EUROFINS240000016125 Réf. Prel : P14 RDC - 025/Revêtements de sol - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-015959-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2025 16:42 Page5/15
Dossier N° : 25GE007756 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 21/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE007756 Référence de suivi du dossier N° : 25A028245
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 21/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	25A028245-015 - EUROFINS240000016126 Réf. Prel : P15 RDC - 025/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mortier/)	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
016	25A028245-016 - EUROFINS240000016127 Réf. Prel : P16 RDC - 025/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
017 (2)	25A028245-017 - EUROFINS240000016128 Réf. Prel : P17 RDC - 025/Revêtements de sol - (Mortier/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) en traces	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
018	25A028245-018 - EUROFINS240000016129 Réf. Prel : P18 RDC - 023/Grilles - (Décoratif/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau (noir)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-015959-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2025 16:42 Page6/15
Dossier N° : 25GE007756 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 21/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE007756 Référence de suivi du dossier N° : 25A028245
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 21/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	25A028245-019 - EUROFINS240000016090 Réf. Prel : P19 RDC - 015/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris, Noir)	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (blanc)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
020 (1)	25A028245-020 - EUROFINS240000016091 Réf. Prel : P20 RDC - 015/Revêtements de sol - (Dur/Gris)	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
021	25A028245-021 - EUROFINS240000016092 Réf. Prel : P21 RDC - 015/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Granuleux/Rose)	Matériau de type peinture (beige) + (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (jaune)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-015959-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2025 16:42 Page7/15
Dossier N° : 25GE007756 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 21/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE007756 Référence de suivi du dossier N° : 25A028245
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 21/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	25A028245-022 - EUROFINS240000016094 Réf. Prel : P22 RDC - 015/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur, Compact, Ciment/Rose)	Matériau de type peinture (rose) (clair) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
023	25A028245-023 - EUROFINS240000016097 Réf. Prel : P23 RDC - 013/Revêtements de sol - (Plastique/)	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (gris) (foncé) ; matériau de type colle (jaune) en traces	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
024 (1)	25A028245-024 - EUROFINS240000016095 Réf. Prel : P24 RDC - 013/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau souple de type joint (blanc)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
025	25A028245-025 - EUROFINS240000016098 Réf. Prel : P25 RDC - 002/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-015959-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2025 16:42 Page8/15
Dossier N° : 25GE007756 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 21/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE007756 Référence de suivi du dossier N° : 25A028245
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 21/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	25A028245-026 - EUROFINS240000016099 Réf. Prel : P26 RDC - 002/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
027	25A028245-027 - EUROFINS240000016100 Réf. Prel : P27 R+1 - 034/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/)	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
028	25A028245-028 - EUROFINS240000016101 Réf. Prel : P28 R+1 - 034/Revêtements de sol - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
029	25A028245-029 - EUROFINS240000016102 Réf. Prel : P29 R+1 - 034/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre/)	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris) (clair)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-015959-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2025 16:42 Page9/15
Dossier N° : 25GE007756 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 21/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE007756 Référence de suivi du dossier N° : 25A028245
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 21/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	25A028245-030 - EUROFINS240000016103 Réf. Prel : P30 R+1 - 031/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Gris, Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
031	25A028245-031 - EUROFINS240000016104 Réf. Prel : P31 R+1 - 013/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre/)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
032 (2)	25A028245-032 - EUROFINS240000016105 Réf. Prel : P32 R+1 - 011/Revêtements de sol - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
033 (2)	25A028245-033 - EUROFINS240000016093 Réf. Prel : P33 R+1 - 011/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris) (clair) en traces	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-015959-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2025 16:42 Page10/15
Dossier N° : 25GE007756 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 21/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE007756 Référence de suivi du dossier N° : 25A028245
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 21/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034 (2)	25A028245-034 - EUROFINS240000015949 Réf. Prel : P34 R+2 - 014/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre/)	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
035 (1)	25A028245-035 - EUROFINS240000015948 Réf. Prel : P35 R+2 - 014/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur, Compact, Ciment/Rose)	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
036 (1)	25A028245-036 - EUROFINS240000015947 Réf. Prel : P36 R+2 - 014/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur/)	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
037	25A028245-037 - EUROFINS240000016115 Réf. Prel : P37 R+2 - 032/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris) en traces	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-015959-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2025 16:42 Page11/15
Dossier N° : 25GE007756 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 21/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE007756 Référence de suivi du dossier N° : 25A028245
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 21/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	25A028245-038 - EUROFINS240000015946 Réf. Prel : P38 R+3 - 028/Revêtements de sol - (Dur/Gris)	Matériau semi-dur (cémenteux) (beige)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
039	25A028245-039 - EUROFINS240000015945 Réf. Prel : P39 R+3 - 028/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur, Ciment/)	Matériau semi-dur (cémenteux) (gris) ; matériau (blanc) en traces	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
040	25A028245-040 - EUROFINS240000015944 Réf. Prel : P40 R+3 - 028/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Gris, Blanc)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
041 (1)	25A028245-041 - EUROFINS240000015943 Réf. Prel : P41 R+3 - 011/Ardoises	Matériau dur de type ardoise (noir)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-015959-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2025 16:42
Dossier N° : 25GE007756 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 21/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE007756 Référence de suivi du dossier N° : 25A028245
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 21/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042	25A028245-042 - EUROFINS24000001 5942 Réf. Prel : P42 R+3 - 013/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur/)	Matériau de type peinture (beige) + (rose) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris) (foncé)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
043	25A028245-043 - EUROFINS24000001 5941 Réf. Prel : P43 R+3 - 013/Revêtements de sol - (Décoratif/Noir)	Matériau semi-dur (noir)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
044	25A028245-044 - EUROFINS24000001 5937 Réf. Prel : P44 R+3 - 013/Revêtements de sol - (Décoratif/Noir)	Matériau (jaune) ; matériau semi-dur (noir)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
045	25A028245-045 - EUROFINS24000001 5940 Réf. Prel : P45 R+3 - 013/Revêtements de sol - (Décoratif/Bleu)	Matériau semi-dur de type plaque (bleu) + (beige)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-015959-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2025 16:42 Page13/15
Dossier N° : 25GE007756 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 21/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE007756 Référence de suivi du dossier N° : 25A028245
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 21/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046 (2)	25A028245-046 - EUROFINS240000015939 Réf. Prel : P46 R+3 - 013/Revêtements de sol - (Décoratif/Bleu)	Matériau semi-dur de type plaque (bleu) + (beige)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
047	25A028245-047 - EUROFINS240000015938 Réf. Prel : P47 R+3 - 014/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
048	25A028245-048 - EUROFINS240000015936 Réf. Prel : P48 R-1 - 004/Poutres - (Ciment, Peint/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
049	25A028245-049 - EUROFINS240000015935 Réf. Prel : P49 R-1 - 004/Plafonds - (Ciment/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-015959-01 Date d'émission de rapport : 21/08/2025 16:42
Dossier N° : 25GE007756 Date de réception : 19/08/2025 Date d'analyse : 21/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE007756 Référence de suivi du dossier N° : 25A028245
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 21/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
050	25A028245-050 - EUROFINS240000015934 Réf. Prel : P50 R-1 - 004/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
051	25A028245-051 - EUROFINS240000015931 Réf. Prel : P51 R-1 - 003/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (beige)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
052	25A028245-052 - EUROFINS240000015932 Réf. Prel : P52 R-1 - 003/Plafonds - (Ciment/)	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
053	25A028245-053 - EUROFINS240000015933 Réf. Prel : P53 R-1 - 003/Poutres - (Ciment, Peint/)	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

(2) Une lingette ayant été utilisée lors du prélèvement pour la protection de l'opérateur de repérage est présente dans l'échantillon. Celle-ci n'a pas été analysée.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-015959-01 | Date d'émission de rapport : 21/08/2025 16:42 | Page15/15
Dossier N° : 25GE007756 | Date de réception : 19/08/2025 | Date d'analyse : 21/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE007756 | Référence de suivi du dossier N° : 25A028245
Reçu au laboratoire le : 19/08/2025 | Date de réception : 18/08/2025
Date d'analyse : 21/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/1_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Hidajeta Foric
Technicien(ne) Analyste Microscopie
CFR328

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Madame Solene LIPIEC
5 Rue Pablo Picasso
57365 ENNERY

Notre référence : AR-25-LE-092922-01

Numéro de dossier : 25A029397
Référence de dossier : 1510797887/27550707/S1/1/3_27550707/1/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25A029397-001 - Référence *BV3MV1037 Réf. Prel : P54 RDC - 025/Revêtements de sol - (Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A029397-002 - Référence *BV3MV1038 Réf. Prel : P55 RDC - 013/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-016406-01 — Date d'émission de rapport : 01/09/2025 17:28 —
Dossier N° : 25GE008081 — Date de réception : 29/08/2025 — Date d'analyse : 29/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE008081 — Référence de suivi du dossier N° : 25A029397
Reçu au laboratoire le : 29/08/2025 — Date de réception : 28/08/2025
Date d'analyse : 29/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/3_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25A029397-001 - BV3MV1037 Réf. Prel : P54 RDC - 025/Revêtements de sol - (Mortier/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002 (1)	25A029397-002 - BV3MV1038 Réf. Prel : P55 RDC - 013/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)
(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-016406-01 | Date d'émission de rapport : 01/09/2025 17:28 | Page2/2
Dossier N° : 25GE008081 | Date de réception : 29/08/2025 | Date d'analyse : 29/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE008081 | Référence de suivi du dossier N° : 25A029397
Reçu au laboratoire le : 29/08/2025 | Date de réception : 28/08/2025
Date d'analyse : 29/08/2025
Référence dossier Client:1510797887/27550707/S1/1/3_27550707/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Marie Christelle Pierrevelcin
Chef(fe) de Groupe Technicienne
META

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS
