DIAGOBAH
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Université de Strasbourg

# DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



| RÉFERENCES | DÉSIGNATION DU BIEN | PROPRIÉTAIRE |
|---|---|---|
| Référence dossier : **26MHE0439**<br>Réalisé le : **26/05/2026**<br>Référence bien : **0290 - Ancien CSU** | **1 Allée Konrad Roentgen**<br>**67000 STRASBOURG** | **UNIVERSITE DE STRASBOURG**<br>**18 Rue Goethe**<br>**67081 STRASBOURG CEDEX** |

**OBJET DE LA MISSION**

## REPÉRAGE AMIANTE AVANT DÉMOLITION

**SYNTHÈSE DU REPÉRAGE**

AMIANTE
PRÉSENCE
AMIANTE

**PRE-RAPPORT**

# SOMMAIRE

**1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS**

*1.1 Désignation de l'immeuble bâti visité*
*1.2 Désignation du propriétaire*
*1.3 Désignation du donneur d'ordre*
*1.4 Opérateur de repérage*
*1.5 Société*
*1.6 Laboratoire d'analyses*

**2. CONCLUSIONS**

*2.1 Conclusion du repérage*
*2.2 Réserves et commentaires*

**3. LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S)**

*3.1 Liste des locaux visités*
*3.2 Liste des locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)*

**4. ÉTUDE PRÉALABLE**

*4.1 Programme de travaux du donneur d'ordre*
*4.2 Périmètre défini par le donneur d'ordre*
*4.3 Objectif de la mission*
*4.4 Programme de repérage de la mission*
*4.5 Analyse des documents transmis*
*4.6 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapports aux normes en vigueur*
*4.7 Plan et procédures de prélèvements*

**5. CONDITIONS DE REPÉRAGES**

*5.1 Modalités de repérages*
*5.2 Obligations de communication du rapport de repérage*

**6. RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE**

*6.1 Tableau des mesures*
*6.2 Quantitatif de matériaux amiantés*

**7. ANNEXES**

# PRE-RAPPORT DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DÉMOLITION DANS UN IMMEUBLE BÂTI

La mission est effectuée en application de l'article L4531-1 du code du travail conjointement aux arrêtés du 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 et du 16 juillet 2019 et conformément aux articles R.1334-19, R.1334-22, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6 et l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, issues du décret 2011-629 du 3 juin 2011. *Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis*

## 1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

### *1.1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE BÂTI VISITÉ*

Adresse : **1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG**

Référence bien : **0290 - Ancien CSU**

Date de construction : **Date du permis de construire non connue**

### *1.2 DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE*

**UNIVERSITE DE STRASBOURG**
**18 Rue Goethe**
**67081 STRASBOURG CEDEX**

### *1.3 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE*

**UNIVERSITE DE STRASBOURG - Mme METTLING Nathalie**
**4 rue Blaise Pascal**
**67080 STRASBOURG**

### *1.4 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE*

**Nom *:* M WEBER Régis**
**N° de certification : CPDI3476**
**Délivré le : 21/10/2022**
**Échéance le *:* 20/10/2029**



**Accompagnateur : *M. DREISTADT 03 68 85 08 27***

*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert - Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE.*

Raison sociale : **DIAGOBAH** (SIRET : **88429685600039**)
Adresse : **1 rue René Laennec, 67300 SCHILTIGHEIM**
Assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité : **10825380704 / 30/06/2026**

### *1.6 LABORATOIRE D'ANALYSES*

Raison sociale : **ITGA Rennes**
Adresse : **Parc Edonia bat.R , 3 rue de la Terre Adelie 35760 Saint-Gégoire**
Numéro de l'accréditation Cofrac : **1-5967 - 394 082 697 00332**

# 2. CONCLUSIONS

## 2.1 CONCLUSION DU REPÉRAGE

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport,
il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

| ZPSO | REF. PRLV | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | DESCRIPTION | QTE | ETAT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-001 | 002HM 00318 3P196 | RDC - DG4 | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure | Reprise d'étanchéité | 1 U | BE |
| ZPSO-002 | 002HM 00318 3P146 | RDC - 29 - Local Technique | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure | Reprise d'étanchéité | 1 U | BE |
| | | RDC - 31 - Local Technique | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure | Reprise d'étanchéité | 1 U | BE |
| ZPSO-003 | 002HM 00318 3P29 | RDC - 26 - Vestiaire | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage | Colle de carrelage | 12 m2 | BE |
| | | RDC - 28 - Vestiaire | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage | Colle de carrelage | 10 m2 | BE |
| | | RDC - SAS03 | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage | Colle de carrelage | 1 m2 | BE |
| | | RDC - SAS04 | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage | Colle de carrelage | 1 m2 | BE |
| ZPSO-004 | 002HM 00318 3P119 | RDC - 34 - Bureau | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse | Colle bitumineuse | 19 m2 | BE |
| | | RDC - SAS03 | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse | Colle bitumineuse | 1 m2 | BE |
| ZPSO-005 | 002HM 00318 3S44 | RDC - 24 - Cafétéria | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol | Dalle de sol | 15 m2 | BE |
| | | RDC - 30 - Vestiaire | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol | Dalle de sol | 13 m2 | BE |
| ZPSO-006 | 002HM 00318 3P38 | RDC - 24 - Cafétéria | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse | Colle bitumineuse | 14 m2 | BE |
| | | RDC - 30 - Vestiaire | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse | Colle bitumineuse | 13 m2 | BE |

| ZPSO | REF. PRLV | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | DESCRIPTION | QTE | ETAT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-007 | 002HM00318 3S109 | RDC - 38 - Bureau | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol | Dalle de sol | 21 m2 | BE |
| | | RDC - DG4 | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol | Dalle de sol | 92 m2 | BE |
| ZPSO-008 | 002HM00318 3P98 | RDC - 38 - Bureau | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse | Colle bitumineuse | 21 m2 | BE |
| ZPSO-009 | 002HM00318 3P191 | RDC - DG4 | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle bitumineuse + Couche2: Ragréage | Couche1: Colle bitumineuse + Couche2: Ragréage | 92 m2 | BE |
| ZPSO-010 | 002HM00318 3P107 | RDC - 32 - Secrétariat | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse | Colle bitumineuse | 25 m2 | BE |
| | | RDC - 36 - Bureau | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse | Colle bitumineuse | 21 m2 | BE |
| | | RDC - SAS04 | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse | Colle bitumineuse | 1 m2 | BE |
| ZPSO-011 | 002HM00318 3P51 | RDC - 26 - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence | Colle de faïence | 4 m2 | BE |
| | | RDC - SAS03 | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence | Colle de faïence | 2 m2 | BE |
| | | RDC - SAS04 | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence | Colle de faïence | 2 m2 | BE |
| ZPSO-012 | 002HM00318 3P104 | RDC - SAS03 | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage | Colle de plinthe | 8 ml | BE |
| | | RDC - SAS04 | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage | Colle de plinthe | 8 ml | BE |
| ZPSO-013 | 002HM00318 3P17P 18P52 P53 | RDC - 26 - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage | Colle de plinthe | 24 ml | BE |

| ZPSO | REF. PRLV | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | DESCRIPTION | QTE | ETAT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-013 | | RDC - 28 - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage | Colle de plinthe | 10 ml | BE |
| ZPSO-014 | 002HM00318 3P199 | RDC - DG4 | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Joint entre éléments | Joint entre éléments (Mastics) | 5 ml | BE |
| ZPSO-015 | 002HM00318 3P273 | RDC - 01 - Stockage | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage | Colle de carrelage | 60 m2 | BE |
| | | RDC - 01A - Stockage | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage | Colle de carrelage | 21 m2 | BE |
| | | RDC - 12 - Stockage | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage | Colle de carrelage | 25 m2 | BE |
| | | RDC - SAS02 - Atelier | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage | Colle de carrelage | 14 m2 | BE |
| ZPSO-016 | 002HM00318 3P275 | RDC - 01 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence | Colle de faïence | 96 m2 | BE |
| | | RDC - 01A - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence | Colle de faïence | | BE |
| | | RDC - SAS02 - Atelier | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence | Colle de faïence | | BE |
| ZPSO-017 | 002HM00318 3P315 | RDC - 04 - Local de service | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence | Colle de faïence | 25 m2 | BE |
| ZPSO-018 | 002HM00318 3P325 | RDC - WC2 | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence | Colle de faïence | 75 m2 | BE |
| ZPSO-019 | 002HM00318 3P262 | RDC - DG1 | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure | Reprise d'étanchéité | 1 U | DL |

| ZPSO | REF. PRLV | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | DESCRIPTION | QTE | ETAT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-020 | 002HM 00318 3P270 | RDC - DG1 | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) | Joint de mastic de vitrage | 1 U | BE |
| ZPSO-021 | 002HM 00318 3P263 | RDC - DG6 - Bureau (annexe) | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiserie - Joint de mastic de vitrage | Joint de mastic de vitrage | 1 U | BE |
| | | RDC - DG1 | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiserie - Joint de mastic de vitrage | Joint de mastic de vitrage | | BE |
| ZPSO-022 | 002HM 00318 3P254 | RDC - DG5 | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes - Peinture | Peinture | 3 ml | BE |
| ZPSO-023 | 002HM 00318 3P260 | RDC - 05 - Bureau | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence | Colle de faïence | 198 m2 | BE |
| | | RDC - DG6 - Bureau (annexe) | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence | Colle de faïence | | BE |
| | | RDC - DG1 | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence | Colle de faïence | | BE |
| ZPSO-024 | 002HM 00318 3P257 | RDC - STO02 - Cafétéria | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence | Colle de faïence | 2 m2 | BE |
| ZPSO-025 | 002HM 00318 3P293 | RDC - 10 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence | Colle de faïence | 3 m2 | BE |
| ZPSO-026 | 002HM 00318 3P295 | RDC - 08 - Local de service | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence | Colle de faïence | 14 m2 | BE |
| ZPSO-027 | 002HM 00318 3P300 | RDC - 12 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence | Colle de faïence | 18 m2 | BE |
| ZPSO-028 | 002HM 00318 3P344 P325 | RDC - WC4 | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence | Colle de faïence | 66 m2 | BE |

| ZPSO | REF. PRLV | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | DESCRIPTION | QTE | ETAT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-029 | 002HM 00318 3P416 | R+1 - 100 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté | Enduit à base de plâtre projeté | Voir ZPSO-062 | BE |
| ZPSO-030 | 002HM 00318 3P389 | R+1 - DG01 | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence | Colle de faïence | 1 m2 | DL |
| ZPSO-031 | 002HM 00318 3P391 | R+1 - DG01 | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage | Colle de plinthe | 2 ml | BE |
| ZPSO-032 | 002HM 00318 3P402 | R+1 - 113 - WC handicapés | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence | Colle de faïence | 2 m2 | BE |
| ZPSO-033 | 002HM 00318 3P401 | R+1 - 113 - WC handicapés | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage | Colle de plinthe | 12 ml | BE |
| ZPSO-034 | 002HM 00318 3P423 | Toiture - TER2 LGT | | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments associés à la toiture - Conduit de ventilation | Conduit + Mitron | 1 U | BE |
| ZPSO-036 | 002HM 00318 3P155 | RDC - 29 - Local Technique | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Joint plat prédécoupé pour brides | Joint plat prédécoupé pour brides | 1 U | BE |
| ZPSO-047 | 002HM 00318 3P470 | FACADES | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Nez de marche | Nez de marche | 6 U | BE |
| ZPSO-048 | 002HM 00318 3P476 | FACADES | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Joint de dilatation et d'assemblage | Joint de dilatation | 27 U | DL |
| ZPSO-055 | P007 | R+1 - 100 - Salle de sport | Intérieur du conduit | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits air - | Peinture bitumineuse | 2 U | BE |
| | | R+1 - 111 - Salle de sport | Intérieur du conduit | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits air - | Peinture bitumineuse | 2 U | BE |
| ZPSO-056 | P008 | R+1 - 100 - Salle de sport | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Joint plat prédécoupé pour brides | Joint plat prédécoupé pour brides | 2 U | BE |

| ZPSO | REF. PRLV | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | DESCRIPTION | QTE | ETAT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-056 | | R+1 - 111 - Salle de sport | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Joint plat prédécoupé pour brides | Joint plat prédécoupé pour brides | 2 U | BE |
| ZPSO-062 | P016 | R+1 - 100 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit de lissage | Enduit de lissage | 5 m2 | DL |
| ZPSO-067 | P021 | Toiture - TER2 LGT | | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | 164 ml | BE |
| ZPSO-075 | P031 | Toiture - TER03 - Terrasse | | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | 705 ml | BE |
| ZPSO-076 | P032 | Toiture - TER02 - Terrasse | Attique | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | 23 m2 | BE |
| ZPSO-077 | P033 | Toiture - TER01 - Terrasse | Couche supérieure | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Couche1: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Couche1: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) + Couche2: Isolant | 340 ml | BE |
| ZPSO-084 | P040 | Toiture - TER01 - Terrasse | | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | | |
| ZPSO-087 | P043 | R+1 - LOG3 - Salle de bain | Couche inférieure mosaïque | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage | Colle de carrelage | 4 m2 | BE |
| ZPSO-087 | | R+1 - LOG7 - Cuisine | Couche inférieure mosaïque | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage | Colle de carrelage | 7 m2 | BE |
| | | R+1 - LOG8 - WC | Couche inférieure mosaïque | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage | Colle de carrelage | 2 m2 | BE |
| ZPSO-096 | P052 | Toiture - TER2 LGT | | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | 50 ml | BE |

| ZPSO | REF. PRLV | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | DESCRIPTION | QTE | ETAT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-099 | P055 | RDC - DG4 RDC – 33B - Atelier | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Joint entre éléments | Joint entre éléments | 5 ml | DL |
| ZPSO-113 | P070 | RDC - 05 - Bureau | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence | Colle de faïence | 36 m2 | be |
| ZPSO-115 | P072 | RDC - WC1 | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence | Colle de faïence | 28 m | DL |
| ZPSO-119 | P076 | FACADES | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Joint de dilatation et d'assemblage | Joint de dilatation | Voir ZPSO-048 | DL |
| ZPSO-128 | P085 | FACADES | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Joint de dilatation et d'assemblage | Joint de dilatation | Voir ZPSO-048 | DL |
| ZPSO-038 | 002HM 00318 3P474 | FACADES | Noir, Colle beige | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Colle (faïence, pâte de verre, carrelage) | Colle (faïence, pâte de verre, carrelage) | 1725 m2 | BE |
| ZPSO-039 | 002HM 00318 3P482 | FACADES | Noir, Colle beige | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Colle (faïence, pâte de verre, carrelage) | Colle (faïence, pâte de verre, carrelage) | | |
| ZPSO-040 | 002HM 00318 3P493 | FACADES | Noir, Colle grise | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Colle (faïence, pâte de verre, carrelage) | Colle (faïence, pâte de verre, carrelage) | | |
| ZPSO-041 | 002HM 00318 3P486 | FACADES | Blanc, Colle beige | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Colle (faïence, pâte de verre, carrelage) | Colle (faïence, pâte de verre, carrelage) | | |
| ZPSO-091 | P047 | FACADES | Noir colle grise | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Colle (faïence, pâte de verre, carrelage) | Colle (faïence, pâte de verre, carrelage) | | |
| ZPSO-092 | P048 | FACADES | Noir colle grise | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Colle (faïence, pâte de verre, carrelage) | Colle (faïence, pâte de verre, carrelage) | | |

| ZPSO | REF. PRLV | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | DESCRIPTION | QTE | ETAT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-093 | P049 | FACADES | Blanc colle blanc | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Colle (faïence, pâte de verre, carrelage) | Colle (faïence, pâte de verre, carrelage) | | |
| ZPSO-097 | P053 | FACADES | Blanc colle blanche | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Colle (faïence, pâte de verre, carrelage) | Colle (faïence, pâte de verre, carrelage) | | |
| ZPSO-122 | P079 | FACADES | Noir colle grise | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Colle (faïence, pâte de verre, carrelage) | Colle (faïence, pâte de verre, carrelage) | | |
| ZPSO-124 | P081 | FACADES | Blanc colle blanche | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Colle (faïence, pâte de verre, carrelage) | Colle (faïence, pâte de verre, carrelage) | | |
| ZPSO-126 | P083 | FACADES | Noir colle beige | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Colle (faïence, pâte de verre, carrelage) | Colle (faïence, pâte de verre, carrelage) | | |
| ZPSO-127 | P084 | FACADES | Blanc colle blanche | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Colle (faïence, pâte de verre, carrelage) | Colle (faïence, pâte de verre, carrelage) | | |

| Légende : | BE : Bon Etat | DL : Dégradations Locales | ME : Mauvais Etat | NV : Non Visible |
|---|---|---|---|---|
| | ZPSO : Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage | | PRLV : Prélèvement de matériau pour analyse | |

*Nota : L'état du matériau amianté est donné à titre indicatif, il ne résulte pas de l'établissement d'une évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits tel que prévu à l'arrêté du 12 Décembre 2012.*
*Nota2 : Une ZPSO s'entend d'une partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages ou parties d'ouvrages sont semblables. La définition de ZPSO permet à l'opérateur de repérage d'optimiser ses investigations en optimisant le nombre de prélèvements devant être réalisés pour analyse.*

## *2.2 RÉSERVES ET COMMENTAIRES*

Commentaire N°1 : Joints de bride
Les joints de bride du local technique-29 au RDC qui n'ont pas pu être prélevés, car trop serrés, sont considérés comme amiantés.

Commentaire N°2 : L'arrière du doublage dans la SDB et la cuisine du logement de fonction n'a pu être visité que de manière ponctuelle. Si des matériaux sont repérés lors du curage de ce doublage (ancienne faïence par exemple), des investigations complémentaires seront nécessaires.

Commentaire N°3 : Végétation abondante au pied de la façade Ouest.

**Réserve N°1** : En l'absence d'ascensoriste, la trémie d'ascenseur, et extérieur de la cabine, n'ont pu être investiguée. Une contre-visite avec un ascensoriste sera nécessaire avant la démolition du bâtiment.

**Réserves sur les quantitatifs :** Les quantités annoncées dans le tableau des quantitatifs sont données à titre indicatif et estimatif, elles ne sauraient engager la responsabilité du diagnostiqueur et ne dispensent pas d'un comptage précis dans le cadre du chiffrage des travaux. Le diagnostic amiante avant travaux n'est pas un diagnostic déchets il ne vise pas à estimer la quantité de déchets produits par les travaux de désamiantage et la rénovation.

Le diagnostic vise uniquement les éléments accessibles par des démontages et démolition légère. La destruction de dalles ou de murs lourds ne fait pas partie de la mission. Les réseaux, les conduits, les fondations, les cuves et les constructions, enterrés sous les bâtiments et voiries, n'ont pas pu être sondés, ni l'ensemble des éléments enterrés (plaques, gravats, coffrages...).

Ce diagnostic porte uniquement sur l'ensemble bâti. Le mobilier, les machines et les biens présents dans le bâtiment ne sont pas visés.

**Lors de travaux, en cas de suspicion sur des matériaux douteux, il conviendra d'en avertir immédiatement l'opérateur de repérage afin de contrôler et de faire analyser le matériau, si nécessaire.**

# 3. LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S)

## 3.1 *LISTE DES LOCAUX VISITÉS*

Nombre de locaux visités : 123

RDC - 01 - Stockage, RDC - 01A - Stockage, RDC - 02 - Vestiaire, RDC - 02A, RDC - 02B, RDC - 02C, RDC - 02D, RDC - 02E, RDC - 02F, RDC - 02I - SAS, RDC - 03 - Salle de réunion, RDC - 04 - Local de service, RDC - 05 - Bureau, RDC - 06 - Accueil, RDC - 08 - Local de service, RDC - 09 - Atelier, RDC - 10 - Stockage, RDC - 11 - Atelier, RDC - 12 - Stockage, RDC - 13 - Vestiaire, RDC - 13A - SAS, RDC - 13B - Vestiaire, RDC - 14A - Salle de sport, RDC - 15 - Annexe Sport, RDC - 16 - Stockage, RDC - 17 - Salle de sport, RDC - 18 - Salle de sport, RDC - 19 - Salle de sport, RDC - 19A - Stockage, RDC - 20A - Salle de sport, RDC - 20B - Stockage, RDC - 21 - Salle de sport, RDC - 22 - Stockage, RDC - 23 - Stockage, RDC - 24 - Cafétéria, RDC - 25 - Centrale traitement d'air, RDC - 26 - Vestiaire, RDC - 27 - Chaufferie, RDC - 27A - SAS, RDC - 28 - Vestiaire, RDC - 29 - Local Technique, RDC - 30 - Vestiaire, RDC - 31 - Local Technique, RDC - 32 - Secrétariat, RDC - 33A - Atelier, RDC - 33B - Atelier, RDC - 34 - Bureau, RDC - 35 - Atelier, RDC - 36 - Bureau, RDC - 37 - Sanitaires, RDC - 38 - Bureau, RDC - 39 - Atelier, RDC - 41 - Atelier, RDC - 42 - Guichet, RDC - DG6 - Bureau (annexe), RDC - DG1, RDC - DG2, RDC - DG3, RDC - DG4, RDC - DG5, RDC - ES1, RDC - LOG1 - Cave, RDC - LT01 - Local technique, RDC - Minitels - Guichet, RDC - SAS02 - Atelier, RDC - SAS03, RDC - SAS04, RDC - STO02 - Cafétéria, RDC - Stockage03, RDC - WC handicapés, RDC - WC1, RDC - WC2, RDC - WC4, R+1 - 100 - Salle de sport, R+1 - 101 - Stockage, R+1 - 102 - Stockage, R+1 - 109 - Stockage, R+1 - 109A - Stockage, R+1 - 110 - Stockage, R+1 - 111 - Salle de sport, R+1 - 112 - Salle de sport, R+1 - 113 - WC handicapés, R+1 - 114 - Local Technique, R+1 - 115 - Annexe, R+1 - DG01, R+1 - DG2 - R+1, R+1 - DSG6, R+1 - ES01, R+1 - ES1 - R+1, R+1 - ES4, R+1 - GT05 - Gaine technique, R+1 - LOG1 - Chambre, R+1 - LOG2 - Chambre, R+1 - LOG3 - Salle de bain, R+1 - LOG4 - Dégagement, R+1 - LOG5 - Séjour, R+1 - LOG6 - Dégagement, R+1 - LOG7 - Cuisine, R+1 - LOG8 - WC, R+1 - STO01 - Stockage, R+1 - TER - Terrasse R+1, R+2 - 204 - Machinerie, R+2 - 205 - Stockage, R+2 - ES01 - R+2, R+2 - ES02, R+2 - LTE01 - Centrale traitement d'air, R+2 - LTE02 - Local Technique, R+2 - VIDSUR100 - Vide, R+2 - VIDSUR111 - Vide, R+2 - VIDSUR112 - Vide, Etage Machinerie - ESC R+2machinerie, Etage Machinerie - LTE01 - Local Technique R+2machinerie, Etage Machinerie - TER - Terrasse R+2, Etage Machinerie - TER - Terrasse R+2machinerie, Etage Machinerie - VIDSUR100 - Vide R+2Machinerie, Etage Machinerie - VIDSUR111 - Vide R+2machnierie, Etage Machinerie - VIDSUR112 - Vide R+2machnierie, Toiture - TER01 - Terrasse, Toiture - TER02 - Terrasse, Toiture - TER03 - Terrasse, Toiture - TER2 LGT, Toiture - TER1 LGT, FACADES

## 3.2 *LISTE DES LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)*

Nombre de locaux non visités :

| *LOCALISATION* | *PARTIES DU LOCAL* | *RAISON* |
|---|---|---|
| Trémie d'ascenseur | Toutes | Absence de personnel habilité (ascensoriste) |

# 4. ÉTUDE PRÉALABLE

## 4.1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Démolition complète du bâtiment.

## 4.2 PÉRIMÈTRE DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

## 4.3 OBJECTIF DE LA MISSION

« Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux ». Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

## 4.4 PROGRAMME DE REPÉRAGE DE LA MISSION

Le programme de repérage est défini par la liste C de l'Annexe 13.9 du Code de la santé publique et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017.
Annexe 13.9 du Code de la santé publique modifié + Annexe A de la Norme NF-X 46-020 d'Août 2017.

| | |
|---|---|
| 1 - COUVERTURES, TOITURES, TERRASSES ET ETANCHEITES | Plaques ondulées et planes |
| | Ardoises, bardeaux bitumineux |
| | Éléments associés à la toiture |
| | Éléments sous toiture |
| | Étanchéité de toiture terrasse |
| | Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières |
| 2 - PAROIS VERTICALES EXTERIEURES ET FAÇADES | Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich |
| | Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage |
| | Façades lourdes y compris poteaux |
| | Menuiseries extérieures |
| | Éléments associés aux façades |
| 3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES | Murs et cloisons maçonnés |
| | Poteaux |
| | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) |
| | Gaines et coffres verticaux |
| | Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques |
| | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres |
| 4 - PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS | Plafonds |
| | Poutres et charpentes |
| | Poutres et charpentes |
| | Gaines et coffres horizontaux |
| | Faux plafonds |
| | Suspentes et contrevents |
| 5 - PLANCHERS ET PLANCHERS TECHNIQUES | Revêtements de sols |
| 6 - CONDUITS ET ACCESSOIRES INTERIEURS | Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) |
| | Clapets / volets coupe-feu |
| | Vide-ordures |
| 7 - ASCENSEURS, MONTE-CHARGES ET ESCALIERS MECANIQUES | Portes et cloisons palières |
| | Parois des équipements |
| | Matériels en machinerie |
| 8 - ÉQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES | Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes |
| | Convecteurs et radiateurs électriques |
| | Fusibles à broche |
| | Canalisations électriques préfabriquées |
| | Coffres-forts |
| | Portes de placard, baignoires et éviers métalliques |
| | Jardinières, bac à sable incendie |
| 9 - FONDATIONS ET SOUBASSEMENTS | Étanchéité des murs enterrés |
| | Parois verticales et horizontales enterrées |
| | Conduits et fourreaux |
| 10 - AMENAGEMENTS, VOIRIES ET RESEAUX DIVERS | Conduits, Siphons |
| | Voiries |
| | Espaces sportifs |
| | Aménagements extérieurs |

### 4.5 *ANALYSE DES DOCUMENTS TRANSMIS*

| *DOCUMENTS DEMANDÉS* | *DOCUMENTS REMIS* |
|---|---|
| Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés | - |
| Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place | - |
| Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité | - |

Observations :
**Néant**

### *4.6 ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORTS AUX NORMES EN VIGUEUR*

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017.

| *OBSERVATIONS* | *OUI* | *NON* | *SANS OBJET* |
|---|---|---|---|
| Plan de prévention réalisé avant intervention sur site | - | - | x |
| Vide sanitaire accessible | | | x |
| Combles ou toiture accessibles et visitables | | | x |

### *4.7 PLAN ET PROCÉDURES DE PRÉLÈVEMENTS*

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

# 5. CONDITIONS DE REPÉRAGES

## 5.1 MODALITÉS DE REPÉRAGES

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage rechercher la présence de Matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autres aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la liste des matériaux de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers.

L'ensemble du périmètre du bien concerné par les travaux doit être inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés, l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas exceptionnels, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être menées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de Zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendues des ZPSO.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux ou produits utilisées, il atteste, le cas échant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaire pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017, les analyses des échantillons de ces matériaux ou produits sont réalisées couches par couches par un organismes accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

## 5.2 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPÉRAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personnes physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti. Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

# 6. RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE

## 6.1 TABLEAU DES MESURES

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S001 | | RDC - LT01 - Local technique; R+1 - DG01 | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Béton brut | Béton brut | Absence d'amiante (Absence d'amiante par nature) |
| S002 | | RDC - 37 - Sanitaires; R+1 - LOG5 - Séjour; R+1 - LOG6 - Dégagement | Couche supérieure | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | - | Parquet bois | Absence d'amiante (Absence d'amiante par nature) |
| S003 | | R+1 - LOG3 - Salle de bain; R+1 - LOG7 - Cuisine; R+1 - LOG8 - WC | Couche supérieure | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Absence d'amiante (Absence d'amiante par nature ( > 1997)) |
| S004 | | RDC - 33A - Atelier | | 8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques | Plaques souples bitumineuses antivibratiles | Plaques souples bitumineuses antivibratiles | Absence d'amiante (Absence d'amiante par nature ( > 1997)) |
| S005 | | R+2 - 204 - Machinerie | | 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - Matériels en machinerie | Machinerie | Machinerie | Absence d'amiante (Absence d'amiante par nature ( > 1997)) |
| ZPSO-001 | 002HM003183P196 | RDC - DG4 | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure | Reprise d'étanchéité | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-002 | 002HM003183P146 | RDC - 29 - Local Technique | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure | Reprise d'étanchéité | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 31 - Local Technique | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure | Reprise d'étanchéité | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-003 | 002HM003183P29 | RDC - 26 - Vestiaire | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 28 - Vestiaire | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - SAS03 | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-003 | | RDC - SAS04 | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-004 | 002HM003183P119 | RDC - 34 - Bureau | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle bitumineuse | Colle bitumineuse | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - SAS03 | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle bitumineuse | Colle bitumineuse | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-005 | 002HM003183S44 | RDC - 24 - Cafétéria | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Dalle de sol | Dalle de sol | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 30 - Vestiaire | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Dalle de sol | Dalle de sol | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-006 | 002HM003183P38 | RDC - 24 - Cafétéria | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle bitumineuse | Colle bitumineuse | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 30 - Vestiaire | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle bitumineuse | Colle bitumineuse | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-007 | 002HM003183S109 | RDC - 38 - Bureau | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Dalle de sol | Dalle de sol | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG4 | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Dalle de sol | Dalle de sol | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-008 | 002HM003183P98 | RDC - 38 - Bureau | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle bitumineuse | Colle bitumineuse | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-009 | 002HM003183P191 | RDC - DG4 | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Colle bitumineuse + Couche2: Ragréage | Couche1: Colle bitumineuse + Couche2: Ragréage | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-010 | 002HM003183P107 | RDC - 32 - Secrétariat | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle bitumineuse | Colle bitumineuse | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 36 - Bureau | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle bitumineuse | Colle bitumineuse | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - SAS04 | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle bitumineuse | Colle bitumineuse | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-011 | 002HM0031 83P51 | RDC - 26 - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | 002HM0031 83P105P116 | RDC - SAS03 | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | 002HM0031 83P105 | RDC - SAS04 | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-012 | 002HM0031 83P104 | RDC - SAS03 | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de carrelage | Colle de plinthe | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - SAS04 | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de carrelage | Colle de plinthe | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-013 | 002HM0031 83P17P18P5 2P53 | RDC - 26 - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de carrelage | Colle de plinthe | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 28 - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de carrelage | Colle de plinthe | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-014 | 002HM0031 83P199 | RDC - DG4 | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint entre éléments | Joint entre éléments (Mastics) | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-015 | 002HM0031 83P2733 | RDC - 01 - Stockage | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 01A - Stockage | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 12 - Stockage | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-015 | | RDC - SAS02 - Atelier | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-016 | 002HM0031 83P275 | RDC - 01 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 01A - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - SAS02 - Atelier | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-017 | 002HM0031 83P315 | RDC - 04 - Local de service | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-018 | 002HM0031 83P325 | RDC - WC2 | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-019 | 002HM0031 83P262 | RDC - DG1 | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure | Reprise d'étanchéité | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-020 | 002HM0031 83P270 | RDC - DG1 | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) | Joint de mastic de vitrage | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-021 | 002HM0031 83P263 | RDC - DG6 - Bureau (annexe) | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiserie | Joint de mastic de vitrage | Joint de mastic de vitrage | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG1 | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiserie | Joint de mastic de vitrage | Joint de mastic de vitrage | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-022 | 002HM0031 83P254 | RDC - DG5 | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes | Peinture | Peinture | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-023 | 002HM0031 83P260 | RDC - 05 - Bureau | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-023 | | RDC - DG6 - Bureau (annexe) | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG1 | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-024 | 002HM0031 83P257 | RDC - STO02 - Cafétéria | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Présence d'amiante (En attente des résultats d'analyse) |
| ZPSO-025 | 002HM0031 83P293 | RDC - 10 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-026 | 002HM0031 83P295 | RDC - 08 - Local de service | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-027 | 002HM0031 83P300 | RDC - 12 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-028 | 002HM0031 83P344P325 | RDC - WC4 | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-029 | 002HM0031 83P416 | R+1 - 100 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre projeté | Enduit à base de plâtre projeté | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-030 | 002HM0031 83P389 | R+1 - DG01 | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-031 | 002HM0031 83P391 | R+1 - DG01 | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de carrelage | Colle de plinthe | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-032 | 002HM0031 83P402 | R+1 - 113 - WC handicapés | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-033 | 002HM0031 83P401 | R+1 - 113 - WC handicapés | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de carrelage | Colle de plinthe | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-034 | 002HM0031 83P423 | Toiture - TER2 LGT | | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments associés à la toiture | Conduit de ventilation | Conduit + Mitron | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-036 | 002HM0031 83P155 | RDC - 29 - Local Technique | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint plat prédécoupé pour brides | Joint plat prédécoupé pour brides | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-038 | 002HM0031 83P474 | FACADES | Noir, Colle beige | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-039 | 002HM0031 83P482 | FACADES | Noir, Colle beige | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-040 | 002HM0031 83P493 | FACADES | Noir, Colle grise | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-041 | 002HM0031 83P486 | FACADES | Blanc, Colle beige | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-042 | 002HM0031 83P481 | FACADES | Noir, Colle grise | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-043 | 002HM0031 83P487 | FACADES | Noir, Colle grise | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-044 | 002HM0031 83P473 | FACADES | Blanc, Colle blanche | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-045 | 002HM0031 83P483 | FACADES | Blanc, Colle blanche | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-046 | 002HM0031 83P492 | FACADES | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-047 | 002HM0031 83P470 | FACADES | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Nez de marche | Nez de marche | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-048 | 002HM0031 83P476 | FACADES | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Joint de dilatation et d'assemblage | Joint de dilatation | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-049 | P001 | FACADES | Blanc colle blanche | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-050 | P002 | FACADES | Noir colle grise | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-051 | P003 | FACADES | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Joint de dilatation | Joint de dilatation | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-052 | P004 | FACADES | Blanc colle blanche | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-053 | P005 | FACADES | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-054 | P006 | R+1 - 100 - Salle de sport | | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments sous toiture | Isolant sous toiture | Isolant sous toiture | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-055 | P007 | R+1 - 100 - Salle de sport | Intérieur du conduit | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits air | | Peinture bitumineuse | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 111 - Salle de sport | Intérieur du conduit | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits air | | Peinture bitumineuse | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-056 | P008 | R+1 - 100 - Salle de sport | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint plat prédécoupé pour brides | Joint plat prédécoupé pour brides | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 111 - Salle de sport | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint plat prédécoupé pour brides | Joint plat prédécoupé pour brides | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-057 | | R+1 - 100 - Salle de sport | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith…) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | P010 | R+1 - 111 - Salle de sport | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith…) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | P009 | R+1 - 112 - Salle de sport | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith…) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-058 | P011 | R+1 - 111 - Salle de sport | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | - | Isolant sous parquet | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-059 | P012 | R+1 - 100 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre projeté | Enduit à base de plâtre projeté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-060 | P013 | R+1 - 100 - Salle de sport | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-061 | P014 | R+1 - 100 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | P015 | R+1 - 100 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-062 | P016 | R+1 - 100 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit de lissage | Enduit de lissage | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-063 | P017 | RDC - 13A - SAS | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint entre éléments | Joint entre éléments | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-064 | P018 | Toiture - TER02 - Terrasse | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) | Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-065 | P019 | Toiture - TER2 LGT | Couche supérieure | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) + Couche2: - | Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) + Couche2: Isolant | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-066 | P020 | Toiture - TER2 LGT | Couche 2 | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) + Couche2: - | Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) + Couche2: Isolant | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-067 | P021 | Toiture - TER2 LGT | | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-068 | P022 | Toiture - TER2 LGT | | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-069 | P023 | Toiture - TER03 - Terrasse | Couche supérieure | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) + Couche2: - | Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) + Couche2: Isolant | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | P029 | Toiture - TER03 - Terrasse | Couche supérieure | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) + Couche2: - | Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) + Couche2: Isolant | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-070 | P024 | Toiture - TER03 - Terrasse | Couche 2 | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) + Couche2: - | Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) + Couche2: Isolant | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | P030 | Toiture - TER03 - Terrasse | Couche 2 | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) + Couche2: - | Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) + Couche2: Isolant | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-071 | P025 | Toiture - TER03 - Terrasse | Sheds | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-072 | P026 | Toiture - TER03 - Terrasse | Sheds | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Partie plane : pare vapeur | Partie plane : pare vapeur | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-073 | P027 | Toiture - TER03 - Terrasse | Couche supérieure | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Couche1: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) + Couche2: - | Couche1: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) + Couche2: Isolant | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-074 | P028 | Toiture - TER03 - Terrasse | | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-075 | P031 | Toiture - TER03 - Terrasse | | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-076 | P032 | Toiture - TER02 - Terrasse | Attique | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-077 | P033 | Toiture - TER01 - Terrasse | Couche supérieure | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Couche1: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Couche1: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) + Couche2: Isolant | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-078 | P034 | Toiture - TER01 - Terrasse | Couche inférieure | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-079 | P035 | Toiture - TER01 - Terrasse | Couche supérieure | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) + Couche2: - | Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) + Couche2: Isolant | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-080 | P036 | Toiture - TER01 - Terrasse | Couche 2 | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) + Couche2: - | Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) + Couche2: Isolant | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-081 | P037 | Toiture - TER01 - Terrasse | Sheds | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-082 | P038 | Toiture - TER01 - Terrasse | Couche 2 | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-083 | P039 | Toiture - TER01 - Terrasse | | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Partie plane : pare vapeur | Partie plane : pare vapeur | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-084 | P040 | Toiture - TER01 - Terrasse | | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-085 | P041 | R+1 - LOG3 - Salle de bain | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Plot de colle fixant les cloisons au mur | Plot de colle fixant les cloisons au mur | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-086 | | R+1 - LOG5 - Séjour | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage | Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | P042 | R+1 - LOG6 - Dégagement | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage | Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-087 | P043 | R+1 - LOG3 - Salle de bain | Couche inférieure mosaïque | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - LOG7 - Cuisine | Couche inférieure mosaïque | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - LOG8 - WC | Couche inférieure mosaïque | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-088 | P044 | Toiture - TER1 LGT | | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-089 | P045 | Toiture - TER1 LGT | | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Partie plane : pare vapeur | Partie plane : pare vapeur | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-090 | P046 | Toiture - TER1 LGT | | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-091 | P047 | FACADES | Noir colle grise | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-092 | P048 | FACADES | noir colle grise | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-093 | P049 | FACADES | Blanc colle blanc | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-094 | P050 | Toiture - TER2 LGT | | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-095 | P051 | Toiture - TER2 LGT | | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Partie plane : pare vapeur | Partie plane : pare vapeur | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-096 | P052 | Toiture - TER2 LGT | | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-097 | P053 | FACADES | Blanc colle blanche | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-098 | P054 | RDC - 12 - Stockage | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint entre éléments | Joint entre éléments | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-099 | P055 | RDC - DG4<br>RDC – 33B - Atelier | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint entre éléments | Joint entre éléments | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-100 | P056 | R+2 - LTE01 - Centrale traitement d'air | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint entre éléments | Joint entre éléments | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-101 | P057 | FACADES | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | P058 | FACADES | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-102 | P059 | RDC - 27 - Chaufferie | | 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques | Panneaux, plaques en fibres-ciment de vantail, bakelite | Panneaux + Isolant | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-103 | P060 | RDC - 27 - Chaufferie | | 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques | Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) | Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-104 | P061 | RDC - 27 - Chaufferie | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiserie | - | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-105 | P062 | RDC - DG4 | | 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques | Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) | Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-106 | P063 | RDC - 21 - Salle de sport | Sous parquet | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-107 | P064 | RDC - 17 - Salle de sport | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-108 | P065 | RDC - 17 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | - | Colle de panneaux | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-109 | P066 | RDC - 17 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux métalliques | - | Peinture | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-110 | P067 | RDC - 18 - Salle de sport | Sous parquet | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | - | Isolant | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-111 | P068 | RDC - 18 - Salle de sport | Couche inférieure | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | - | Étanchéité bitumineuse | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-112 | P069 | RDC - 05 - Bureau | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-113 | P070 | RDC - 05 - Bureau | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-114 | P071 | RDC - 03 - Salle de réunion | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint entre éléments | Joint entre éléments | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-115 | P072 | RDC - WC1 | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-116 | P073 | RDC - WC1 | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-117 | P074 | FACADES | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-118 | P075 | FACADES | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-119 | P076 | FACADES | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Joint de dilatation et d'assemblage | Joint de dilatation | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-120 | P077 | FACADES | Châssis alu | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-121 | P078 | FACADES | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-122 | P079 | FACADES | Noir colle gris | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-123 | P080 | FACADES | Noir colle beige | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-124 | P081 | FACADES | Blanc colle blanche | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-125 | P082 | FACADES | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-126 | P083 | FACADES | noir colle beige | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-127 | P084 | FACADES | blanc colle blanche | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-128 | P085 | FACADES | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Joint de dilatation et d'assemblage | Joint de dilatation | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-129 | P086 | FACADES | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-130 | P087 | FACADES | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-131 | P088 | FACADES | Blanc colle blanche | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | P089 | FACADES | Blanc colle blanche | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Colle (faience, pate de verre, carrelage) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-132 | P090 | FACADES | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Poteau metalliques | Joint | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-133 | P091 | FACADES | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-134 | P092 | FACADES | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-135 | 002HM003183P3P4P6P21P22P23P43P54P63P100P101P102P192P203P209P214P215P221P227P238P246P277P309P323P354 | RDC - 01 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 01A - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 03 - Salle de réunion | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 04 - Local de service | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 06 - Accueil | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 08 - Local de service | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 09 - Atelier | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 10 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 11 - Atelier | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 12 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 19 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-135 | | RDC - 20A - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 21 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 24 - Cafétéria | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 26 - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 28 - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 30 - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 32 - Secrétariat | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 33A - Atelier | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 33B - Atelier | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 34 - Bureau | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 35 - Atelier | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 37 - Sanitaires | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 38 - Bureau | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 41 - Atelier | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-135 | | RDC - 42 - Guichet | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG1 | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG2 | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG3 | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG4 | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - Minitels - Guichet | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - SAS02 - Atelier | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - SAS03 | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - SAS04 | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - STO02 - Cafétéria | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - WC1 | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - WC2 | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - WC4 | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-136 | | RDC - 03 - Salle de réunion | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 002HM003183P5P7P126P127P128P133P234P298P314P349 | RDC - 08 - Local de service | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 11 - Atelier | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 12 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 14A - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 19 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 20B - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 22 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 23 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 25 - Centrale traitement d'air | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 27 - Chaufferie | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 27A - SAS | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 33B - Atelier | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 35 - Atelier | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 41 - Atelier | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-137 | 002HM003183P8P31P60P140P204P248P276P281P301P378 | RDC - 01 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit de rebouchage | Enduit de rebouchage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 01A - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit de rebouchage | Enduit de rebouchage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 09 - Atelier | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit de rebouchage | Enduit de rebouchage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 12 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit de rebouchage | Enduit de rebouchage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 21 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit de rebouchage | Enduit de rebouchage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 23 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit de rebouchage | Enduit de rebouchage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 28 - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit de rebouchage | Enduit de rebouchage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 29 - Local Technique | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit de rebouchage | Enduit de rebouchage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 33A - Atelier | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit de rebouchage | Enduit de rebouchage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG4 | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit de rebouchage | Enduit de rebouchage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - SAS02 - Atelier | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit de rebouchage | Enduit de rebouchage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-138 | 002HM003183P30P42P46P106P319P326P343 | RDC - 02 - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre projeté | Enduit à base de plâtre projeté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 02A | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre projeté | Enduit à base de plâtre projeté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 02B | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre projeté | Enduit à base de plâtre projeté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-138 | | RDC - 02C | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre projeté | Enduit à base de plâtre projeté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 02D | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre projeté | Enduit à base de plâtre projeté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 02E | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre projeté | Enduit à base de plâtre projeté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 02F | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre projeté | Enduit à base de plâtre projeté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 02I - SAS | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre projeté | Enduit à base de plâtre projeté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 06 - Accueil | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre projeté | Enduit à base de plâtre projeté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 13 - Vestaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre projeté | Enduit à base de plâtre projeté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 13A - SAS | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre projeté | Enduit à base de plâtre projeté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 13B - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre projeté | Enduit à base de plâtre projeté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 24 - Cafétéria | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre projeté | Enduit à base de plâtre projeté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 26 - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre projeté | Enduit à base de plâtre projeté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 28 - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre projeté | Enduit à base de plâtre projeté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - SAS03 | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre projeté | Enduit à base de plâtre projeté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - SAS04 | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre projeté | Enduit à base de plâtre projeté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-138 | | RDC - WC handicapés | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre projeté | Enduit à base de plâtre projeté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - WC2 | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre projeté | Enduit à base de plâtre projeté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - WC4 | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre projeté | Enduit à base de plâtre projeté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-139 | 002HM003183P59P64P201P211P212P222P232P233P249P297P360P375 | RDC - 03 - Salle de réunion | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 05 - Bureau | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 06 - Accueil | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 09 - Atelier | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 11 - Atelier | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 15 - Annexe Sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 20A - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-139 | | RDC - 21 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 22 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 23 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 42 - Guichet | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG2 | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG3 | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG4 | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - Minitels - Guichet | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-139 | | RDC - STO02 - Cafétéria | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-140 | 002HM0031 83P131 | RDC - 27 - Chaufferie | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Jonction entre agglos | Jonction entre agglos | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-141 | 002HM0031 83P139P223 | RDC - 29 - Local Technique | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment projeté | Enduit à base de ciment projeté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 31 - Local Technique | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment projeté | Enduit à base de ciment projeté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG2 | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment projeté | Enduit à base de ciment projeté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - STO02 - Cafétéria | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment projeté | Enduit à base de ciment projeté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-142 | 002HM0031 83P213 | RDC - DG2 | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG3 | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - WC1 | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-143 | 002HM0031 83P220 | RDC - DG2 | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Plot de colle fixant les cloisons au mur | Plot de colle fixant les cloisons au mur | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-144 | 002HM0031 83P229 | RDC - STO02 - Cafétéria | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Joint de maconnerie | Joint de maconnerie | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - WC1 | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Joint de maconnerie | Joint de maconnerie | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-145 | 002HM003183P258 | RDC - 09 - Atelier | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Joint entre agglos | Joint entre agglos | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 10 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Joint entre agglos | Joint entre agglos | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 11 - Atelier | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Joint entre agglos | Joint entre agglos | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - SAS02 - Atelier | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Joint entre agglos | Joint entre agglos | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-146 | 002HM003183P259 | RDC - DG2 | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Panneaux de cloisons | Panneaux de cloisons | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-147 | 002HM003183P350 | RDC - 19 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit de lissage | Enduit de lissage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-148 | 002HM003183P11P12P35P69P86P112P145P194P231P267P283P302P322P377 | RDC - 06 - Accueil | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Joint à lèvre | Joint à lèvre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 08 - Local de service | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Joint à lèvre | Joint à lèvre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 09 - Atelier | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Joint à lèvre | Joint à lèvre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 11 - Atelier | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Joint à lèvre | Joint à lèvre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 12 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Joint à lèvre | Joint à lèvre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 14A - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Joint à lèvre | Joint à lèvre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 17 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Joint à lèvre | Joint à lèvre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 18 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Joint à lèvre | Joint à lèvre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-148 | | RDC - 19 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Joint à lèvre | Joint à lèvre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 20A - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Joint à lèvre | Joint à lèvre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 21 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Joint à lèvre | Joint à lèvre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 23 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Joint à lèvre | Joint à lèvre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 24 - Cafétéria | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Joint à lèvre | Joint à lèvre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 26 - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Joint à lèvre | Joint à lèvre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 28 - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Joint à lèvre | Joint à lèvre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 29 - Local Technique | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Joint à lèvre | Joint à lèvre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 30 - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Joint à lèvre | Joint à lèvre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 31 - Local Technique | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Joint à lèvre | Joint à lèvre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 32 - Secrétariat | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Joint à lèvre | Joint à lèvre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 33A - Atelier | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Joint à lèvre | Joint à lèvre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 34 - Bureau | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Joint à lèvre | Joint à lèvre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 38 - Bureau | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Joint à lèvre | Joint à lèvre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-148 | | RDC - DG1 | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Joint à lèvre | Joint à lèvre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG4 | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Joint à lèvre | Joint à lèvre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - LOG1 - Cave | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Joint à lèvre | Joint à lèvre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - SAS02 - Atelier | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Joint à lèvre | Joint à lèvre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-149 | 002HM003183P34P68P72P111P144P193P242P261P264P265P271P272P282P320P324P340P356 | RDC - 02 - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Mastic vitrier | Mastic vitrier | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 03 - Salle de réunion | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Mastic vitrier | Mastic vitrier | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 06 - Accueil | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Mastic vitrier | Mastic vitrier | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 08 - Local de service | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Mastic vitrier | Mastic vitrier | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 09 - Atelier | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Mastic vitrier | Mastic vitrier | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 11 - Atelier | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Mastic vitrier | Mastic vitrier | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 12 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Mastic vitrier | Mastic vitrier | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 14A - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Mastic vitrier | Mastic vitrier | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 17 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Mastic vitrier | Mastic vitrier | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 18 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Mastic vitrier | Mastic vitrier | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-149 | | RDC - 19 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Mastic vitrier | Mastic vitrier | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 20A - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Mastic vitrier | Mastic vitrier | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 21 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Mastic vitrier | Mastic vitrier | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 24 - Cafétéria | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Mastic vitrier | Mastic vitrier | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 26 - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Mastic vitrier | Mastic vitrier | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 28 - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Mastic vitrier | Mastic vitrier | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 29 - Local Technique | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Mastic vitrier | Mastic vitrier | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 30 - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Mastic vitrier | Mastic vitrier | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 32 - Secrétariat | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Mastic vitrier | Mastic vitrier | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 34 - Bureau | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Mastic vitrier | Mastic vitrier | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 38 - Bureau | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Mastic vitrier | Mastic vitrier | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG1 | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Mastic vitrier | Mastic vitrier | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG2 | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Mastic vitrier | Mastic vitrier | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG4 | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Mastic vitrier | Mastic vitrier | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-149 | | RDC - SAS02 - Atelier | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Mastic vitrier | Mastic vitrier | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-150 | 002HM003183P36P70P75P113P266P321P341 | RDC - 02 - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Reprise d'étanchéïté | Reprise d'étanchéïté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 06 - Accueil | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Reprise d'étanchéïté | Reprise d'étanchéïté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 14A - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Reprise d'étanchéïté | Reprise d'étanchéïté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 17 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Reprise d'étanchéïté | Reprise d'étanchéïté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 18 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Reprise d'étanchéïté | Reprise d'étanchéïté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 19 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Reprise d'étanchéïté | Reprise d'étanchéïté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 20A - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Reprise d'étanchéïté | Reprise d'étanchéïté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 21 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Reprise d'étanchéïté | Reprise d'étanchéïté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 24 - Cafétéria | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Reprise d'étanchéïté | Reprise d'étanchéïté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 26 - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Reprise d'étanchéïté | Reprise d'étanchéïté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 28 - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Reprise d'étanchéïté | Reprise d'étanchéïté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 30 - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Reprise d'étanchéïté | Reprise d'étanchéïté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 32 - Secrétariat | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Reprise d'étanchéïté | Reprise d'étanchéïté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-150 | | RDC - 34 - Bureau | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Reprise d'étanchéïté | Reprise d'étanchéïté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 38 - Bureau | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Reprise d'étanchéïté | Reprise d'étanchéïté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG1 | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Reprise d'étanchéïté | Reprise d'étanchéïté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-151 | 002HM0031 83P115P142 | RDC - 31 - Local Technique | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Joint | Joint | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-152 | 002HM0031 83P65P280 | RDC - 01 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Isolant intérieur | Isolant intérieur | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 21 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Isolant intérieur | Isolant intérieur | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - SAS02 - Atelier | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Isolant intérieur | Isolant intérieur | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-153 | 002HM0031 83P89P93P4 03P404P408 | R+1 - 100 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 111 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 112 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 113 - WC handicapés | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 114 - Local Technique | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - LOG1 - Chambre | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - LOG2 - Chambre | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-153 | | R+1 - LOG3 - Salle de bain | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - LOG4 - Dégagement | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - LOG5 - Séjour | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - LOG6 - Dégagement | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - LOG7 - Cuisine | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - LOG8 - WC | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-154 | 002HM003183P390 | R+1 - 113 - WC handicapés | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-155 | 002HM003183P364P365P374P407P413P414P415P419P420P444P454 | R+1 - 100 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 109 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 109A - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 111 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 112 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 113 - WC handicapés | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - DG01 | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-156 | 002HM0031 83P390 | R+1 - DG01 | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-157 | 002HM0031 83P408 | R+1 - 110 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit de lisage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-158 | 002HM0031 83P444P454 | R+2 - 205 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+2 - LTE01 - Centrale traitement d'air | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+2 - LTE02 - Local Technique | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-159 | 002HM0031 83P393 | R+1 - DG01 | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-160 | 002HM0031 83P91P94P3 92P396P411 P443 | R+1 - DG01 | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - LOG1 - Chambre | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - LOG2 - Chambre | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - LOG3 - Salle de bain | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - LOG4 - Dégagement | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-160 | | R+1 - LOG5 - Séjour | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - LOG6 - Dégagement | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - LOG7 - Cuisine | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - LOG8 - WC | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+2 - 204 - Machinerie | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+2 - 205 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+2 - LTE01 - Centrale traitement d'air | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+2 - LTE02 - Local Technique | | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-161 | 002HM0031 83P445 | R+2 - 205 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Joint entre maçonnerie | Joint entre maçonnerie | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-161 | | R+2 - LTE01 - Centrale traitement d'air | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Joint entre maçonnerie | Joint entre maçonnerie | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+2 - LTE02 - Local Technique | | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Joint entre maçonnerie | Joint entre maçonnerie | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-162 | 002HM0031 83P92P371 | R+1 - 110 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Mastic vitrier | Mastic vitrier | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 111 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Mastic vitrier | Mastic vitrier | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - LOG6 - Dégagement | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Mastic vitrier | Mastic vitrier | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-163 | 002HM0031 83P369 | R+1 - 100 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Joint à lèvre | Joint à lèvre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 111 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Joint à lèvre | Joint à lèvre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 112 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Joint à lèvre | Joint à lèvre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-164 | 002HM0031 83P422 | R+1 - 111 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries | Reprise d'étanchéïté | Reprise d'étanchéïté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-166 | 002HM0031 83P47P110P 465 | RDC - 14A - Salle de sport | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 26 - Vestiaire | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 32 - Secrétariat | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 34 - Bureau | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - SAS03 | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-166 | | RDC - SAS04 | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-167 | 002HM003183P10P24P26P79P87P135P141P310P353 | RDC - 08 - Local de service | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 14A - Salle de sport | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 17 - Salle de sport | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 18 - Salle de sport | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 19 - Salle de sport | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 20A - Salle de sport | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 23 - Stockage | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 24 - Cafétéria | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 25 - Centrale traitement d'air | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 26 - Vestiaire | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 27 - Chaufferie | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 27A - SAS | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 28 - Vestiaire | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-167 | | RDC - 29 - Local Technique | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 30 - Vestiaire | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 31 - Local Technique | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 33A - Atelier | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 33B - Atelier | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 35 - Atelier | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 41 - Atelier | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - LOG1 - Cave | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - SAS03 | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - SAS04 | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-168 | 002HM003183P56P198P230P237P240P347 | RDC - 03 - Salle de réunion | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds | Panneaux et plaques | Panneaux et plaques | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 04 - Local de service | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds | Panneaux et plaques | Panneaux et plaques | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 06 - Accueil | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds | Panneaux et plaques | Panneaux et plaques | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 08 - Local de service | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds | Panneaux et plaques | Panneaux et plaques | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-168 | | RDC - 14A - Salle de sport | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds | Panneaux et plaques | Panneaux et plaques | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 17 - Salle de sport | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds | Panneaux et plaques | Panneaux et plaques | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 18 - Salle de sport | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds | Panneaux et plaques | Panneaux et plaques | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 19 - Salle de sport | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds | Panneaux et plaques | Panneaux et plaques | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 20A - Salle de sport | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds | Panneaux et plaques | Panneaux et plaques | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 20B - Stockage | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds | Panneaux et plaques | Panneaux et plaques | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 21 - Salle de sport | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds | Panneaux et plaques | Panneaux et plaques | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 22 - Stockage | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds | Panneaux et plaques | Panneaux et plaques | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 24 - Cafétéria | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds | Panneaux et plaques | Panneaux et plaques | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 26 - Vestiaire | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds | Panneaux et plaques | Panneaux et plaques | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 42 - Guichet | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds | Panneaux et plaques | Panneaux et plaques | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG1 | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds | Panneaux et plaques | Panneaux et plaques | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG2 | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds | Panneaux et plaques | Panneaux et plaques | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG3 | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds | Panneaux et plaques | Panneaux et plaques | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-168 | | RDC - DG4 | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds | Panneaux et plaques | Panneaux et plaques | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - Minitels - Guichet | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds | Panneaux et plaques | Panneaux et plaques | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - STO02 - Cafétéria | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds | Panneaux et plaques | Panneaux et plaques | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - WC1 | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds | Panneaux et plaques | Panneaux et plaques | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - WC2 | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds | Panneaux et plaques | Panneaux et plaques | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - WC4 | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds | Panneaux et plaques | Panneaux et plaques | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-169 | 002HM0031 83P103 | RDC - 38 - Bureau | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Panneaux collés vissés ou cloués | Panneaux collés vissés ou cloués | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-170 | 002HM0031 83P132P239 | RDC - 01 - Stockage | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 01A - Stockage | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 02I - SAS | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 03 - Salle de réunion | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 04 - Local de service | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 05 - Bureau | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 06 - Accueil | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-170 | | RDC - 08 - Local de service | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 09 - Atelier | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 10 - Stockage | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 11 - Atelier | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 12 - Stockage | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 13 - Vestaire | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 13A - SAS | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 13B - Vestiaire | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 14A - Salle de sport | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 17 - Salle de sport | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 19 - Salle de sport | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 20A - Salle de sport | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 23 - Stockage | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 27 - Chaufferie | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-170 | | RDC - 27A - SAS | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG1 | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG2 | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - Minitels - Guichet | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - SAS02 - Atelier | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - STO02 - Cafétéria | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - WC2 | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - WC4 | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Flocage | Flocage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-171 | 002HM0031 83P399P425 P440 | RDC - 14A - Salle de sport | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 15 - Annexe Sport | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 17 - Salle de sport | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-171 | | RDC - 18 - Salle de sport | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG2 | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-172 | 002HM0031 83P436P437 | RDC - 15 - Annexe Sport | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de plâtre projeté | Enduit à base de plâtre projeté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-173 | 002HM0031 83P90P95 | R+1 - LOG1 - Chambre | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - LOG2 - Chambre | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - LOG3 - Salle de bain | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - LOG4 - Dégagement | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - LOG5 - Séjour | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - LOG6 - Dégagement | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - LOG7 - Cuisine | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - LOG8 - WC | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-174 | 002HM0031 83P96 | R+1 - LOG7 - Cuisine | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Gaines et coffres horizontaux | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement de plaque de plâtre cartonné | Couche1: Bandes calicot + Couche2: Enduit de jointoiement de plaque de plâtre cartonné | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-175 | 002HM0031 83P367P405 P409P412 | R+1 - 100 - Salle de sport | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 109 - Stockage | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 109A - Stockage | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 111 - Salle de sport | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 112 - Salle de sport | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - DG01 | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-176 | 002HM0031 83P368P384 | R+1 - 100 - Salle de sport | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes | Peinture | Peinture | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 109 - Stockage | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes | Peinture | Peinture | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 111 - Salle de sport | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes | Peinture | Peinture | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 112 - Salle de sport | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes | Peinture | Peinture | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - DG01 | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes | Peinture | Peinture | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-177 | 002HM0031 83S478 | R+1 - DG01 | | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds | Panneaux et plaques | Panneaux et plaques | Absence d'amiante (Absence d'amiante par nature ( > 1997)) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-178 | 002HM003183P16P39P40P41P48P83P99P109P118P236P305P317P318P345P357P358P426P428P429P463 | RDC - 03 - Salle de réunion | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 04 - Local de service | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 06 - Accueil | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 08 - Local de service | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 14A - Salle de sport | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 17 - Salle de sport | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-178 | | RDC - 18 - Salle de sport | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 19 - Salle de sport | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 19A - Stockage | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 20A - Salle de sport | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 20B - Stockage | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 22 - Stockage | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-178 | | RDC - 24 - Cafétéria | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 26 - Vestiaire | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 28 - Vestiaire | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 30 - Vestiaire | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 33A - Atelier | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 34 - Bureau | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-178 | | RDC - 35 - Atelier | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 38 - Bureau | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 41 - Atelier | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - LOG1 - Cave | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - SAS04 | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-179 | 002HM0031 83P108P136 P202 | RDC - 24 - Cafétéria | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse | Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 27A - SAS | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse | Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 30 - Vestiaire | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse | Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-179 | | RDC - 32 - Secrétariat | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse | Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 38 - Bureau | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse | Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG4 | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse | Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - SAS04 | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse | Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-180 | 002HM003183P80P122P123P124P125P137P138P252P274P292P299P348P376P434P435 | RDC - 01 - Stockage | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith...) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 01A - Stockage | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith...) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 10 - Stockage | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith...) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 12 - Stockage | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith...) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 14A - Salle de sport | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith...) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 15 - Annexe Sport | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith...) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 19 - Salle de sport | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith...) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 23 - Stockage | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith...) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 25 - Centrale traitement d'air | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith...) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 27 - Chaufferie | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith...) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-180 | | RDC - 27A - SAS | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith…) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 29 - Local Technique | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith…) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 31 - Local Technique | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith…) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 42 - Guichet | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith…) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - LOG1 - Cave | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith…) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - LT01 - Local technique | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith…) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-181 | 002HM0031 83P243 | RDC - WC1 | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | - | Enduit de rebouchage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-182 | 002HM0031 83P88 | R+1 - LOG1 - Chambre | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - LOG2 - Chambre | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - LOG4 - Dégagement | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-183 | 002HM003183P97P362P376P406P410 | R+1 - 100 - Salle de sport | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith...) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 109 - Stockage | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith...) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 110 - Stockage | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith...) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 111 - Salle de sport | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith...) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 112 - Salle de sport | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith...) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - LOG6 - Dégagement | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith...) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-184 | 002HM003183P363 | R+1 - 100 - Salle de sport | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de barre de seuil | Colle de barre de seuil | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 112 - Salle de sport | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de barre de seuil | Colle de barre de seuil | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-185 | 002HM003183P385P387 | R+1 - DG01 | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-186 | 002HM003183P397 | R+1 - DG01 | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Bande podotactile | Bande podotactile | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-187 | 002HM003183P398 | R+1 - DG01 | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Nez de marche | Nez de marche | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-188 | 002HM003183P441 | R+2 - 205 - Stockage | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Ragréage | Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-189 | 002HM003183P442 | R+2 - 204 - Machinerie | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith...) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+2 - 205 - Stockage | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith...) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-189 | | R+2 - LTE01 - Centrale traitement d'air | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith…) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+2 - LTE02 - Local Technique | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith…) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | Etage Machinerie - ESC R+machinerie | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith…) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | Etage Machinerie - LTE01 - Local Technique R+machinerie | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment (terrazolith…) | Sol coulé à base ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-190 | 002HM003183P216P219P224P228P250P306P331P339P342P382P400 | RDC - 02 - Vestiaire | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 02A | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 02B | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 02C | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 02D | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 02E | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 02F | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 02I - SAS | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 04 - Local de service | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 08 - Local de service | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-190 | | RDC - 13 - Vestaire | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 13A - SAS | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 37 - Sanitaires | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 42 - Guichet | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG1 | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG2 | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG3 | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - Minitels - Guichet | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - WC handicapés | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - WC1 | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - WC2 | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - WC4 | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage | Colle de carrelage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-191 | 002HM0031 83P58P81P8 2P235 | RDC - 03 - Salle de réunion | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle non bitumineuse | Colle non bitumineuse | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 21 - Salle de sport | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle non bitumineuse | Colle non bitumineuse | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-191 | | RDC - LOG1 - Cave | | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle non bitumineuse | Colle non bitumineuse | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-192 | 002HM003183P19P50P226P307P328P329P337P383 | RDC - 02 - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 02A | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 02B | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 02C | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 02D | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 02E | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 02F | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 02I - SAS | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 08 - Local de service | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 13 - Vestaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-192 | | RDC - 13A - SAS | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 13B - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 26 - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 28 - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 33A - Atelier | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 37 - Sanitaires | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - WC handicapés | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - WC1 | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-193 | 002HM0031 83P208P217 P218P251P3 30P336P386 | RDC - 02 - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de carrelage | Colle de plinthe | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 02A | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de carrelage | Colle de plinthe | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 02B | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de carrelage | Colle de plinthe | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-193 | | RDC - 02C | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de carrelage | Colle de plinthe | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 02D | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de carrelage | Colle de plinthe | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 02E | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de carrelage | Colle de plinthe | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 02F | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de carrelage | Colle de plinthe | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 02I - SAS | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de carrelage | Colle de plinthe | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 13 - Vestaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de carrelage | Colle de plinthe | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 13A - SAS | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de carrelage | Colle de plinthe | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 13B - Vestiaire | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de carrelage | Colle de plinthe | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 37 - Sanitaires | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de carrelage | Colle de plinthe | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 42 - Guichet | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de carrelage | Colle de plinthe | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG1 | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de carrelage | Colle de plinthe | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-193 | | RDC - DG2 | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de carrelage | Colle de plinthe | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG3 | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de carrelage | Colle de plinthe | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - Minitels - Guichet | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de carrelage | Colle de plinthe | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-194 | 002HM0031 83P84P253 | RDC - 42 - Guichet | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Plinthe | Plinthe | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - LOG1 - Cave | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Plinthe | Plinthe | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-195 | 002HM0031 83P346P464 | RDC - 19 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de plinthe | Colle de plinthe | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 14A - Salle de sport; RDC - 23 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de plinthe | Colle de plinthe | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-196 | 002HM0031 83P352 | RDC - 19 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Plinthe ciment | Plinthe ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 23 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Plinthe ciment | Plinthe ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - LT01 - Local technique | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Plinthe ciment | Plinthe ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-197 | 002HM0031 83P355P361 | RDC - 19 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle | Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-197 | | RDC - 20A - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle | Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-198 | 002HM0031 83P359 | RDC - 20A - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Peinture de plinthe | Peinture de plinthe | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-199 | 002HM0031 83P394 | R+1 - LOG3 - Salle de bain | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - LOG7 - Cuisine | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - LOG8 - WC | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence | Colle de faïence | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-200 | 002HM0031 83P366 | R+1 - 100 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Plinthe ciment | Plinthe ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 109 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Plinthe ciment | Plinthe ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 110 - Stockage | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Plinthe ciment | Plinthe ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 111 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Plinthe ciment | Plinthe ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 112 - Salle de sport | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Plinthe ciment | Plinthe ciment | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-201 | 002HM0031 83P386P388 P395 | RDC - ES1 | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de carrelage | Colle de plinthe | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-201 | | R+1 - ASC1 - R+1 | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de carrelage | Colle de plinthe | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - DG01 | | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de carrelage | Colle de plinthe | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-202 | 002HM003183P9 | RDC - 33A - Atelier | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint sur support | Joint sur support | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 33B - Atelier | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint sur support | Joint sur support | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-203 | 002HM003183P15P27P32P33P62P241P247P288P291P296 | RDC - 01 - Stockage | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint entre éléments | Joint entre éléments | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 03 - Salle de réunion | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint entre éléments | Joint entre éléments | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 09 - Atelier | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint entre éléments | Joint entre éléments | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 12 - Stockage | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint entre éléments | Joint entre éléments | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 21 - Salle de sport | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint entre éléments | Joint entre éléments | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-203 | | RDC - 24 - Cafétéria | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint entre éléments | Joint entre éléments | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 26 - Vestiaire | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint entre éléments | Joint entre éléments | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 28 - Vestiaire | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint entre éléments | Joint entre éléments | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 41 - Atelier | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint entre éléments | Joint entre éléments | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG4 | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint entre éléments | Joint entre éléments | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - SAS02 - Atelier | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint entre éléments | Joint entre éléments | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - WC2 | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint entre éléments | Joint entre éléments | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - WC4 | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint entre éléments | Joint entre éléments | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-204 | 002HM0031 83P25P85 | RDC - 28 - Vestiaire | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Habillage plâtre | Habillage plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - LOG1 - Cave | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Habillage plâtre | Habillage plâtre | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-205 | 002HM0031 83P28P380 | RDC - 28 - Vestiaire | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Tresses | Tresses | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - LT01 - Local technique | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Tresses | Tresses | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-206 | 002HM0031 83P28P380 | RDC - 01 - Stockage | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Manchon | Manchon | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 01A - Stockage | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Manchon | Manchon | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 21 - Salle de sport | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Manchon | Manchon | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-207 | 002HM0031 83P130 | RDC - 27 - Chaufferie | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Conduit | Conduit | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-208 | 002HM003183P148P149P150P151P152P153P164P165P166P167P187P188P197P205P206P210P332P424 | RDC - 02I - SAS | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 04 - Local de service | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 05 - Bureau | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 06 - Accueil | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 13A - SAS | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 13B - Vestiaire | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 14A - Salle de sport | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-208 | | RDC - 18 - Salle de sport | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 25 - Centrale traitement d'air | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 27 - Chaufferie | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 29 - Local Technique | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG2 | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG3 | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG4 | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-208 | | RDC - Minitels - Guichet | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Couche1: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) + Couche2: Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-209 | 002HM003183 | RDC - 08 - Local de service | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint plat prédécoupé pour brides | Joint plat prédécoupé pour brides | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 25 - Centrale traitement d'air | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint plat prédécoupé pour brides | Joint plat prédécoupé pour brides | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 27 - Chaufferie | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint plat prédécoupé pour brides | Joint plat prédécoupé pour brides | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 29 - Local Technique | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint plat prédécoupé pour brides | Joint plat prédécoupé pour brides | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG2 | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint plat prédécoupé pour brides | Joint plat prédécoupé pour brides | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-210 | 002HM003183P156P157P158P159P160P174P175P176P177P178P179P180P181P182P183P185P186P189P255P311 | RDC - 08 - Local de service | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint plat prédécoupé pour brides | Joint plat prédécoupé pour brides | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 25 - Centrale traitement d'air | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint plat prédécoupé pour brides | Joint plat prédécoupé pour brides | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-210 | | RDC - 27 - Chaufferie | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint plat prédécoupé pour brides | Joint plat prédécoupé pour brides | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 29 - Local Technique | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint plat prédécoupé pour brides | Joint plat prédécoupé pour brides | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG2 | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint plat prédécoupé pour brides | Joint plat prédécoupé pour brides | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-211 | 002HM003183P245P287 | RDC - 01 - Stockage | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Carton | Carton | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 01A - Stockage | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Carton | Carton | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG4 | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Carton | Carton | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-212 | 002HM003183P256P289P290P303P304 | RDC - 01 - Stockage | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduit air | Mastics | Mastics | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 01A - Stockage | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduit air | Mastics | Mastics | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 09 - Atelier | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduit air | Mastics | Mastics | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 12 - Stockage | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduit air | Mastics | Mastics | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-212 | | RDC - DG2 | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduit air | Mastics | Mastics | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - SAS02 - Atelier | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduit air | Mastics | Mastics | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-213 | 002HM0031 83P446 | R+2 - 205 - Stockage | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+2 - LTE01 - Centrale traitement d'air | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+2 - LTE02 - Local Technique | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Enveloppe (bande tissée enduite ou non) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-214 | 002HM0031 83P447P448 P449P450 | R+2 - 205 - Stockage | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) | Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+2 - LTE01 - Centrale traitement d'air | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) | Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+2 - LTE02 - Local Technique | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) | Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-215 | 002HM0031 83P451 | R+2 - 205 - Stockage | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint entre éléments | Joint entre éléments | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-215 | | R+2 - LTE01 - Centrale traitement d'air | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint entre éléments | Joint entre éléments | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-216 | 002HM003183P452 | R+2 - 205 - Stockage | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint plat prédécoupé pour brides | Joint plat prédécoupé pour brides | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+2 - LTE02 - Local Technique | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint plat prédécoupé pour brides | Joint plat prédécoupé pour brides | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-217 | 002HM003183P453 | R+2 - LTE02 - Local Technique | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Tresse | Tresse | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-218 | 002HM003183P458 | Toiture - TER02 - Terrasse | | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint plat prédécoupé pour brides | Joint plat prédécoupé pour brides | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-219 | 002HM003183P13P55P66P117P134P154P161P162P168P169P170P171P172P190P200P244P278P316 | RDC - 01 - Stockage | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Tresses | Tresses | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 01A - Stockage | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Tresses | Tresses | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 04 - Local de service | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Tresses | Tresses | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 09 - Atelier | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Tresses | Tresses | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 12 - Stockage | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Tresses | Tresses | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 20A - Salle de sport | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Tresses | Tresses | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-219 | | RDC - 21 - Salle de sport | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Tresses | Tresses | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 24 - Cafétéria | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Tresses | Tresses | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 25 - Centrale traitement d'air | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Tresses | Tresses | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 26 - Vestiaire | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Tresses | Tresses | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 27 - Chaufferie | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Tresses | Tresses | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 27A - SAS | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Tresses | Tresses | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 28 - Vestiaire | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Tresses | Tresses | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 29 - Local Technique | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Tresses | Tresses | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 30 - Vestiaire | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Tresses | Tresses | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 32 - Secrétariat | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Tresses | Tresses | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 33A - Atelier | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Tresses | Tresses | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 33B - Atelier | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Tresses | Tresses | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 34 - Bureau | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Tresses | Tresses | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 35 - Atelier | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Tresses | Tresses | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-219 | | RDC - 38 - Bureau | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Tresses | Tresses | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 41 - Atelier | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Tresses | Tresses | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG1 | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Tresses | Tresses | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG2 | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Tresses | Tresses | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG4 | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Tresses | Tresses | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - SAS02 - Atelier | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Tresses | Tresses | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - SAS03 | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Tresses | Tresses | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - WC1 | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Tresses | Tresses | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-220 | 002HM003183P14P67P279 | RDC - 01 - Stockage | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Peinture anti-condensation | Peinture anti-condensation | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 01A - Stockage | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Peinture anti-condensation | Peinture anti-condensation | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 09 - Atelier | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Peinture anti-condensation | Peinture anti-condensation | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 12 - Stockage | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Peinture anti-condensation | Peinture anti-condensation | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 20A - Salle de sport | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Peinture anti-condensation | Peinture anti-condensation | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 21 - Salle de sport | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Peinture anti-condensation | Peinture anti-condensation | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-220 | | RDC - 24 - Cafétéria | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Peinture anti-condensation | Peinture anti-condensation | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 26 - Vestiaire | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Peinture anti-condensation | Peinture anti-condensation | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 28 - Vestiaire | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Peinture anti-condensation | Peinture anti-condensation | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 33A - Atelier | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Peinture anti-condensation | Peinture anti-condensation | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 34 - Bureau | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Peinture anti-condensation | Peinture anti-condensation | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 35 - Atelier | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Peinture anti-condensation | Peinture anti-condensation | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 38 - Bureau | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Peinture anti-condensation | Peinture anti-condensation | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 41 - Atelier | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Peinture anti-condensation | Peinture anti-condensation | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - SAS02 - Atelier | | 8 - Équipements divers et accessoires - Radiateurs | Peinture anti-condensation | Peinture anti-condensation | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-221 | 002HM003183P44 | RDC - 24 - Cafétéria | | 8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques | Plaques souples bitumineuses antivibratiles | Plaques souples bitumineuses antivibratiles | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - WC1 | | 8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques | Plaques souples bitumineuses antivibratiles | Plaques souples bitumineuses antivibratiles | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-222 | 002HM003183P37P71P76P114P269P284P334 | RDC - 01 - Stockage | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 01A - Stockage | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 02 - Vestiaire | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-222 | | RDC - 02I - SAS | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 08 - Local de service | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 09 - Atelier | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 11 - Atelier | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 12 - Stockage | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 13 - Vestaire | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 13A - SAS | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 13B - Vestiaire | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 18 - Salle de sport | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 21 - Salle de sport | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 24 - Cafétéria | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 26 - Vestiaire | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 28 - Vestiaire | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 30 - Vestiaire | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-222 | | RDC - 32 - Secrétariat | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 34 - Bureau | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 38 - Bureau | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG1 | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - SAS02 - Atelier | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-223 | 002HM003183P73P147P195P268P333 | RDC - 02 - Vestiaire | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) | Joint de mastic de vitrage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 02I - SAS | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) | Joint de mastic de vitrage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 13 - Vestaire | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) | Joint de mastic de vitrage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 13A - SAS | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) | Joint de mastic de vitrage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 13B - Vestiaire | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) | Joint de mastic de vitrage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 17 - Salle de sport | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) | Joint de mastic de vitrage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 18 - Salle de sport | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) | Joint de mastic de vitrage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 20A - Salle de sport | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) | Joint de mastic de vitrage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - 21 - Salle de sport | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) | Joint de mastic de vitrage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-223 | | RDC - 31 - Local Technique | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) | Joint de mastic de vitrage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG1 | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) | Joint de mastic de vitrage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | RDC - DG4 | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) | Joint de mastic de vitrage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-224 | 002HM0031 83P417P418 P372P373 | R+1 - 100 - Salle de sport | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Couche1: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) + Couche2: Joint à lèvre + Couche3: Reprise d'étanchéité | Couche1: Joint de mastic de vitrage + Couche2: Joint à lèvre + Couche3: Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 111 - Salle de sport | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Couche1: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) + Couche2: Joint à lèvre + Couche3: Reprise d'étanchéité | Couche1: Joint de mastic de vitrage + Couche2: Joint à lèvre + Couche3: Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | R+1 - 112 - Salle de sport | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Couche1: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) + Couche2: Joint à lèvre + Couche3: Reprise d'étanchéité | Couche1: Joint de mastic de vitrage + Couche2: Joint à lèvre + Couche3: Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-225 | 002HM0031 83P489 | Toiture - TER1 LGT | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Garde-corps | Mastic vitrier | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-226 | 002HM0031 83P455 | Toiture - TER02 - Terrasse | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) | Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-227 | 002HM0031 83P456P459 P460 | Toiture - TER01 - Terrasse | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) | Joint de mastic de vitrage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | Toiture - TER02 - Terrasse | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) | Joint de mastic de vitrage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| IDENTIFICATION DE LA ZPSO | N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | LOCALISATION DETAILLEE | COMPOSANT | PARTIE DE COMPOSANT | DESCRIPTION | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-227 | | Toiture - TER03 - Terrasse | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) | Joint de mastic de vitrage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-228 | 002HM0031 83P485 | FACADES | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Joint de parement | Joint de parement | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-229 | 002HM0031 83P491 | FACADES | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) | Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-230 | 002HM0031 83P484 | FACADES | | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Joint de dilatation | Joint de dilatation | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-231 | 002HM0031 83P478P488 | Toiture - TER01 - Terrasse | | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Solin | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | Toiture - TER02 - Terrasse | | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Solin | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| | | Toiture - TER03 - Terrasse | | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Solin | Reprise d'étanchéité | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

### *6.2 QUANTITATIF DE MATÉRIAUX AMIANTÉS*

Le quantitatif des matériaux amiantés ainsi que l'état de conservation se trouvent dans la conclusion en page 4

# 7. ANNEXES

## SOMMAIRE

7.1 SCHÉMA DE REPÉRAGE

7.2 REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

7.3 RAPPORT D'ESSAIS

7.4 RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

7.5 AUTRES DOCUMENTS

## *7.1 Annexe : SCHÉMA DE REPÉRAGE*


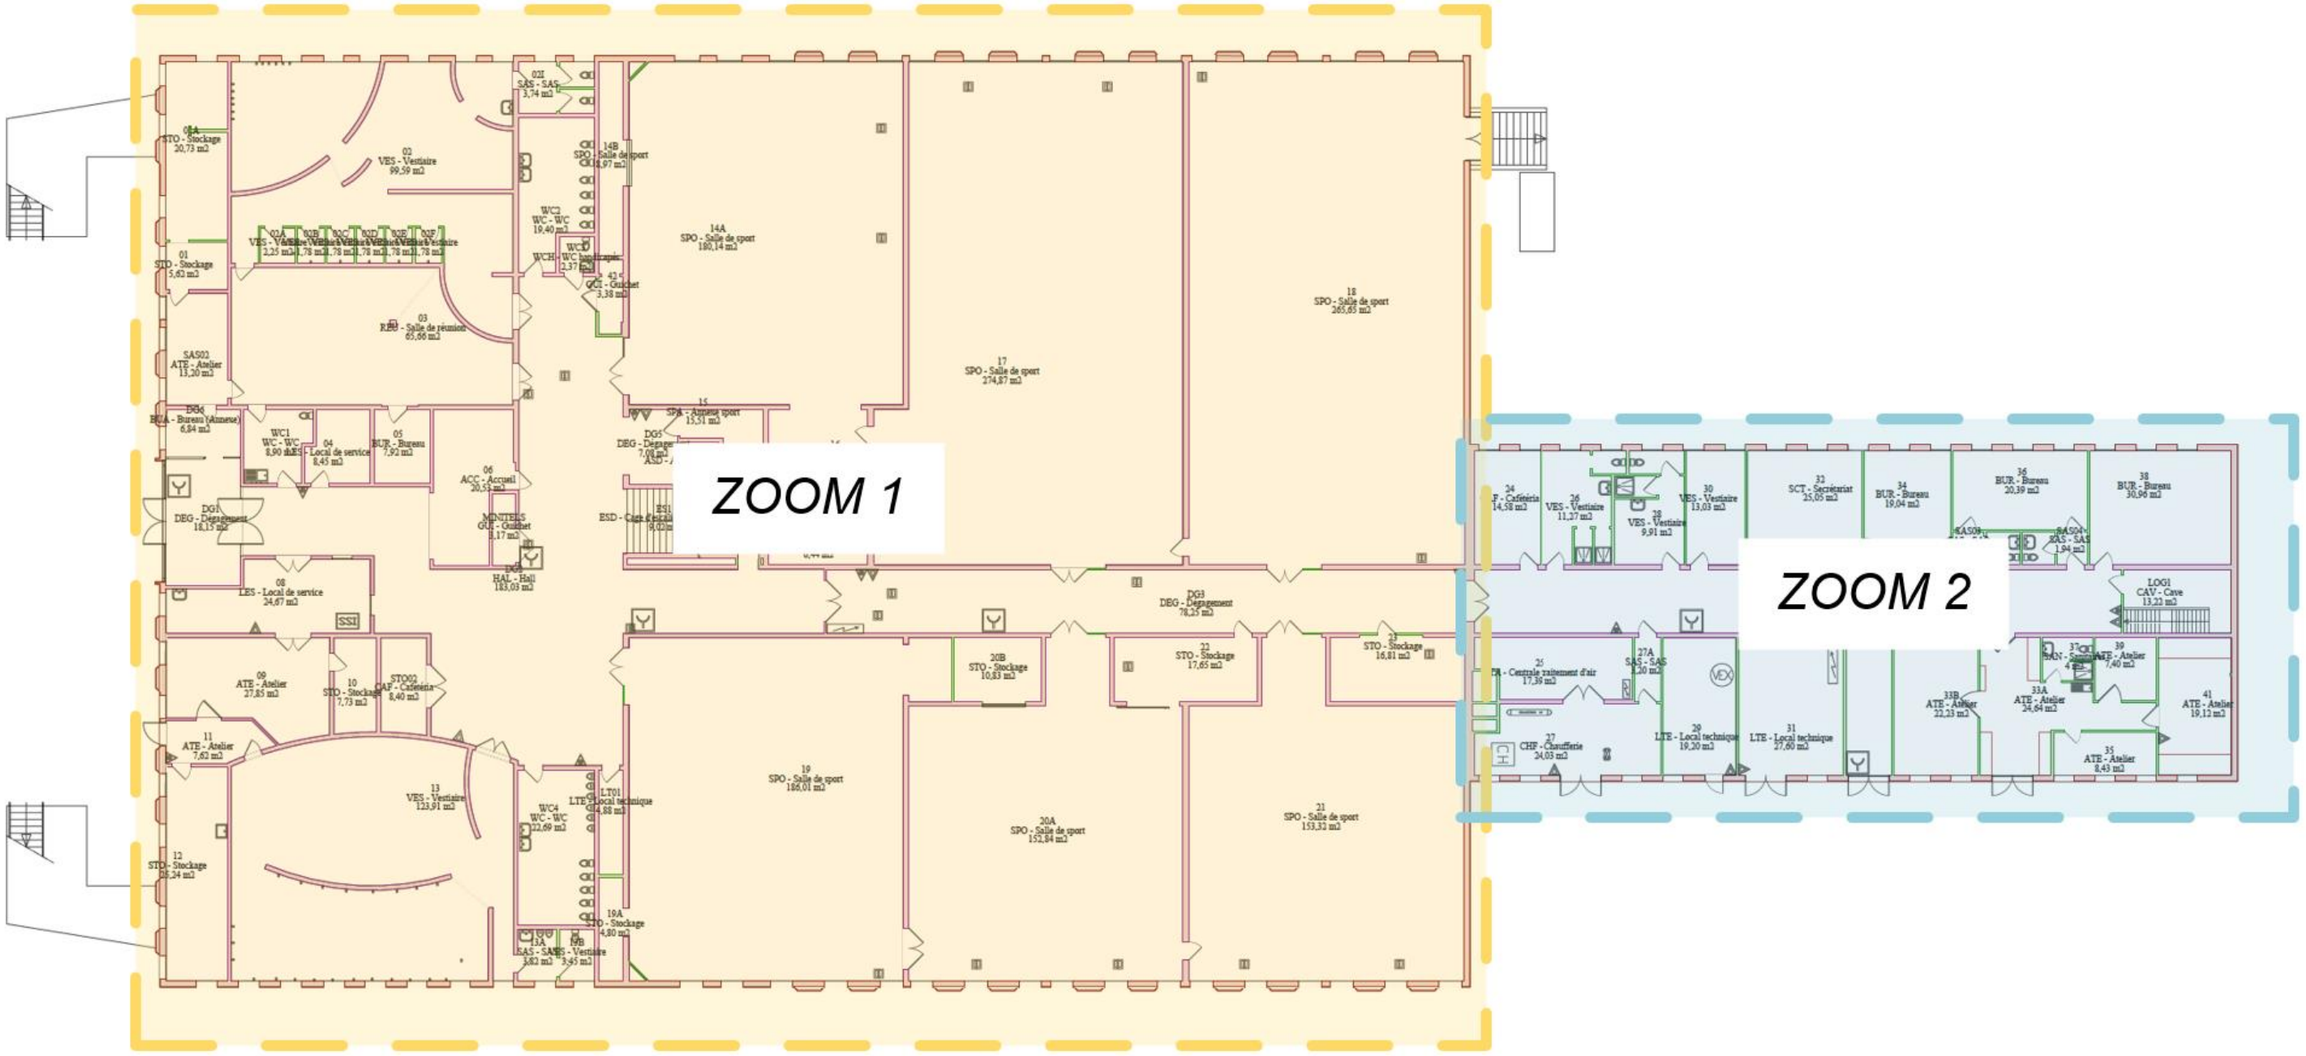




**Planche croquis de repérage technique : Identification des zooms - RDC**
**DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis**
**Dossier n° 26MHE0439 du 26/05/2026**
**Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG**

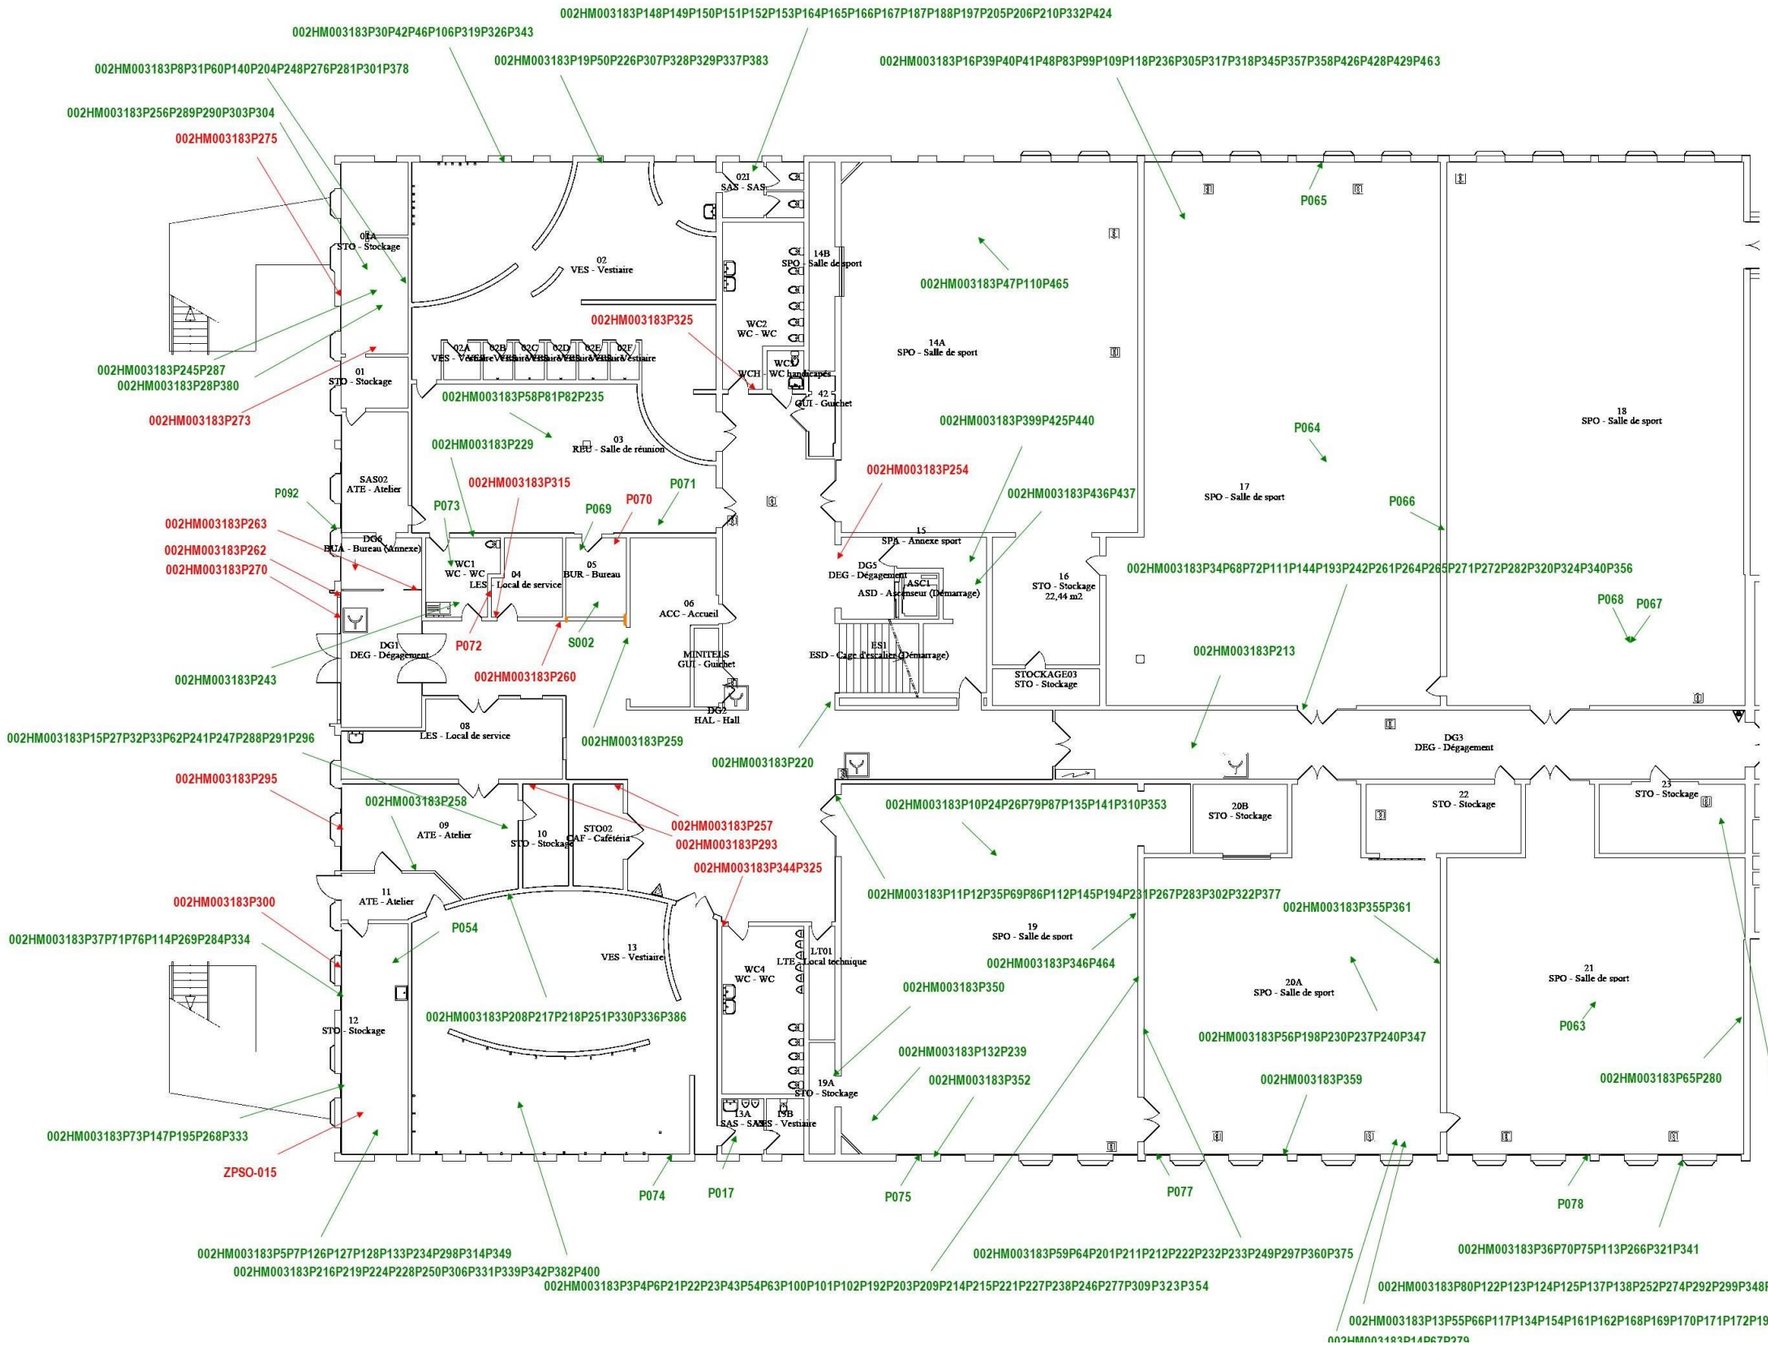


| | |
|---|---|
| P XXX → | Localisation d'un prélèvement - Négatif |
| P XXX → | Localisation d'un prélèvement - Positif |
| ZPSO - XXX → | Localisation d'une ZPSO - Négative |
| ZPSO - XXX → | Localisation d'une ZPSO - Positive |
| S XXX → | Localisation d'un sondage - Négatif |
| S XXX → | Localisation d'un sondage - Positif |

# Planche croquis de repérage technique : RDC – ZOOM1

**DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis**
**Dossier n° 26MHE0439 du 26/05/2026**
**Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG**

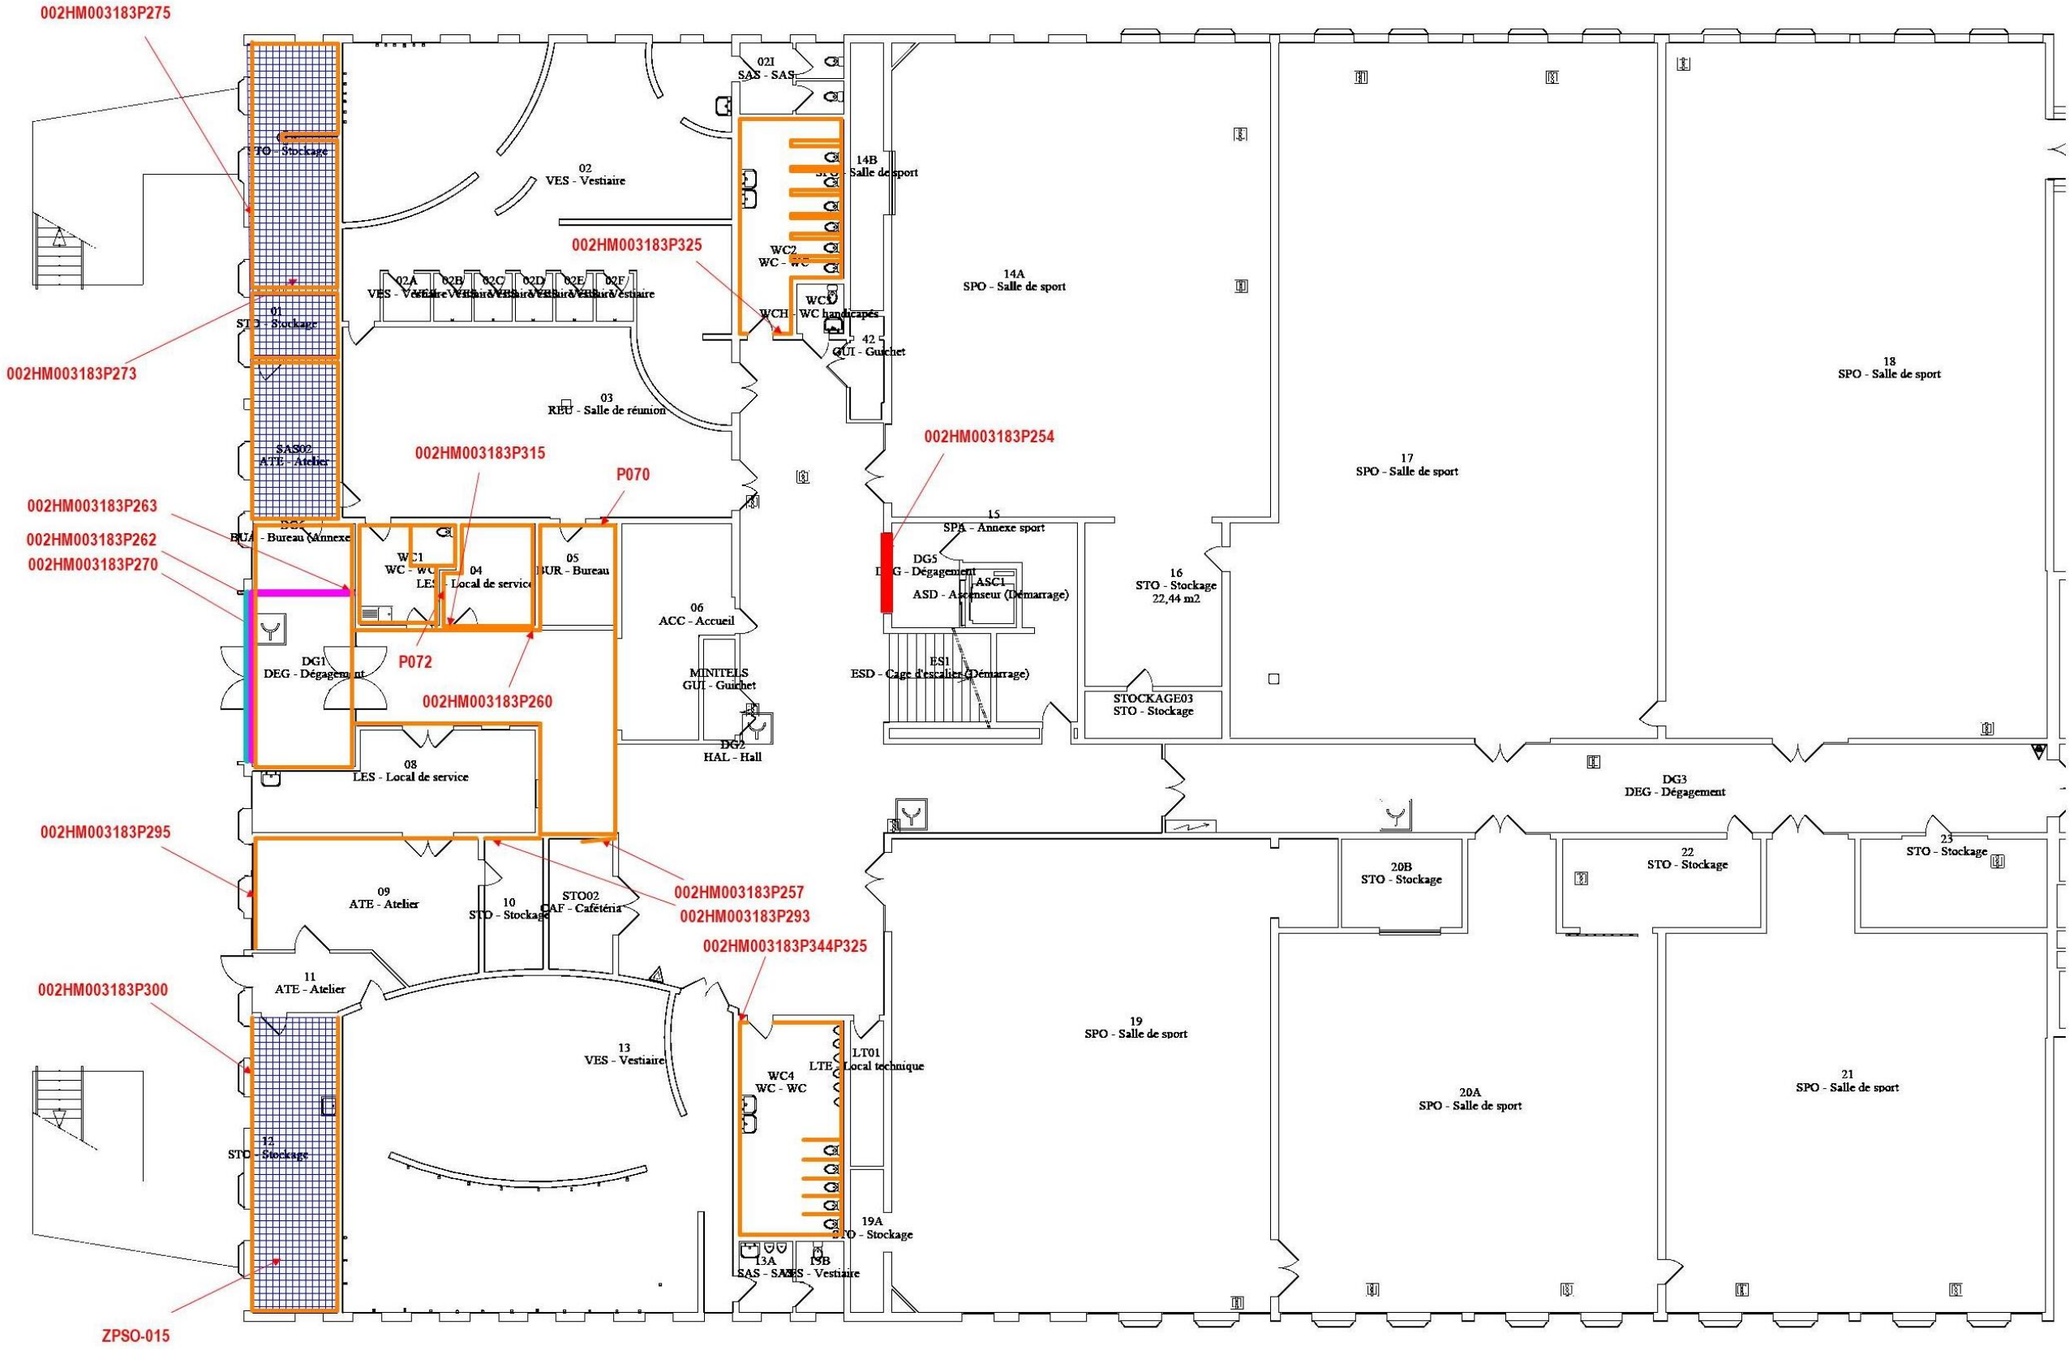



## Matériaux et Produits contenant de l'amiante : RDC – ZOOM1

**DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis**
**Dossier n° 26MHE0439 du 26/05/2026**
**Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Colle de carrelage (sol) | | Reprise d'étanchéité | | Peinture sur poutre |
| | Colle de faïence | | Joint de mastic vitrier | | |

| | |
|---|---|
| P XXX → | Localisation d'un prélèvement - Négatif |
| P XXX → | Localisation d'un prélèvement - Positif |
| ZPSO - XXX → | Localisation d'une ZPSO - Négative |
| ZPSO - XXX → | Localisation d'une ZPSO - Positive |
| S XXX → | Localisation d'un sondage - Négatif |
| S XXX → | Localisation d'un sondage - Positif |

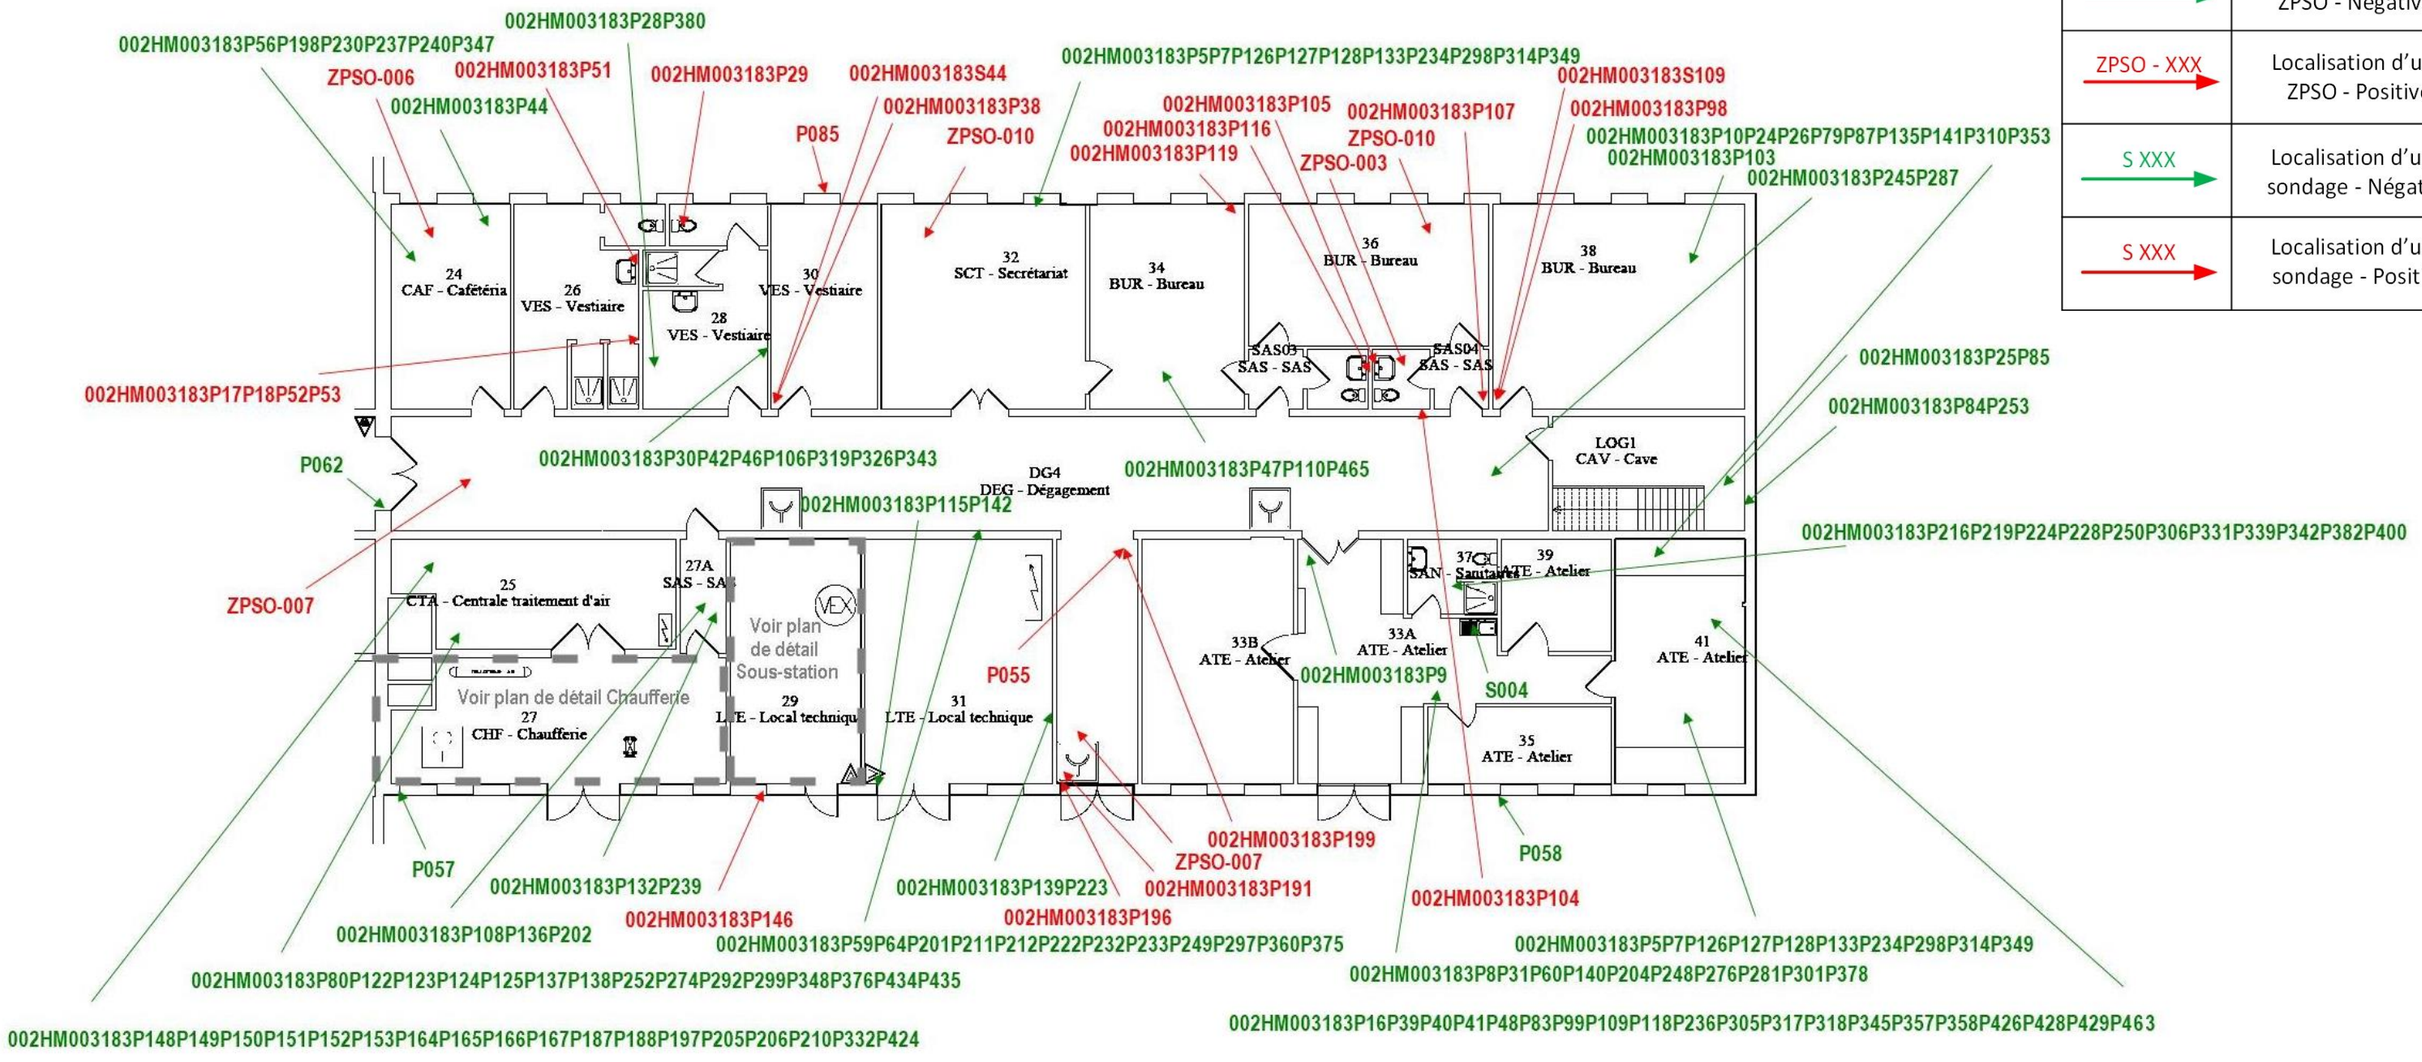


## Planche croquis de repérage technique : RDC – ZOOM2


**DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis**
**Dossier n° 26MHE0439 du 26/05/2026**
**Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG**

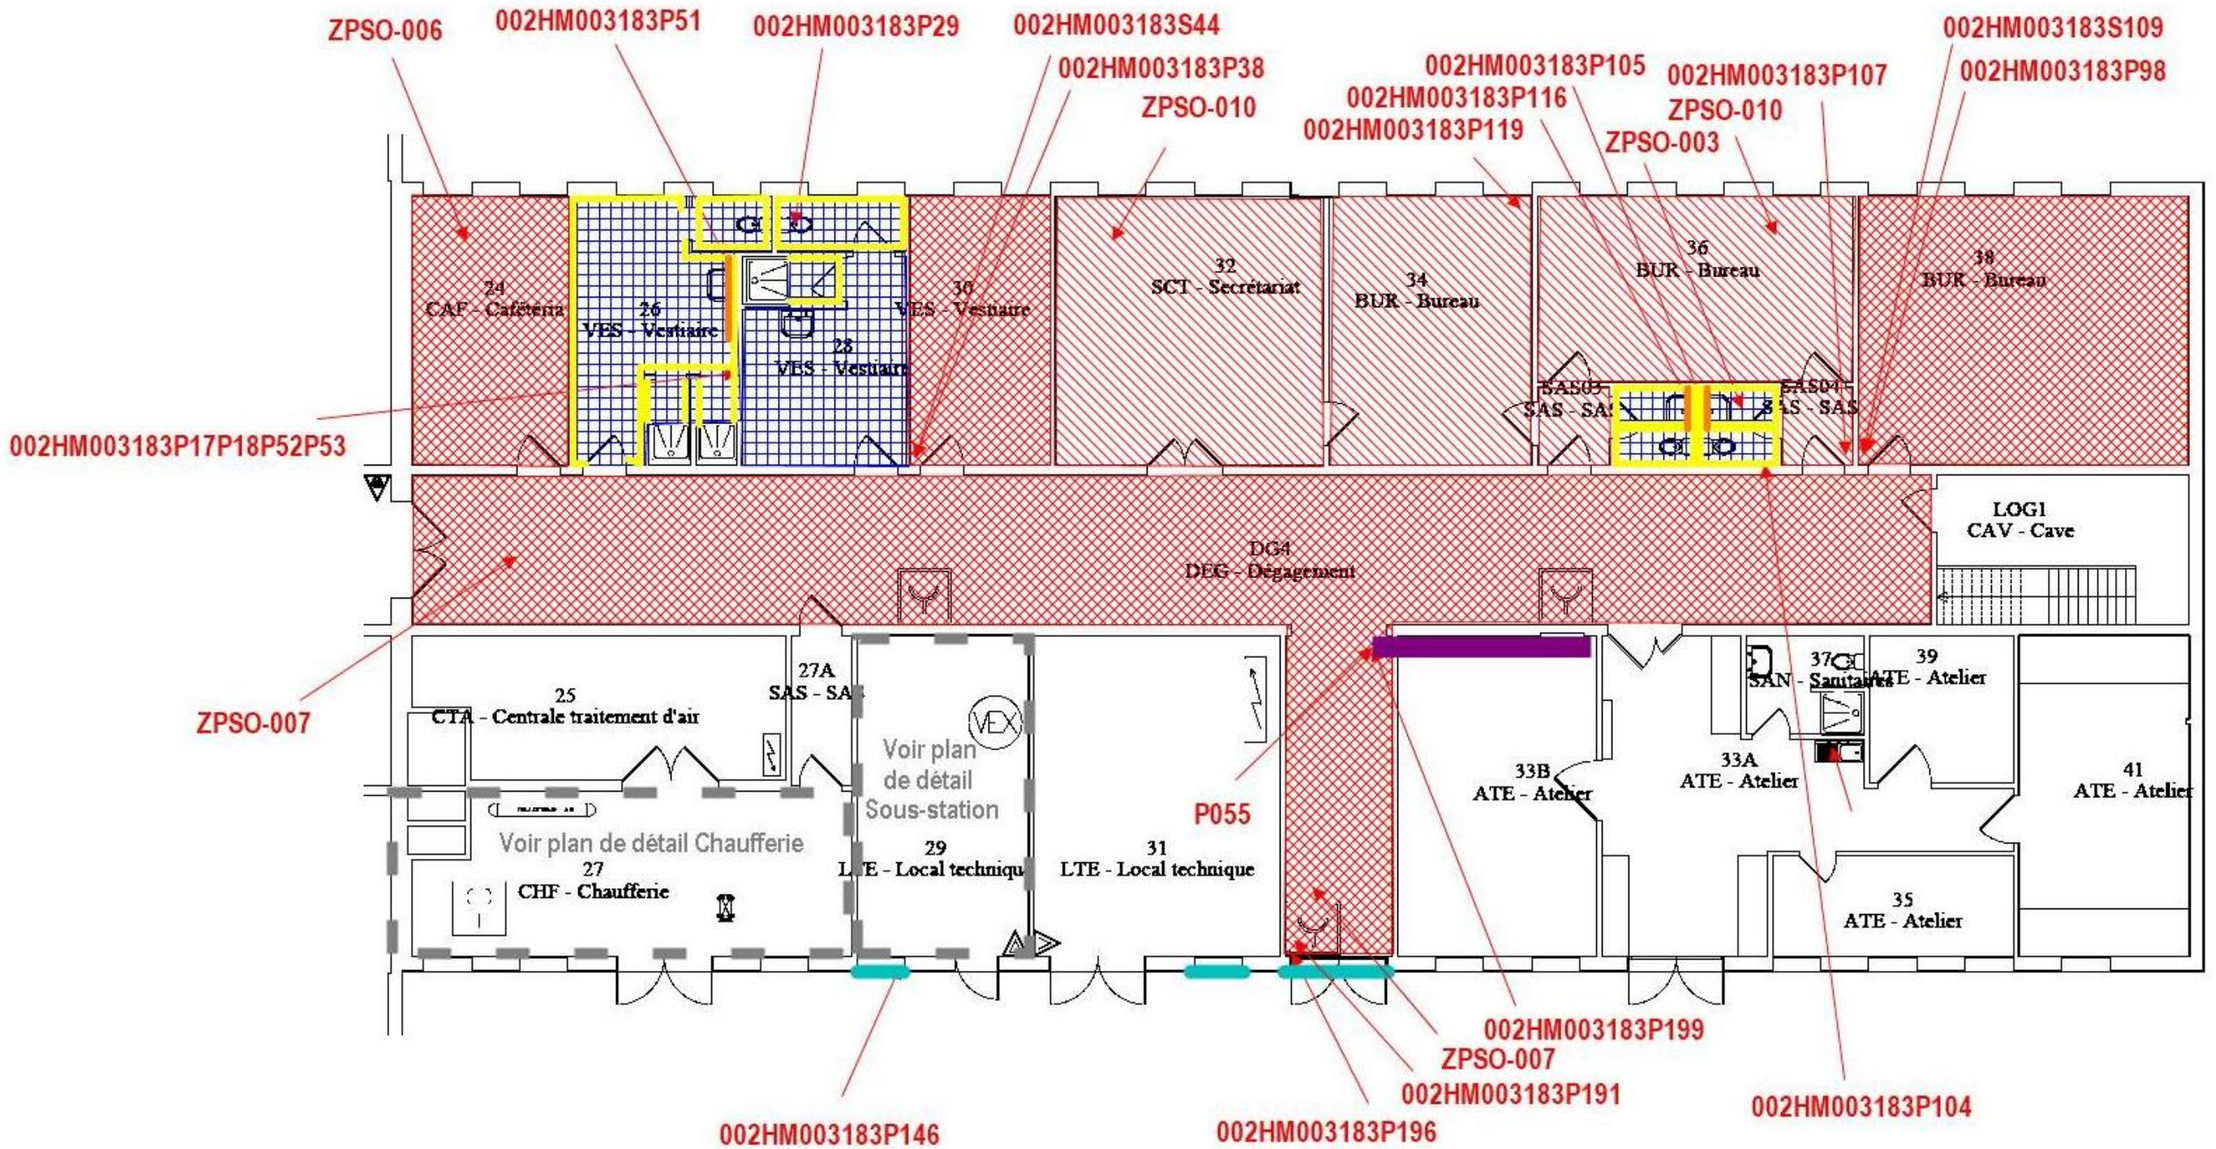


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Colle bitumineuse | | Colle de carrelage (sol) | | Colle de faïence | | Reprise d'étanchéité |
| | Dalle de sol + Colle bitumineuse | | Colle de plinthe | | Joint entre éléments (conduit air) | | |


## Matériaux et Produits contenant de l'amiante : RDC – ZOOM2

**DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis**
**Dossier n° 26MHE0439 du 26/05/2026**
**Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG**

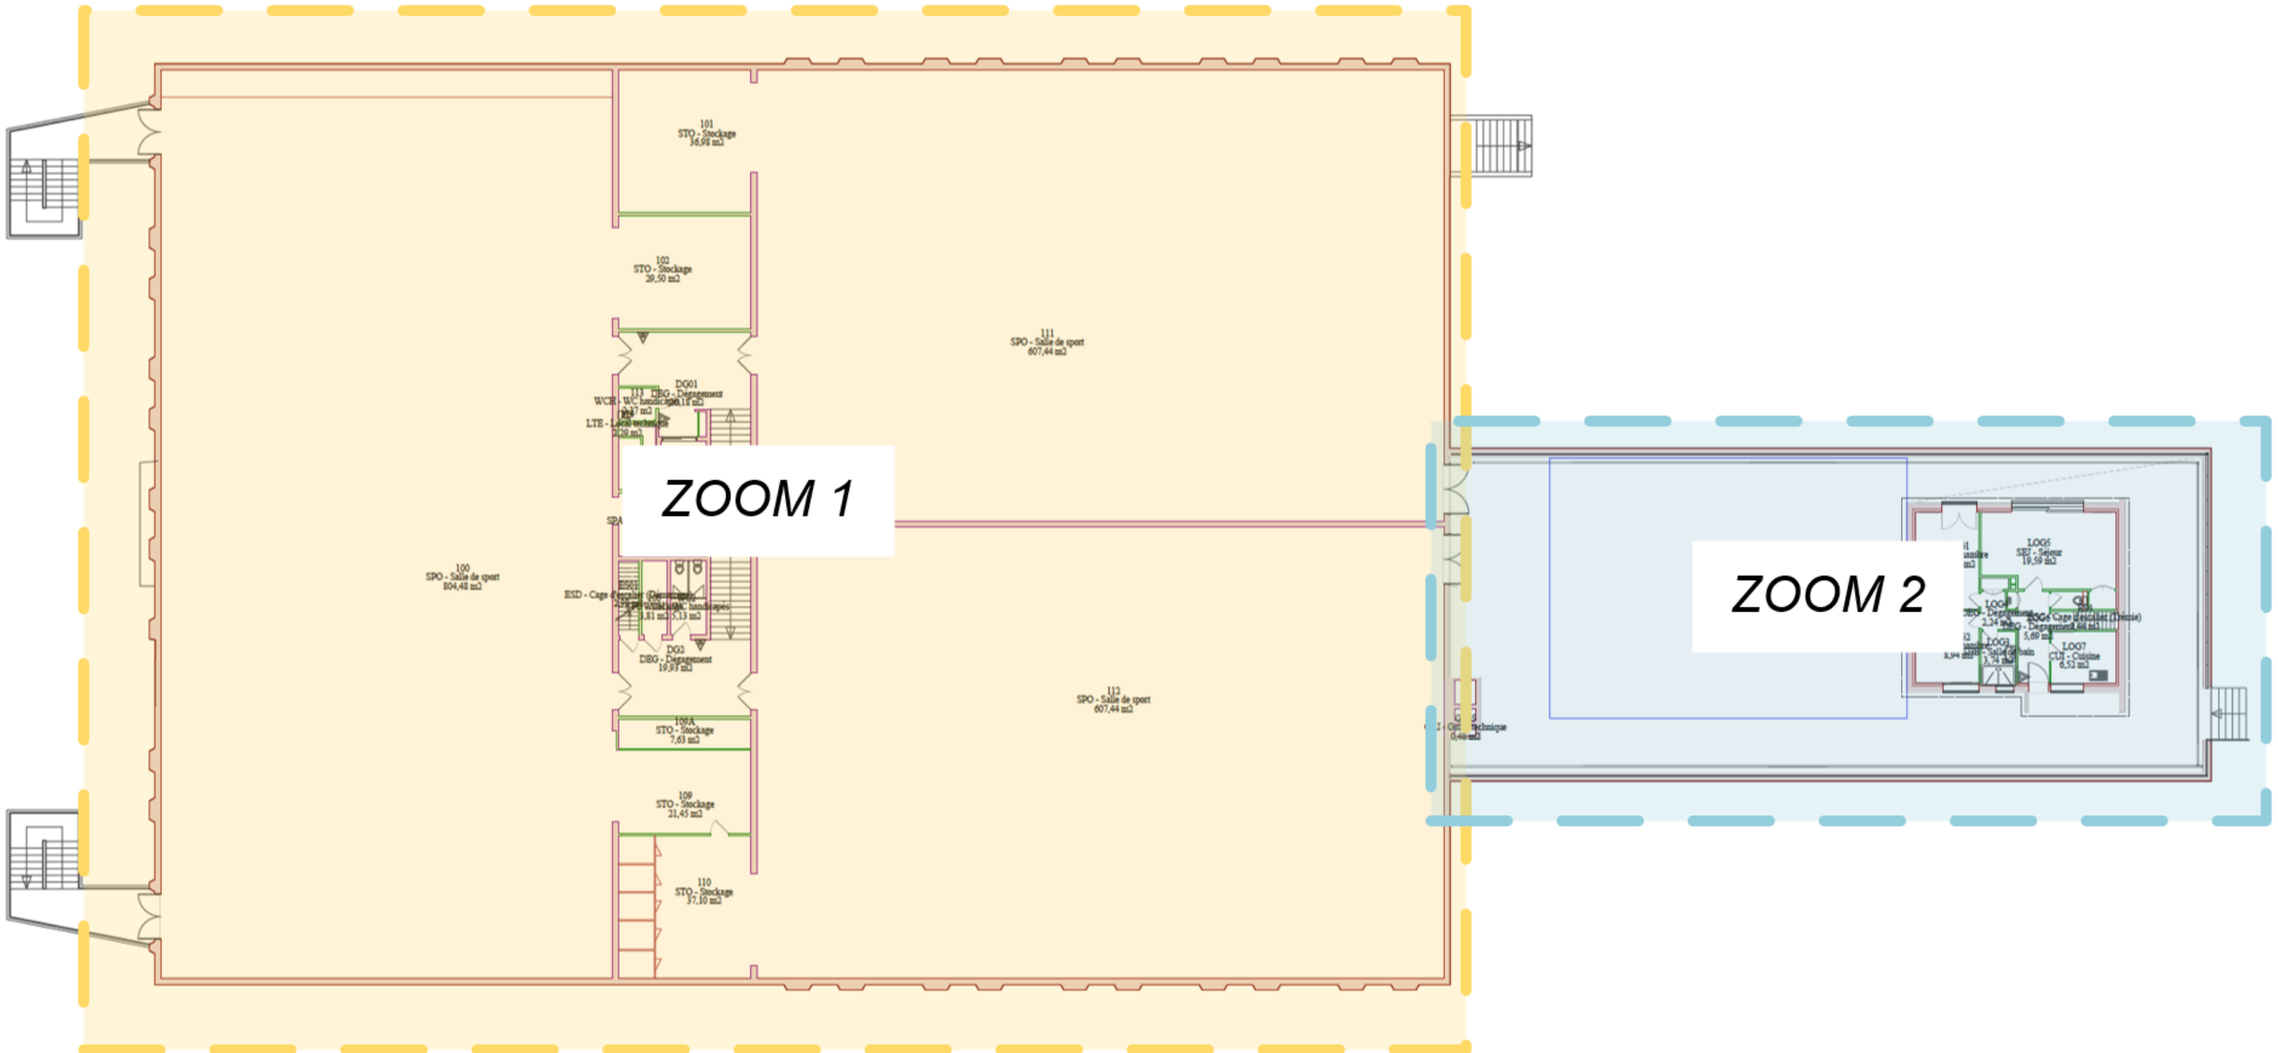



## Planche croquis de repérage technique : Identification des zooms – R+1

**DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis**
**Dossier n° 26MHE0439 du 26/05/2026**
**Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG**

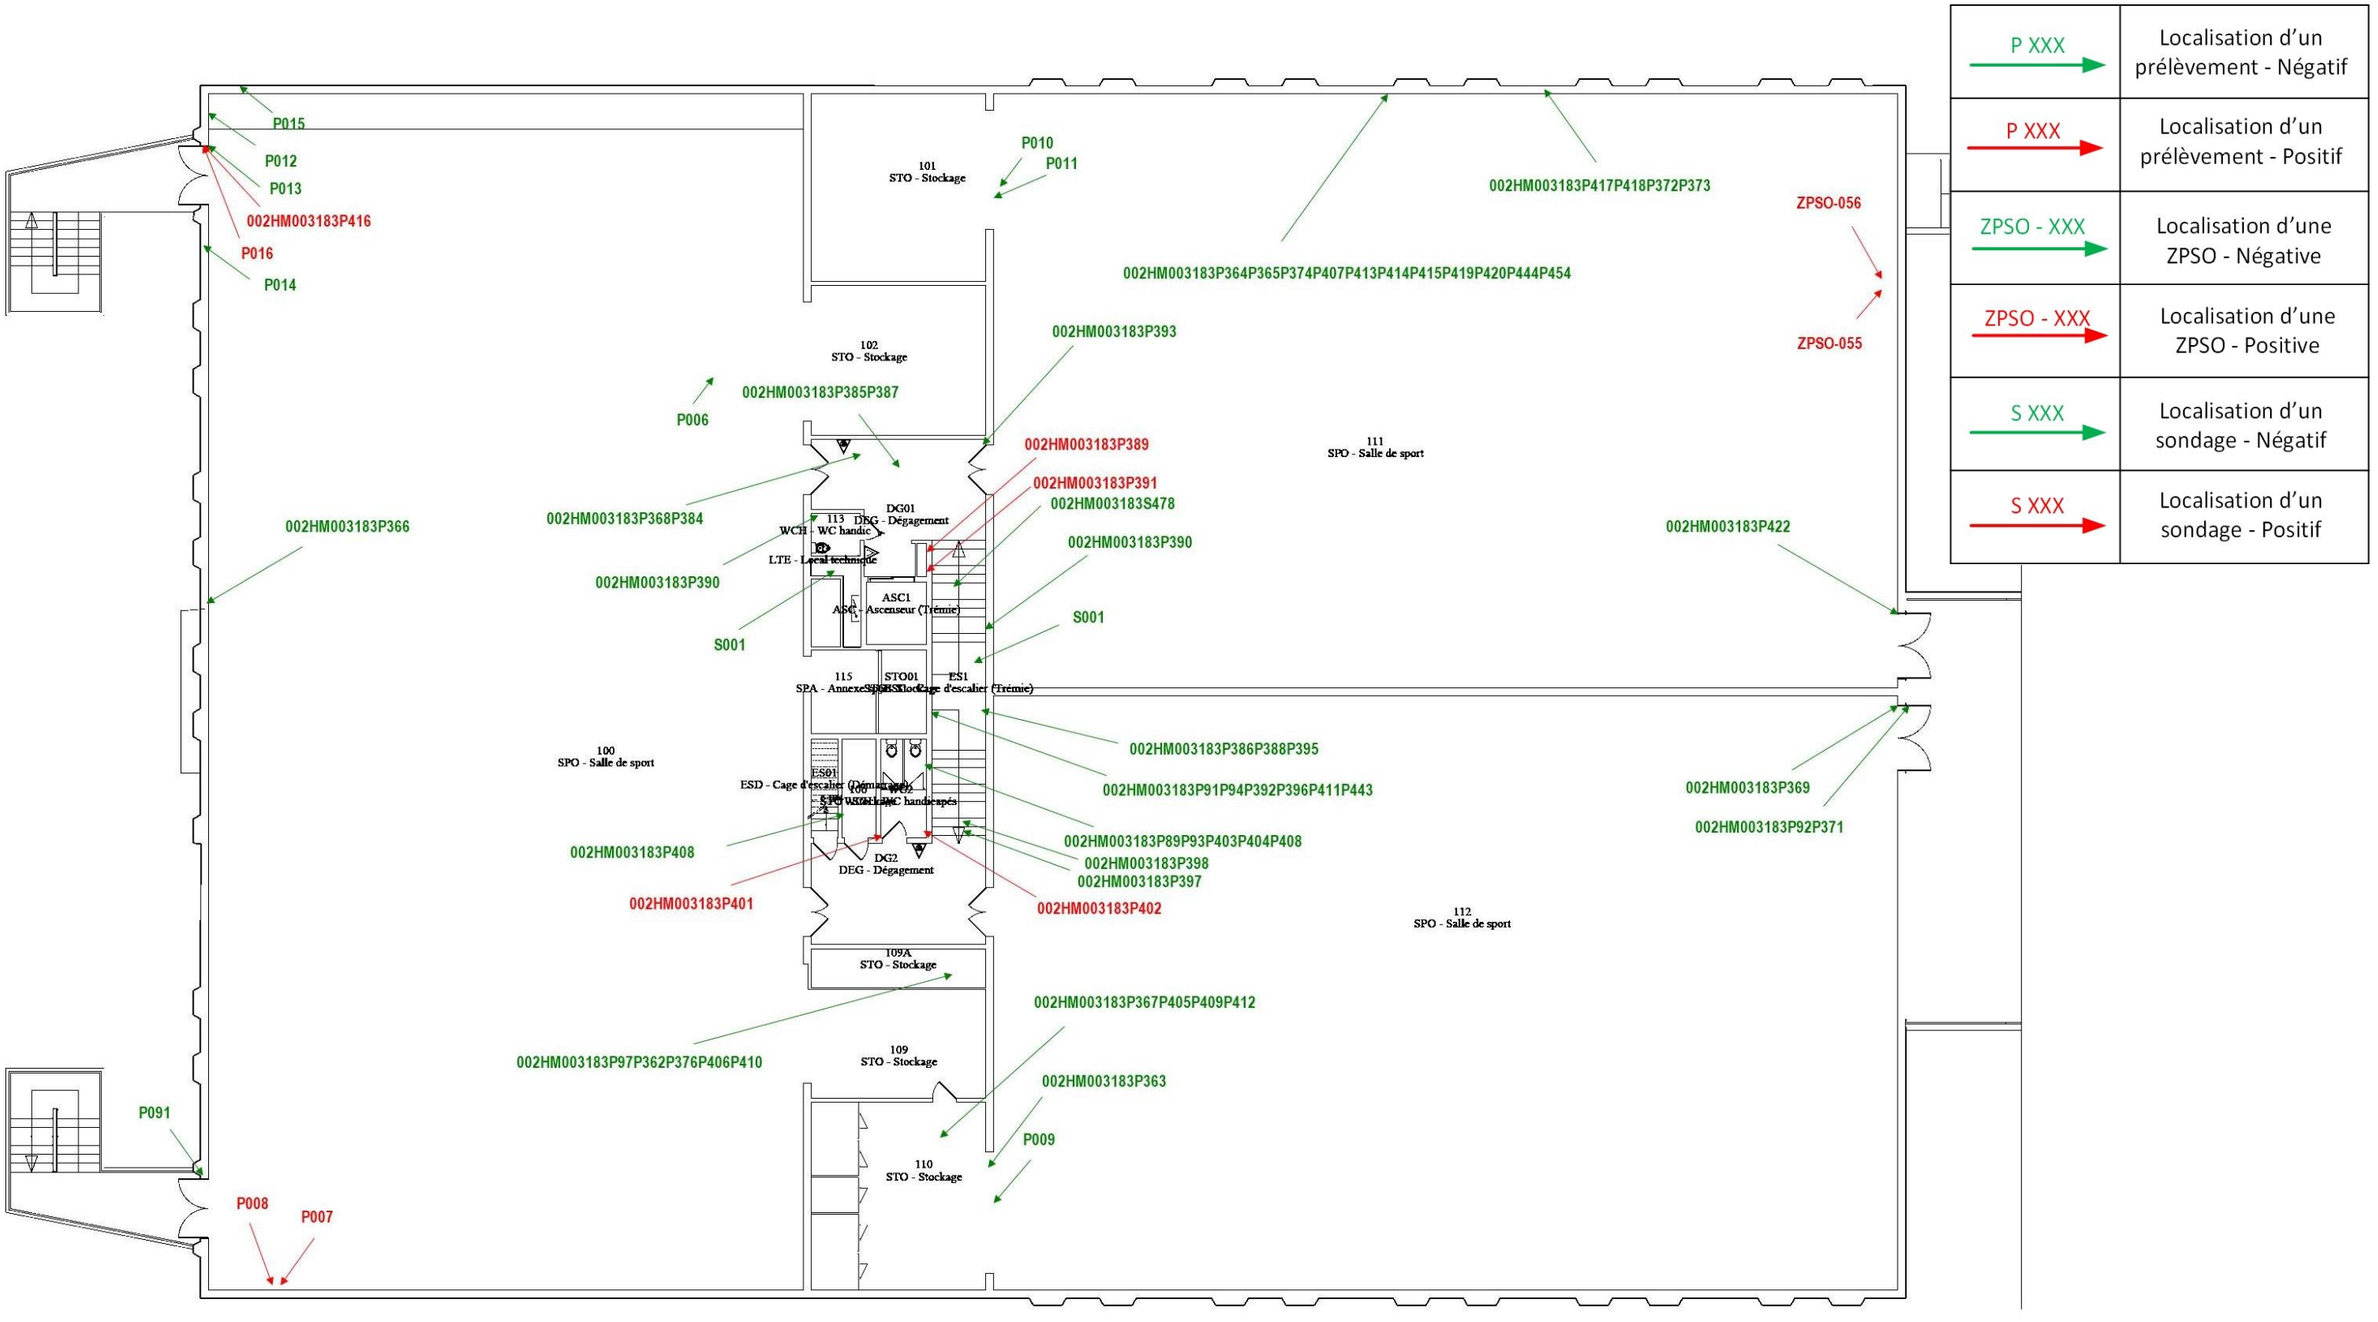


# Planche croquis de repérage technique : R+1 – ZOOM1

**DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis**
**Dossier n° 26MHE0439 du 26/05/2026**
**Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG**

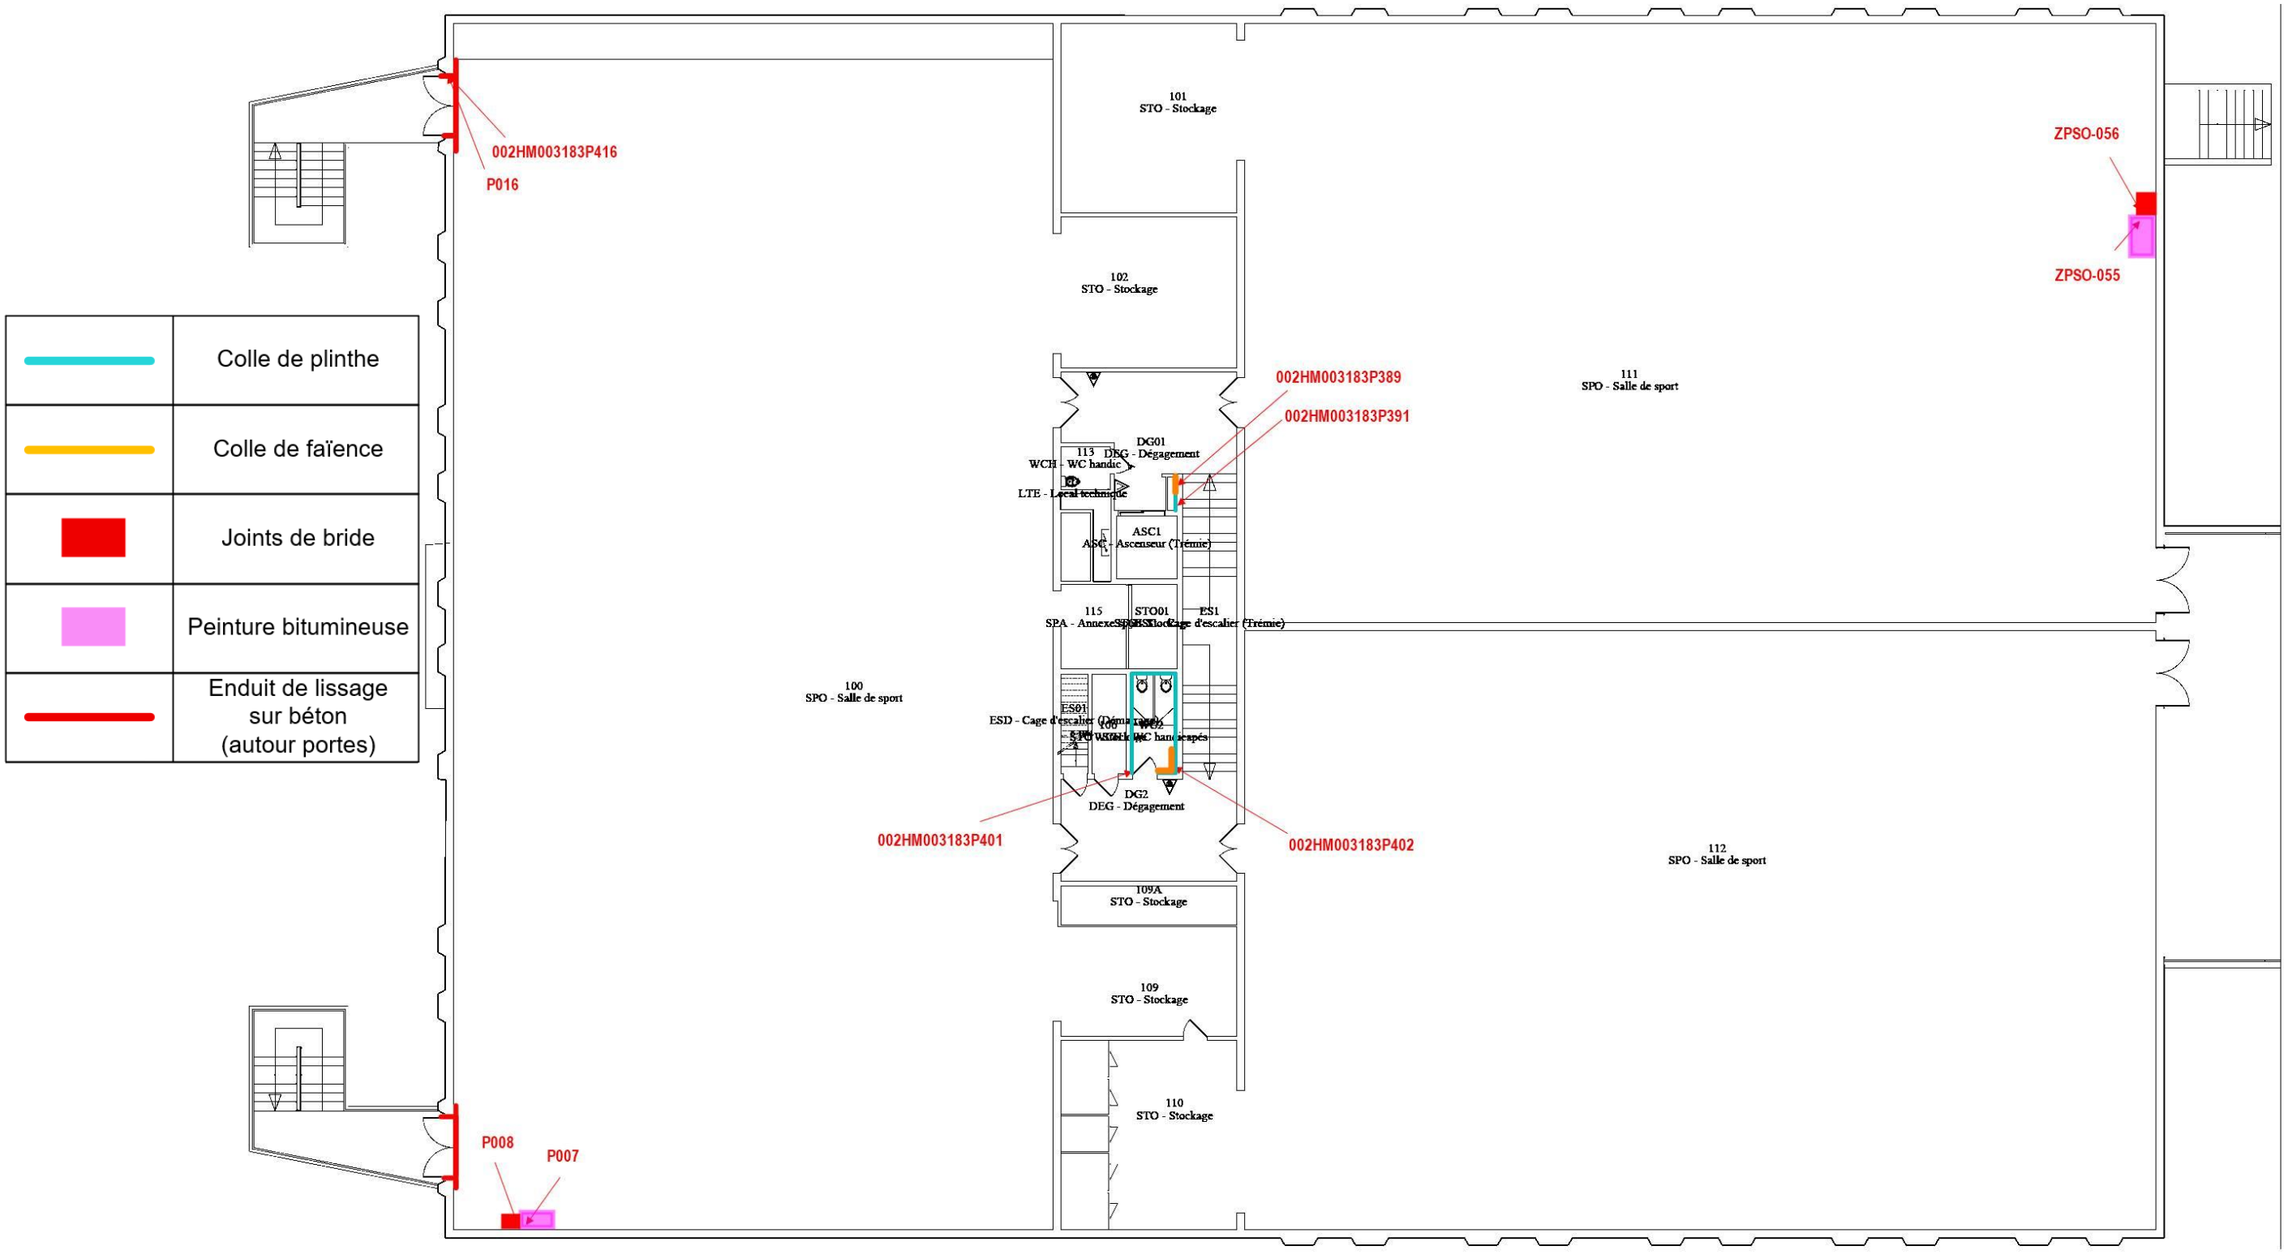



## Matériaux et Produits contenant de l'amiante : R+1 – ZOOM1

**DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis**
**Dossier n° 26MHE0439 du 26/05/2026**
**Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG**


Référence : 26MHE0439

| | |
|---|---|
| P XXX | Localisation d'un prélèvement - Négatif |
| P XXX | Localisation d'un prélèvement - Positif |
| ZPSO - XXX | Localisation d'une ZPSO - Négative |
| ZPSO - XXX | Localisation d'une ZPSO - Positive |
| S XXX | Localisation d'un sondage - Négatif |
| S XXX | Localisation d'un sondage - Positif |

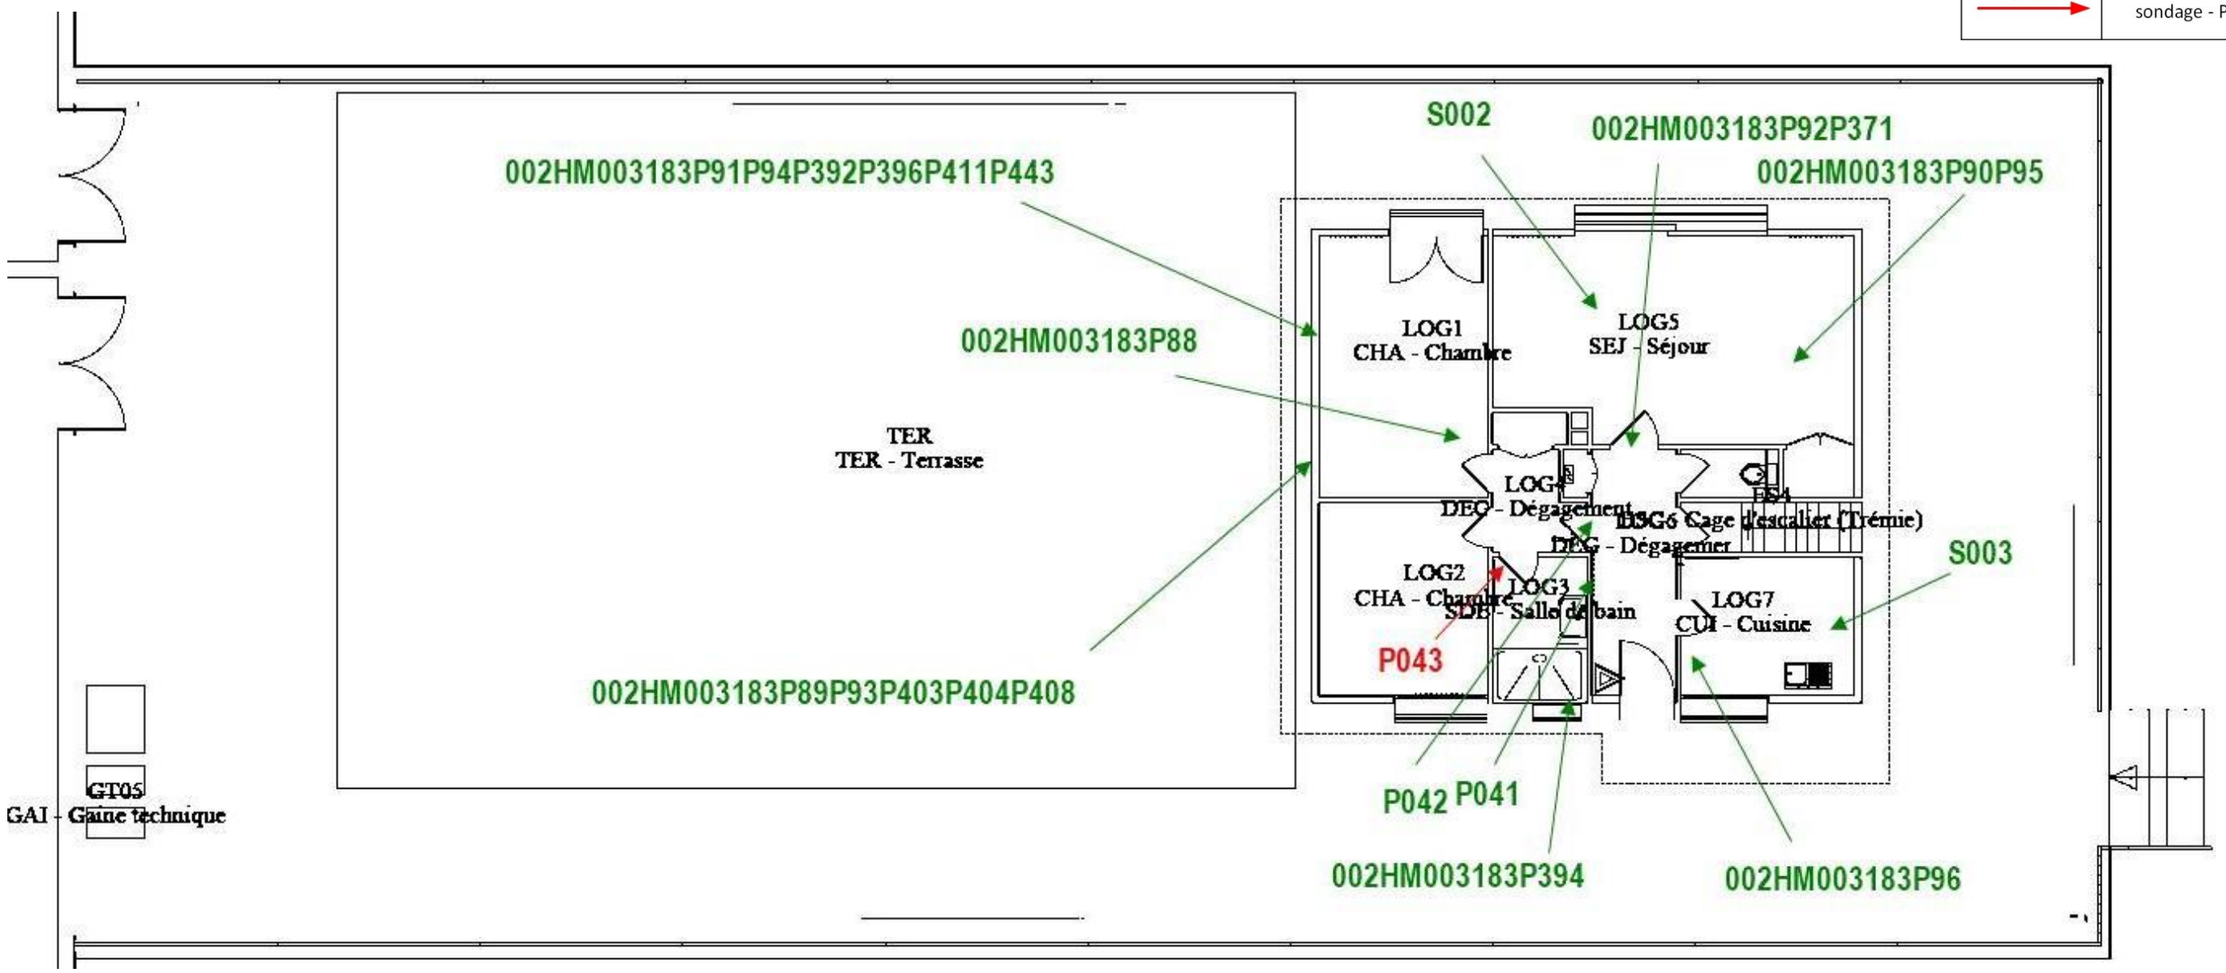


## Planche croquis de repérage technique : R+2 – ZOOM2

**DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis**
**Dossier n° 26MHE0439 du 26/05/2026**
**Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG**

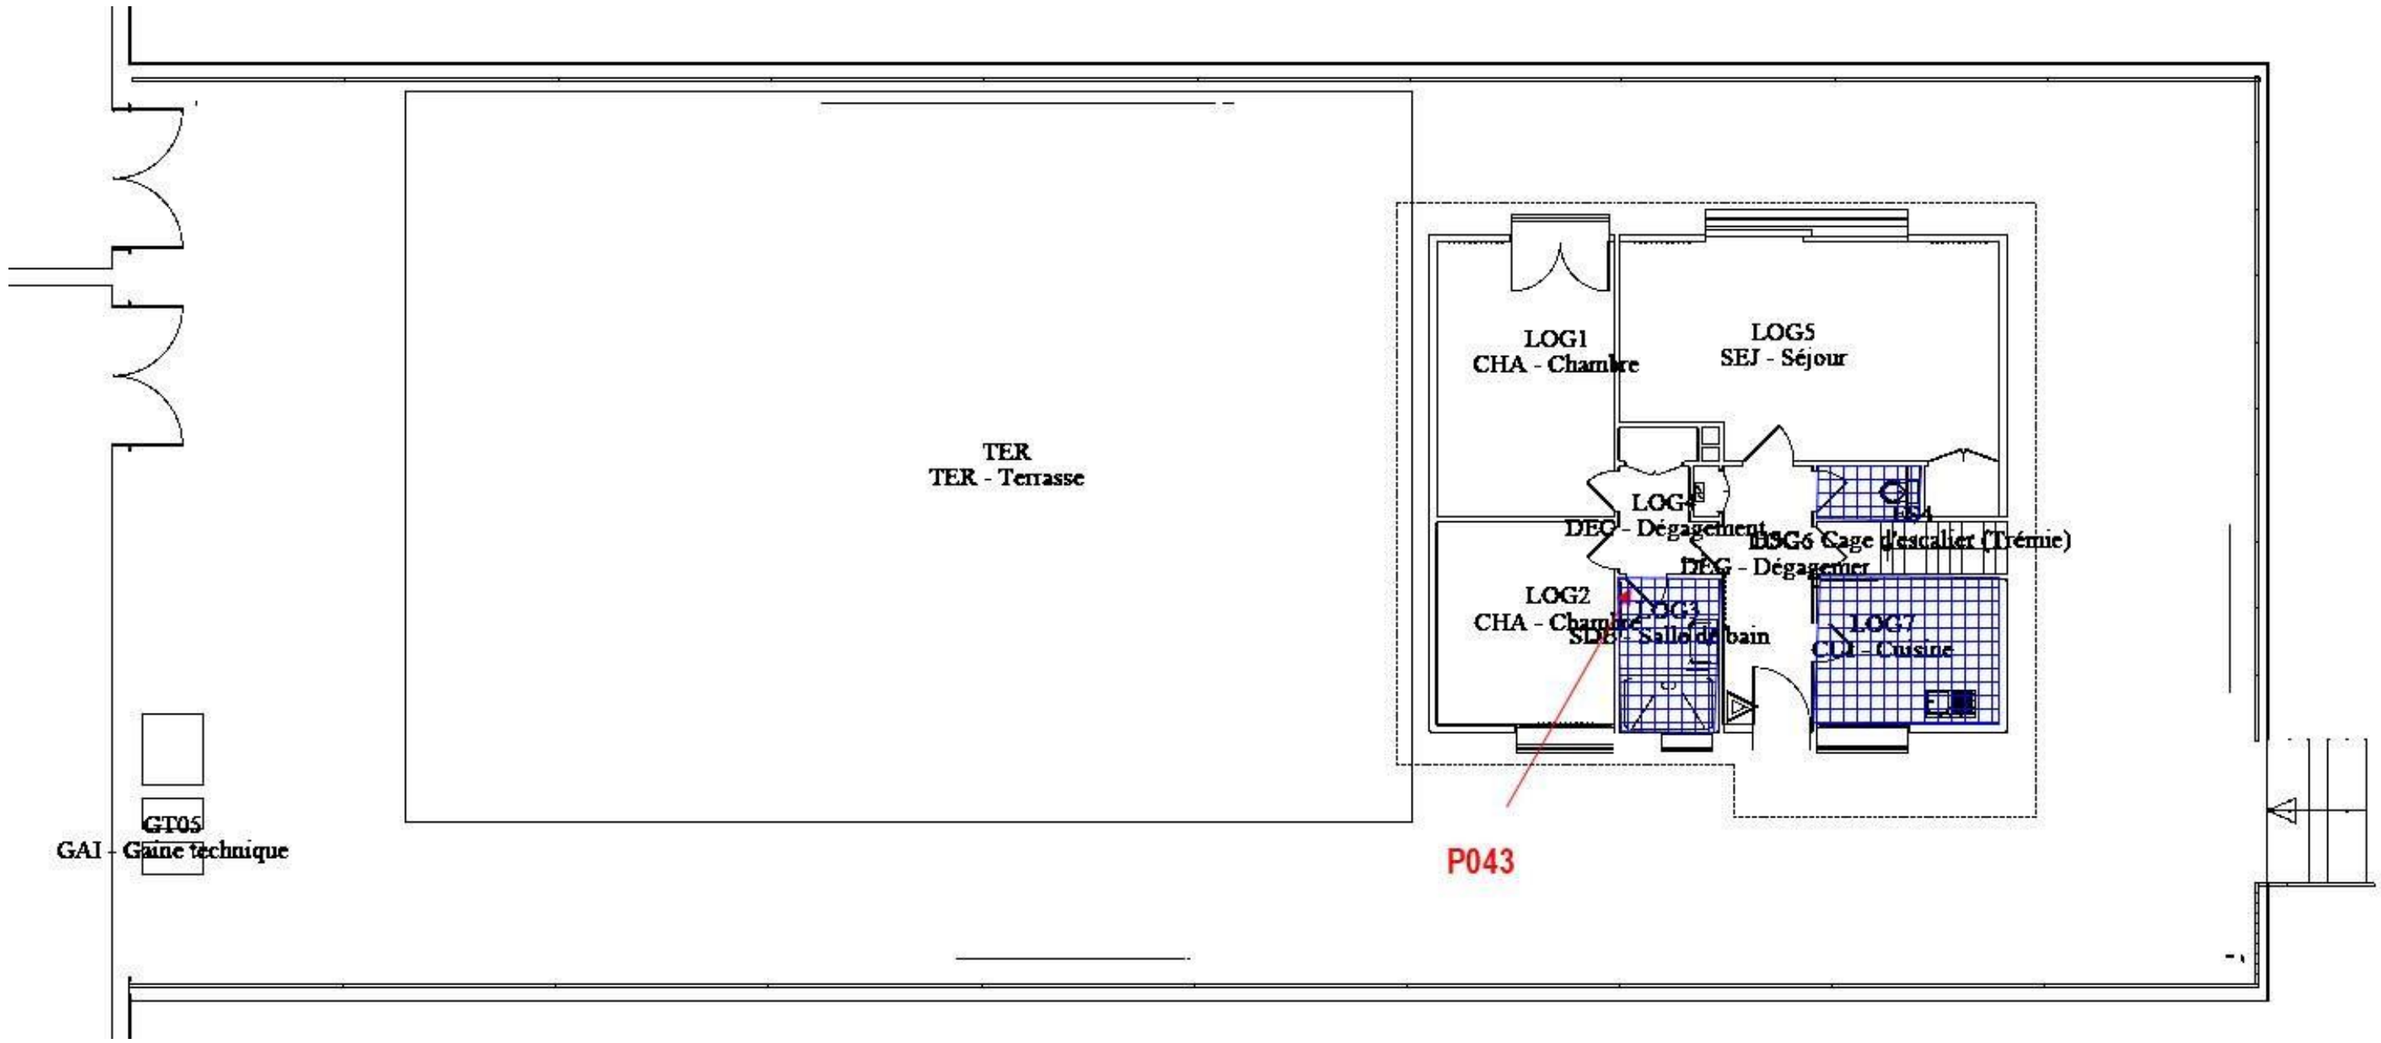



Colle de carrelage
(couche inférieure)

## Matériaux et Produits contenant de l'amiante : R+2 – ZOOM2

**DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis**
**Dossier n° 26MHE0439 du 26/05/2026**
**Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG**


| | |
|---|---|
| P XXX | Localisation d'un prélèvement - Négatif |
| P XXX | Localisation d'un prélèvement - Positif |
| ZPSO - XXX | Localisation d'une ZPSO - Négative |
| ZPSO - XXX | Localisation d'une ZPSO - Positive |
| S XXX | Localisation d'un sondage - Négatif |
| S XXX | Localisation d'un sondage - Positif |

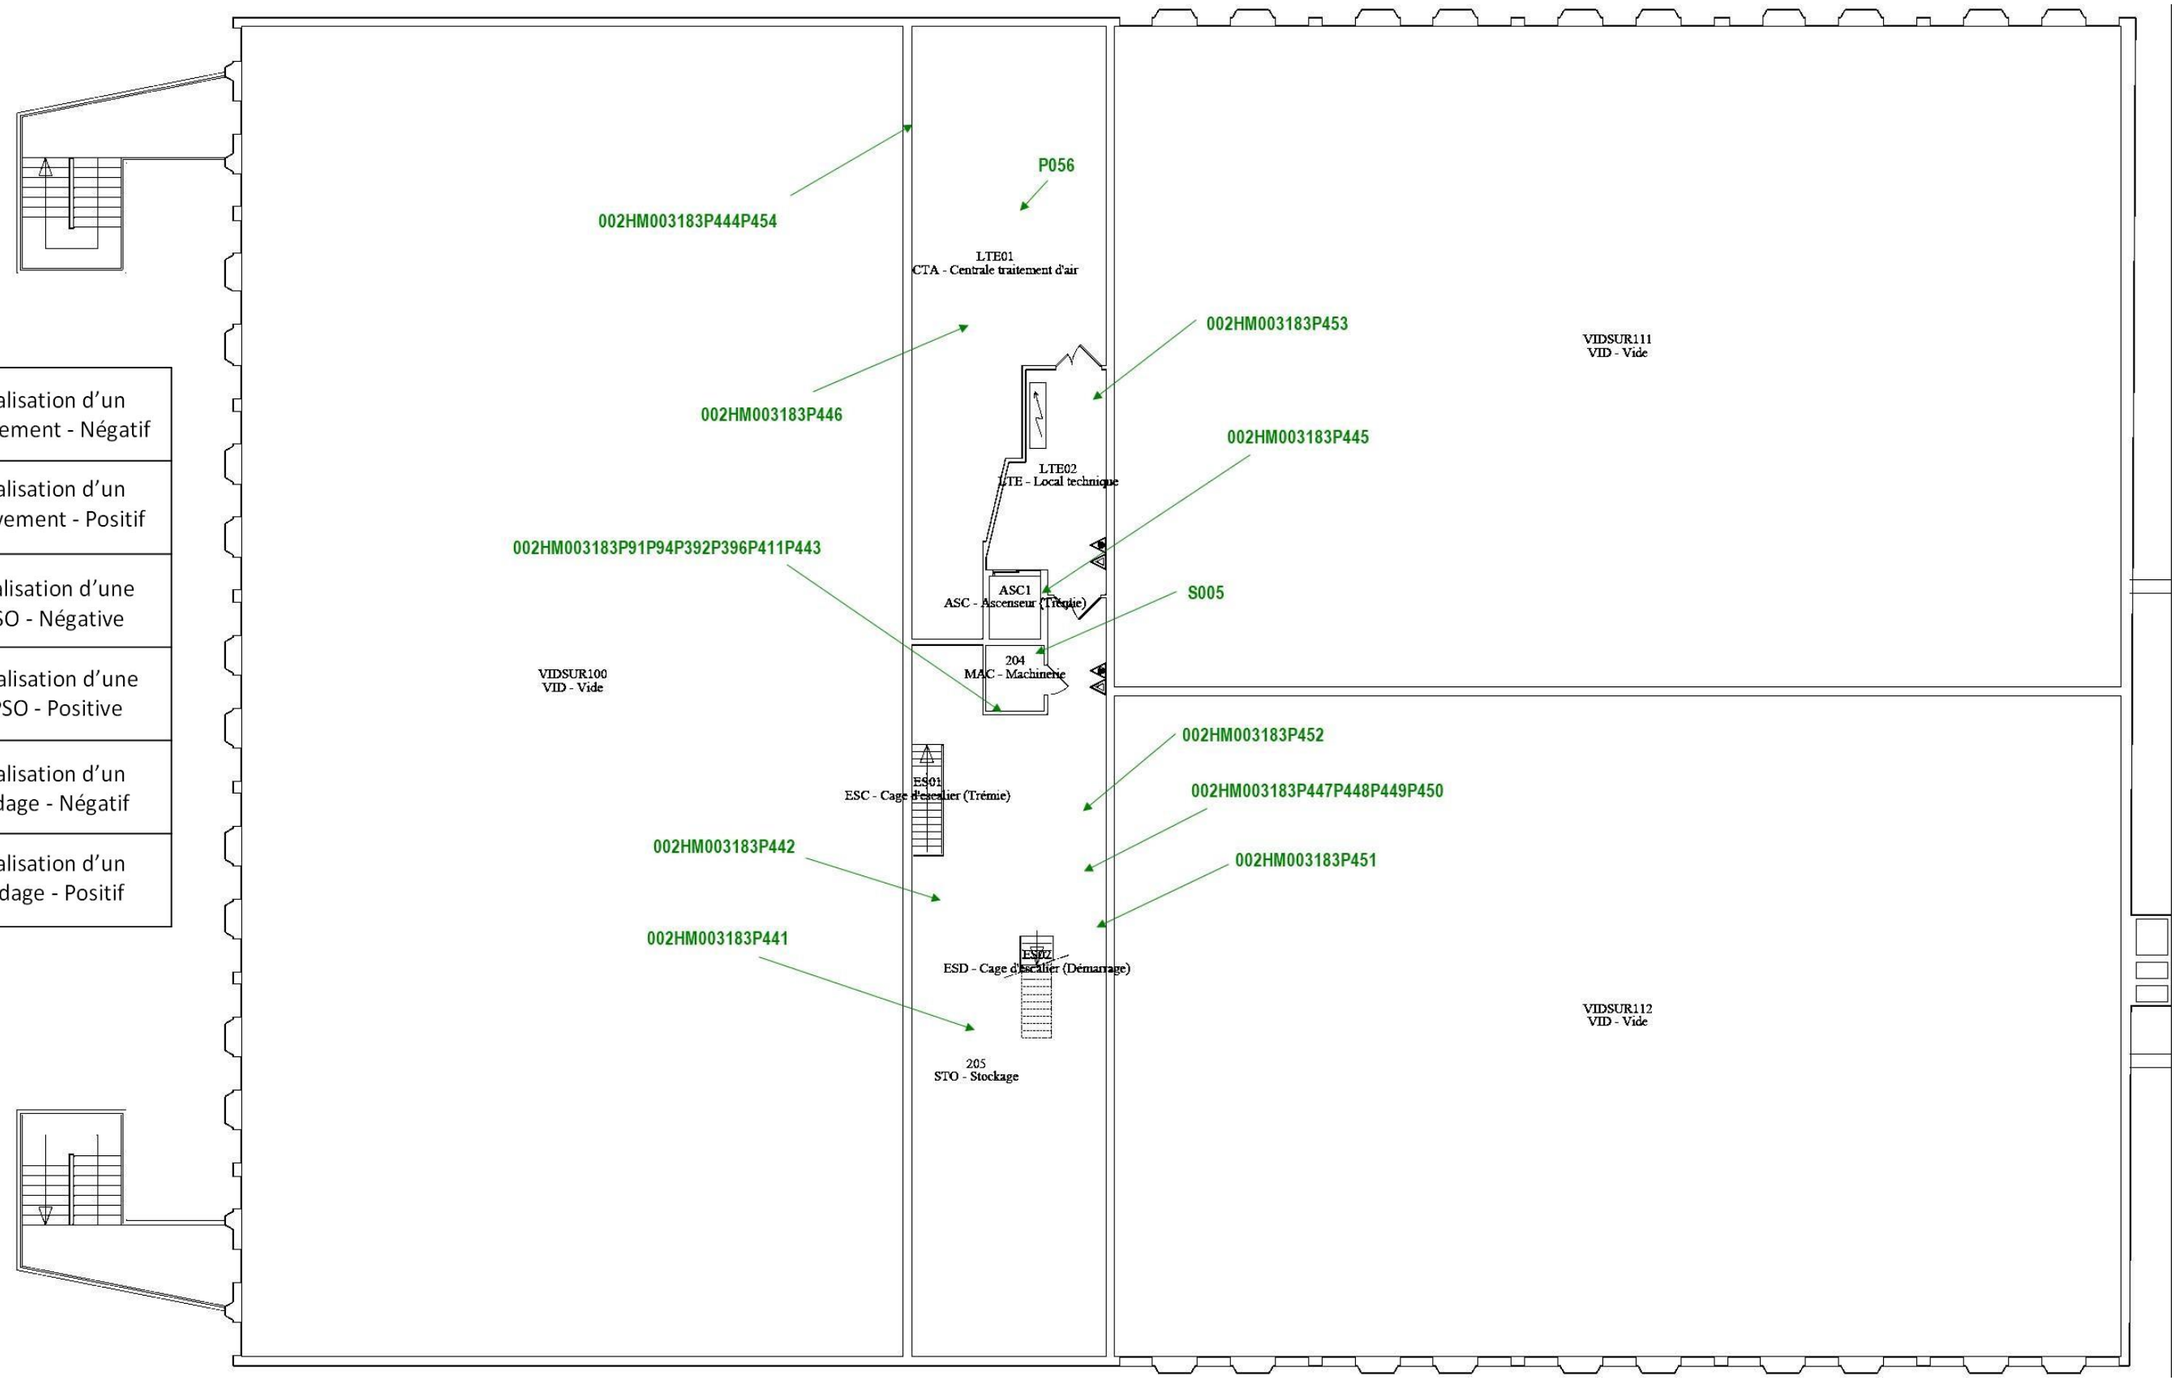


## Planche croquis de repérage technique : R+2

**DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis**
**Dossier n° 26MHE0439 du 26/05/2026**
**Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG**


| | |
|---|---|
| P XXX → | Localisation d'un prélèvement - Négatif |
| P XXX → | Localisation d'un prélèvement - Positif |
| ZPSO - XXX → | Localisation d'une ZPSO - Négative |
| ZPSO - XXX → | Localisation d'une ZPSO - Positive |
| S XXX → | Localisation d'un sondage - Négatif |
| S XXX → | Localisation d'un sondage - Positif |

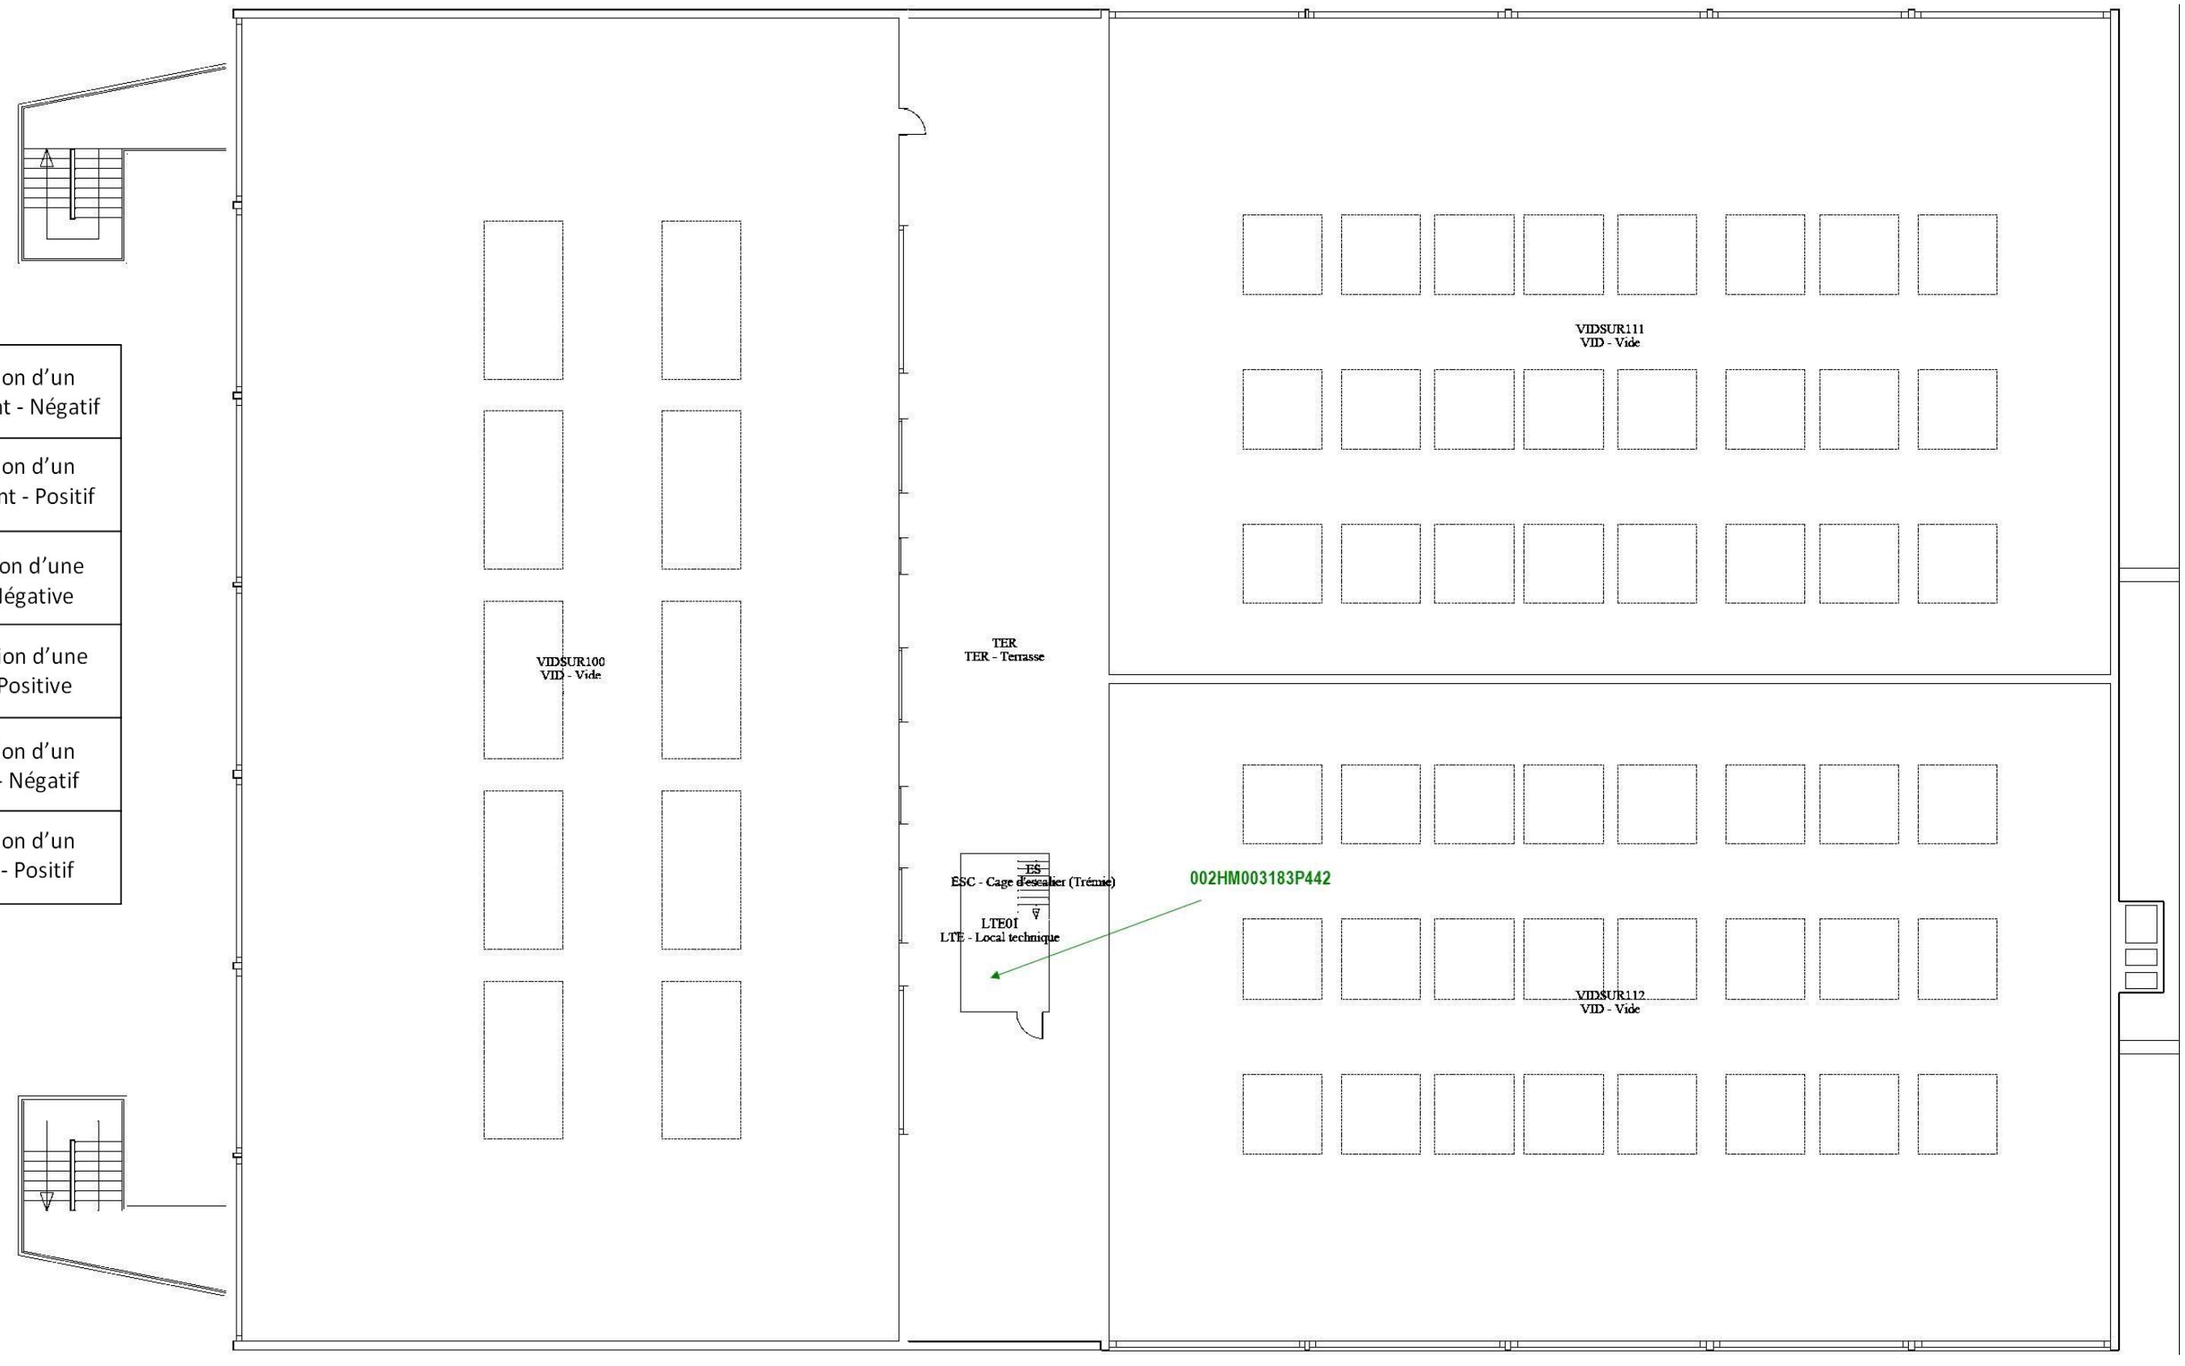


## Planche croquis de repérage technique : ATTIQUE

**DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis**
**Dossier n° 26MHE0439 du 26/05/2026**
**Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG**

| | |
|---|---|
| P XXX → | Localisation d'un prélèvement - Négatif |
| P XXX → | Localisation d'un prélèvement - Positif |
| ZPSO - XXX → | Localisation d'une ZPSO - Négative |
| ZPSO - XXX → | Localisation d'une ZPSO - Positive |
| S XXX → | Localisation d'un sondage - Négatif |
| S XXX → | Localisation d'un sondage - Positif |

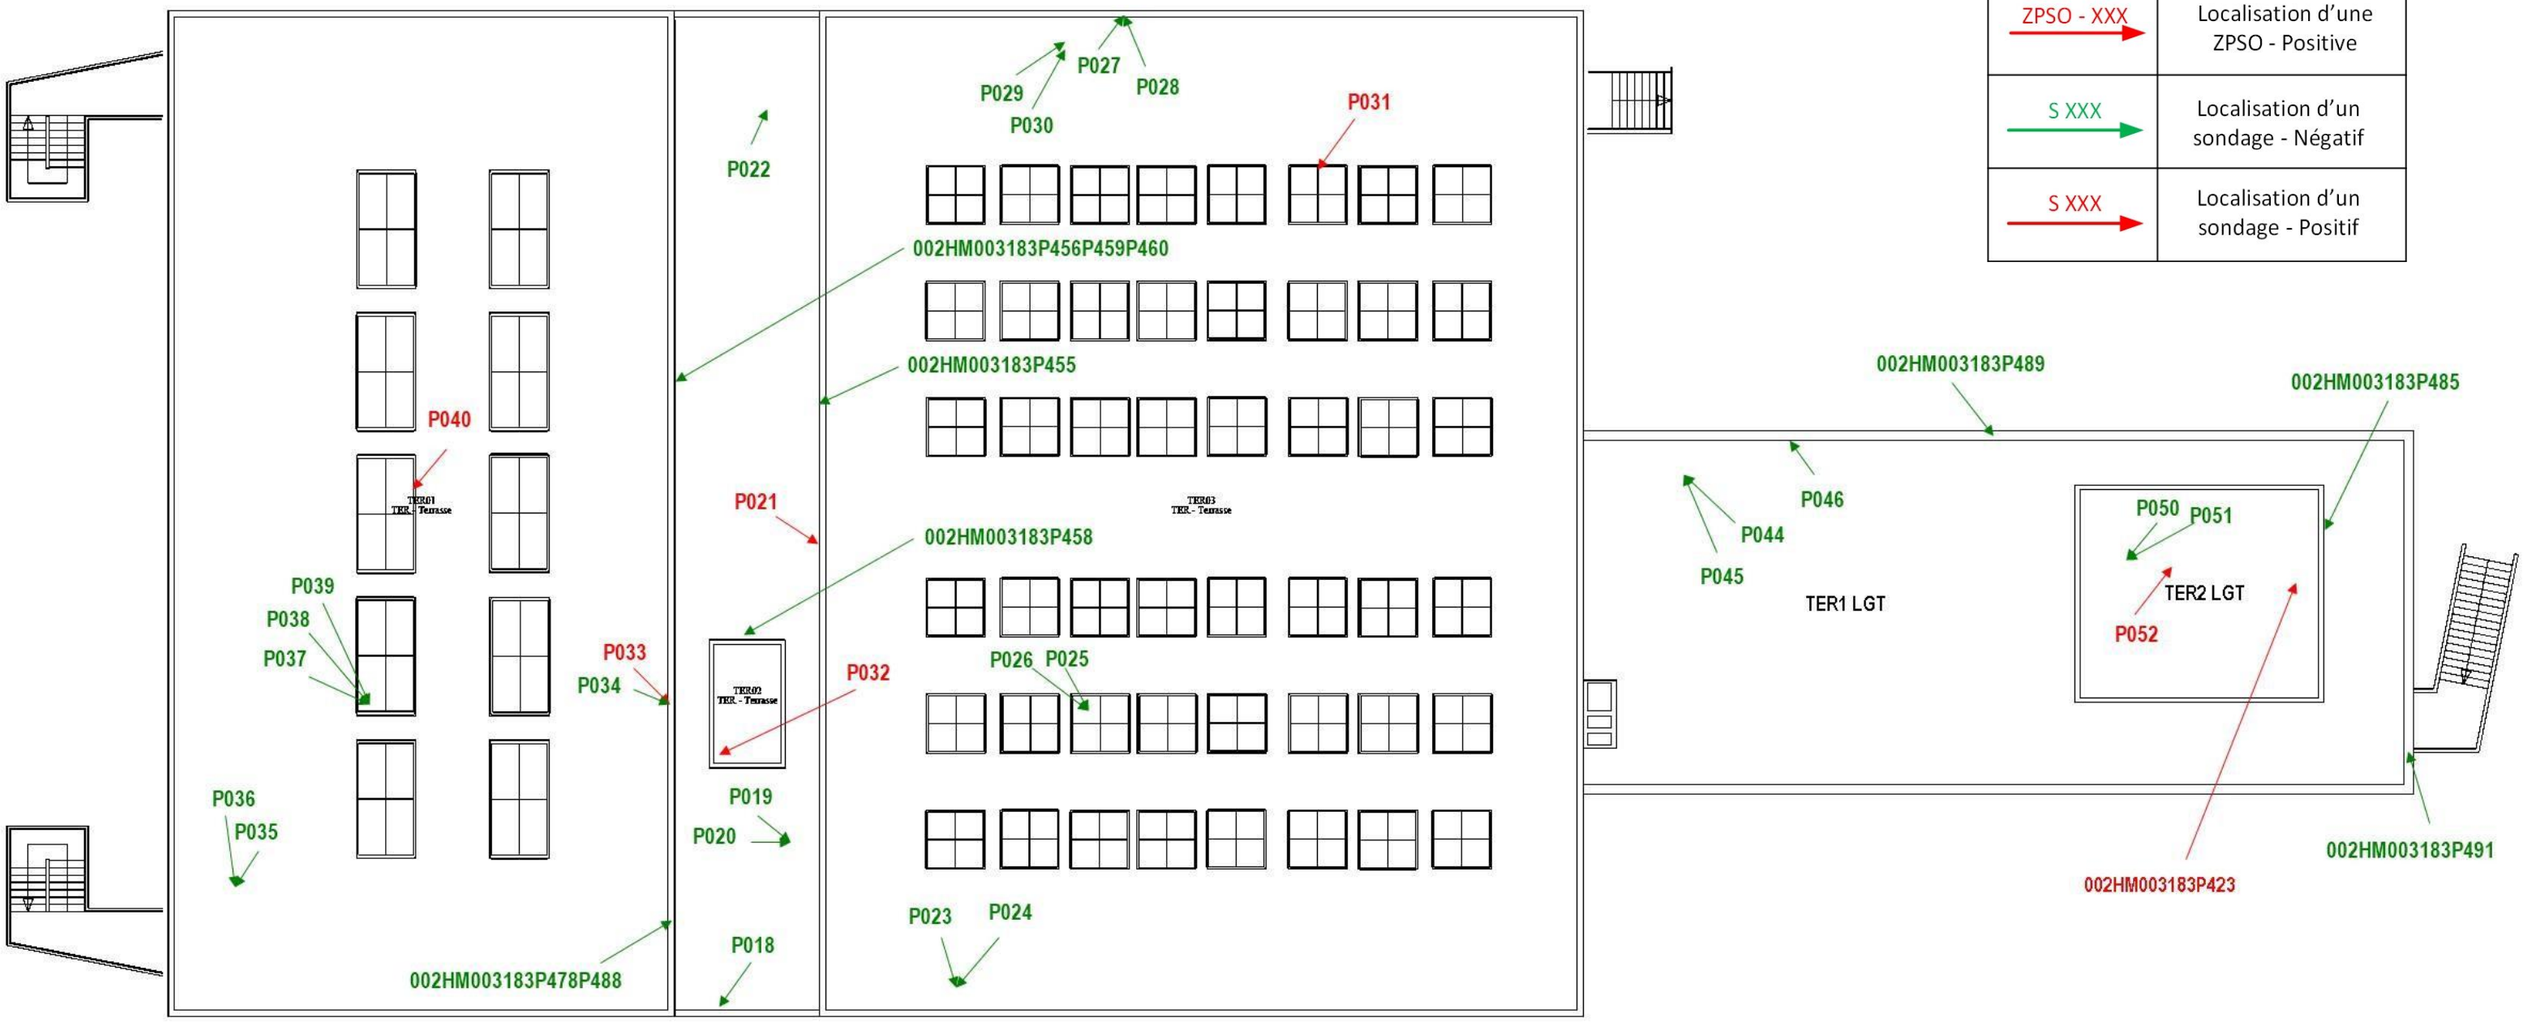


## Planche croquis de repérage technique : TOITURE

**DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis**
**Dossier n° 26MHE0439 du 26/05/2026**
**Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG**




## Matériaux et Produits contenant de l'amiante : TOITURE

**DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis**
**Dossier n° 26MHE0439 du 26/05/2026**
**Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG**


| | |
|---|---|
| P XXX | Localisation d'un prélèvement - Négatif |
| P XXX | Localisation d'un prélèvement - Positif |
| ZPSO - XXX | Localisation d'une ZPSO - Négative |
| ZPSO - XXX | Localisation d'une ZPSO - Positive |
| S XXX | Localisation d'un sondage - Négatif |
| S XXX | Localisation d'un sondage - Positif |




## Planche croquis de repérage technique : DETAIL RDC 27-Chaufferie

**DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis**
**Dossier n° 26MHE0439 du 26/05/2026**
**Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG**

| | |
|---|---|
| P XXX → | Localisation d'un prélèvement - Négatif |
| P XXX → | Localisation d'un prélèvement - Positif |
| ZPSO - XXX → | Localisation d'une ZPSO - Négative |
| ZPSO - XXX → | Localisation d'une ZPSO - Positive |
| S XXX → | Localisation d'un sondage - Négatif |
| S XXX → | Localisation d'un sondage - Positif |

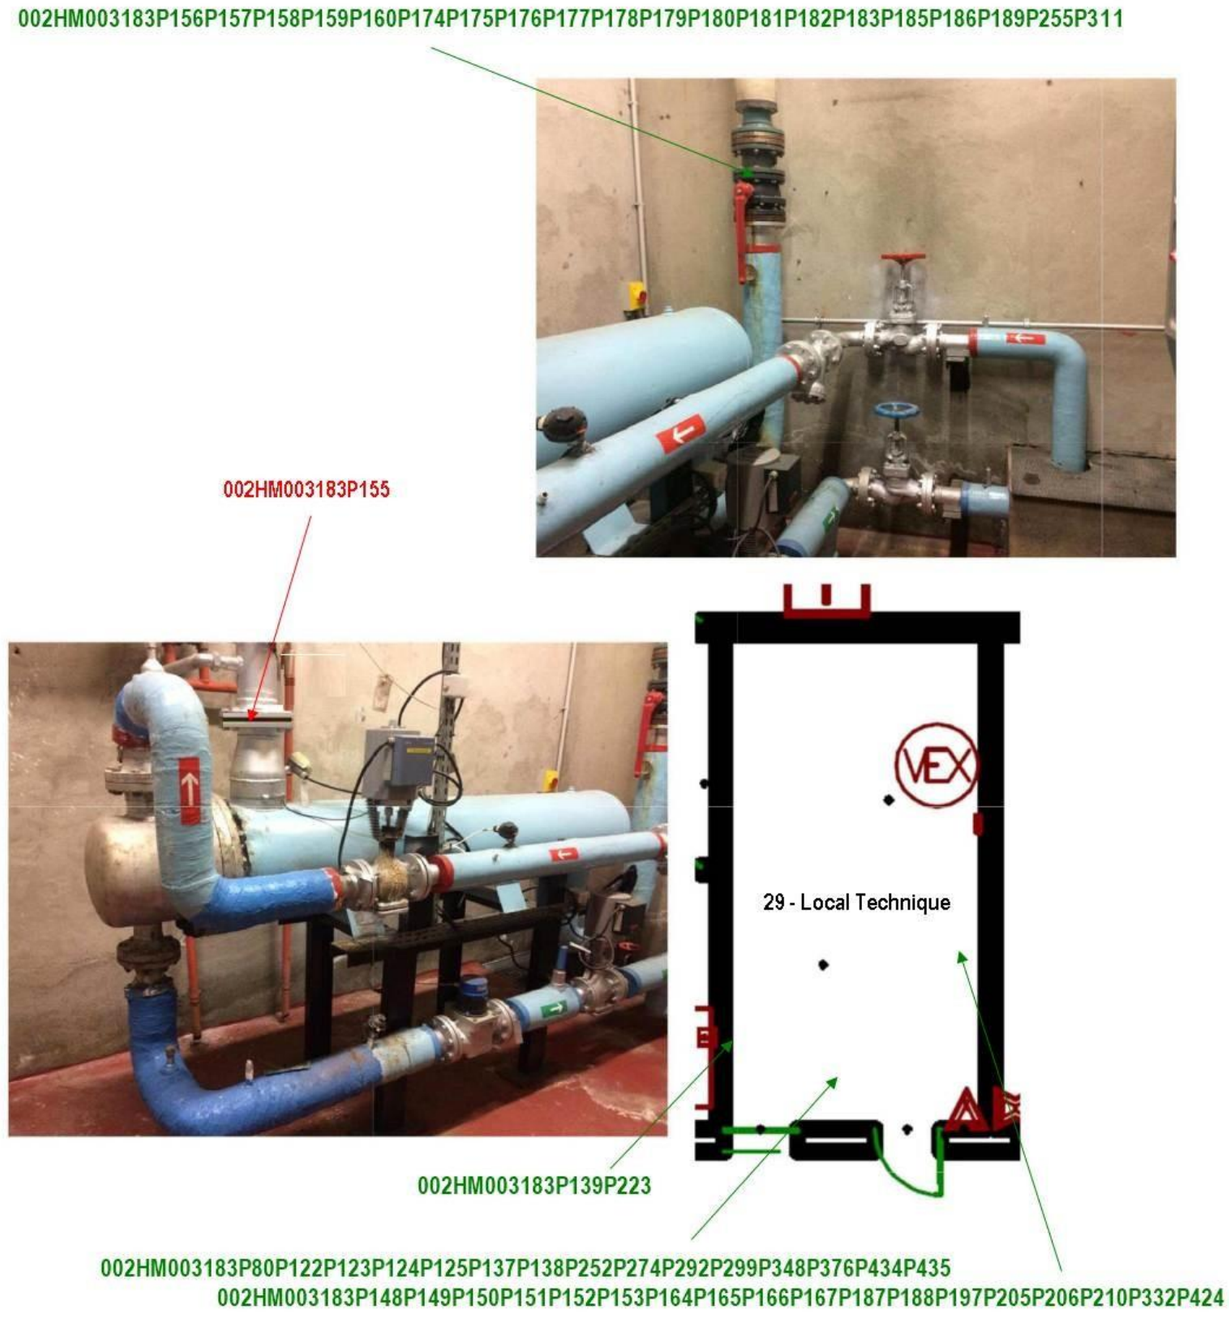



## Planche croquis de repérage technique : DETAIL RDC 29-LOCAL TECHNIQUE

**DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis**
**Dossier n° 26MHE0439 du 26/05/2026**
**Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG**

| | |
|---|---|
| | Joints de bride |
| | Joints de bride |



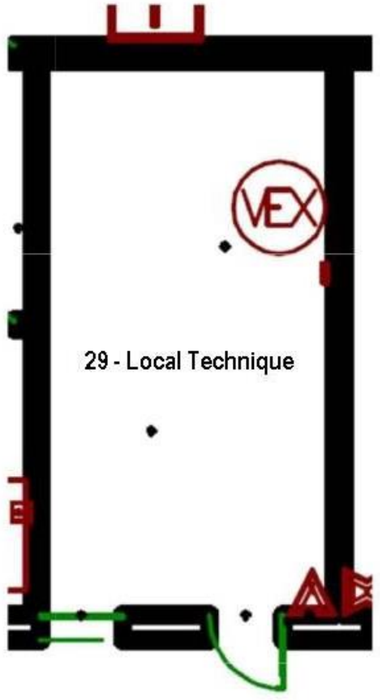



## Matériaux et Produits contenant de l'amiante : DETAIL RDC 29-LOCAL TECHNIQUE


**DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis**
**Dossier n° 26MHE0439 du 26/05/2026**
**Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG**

| | |
|---|---|
| P XXX | Localisation d'un prélèvement - Négatif |
| P XXX | Localisation d'un prélèvement - Positif |
| ZPSO - XXX | Localisation d'une ZPSO - Négative |
| ZPSO - XXX | Localisation d'une ZPSO - Positive |
| S XXX | Localisation d'un sondage - Négatif |
| S XXX | Localisation d'un sondage - Positif |

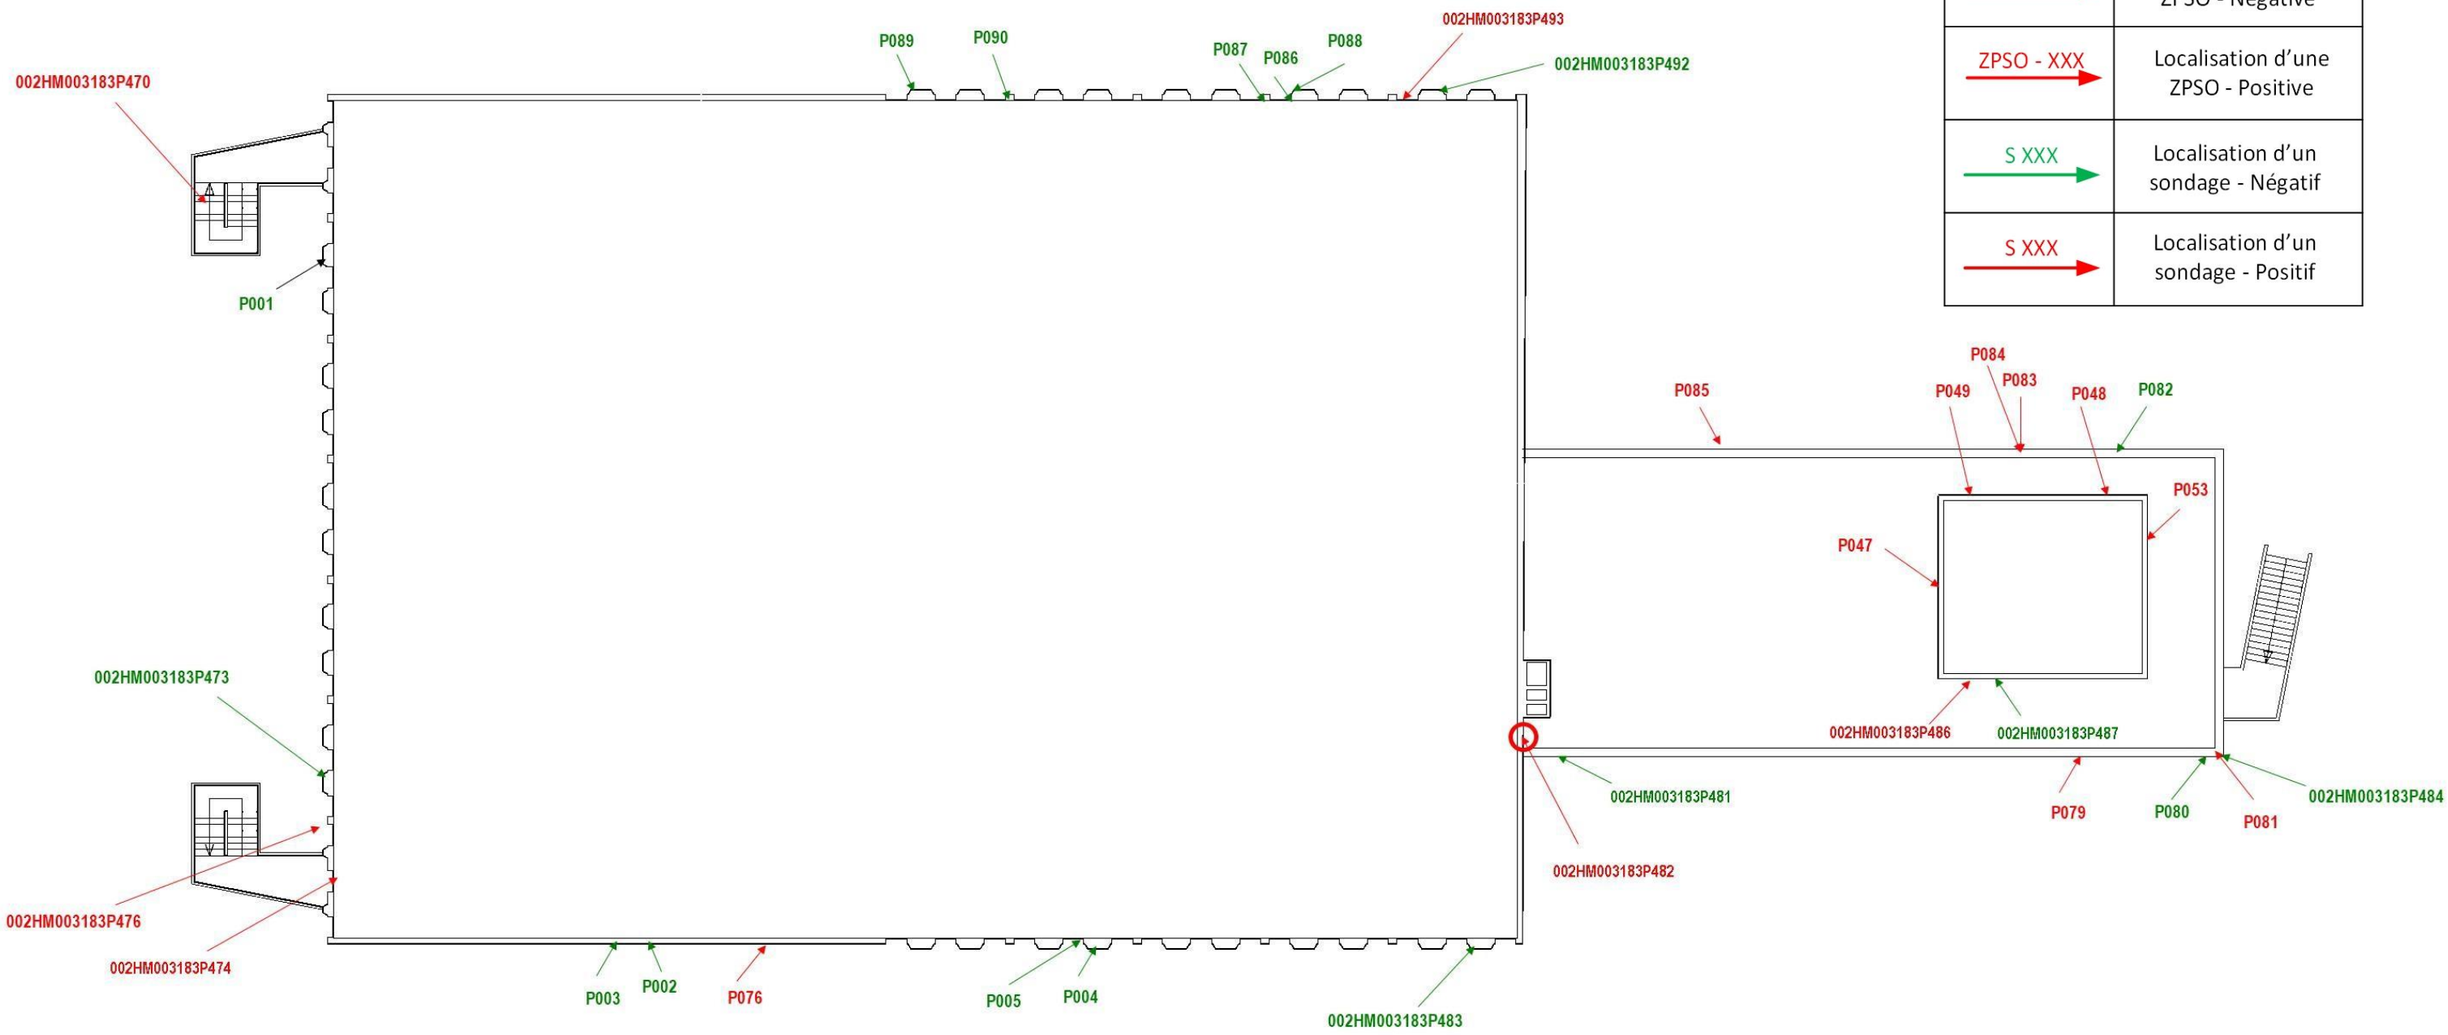


## Planche croquis de repérage technique : FACADES

**DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis**
**Dossier n° 26MHE0439 du 26/05/2026**
**Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG**

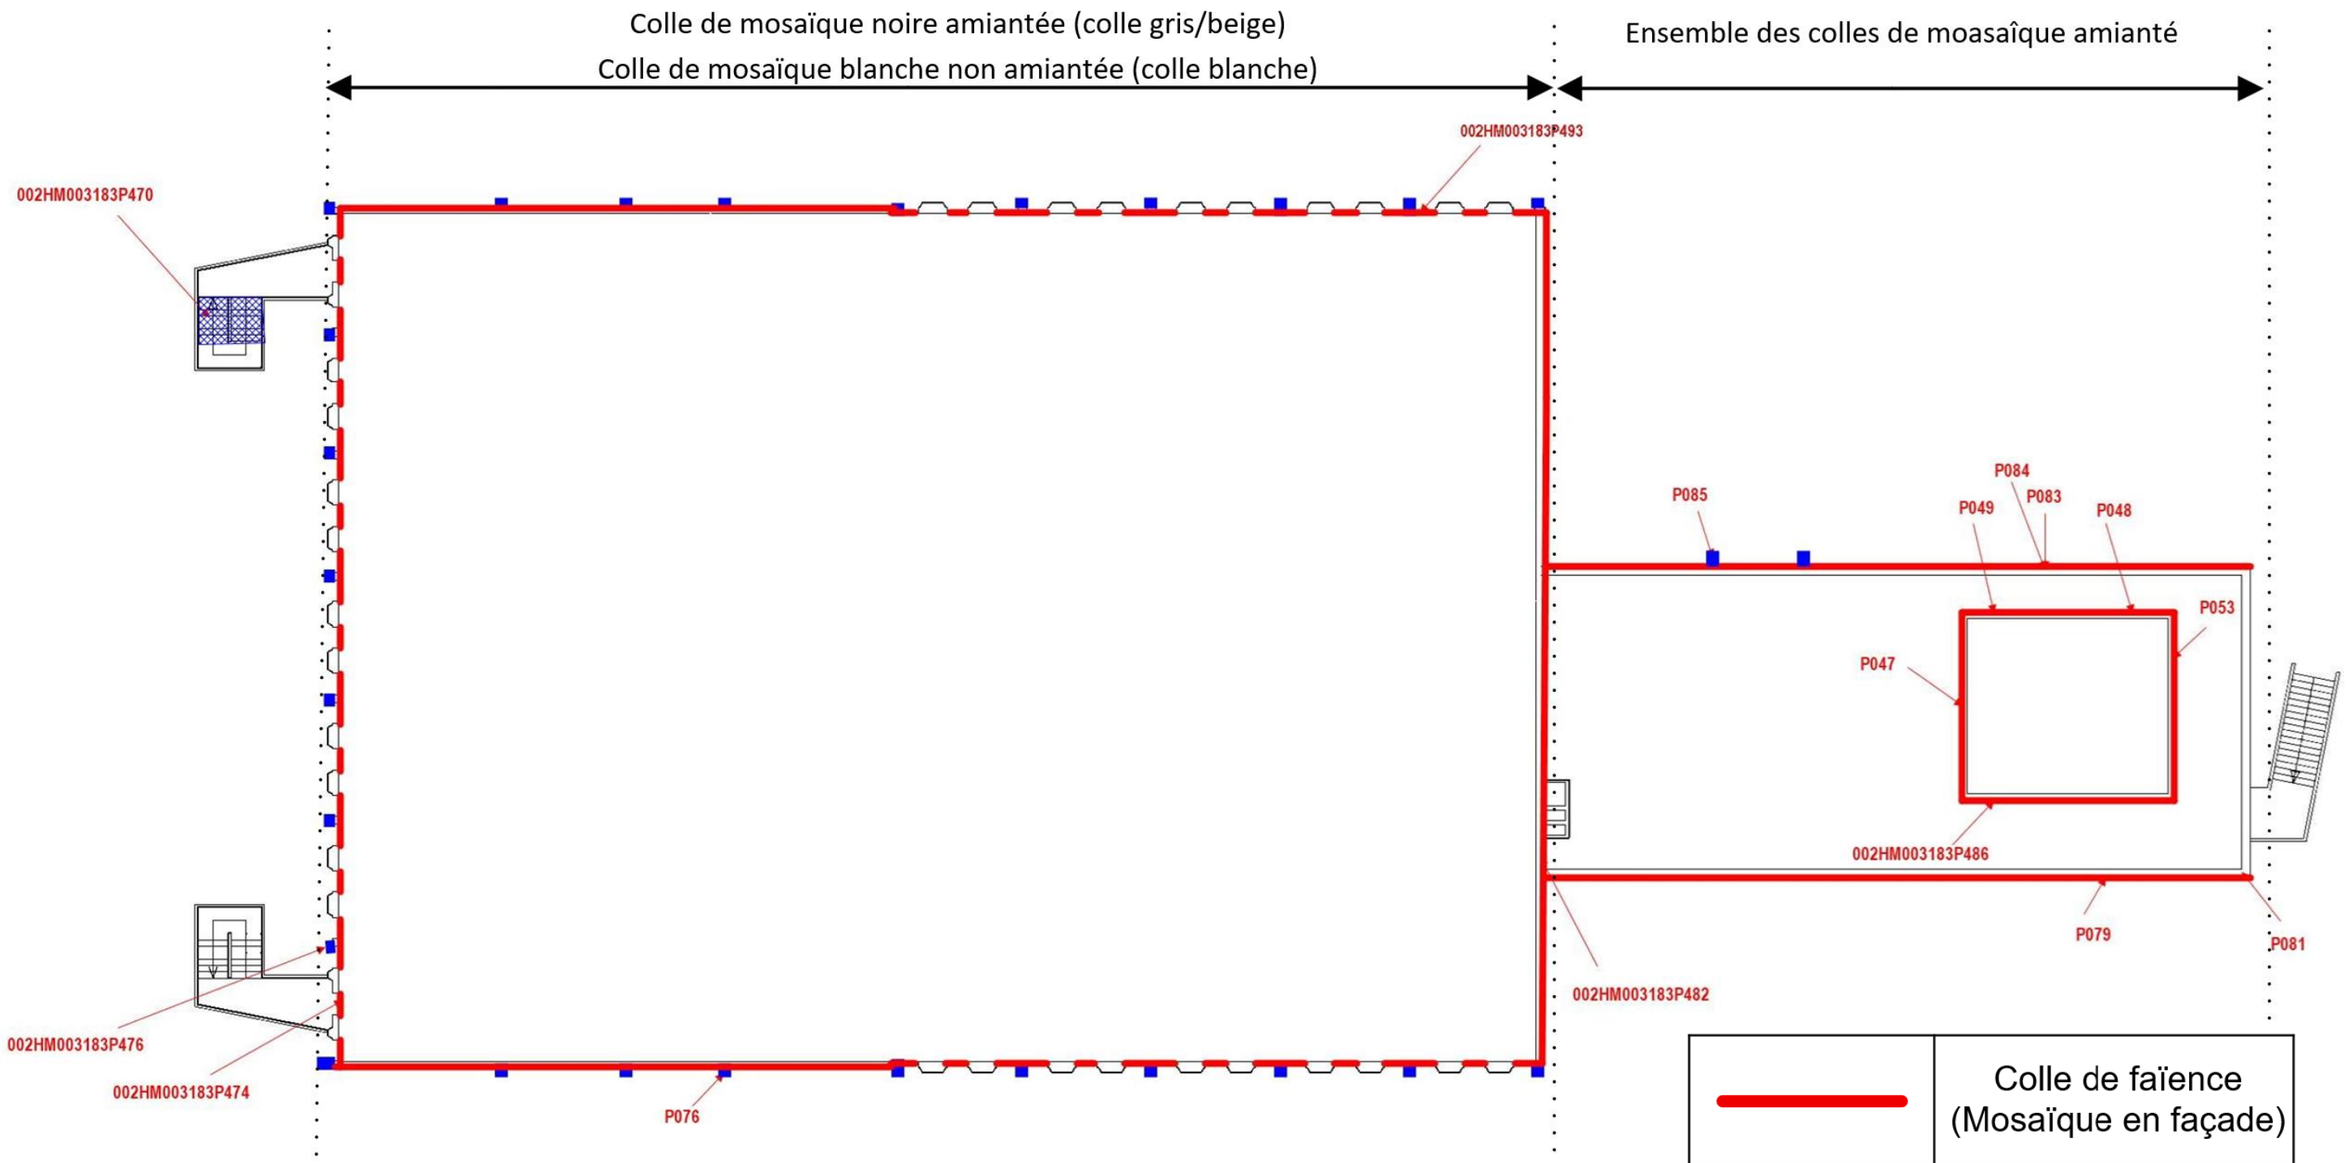


## Matériaux et Produits contenant de l'amiante : FACADES

**DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis**
**Dossier n° 26MHE0439 du 26/05/2026**
**Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG**

# 7.2 Annexe : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Rouge = Positif ; Vert = Négatif

| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| 002HM003 183P104 | RDC - SAS04 | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de plinthe |  002HM003183 n°104 - 1 (P104) - RDC - Vol 24 |
| 002HM003 183P105 | RDC - SAS04 | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence |  002HM003183 n°105 - 1 (P105) - RDC - Vol 24 |
| 002HM003 183P107 | RDC - SAS04 | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle bitumineuse |  002HM003183 n°107 - 1 (P107) - RDC - Vol 25 |
| 002HM003 183P119 | RDC - 34 - Bureau | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle bitumineuse |  002HM003183 n°119 - 1 (P119) - RDC - Vol 18 |

| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| 002HM003 183P146 | RDC - 29 - Local Technique | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité |  002HM003183 n°146 - 1 (P146) - RDC - Vol 9 |
| 002HM003 183P155 | RDC - 29 - Local Technique | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint plat prédécoupé pour brides |  002HM003183 n°155 - 1 (P155) - Plan détail sous-station - Vol 83 |
| 002HM003 183P17P18 P52P53 | RDC - 26 - Vestiaire | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de plinthe |  002HM003183 n°53 - 1 (P53) - RDC - Vol 14  002HM003183 n°52 - 1 (P52) - RDC - Vol 14 |

| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| 002HM003 183P191 | RDC - DG4 | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Colle bitumineuse + Couche2: Ragréage |  002HM003183 n°191 - 1 (P191) - RDC - Vol 7 |
| 002HM003 183P196 | RDC - DG4 | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité |  002HM003183 n°196 - 1 (P196) - RDC - Vol 7 |
| 002HM003 183P199 | RDC - DG4 | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint entre éléments (Mastics) |  002HM003183 n°199 - 1 (P199) - RDC - Vol 7 |
| 002HM003 183P254 | RDC - DG5 | 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes | Peinture |  002HM003183 n°254 - 1 (P254) - RDC - Vol 52 |

| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| 002HM003183P257 | RDC - STO02 - Cafétéria | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence |  002HM003183 n°257 - 1 (P257) - RDC - Vol 57 |
| 002HM003183P260 | RDC - DG1 | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence |  002HM003183 n°260 - 1 (P260) - RDC - Vol 52 |
| 002HM003183P262 | RDC - DG1 | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité |  002HM003183 n°262 - 1 (P262) - RDC - Vol 63 |
| 002HM003183P263 | RDC - D06 - Bureau (annexe) | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiserie | Joint de mastic de vitrage |  002HM003183 n°263 - 1 (P263) - RDC - Vol 63 |

| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| 002HM003 183P270 | RDC - DG1 | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Joint de mastic de vitrage |  002HM003183 n°270 - 1 (P270) - RDC - Vol 63 |
| 002HM003 183P273 | RDC - 01A - Stockage | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage |  002HM003183 n°273 - 1 (P273) - RDC - Vol 44 |
| 002HM003 183P275 | RDC - 01A - Stockage | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence |  002HM003183 n°275 - 1 (P275) - RDC - Vol 44 |
| 002HM003 183P29 | RDC - 28 - Vestiaire | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de faïence |  002HM003183 n°295 - 1 (P295) - RDC - Vol 59 |

| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| 002HM003183P293 | RDC - 10 - Stockage | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence |  002HM003183 n°293 - 1 (P293) - RDC - Vol 60 |
| 002HM003183P300 | RDC - 12 - Stockage | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence |  002HM003183 n°300 - 1 (P300) - RDC - Vol 62 |
| 002HM003183P315 | RDC - 04 - Local de service | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence |  002HM003183 n°315 - 1 (P315) - RDC - Vol 47 |
| 002HM003183P325 | RDC - WC2 | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence |  002HM003183 n°325 - 1 (P325) - RDC - Vol 40 |


| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| 002HM003183P344P325 | RDC - WC4 | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence |  002HM003183 n°325 - 1 (P325) - RDC - Vol 40  002HM003183 n°300 - 1 (P300) - RDC - Vol 62 |
| 002HM003183P389 | R+1 - DG01 | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence |  002HM003183 n°389 - 1 (P389) - R+1 - Vol 79 |
| 002HM003183P391 | R+1 - DG01 | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de plinthe |  002HM003183 n°391 - 1 (P391) - R+1 - Vol 77 |


| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| 002HM003 183P401 | R+1 - 113 - WC handicapés | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de plinthe |  002HM003183 n°401 - 1 (P401) - R+1 - Vol 80 |
| 002HM003 183P402 | R+1 - 113 - WC handicapés | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence |  002HM003183 n°402 - 1 (P402) - R+1 - Vol 80 |
| 002HM003 183P416 | R+1 - 100 - Salle de sport | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre projeté |  002HM003183 n°416 - 1 (P416) - R+1 - Vol 76 |
| 002HM003 183P423 | Toiture - TER2 LGT | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments associés à la toiture | Conduit + Mitron |  002HM003183 n°423 - 2 (P423) - R+2 - Vol 87 |

| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| 002HM003 183P470 | FACADES | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Nez de marche |  002HM003183 n°470 - 1 (P470) - Façades - Vol 97 (Façades) |
| 002HM003 183P473 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) |  002HM003183 n°473 - 1 (P473) - Façades - Vol 97 (Façades) |
| 002HM003 183P474 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) |  002HM003183 n°474 - 1 (P474) - Façades - Vol 97 (Façades) |
| 002HM003 183P476 | FACADES | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Joint de dilatation |  002HM003183 n°476 - 1 (P476) - Façades - Vol 97 (Façades) |

| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| 002HM003 183P481 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) |  002HM003183 n°481 - 1 (P481) - Façades - Vol 97 (Façades) |
| 002HM003 183P482 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) |  002HM003183 n°482 - 1 (P482) - Façades - Vol 97 (Façades) |
| 002HM003 183P483 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) |  002HM003183 n°483 - 1 (P483) - Façades - Vol 97 (Façades) |
| 002HM003 183P486 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) |  002HM003183 n°486 - 1 (P486) - Façades - Vol 97 (Façades) |


| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| 002HM003 183P487 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) |  002HM003183 n°487 - 1 (P487) - Façades - Vol 97 (Façades) |
| 002HM003 183P492 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) |  002HM003183 n°492 - 1 (P492) - Façades - Vol 97 (Façades) |
| 002HM003 183P493 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) |  002HM003183 n°493 - 1 (P493) - Façades - Vol 97 (Façades) |
| 002HM003 183P51 | RDC - 26 - Vestiaire | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence |  002HM003183 n°51 - 1 (P51) - RDC - Vol 14 |
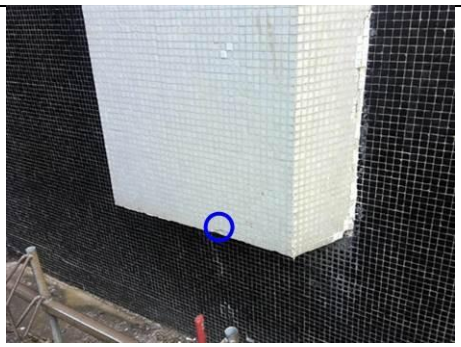
| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| 002HM003183P98 | RDC - 38 - Bureau | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle bitumineuse |  002HM003183 n°98 - 1 (P98) - RDC - Vol 20 |
| 002HM003183S109 | RDC - 38 - Bureau | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Dalle de sol |  S109 - 1 (S109) - RDC - Vol 20 |
| 002HM003183S44 | RDC - 30 - Vestiaire | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Dalle de sol |  S44 - 1 (S44) - RDC - Vol 16 |
| P001 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) |  |
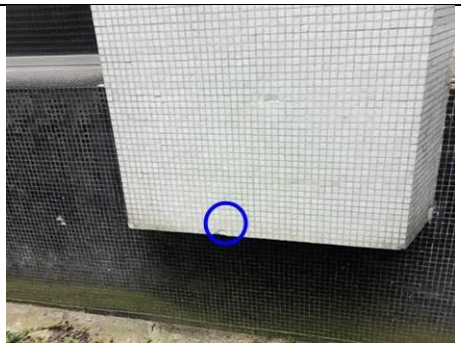
| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| P002 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) |  |
| P003 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Joint de dilatation |  |
| P004 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) |  |
| P005 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité |  |

| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| P006 | R+1 - 100 - Salle de sport | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments sous toiture | Isolant sous toiture |  |
| P007 | R+1 - 100 - Salle de sport | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits air | Peinture bitumineuse |  |
| P008 | R+1 - 100 - Salle de sport | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint plat prédécoupé pour brides |  |
| P009 | R+1 - 112 - Salle de sport | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment |  |

| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| P010 | R+1 - 111 - Salle de sport | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Sol coulé à base ciment |  |
| P011 | R+1 - 111 - Salle de sport | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Isolant sous parquet |  |
| P012 | R+1 - 100 - Salle de sport | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit à base de plâtre projeté |  |
| P013 | R+1 - 100 - Salle de sport | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité |  |
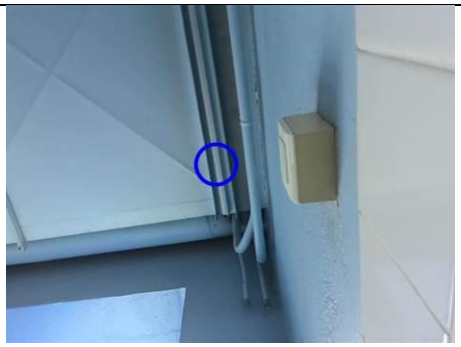
| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| P014 | R+1 - 100 - Salle de sport | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché |  |
| P015 | R+1 - 100 - Salle de sport | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché |  |
| P016 | R+1 - 100 - Salle de sport | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | Enduit de lissage |  |
| P017 | RDC - 13A - SAS | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint entre éléments |  |

| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| P018 | Toiture - TER02 - Terrasse | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) |  |
| P019 | Toiture - TER2 LGT | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) + Couche2: Isolant |  |
| P020 | Toiture - TER2 LGT | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) + Couche2: Isolant |  |
| P021 | Toiture - TER2 LGT | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) |  |

| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| P022 | Toiture - TER2 LGT | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) |  |
| P023 | Toiture - TER03 - Terrasse | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) + Couche2: Isolant |  |
| P024 | Toiture - TER03 - Terrasse | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) + Couche2: Isolant |  |
| P025 | Toiture - TER03 - Terrasse | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) |  |

| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| P026 | Toiture - TER03 - Terrasse | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Partie plane : pare vapeur |  |
| P027 | Toiture - TER03 - Terrasse | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Couche1: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) + Couche2: Isolant |  |
| P028 | Toiture - TER03 - Terrasse | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) |  |
| P029 | Toiture - TER03 - Terrasse | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) + Couche2: Isolant |  |

| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| P030 | Toiture - TER03 - Terrasse | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) + Couche2: Isolant |  |
| P031 | Toiture - TER03 - Terrasse | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) |  |
| P032 | Toiture - TER02 - Terrasse | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) |  |
| P033 | Toiture - TER01 - Terrasse | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Couche1: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) + Couche2: Isolant |  |

| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| P034 | Toiture - TER01 - Terrasse | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) |  |
| P035 | Toiture - TER01 - Terrasse | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) + Couche2: Isolant |  |
| P036 | Toiture - TER01 - Terrasse | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) + Couche2: Isolant |  |
| P037 | Toiture - TER01 - Terrasse | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) |  |

| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| P038 | Toiture - TER01 - Terrasse | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) |  |
| P039 | Toiture - TER01 - Terrasse | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Partie plane : pare vapeur |  |
| P040 | Toiture - TER01 - Terrasse | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) |  |
| P041 | R+1 - LOG3 - Salle de bain | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Plot de colle fixant les cloisons au mur |  |


| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| P042 | R+1 - LOG6 - Dégagement | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage |  |
| P043 | R+1 - LOG3 - Salle de bain | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage |  |
| P044 | Toiture - TER1 LGT | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) |  |
| P045 | Toiture - TER1 LGT | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Partie plane : pare vapeur |  |

| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| P046 | Toiture - TER1 LGT | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) |  |
| P047 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) |  |
| P048 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) |  |
| P049 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) |  |


| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| P050 | Toiture - TER2 LGT | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) |  |
| P051 | Toiture - TER2 LGT | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Partie plane : pare vapeur |  |
| P052 | Toiture - TER2 LGT | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse | Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) |  |
| P053 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) |  |

| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| P054 | RDC - 12 - Stockage | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint entre éléments |  |
| P055 | RDC - DG4 | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint entre éléments |  |
| P056 | R+2 - LTE01 - Centrale traitement d'air | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint entre éléments |  |
| P057 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité |  |

| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| P058 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité |  |
| P059 | RDC - 27 - Chaufferie | 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques | Panneaux + Isolant |  |
| P060 | RDC - 27 - Chaufferie | 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques | Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) |  |
| P061 | RDC - 27 - Chaufferie | 3 - Parois verticales intérieures - Menuiserie | Reprise d'étanchéité |  |

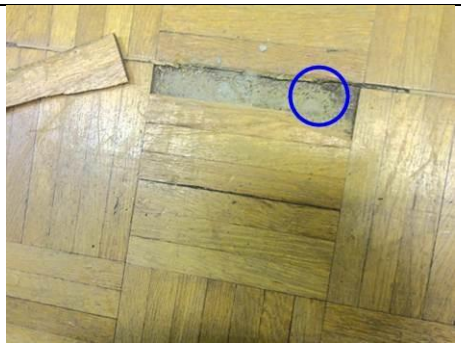
| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| P062 | RDC - DG4 | 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques | Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) |  |
| P063 | RDC - 21 - Salle de sport | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage |  |
| P064 | RDC - 17 - Salle de sport | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage |  |
| P065 | RDC - 17 - Salle de sport | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de panneaux |  |

| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| P066 | RDC - 17 - Salle de sport | 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux métalliques | Peinture |  |
| P067 | RDC - 18 - Salle de sport | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Isolant |  |
| P068 | RDC - 18 - Salle de sport | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Étanchéité bitumineuse |  |
| P069 | RDC - 05 - Bureau | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage |  |
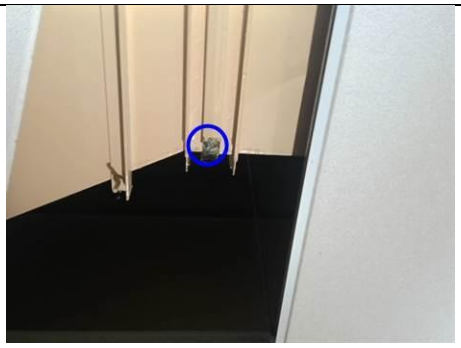
| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| P070 | RDC - 05 - Bureau | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence |  |
| P071 | RDC - 03 - Salle de réunion | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Joint entre éléments |  |
| P072 | RDC - WC1 | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de faïence |  |
| P073 | RDC - WC1 | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Colle de carrelage |  |

| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| P074 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité |  |
| P075 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité |  |
| P076 | FACADES | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Joint de dilatation |  |
| P077 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité |   |

| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| P078 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité |  |
| P079 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) |  |
| P080 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) |  |
| P081 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) |  |
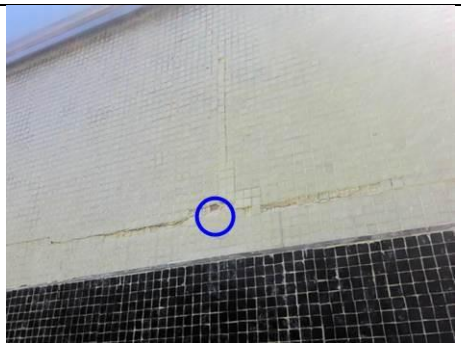
| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| P082 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité |  |
| P083 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) |  |
| P084 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) |  |
| P085 | FACADES | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | Joint de dilatation |  |

| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| P086 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité |  |
| P087 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité |  |
| P088 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) |  |
| P089 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Colle (faience, pate de verre, carrelage) |  |

| N° DE PRELEVEMENT | LOCALISATION | COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | DESCRIPTION | PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| P090 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux | Joint |  |
| P091 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité |  |
| P092 | FACADES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | Reprise d'étanchéité |  |

# *7.3 Annexe : RAPPORT D'ESSAIS*

## Copie des rapports d'essais :

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-22025 EN DATE DU **05/06/2026**

**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.*
*Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

| | |
|---|---|
| Client : DIAGOBAH ALSACE<br>1 Rue René Laennec<br>67300 Schiltigheim | Réf. Commande ITGA : IT0726-22025<br>Réf. Commande Client : 26MHE0439_2026_05_27_1652_3779 |

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 29/05/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Eléments analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG<br>Réf échantillon client : P001 - Colle (faience, pate de verre, carrelage) - FACADES | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40196<br>Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac | |
| Carrelage | --- | Non analysé | |
| 1 Colle beige en vrac | META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : ATH (6) |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG<br>Réf échantillon client : P002 - Colle (faience, pate de verre, carrelage) - FACADES | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40198<br>Description ITGA : Colle grise en vrac | |
| 1 Colle grise en vrac | META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : KAN (6) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 1/18

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-22025 EN DATE DU 05/06/2026
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40200 | |
| Réf échantillon client : P003 - Joint de dilatation - FACADES | | Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac | |
| 1 Matériau gris en faible quantité en vrac | MOLP + META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : HDZ<br>(6) |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40202 | |
| Réf échantillon client : P004 - Colle (faience, pate de verre, carrelage) - FACADES | | Description ITGA : Carrelage / Colle beige et grise en vrac | |
| Carrelage | --- | Non analysé | |
| 1 Colle beige et grise en vrac | META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : KAN<br>(6) |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40204 | |
| Réf échantillon client : P005 - Reprise d'etancheite - FACADES | | Description ITGA : Matériau mou gris et noir / **Matériau gris** | |
| 1 Matériau mou gris et noir + Matériau gris non séparable (2) | META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (4) / - | Autres fibres inhalables distinguées par M. (5)<br>Analyste : ILM<br>(7) |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40206 | |
| Réf échantillon client : P006 - Isolant sous toiture - R+1 - 100 - Salle de sport | | Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières | |
| 1 Matériau fibreux jaune avec poussières | MOLP + META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : HDZ |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40208 | |
| Réf échantillon client : P007 - Peinture bitumineuse - R+1 - 100 - Salle de sport | | Description ITGA : Peinture bitumineuse en vrac | |
| 1 Peinture bitumineuse en vrac | META (A) le 05/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1<br>(8) | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile | Analyste : TIS<br>(6) |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40210 | |
| Réf échantillon client : P008 - Joint plat predecoupe pour brides - R+1 - 100 - Salle de sport | | Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux marron avec fibres visibles | |
| 1 Peinture non séparable + Matériau fibreux marron avec fibres visibles (2) | MOLP le 03/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile | Analyste : VJG<br>(7) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.



DIAGOBAH 1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM | Tél : 03 67 97 45 50
4 rue du Bois de la Champelle - 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY | Tél : 03 54 51 58 5
RCS Nancy : 884 296 856 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10825380704

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-22025 EN DATE DU 05/06/2026
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Eléments analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40212 | |
| Réf échantillon client : P009 - Sol coule a base ciment - R+1 - 112 - Salle de sport | | Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène | |
| 1 Matériau compact gris hétérogène | META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : ATH |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40214 | |
| Réf échantillon client : P010 - Sol coule a base ciment - R+1 - 111 - Salle de sport | | Description ITGA : Matériau compact beige hétérogène | |
| 1 Matériau compact beige hétérogène | META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : ATH |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40216 | |
| Réf échantillon client : P011 - Isolant sous parquet - R+1 - 111 - Salle de sport | | Description ITGA : Mousse bleue | |
| 1 Mousse bleue | META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : ILM |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40218 | |
| Réf échantillon client : P012 - Enduit a base de platre projete - R+1 - 100 - Salle de sport | | Description ITGA : **Peinture en vrac** / Enduit plâtreux beige en vrac | |
| 1 Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable (2) | META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : OFP (6) |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40220 | |
| Réf échantillon client : P013 - Reprise d'etancheite - R+1 - 100 - Salle de sport | | Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact beige | |
| 1 Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable (2) | META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : KAN (7) |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40221 | |
| Réf échantillon client : P014 - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - R+1 - 100 - Salle de sport | | Description ITGA : **Peinture en vrac** / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac | |
| 1 Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable (2) | META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : ATH (6) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.



DIAGOBAH 1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM | Tél : 03 67 97 45 50
4 rue du Bois de la Champelle - 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY | Tél : 03 54 51 58 5
RCS Nancy : 884 296 856 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10825380704

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-22025 EN DATE DU 05/06/2026

## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40223 | |
| Réf échantillon client : P015 - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - R+1 - 100 - Salle de sport | | Description ITGA : **Peinture en vrac** / Enduit gris en vrac hétérogène | |
| 1 Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable (2) | META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : KAN<br>(6) |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40225 | |
| Réf échantillon client : P016 - Enduit a base de platre projete - R+1 - 100 - Salle de sport | | Description ITGA : **Peinture en vrac** / Enduit plâtreux blanc en vrac / **Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène** | |
| 1 Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable (2) | META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile | Analyste : ATH<br>(6) |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40227 | |
| Réf échantillon client : P017 - Joint entre elements - RDC - 13A - SAS | | Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Mousse noire en vrac | |
| 1 Peinture en faible quantité non séparable + Mousse noire en vrac non séparable (2) | META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : ILM<br>(6) |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40229 | |
| Réf échantillon client : P018 - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Toiture - TER02 - Terrasse | | Description ITGA : **Matériau noir** / Enduit beige en vrac | |
| 1 Matériau noir non séparable + Enduit beige en vrac non séparable (2) | META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : ATH<br>(6) |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40231 | |
| Réf échantillon client : P019 - Couche1: Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les ) + Couche2: Isolant - Toiture - TER2 LGT | | Description ITGA : Revêtement bitumineux noir / Matériau fibreux jaune | |
| 1 Revêtement bitumineux noir + Matériau fibreux jaune non séparable (2) | MOLP + META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : ILM<br>(7) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.



DIAGOBAH 1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM | Tél : 03 67 97 45 50
4 rue du Bois de la Champelle - 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY | Tél : 03 54 51 58 5'
RCS Nancy : 884 296 856 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10825380704

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-22025 EN DATE DU 05/06/2026

## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40234 | |
| Réf échantillon client : P020 - Couche1: Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les ) + Couche2: Isolant - Toiture - TER2 LGT | | Description ITGA : Revêtement bitumineux noir avec couche fibreuse | |
| 1 Revêtement bitumineux noir avec couche fibreuse | META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : ILM |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40236 | |
| Réf échantillon client : P021 - Releve : revetement bitumineux (bandes, les ) - Toiture - TER2 LGT | | Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile / **Matériau beige** | |
| 1 Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile + Matériau beige non séparable (2) | META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile | Analyste : ILM<br>(7) |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40238 | |
| Réf échantillon client : P022 - Releve : revetement bitumineux (bandes, les ) - Toiture - TER2 LGT | | Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons | |
| 1 Matériau bitumineux noir avec gravillons | META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : LDA |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40240 | |
| Réf échantillon client : P023 - Couche1: Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les ) + Couche2: Isolant - Toiture - TER03 - Terrasse | | Description ITGA : Revêtement bitumineux noir / Matériau fibreux jaune avec poussières | |
| 1 Revêtement bitumineux noir + Matériau fibreux jaune avec poussières non séparable (2) | MOLP + META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : ILM<br>(7) |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40242 | |
| Réf échantillon client : P024 - Couche1: Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les ) + Couche2: Isolant - Toiture - TER03 - Terrasse | | Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons / Bois sous forme de fibres | |
| 1 Matériau bitumineux noir avec gravillons | META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : ILM |
| Bois sous forme de fibres | --- | Non analysé | |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40244 | |
| Réf échantillon client : P025 - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les ) - Toiture - TER03 - Terrasse | | Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons | |
| 1 Matériau bitumineux noir avec gravillons | META (B) le 05/06/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : ILM |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.



DIAGOBAH 1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM | Tél : 03 67 97 45 50
4 rue du Bois de la Champelle - 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY | Tél : 03 54 51 58 5
RCS Nancy : 884 296 856 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10825380704

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-22025 EN DATE DU 05/06/2026
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40246 | |
| Réf échantillon client : P026 - Partie plane : pare vapeur - Toiture - TER03 - Terrasse | | Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons | |
| 1 Matériau bitumineux noir avec gravillons | META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : HDZ |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40248 | |
| Réf échantillon client : P027 - Couche1 : Releve : revetement bitumineux (bandes, les ) + Couche2 : Isolant - Toiture - TER03 - Terrasse | | Description ITGA : Revêtement bitumineux noir avec couche d'aluminium / Matériau fibreux beige avec poussières | |
| 1 Revêtement bitumineux noir avec couche d'aluminium | META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : ILM |
| 1 Matériau fibreux beige avec poussières | MOLP le 05/06/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3 | Amiante non détecté (3) / Aucune | Analyste : AKN |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40250 | |
| Réf échantillon client : P028 - Releve : revetement bitumineux (bandes, les ) - Toiture - TER03 - Terrasse | | Description ITGA : Revêtement bitumineux noir avec couche en toile | |
| 1 Revêtement bitumineux noir avec couche en toile | META (B) le 05/06/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : ILM |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40252 | |
| Réf échantillon client : P029 - Couche1 : Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les ) + Couche2 : Isolant - Toiture - TER03 - Terrasse | | Description ITGA : Revêtement bitumineux noir / Matériau fibreux jaune avec poussières | |
| 1 Revêtement bitumineux noir (2) + Matériau fibreux jaune avec poussières non séparable | MOLP + META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : ILM (7) |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40254 | |
| Réf échantillon client : P030 - Couche1 : Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les ) + Couche2 : Isolant - Toiture - TER03 - Terrasse | | Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche fibreuse | |
| 1 Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche fibreuse | META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : ILM |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.



DIAGOBAH 1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM | Tél : 03 67 97 45 50
4 rue du Bois de la Champelle - 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY | Tél : 03 54 51 58 5'
RCS Nancy : 884 296 856 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10825380704

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-22025 EN DATE DU 05/06/2026
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40256 | |
| Réf échantillon client : P031 - Releve : revetement bitumineux (bandes, les ) - Toiture - TER03 - Terrasse | | Description ITGA : Revêtement bitumineux noir avec couche d'aluminium | |
| 1 Revêtement bitumineux noir avec couche d'aluminium | META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile | Analyste : HDZ |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40258 | |
| Réf échantillon client : P032 - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les ) - Toiture - TER02 - Terrasse | | Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons | |
| 1 Matériau bitumineux noir avec gravillons | META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile | Analyste : HDZ |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40260 | |
| Réf échantillon client : P033 - Couche1 : Releve : revetement bitumineux (bandes, les ) + Couche2 : Isolant - Toiture - TER01 - Terrasse | | Description ITGA : Revêtement bitumineux noir avec couche d'aluminium et poussières / Matériau fibreux gris avec poussières | |
| 1 Revêtement bitumineux noir avec couche d'aluminium et poussières non séparable + Matériau fibreux gris avec poussières non séparable (2) | MOLP + META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 4<br>Nombre de supports d'analyse : 4 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile | Analyste : ILM<br>(7) |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40262 | |
| Réf échantillon client : P034 - Releve : revetement bitumineux (bandes, les ) - Toiture - TER01 - Terrasse | | Description ITGA : Revêtement bitumineux noir avec poussières / Matériau fibreux marron avec poussières | |
| 1 Revêtement bitumineux noir avec poussières non séparable + Matériau fibreux marron avec poussières non séparable (2) | MOLP + META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 4<br>Nombre de supports d'analyse : 4 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : LDA<br>(7) |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40264 | |
| Réf échantillon client : P035 - Couche1 : Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les ) + Couche2 : Isolant - Toiture - TER01 - Terrasse | | Description ITGA : Revêtement bitumineux noir / Matériau fibreux jaune | |
| 1 Revêtement bitumineux noir + Matériau fibreux jaune non séparable (2) | MOLP + META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : ILM<br>(7) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.



DIAGOBAH 1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM | Tél : 03 67 97 45 50
4 rue du Bois de la Champelle - 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY | Tél : 03 54 51 58 5
RCS Nancy : 884 296 856 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10825380704

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-22025 EN DATE DU 05/06/2026
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Eléments analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40266 | |
| Réf échantillon client : P036 - Couche1: Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les ) + Couche2: Isolant - Toiture - TER01 - Terrasse | | Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons / **Bois sous forme de fibres** | |
| 1 Matériau bitumineux noir avec gravillons | META (B) le 04/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : HDZ |
| Bois sous forme de fibres | --- | Non analysé | |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40268 | |
| Réf échantillon client : P037 - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les ) - Toiture - TER01 - Terrasse | | Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons | |
| 1 Matériau bitumineux noir avec gravillons | META (B) le 04/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : ILM |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40270 | |
| Réf échantillon client : P038 - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les ) - Toiture - TER01 - Terrasse | | Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche fibreuse et poussières | |
| 1 Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche fibreuse et poussières | META (B) le 04/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : ILM |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40272 | |
| Réf échantillon client : P039 - Partie plane : pare vapeur - Toiture - TER01 - Terrasse | | Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse | |
| 1 Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse | META (B) le 04/06/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : LDA |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40274 | |
| Réf échantillon client : P040 - Releve : revetement bitumineux (bandes, les ) - Toiture - TER01 - Terrasse | | Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche fibreuse et poussières | |
| 1 Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche fibreuse et poussières | META (B) le 04/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile | Analyste : ILM |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40276 | |
| Réf échantillon client : P041 - Plot de colle fixant les cloisons au mur - R+1 - LOG3 - Salle de bain | | Description ITGA : Colle blanche en vrac | |
| 1 Colle blanche en vrac | META (A) le 04/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : KAN (6) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.



DIAGOBAH 1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM | Tél : 03 67 97 45 50
4 rue du Bois de la Champelle - 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY | Tél : 03 54 51 58 5
RCS Nancy : 884 296 856 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10825380704

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-22025 EN DATE DU 05/06/2026
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40278 | |
| Réf échantillon client : P042 - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragreage - R+1 - LOC6 - Degagement | | Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac | |
| Carrelage | --- | Non analysé | |
| 1 Colle grise en vrac | META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : ATH<br>(6) |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40280 | |
| Réf échantillon client : P043 - Colle de carrelage - R+1 - LOC3 - Salle de bain | | Description ITGA : Carrelage / Colle beige hétérogène | |
| Carrelage | --- | Non analysé | |
| 1 Colle beige hétérogène | META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Présence de fibres d'amiante (1) / Chrysotile | Analyste : OFP |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40282 | |
| Réf échantillon client : P044 - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les ) - Toiture - TER1 LGT | | Description ITGA : Matériau souple noir | |
| 1 Matériau souple noir | META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : ILM |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40283 | |
| Réf échantillon client : P045 - Partie plane : pare vapeur - Toiture - TER1 LGT | | Description ITGA : **Papier avec couche en mousse / Matériau beige** | |
| 1 Papier avec couche en mousse | META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : AHZ |
| 1 Matériau beige | META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : KAN |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40285 | |
| Réf échantillon client : P046 - Releve : revetement bitumineux (bandes, les ) - Toiture - TER1 LGT | | Description ITGA : **Matériau souple noir / Colle polymère jaune / Matériau gris en vrac hétérogène** | |
| 1 Matériau souple noir + Colle polymère jaune non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable (2) | META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : ILM<br>(6) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.



DIAGOBAH 1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM | Tél : 03 67 97 45 50
4 rue du Bois de la Champelle - 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY | Tél : 03 54 51 58 5'
RCS Nancy : 884 296 856 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10825380704

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-22025 EN DATE DU 05/06/2026
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40287 | |
| Réf échantillon client : P047 - Colle (faience, pate de verre, carrelage) - FACADES | | Description ITGA : Colle grise en vrac hétérogène | |
| 1 Colle grise en vrac hétérogène | META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile | Analyste : ATH<br>(6) |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40289 | |
| Réf échantillon client : P048 - Colle (faience, pate de verre, carrelage) - FACADES | | Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac | |
| Carrelage | --- | Non analysé | |
| 1 Colle beige en vrac | META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile | Analyste : ATH<br>(6) |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40291 | |
| Réf échantillon client : P049 - Colle (faience, pate de verre, carrelage) - FACADES | | Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac | |
| Carrelage | --- | Non analysé | |
| 1 Colle beige en vrac | META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile | Analyste : KAN<br>(6) |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40293 | |
| Réf échantillon client : P050 - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les ) - Toiture - TER2 LGT | | Description ITGA : Revêtement bitumineux noir | |
| 1 Revêtement bitumineux noir | META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : ILM |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40295 | |
| Réf échantillon client : P051 - Partie plane : pare vapeur - Toiture - TER2 LGT | | Description ITGA : Matériau bitumineux noir | |
| 1 Matériau bitumineux noir | META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : ILM |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40298 | |
| Réf échantillon client : P052 - Releve : revetement bitumineux (bandes, les ) - Toiture - TER2 LGT | | Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile | |
| 1 Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile | META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile | Analyste : ILM |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.



DIAGOBAH 1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM | Tél : 03 67 97 45 50
4 rue du Bois de la Champelle - 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY | Tél : 03 54 51 58 5
RCS Nancy : 884 296 856 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10825380704

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-22025 EN DATE DU 05/06/2026

## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40300 | |
| Réf échantillon client : P053 - Colle (faience, pate de verre, carrelage) - FACADES | | Description ITGA : Carrelage / Colle blanche en vrac | |
| Carrelage | --- | Non analysé | |
| 1 Colle blanche en vrac | META (A) le 04/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile | Analyste : KAN (6) |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40301 | |
| Réf échantillon client : P054 - Joint entre elements - RDC - 12 - Stockage | | Description ITGA : **Peinture en vrac** / Matériau mou beige en vrac | |
| 1 Peinture en vrac non séparable + Matériau mou beige en vrac non séparable (2) | META (B) le 04/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (4) / - | Analyste : ILM (6) |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40304 | |
| Réf échantillon client : P055 - Joint entre elements - RDC - DG4 | | Description ITGA : Matériau bitumineux noir en vrac avec couche d'aluminium | |
| 1 Matériau bitumineux noir en vrac avec couche d'aluminium | META (B) le 04/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Anthophyllite | Analyste : ILM (6) |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40306 | |
| Réf échantillon client : P056 - Joint entre elements - R+2 - LTE01 - Centrale traitement d'air | | Description ITGA : Matériau souple noir | |
| 1 Matériau souple noir | META (B) le 04/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté / - | Analyste : ILM |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40308 | |
| Réf échantillon client : P057 - Reprise d'etancheite - FACADES | | Description ITGA : Matériau souple gris avec poussières / **Matériau beige** | |
| 1 Matériau souple gris avec poussières non séparable + Matériau beige non séparable | META (A) le 04/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté / - | Analyste : ATH |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40310 | |
| Réf échantillon client : P058 - Reprise d'etancheite - FACADES | | Description ITGA : Matériau mou gris avec poussières | |
| 1 Matériau mou gris avec poussières | META (B) le 04/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté / - | Analyste : ILM |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.



DIAGOBAH 1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM | Tél : 03 67 97 45 50
4 rue du Bois de la Champelle - 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY | Tél : 03 54 51 58 5'
RCS Nancy : 884 296 856 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10825380704

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-22025 EN DATE DU 05/06/2026
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Eléments analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40312 | |
| Réf échantillon client : P059 - Panneaux + Isolant - RDC - 27 - Chaufferie | | Description ITGA : Couche plâtreuse blanche en vrac / Matériau fibreux jaune en vrac avec poussières | |
| 1 Couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + Matériau fibreux jaune en vrac avec poussières non séparable | MOLP + META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3 | Amiante non détecté / - | Analyste : HDZ |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40314 | |
| Réf échantillon client : P060 - Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) - RDC - 27 - Chaufferie | | Description ITGA : Matériau souple noir / Matériau blanc en vrac avec fibres | |
| 1 Matériau souple noir non séparable + Matériau blanc en vrac avec fibres non séparable | MOLP + META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 5<br>Nombre de supports d'analyse : 5 | Amiante non détecté / - | Autres fibres inhalables distinguées par M.<br>Analyste : BEJ |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40316 | |
| Réf échantillon client : P061 - Reprise d'etancheite - RDC - 27 - Chaufferie | | Description ITGA : Matériau souple gris | |
| 1 Matériau souple gris | META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté / - | Analyste : ILM |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40318 | |
| Réf échantillon client : P062 - Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) - RDC - DG4 | | Description ITGA : Colle polymère incolore avec poussières / Matériau souple noir / Matériau blanc en vrac avec fibres | |
| 1 Colle polymère incolore avec poussières non séparable + Matériau souple noir non séparable + Matériau blanc en vrac avec fibres non séparable | MOLP + META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3 | Amiante non détecté / - | Analyste : ILM |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40320 | |
| Réf échantillon client : P063 - Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ) de revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - RDC - 21 - Salle de sport | | Description ITGA : Revêtement souple beige avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris | |
| 1 Revêtement souple beige avec couche en toile | META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté / - | Analyste : ATH |
| 1 Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable | META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté / - | Analyste : ATH |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.



DIAGOBAH 1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM | Tél : 03 67 97 45 50
4 rue du Bois de la Champelle - 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY | Tél : 03 54 51 58 5
RCS Nancy : 884 296 856 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10825380704

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-22025 EN DATE DU 05/06/2026
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40321 | |
| Réf échantillon client : P064 - Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ) de revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - RDC - 17 - Salle de sport | | Description ITGA : Revêtement cassant vert avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris | |
| 1 Revêtement cassant vert avec couche en toile | META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté / - | Analyste : KAN |
| 1 Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable | META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté / - | Analyste : KAN |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40324 | |
| Réf échantillon client : P065 - Colle de panneaux - RDC - 17 - Salle de sport | | Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse | |
| 1 Colle polymère jaune avec couche en mousse | META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté / - | Analyste : ILM |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40325 | |
| Réf échantillon client : P066 - Peinture - RDC - 17 - Salle de sport | | Description ITGA : Peintures multiples en vrac / **Matériau beige en faible quantité** | |
| 1 Peintures multiples en vrac | META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté / - | Analyste : AHZ |
| Matériau beige en faible quantité | --- | Quantité insuffisante pour analyse | |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40327 | |
| Réf échantillon client : P067 - Isolant - RDC - 18 - Salle de sport | | Description ITGA : Matériau fibreux rose / Matériau fibreux marron | |
| 1 Matériau fibreux rose non séparable + Matériau fibreux marron non séparable | MOLP + META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3 | Amiante non détecté / - | Analyste : HDZ |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40329 | |
| Réf échantillon client : P068 - Etancheite bitumineuse - RDC - 18 - Salle de sport | | Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse | |
| 1 Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse | META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté / - | Analyste(s) : ILM / HDZ |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.



DIAGOBAH 1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM | Tél : 03 67 97 45 50
4 rue du Bois de la Champelle - 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY | Tél : 03 54 51 58 5'
RCS Nancy : 884 296 856 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10825380704

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-22025 EN DATE DU 05/06/2026
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40331 | |
| Réf échantillon client : P069 - Colle de carrelage - RDC - 05 - Bureau | | Description ITGA : Carrelage / Colle beige / **Joint cassant beige** | |
| Carrelage + Joint cassant beige | --- | Non analysé | |
| 1 Colle beige | META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté / - | Analyste : ATH |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40333 | |
| Réf échantillon client : P070 - Colle de faience - RDC - 05 - Bureau | | Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle grise en vrac | |
| Carrelage en vrac | --- | Non analysé | |
| 1 Colle grise en vrac | META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile | Analyste : KAN |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40335 | |
| Réf échantillon client : P071 - Joint entre elements - RDC - 03 - Salle de reunion | | Description ITGA : Mousse noire | |
| 1 Mousse noire | META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté / - | Analyste : ILM |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40337 | |
| Réf échantillon client : P072 - Colle de faience - RDC - WC1 | | Description ITGA : **Peinture en faible quantité en vrac** / Colle grise en vrac | |
| 1 Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Colle grise en vrac non séparable | META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile | Analyste : ATH |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40339 | |
| Réf échantillon client : P073 - Colle de carrelage - RDC - WC1 | | Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle grise en vrac hétérogène | |
| Carrelage en vrac | --- | Non analysé | |
| 1 Colle grise en vrac hétérogène | META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté / - | Analyste : ATH |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40341 | |
| Réf échantillon client : P074 - Reprise d'etancheite - FACADES | | Description ITGA : **Peinture** / Matériau souple incolore | |
| 1 Peinture non séparable + Matériau souple incolore | META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté / - | Analyste : HDZ |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.



DIAGOBAH 1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM | Tél : 03 67 97 45 50
4 rue du Bois de la Champelle - 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY | Tél : 03 54 51 58 5'
RCS Nancy : 884 296 856 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10825380704

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-22025 EN DATE DU 05/06/2026

## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40343 | |
| Réf échantillon client : P075 - Reprise d'etancheite - FACADES | | Description ITGA : Matériau mou gris | |
| 1 Matériau mou gris | META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté / - | Analyste : ILM |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40346 | |
| Réf échantillon client : P076 - Joint de dilatation - FACADES | | Description ITGA : Matériau bitumineux noir | |
| 1 Matériau bitumineux noir | META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile | Analyste : ILM |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40347 | |
| Réf échantillon client : P077 - Reprise d'etancheite - FACADES | | Description ITGA : Matériau mou gris | |
| 1 Matériau mou gris | META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté / - | Analyste : ILM |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40349 | |
| Réf échantillon client : P078 - Reprise d'etancheite - FACADES | | Description ITGA : Matériau mou gris avec poussières | |
| 1 Matériau mou gris avec poussières | META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté / - | Analyste : ILM |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40352 | |
| Réf échantillon client : P079 - Colle (faience, pate de verre, carrelage) - FACADES | | Description ITGA : Colle grise en vrac hétérogène | |
| 1 Colle grise en vrac hétérogène | META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile | Analyste : AHZ |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40355 | |
| Réf échantillon client : P080 - Colle (faience, pate de verre, carrelage) - FACADES | | Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac | |
| Carrelage | --- | Non analysé | |
| 1 Colle grise en vrac | META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté / - | Analyste : OFP |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.



DIAGOBAH 1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM | Tél : 03 67 97 45 50
4 rue du Bois de la Champelle - 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY | Tél : 03 54 51 58 5
RCS Nancy : 884 296 856 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10825380704

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-22025 EN DATE DU 05/06/2026
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40357 | |
| Réf échantillon client : P081 - Colle (faience, pate de verre, carrelage) - FACADES | | Description ITGA : Colle beige en vrac / **Matériau rouge en vrac** | |
| 1 Colle beige en vrac non séparable + Matériau rouge en vrac non séparable | META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile | Autres fibres inhalables distinguées par M.<br>Analyste : BEJ |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40358 | |
| Réf échantillon client : P082 - Reprise d'etancheite - FACADES | | Description ITGA : Matériau souple blanc avec poussières | |
| 1 Matériau souple blanc avec poussières | META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté / - | Analyste : ILM |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40360 | |
| Réf échantillon client : P083 - Colle (faience, pate de verre, carrelage) - FACADES | | Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac | |
| Carrelage | --- | Non analysé | |
| 1 Colle grise en vrac | META (A) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile | Analyste : KAN |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40362 | |
| Réf échantillon client : P084 - Colle (faience, pate de verre, carrelage) - FACADES | | Description ITGA : Colle beige en vrac hétérogène | |
| 1 Colle beige en vrac hétérogène | META (A) le 05/06/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile | Analyste : LDA |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40365 | |
| Réf échantillon client : P085 - Joint de dilatation - FACADES | | Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec poussières | |
| 1 Matériau bitumineux noir avec poussières | META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile | Analyste : ILM |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40367 | |
| Réf échantillon client : P086 - Reprise d'etancheite - FACADES | | Description ITGA : Matériau souple gris | |
| 1 Matériau souple gris | META (B) le 04/06/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté / - | Analyste : ILM |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.



DIAGOBAH 1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM | Tél : 03 67 97 45 50
4 rue du Bois de la Champelle - 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY | Tél : 03 54 51 58 5
RCS Nancy : 884 296 856 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10825380704

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-22025 EN DATE DU 05/06/2026
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40368 | |
| Réf échantillon client : P087 - Reprise d'etancheite - FACADES | | Description ITGA : Matériau mou gris avec poussières | |
| 1 Matériau mou gris avec poussières | META (B) le 04/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté / - | Analyste : ILM |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40370 | |
| Réf échantillon client : P088 - Colle (faience, pate de verre, carrelage) - FACADES | | Description ITGA : Colle beige en vrac hétérogène | |
| 1 Colle beige en vrac hétérogène | META (A) le 04/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté / - | Analyste : ATH |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40372 | |
| Réf échantillon client : P089 - Colle (faience, pate de verre, carrelage) - FACADES | | Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac | |
| Carrelage | --- | Non analysé | |
| 1 Colle beige en vrac | META (A) le 04/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté / - | Analyste : ATH |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40373 | |
| Réf échantillon client : P090 - Joint - FACADES | | Description ITGA : **Matériau blanc en faible quantité** / Matériau souple noir | |
| 1 Matériau blanc en faible quantité non séparable + Matériau souple noir | META (B) le 04/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté / - | Analyste : ILM |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40375 | |
| Réf échantillon client : P091 - Reprise d'etancheite - FACADES | | Description ITGA : **Peinture** / Matériau souple blanc | |
| 1 Peinture non séparable + Matériau souple blanc | META (B) le 04/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté / - | Analyste : ILM |
| Réf dossier client : 26MHE0439 - 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | | Réf échantillon ITGA : IT072605-40377 | |
| Réf échantillon client : P092 - Reprise d'etancheite - FACADES | | Description ITGA : Matériau mou gris | |
| 1 Matériau mou gris | META (B) le 04/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté / - | Analyste : HDZ |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.



DIAGOBAH 1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM | Tél : 03 67 97 45 50
4 rue du Bois de la Champelle - 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY | Tél : 03 54 51 58 5
RCS Nancy : 884 296 856 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10825380704

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-22025 EN DATE DU 05/06/2026

## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|

(1) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées.
(2) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(3) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).
(4) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(5) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(6) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(7) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
(8) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.
1.accréditation n° 1-5967

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.



DIAGOBAH 1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM | Tél : 03 67 97 45 50
4 rue du Bois de la Champelle - 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY | Tél : 03 54 51 58 5'
RCS Nancy : 884 296 856 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10825380704

# *7.4 Annexe*

# *RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ*

*L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.*
*Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.*

## *1. INFORMATIONS GÉNÉRALES*

***a) Dangerosité de l'amiante***

*Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.*

***b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation***

*L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.*
*En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.*
*Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.*
*De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.*

## *3. INTERVENTION DE PROFESSIONNELS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL*

*Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.*
*Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.*
*Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).*

## *4. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SECURITÉ*

*Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :*
- *perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;*
- *remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;*
- *travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.*

*L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.*
*Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.*
*Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.*

## *5. GESTION DES DÉCHETS CONTENANT DE L'AMIANTE*

*Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.*
*Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.*
*Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.*

### *a. Conditionnement des déchets*
*Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.*
*Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.*

### *b. Apport en déchèterie*
*Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.*
*A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.*

### *c. Filières d'élimination des déchets*
*Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.*
*Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.*

### *d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante*
*Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :*
- *de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;*
- *du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux;*
- *de la mairie ;*
- *ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.*


### *e. Traçabilité*
*Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).*
*Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.*
*Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.*

# *7.5 Annexe : AUTRES DOCUMENTS*



**RDC - ZOOM 1 - ACTIONS MENÉES**

Référence: 002hm003183

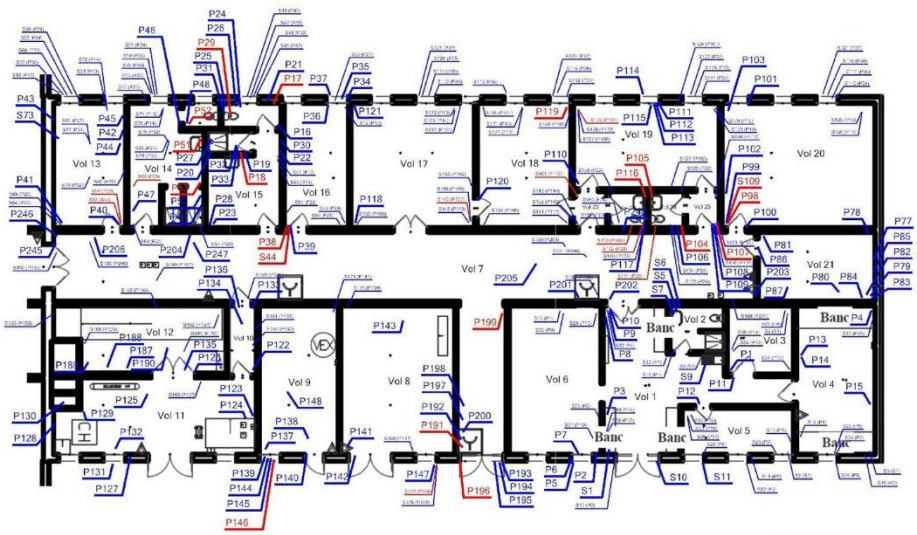


Légende


| | |
|---|---|
| P | Localisation dun prélèvement positif |
| P | Localisation dun prélèvement |
| S | Localisation dun sondage négatif |
| S | Localisation dun sondage positif |

| | Adresse du bien | Désignation | Date intervention | Technicien intervenant |
|---|---|---|---|---|
| AC ENVIRONNEMENT | 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | 12/12/2017 | WEBER Regis |

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120 Assurée par : HDI Global SE N°782084?1-30015 (date de validité : du 01/01/2020 au 31/12/2020) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954

**RDC - ZOOM 2 - ACTIONS MENÉES**


Référence: 002hm003183

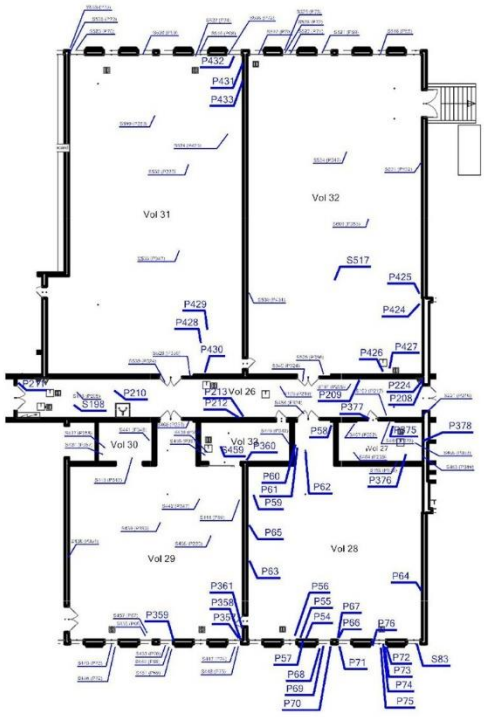


Légende

| | |
|---|---|
| P | Localisation dun prélèvement |
| S | Localisation dun sondage négatif |


Plan de situation



| Adresse du bien | Désignation | Date intervention | Technicien intervenant |
|---|---|---|---|
| 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | 12/12/2017 | WEBER Regis |


AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120 Assurée par : HDI Global SE N°782084?1-30015 (date de validité : du 01/01/2020 au 31/12/2020) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954


PAGE 357 / 520

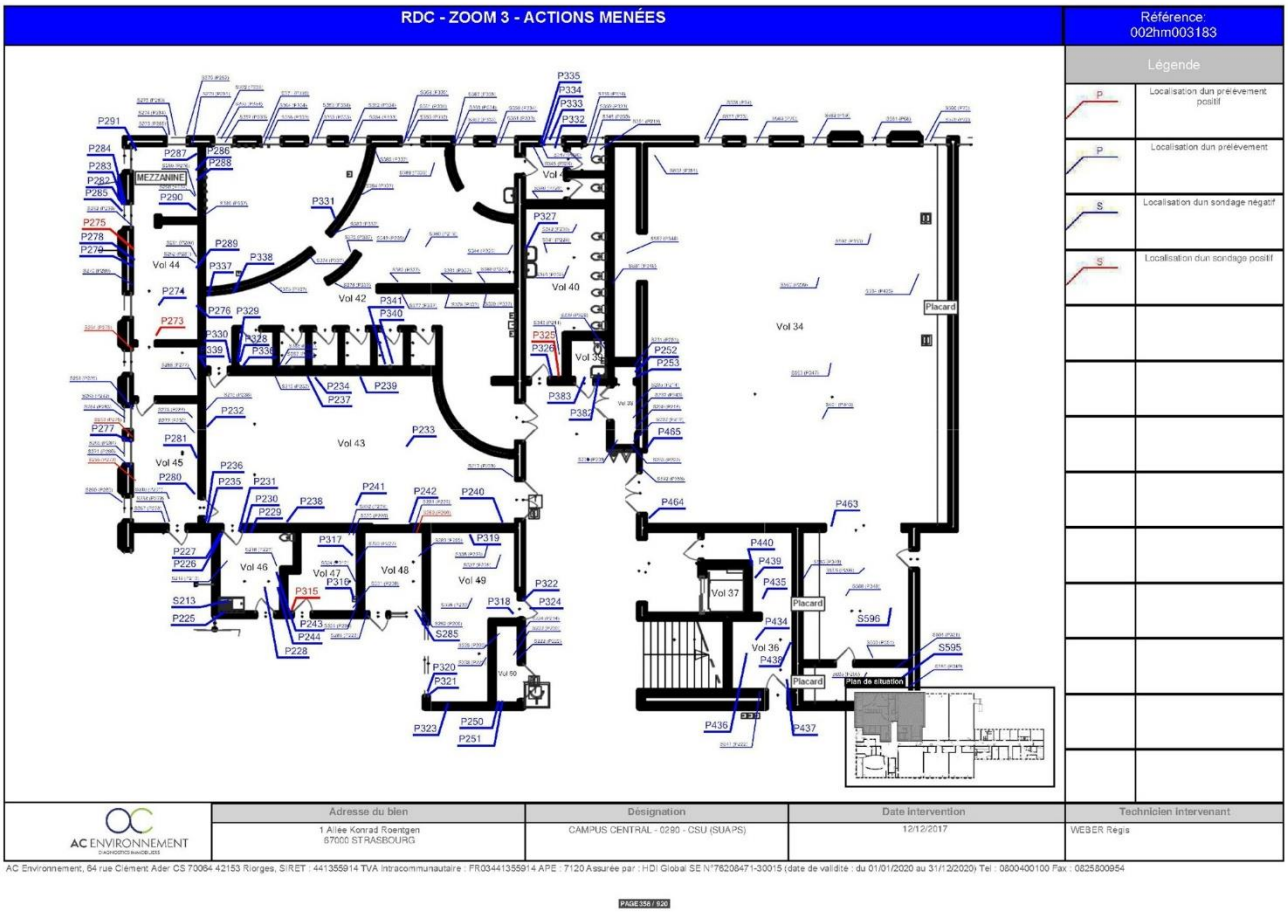



AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120 Assurée par : HDI Global SE N°782084?1-30015 (date de validité : du 01/01/2020 au 31/12/2020) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954

PAGE358 / 820

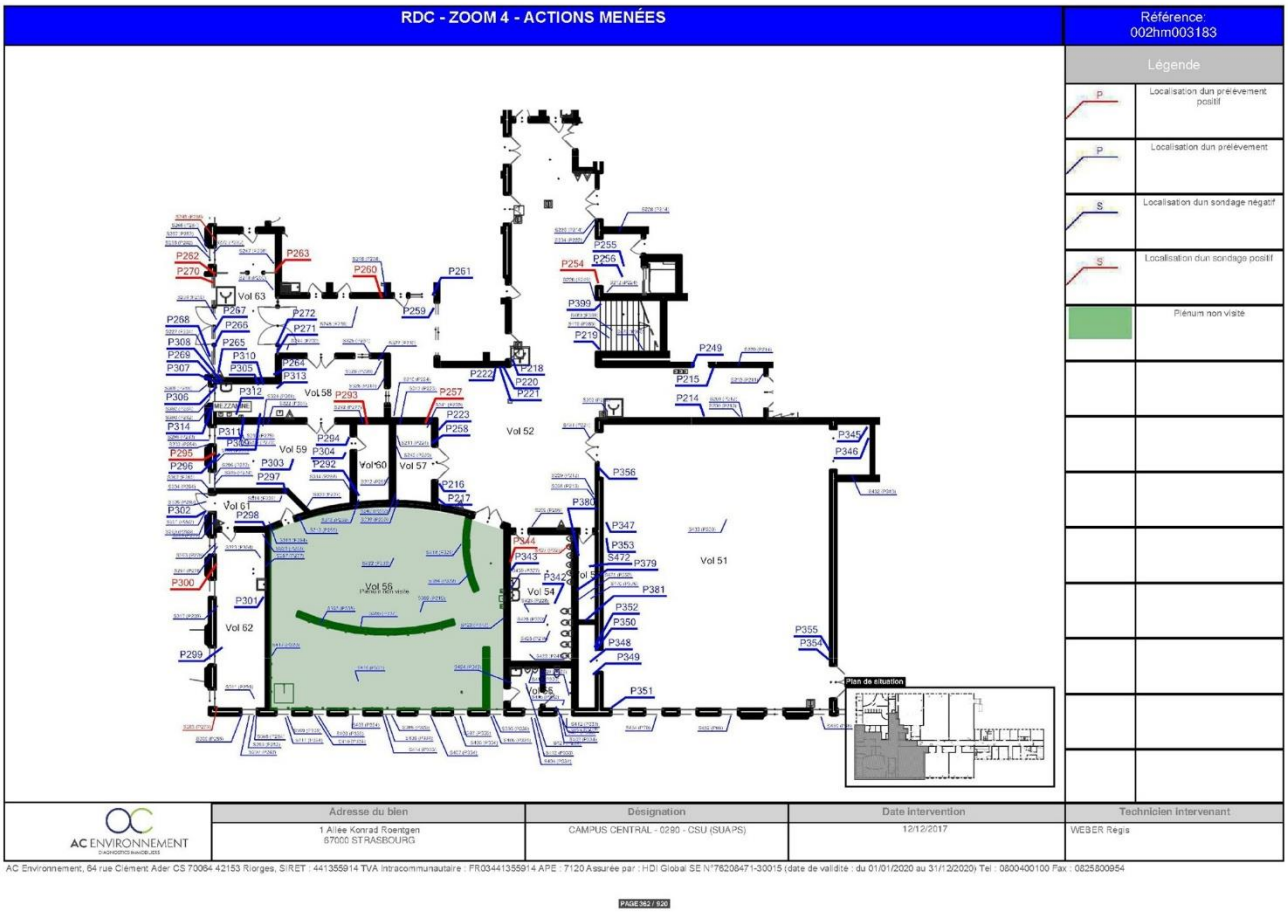

RDC - ZOOM 4 - ACTIONS MENÉES
Référence:
002hm003183
Légende
Localisation dun prélèvement positif
Localisation dun prélèvement
Localisation dun sondage négatif
Localisation dun sondage positif
Plénum non visité
Plan de situation
Adresse du bien
1 Allée Konrad Roentgen
67000 STRASBOURG
Désignation
CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS)
Date intervention
12/12/2017
Technicien intervenant
WEBER Regis
AC ENVIRONNEMENT

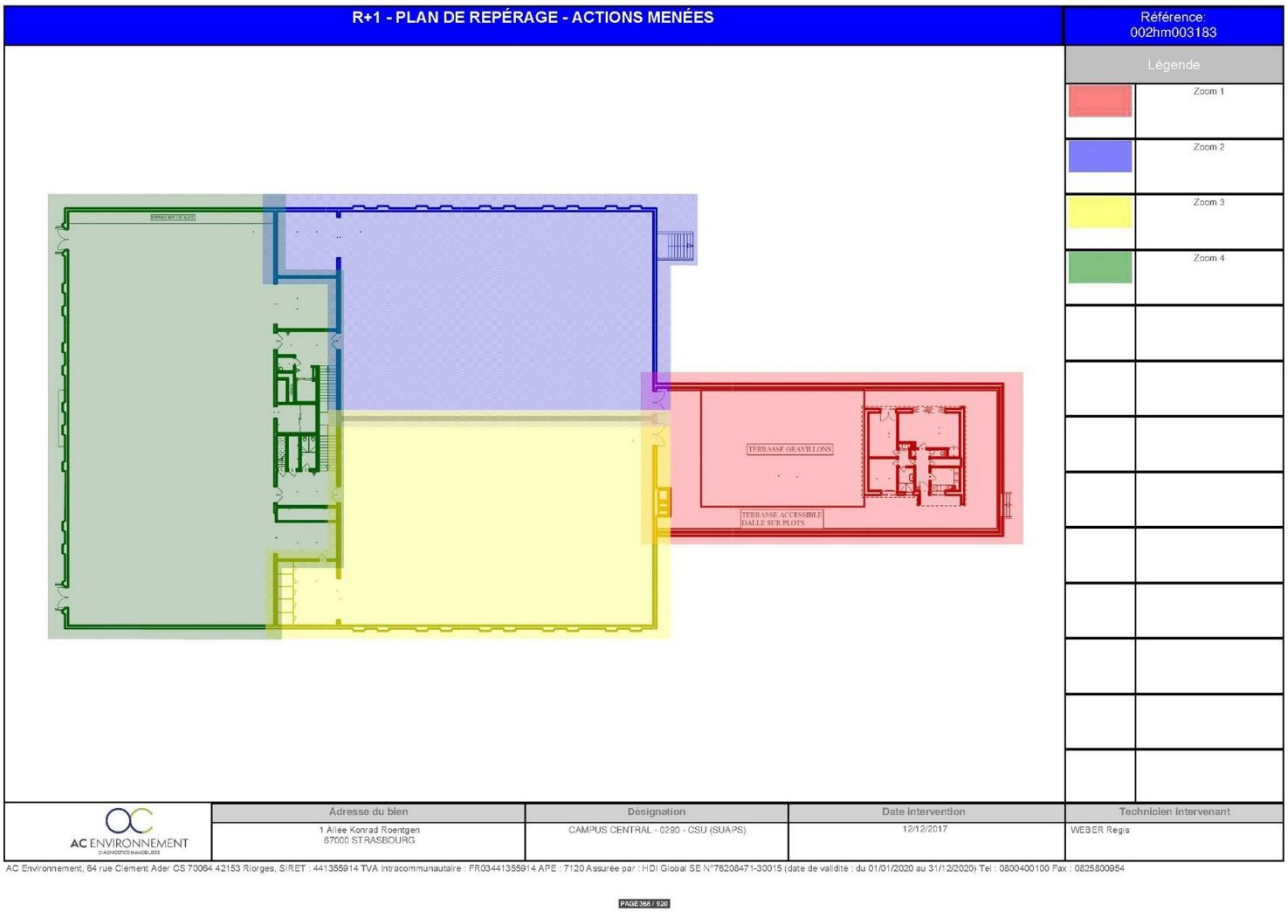
R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES
Référence:
002hm003183
Légende
Zoom 1
Zoom 2
Zoom 3
Zoom 4
TERRASSE GRAVILLONS
TERRASSE ACCESSIBLE DALLE SUR PLOTS
Adresse du bien
1 Allée Konrad Roentgen
67000 STRASBOURG
Désignation
CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS)
Date intervention
12/12/2017
Technicien intervenant
WEBER Regis
AC ENVIRONNEMENT
AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120 Assurée par : HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2020 au 31/12/2020) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
PAGE 368 / 920

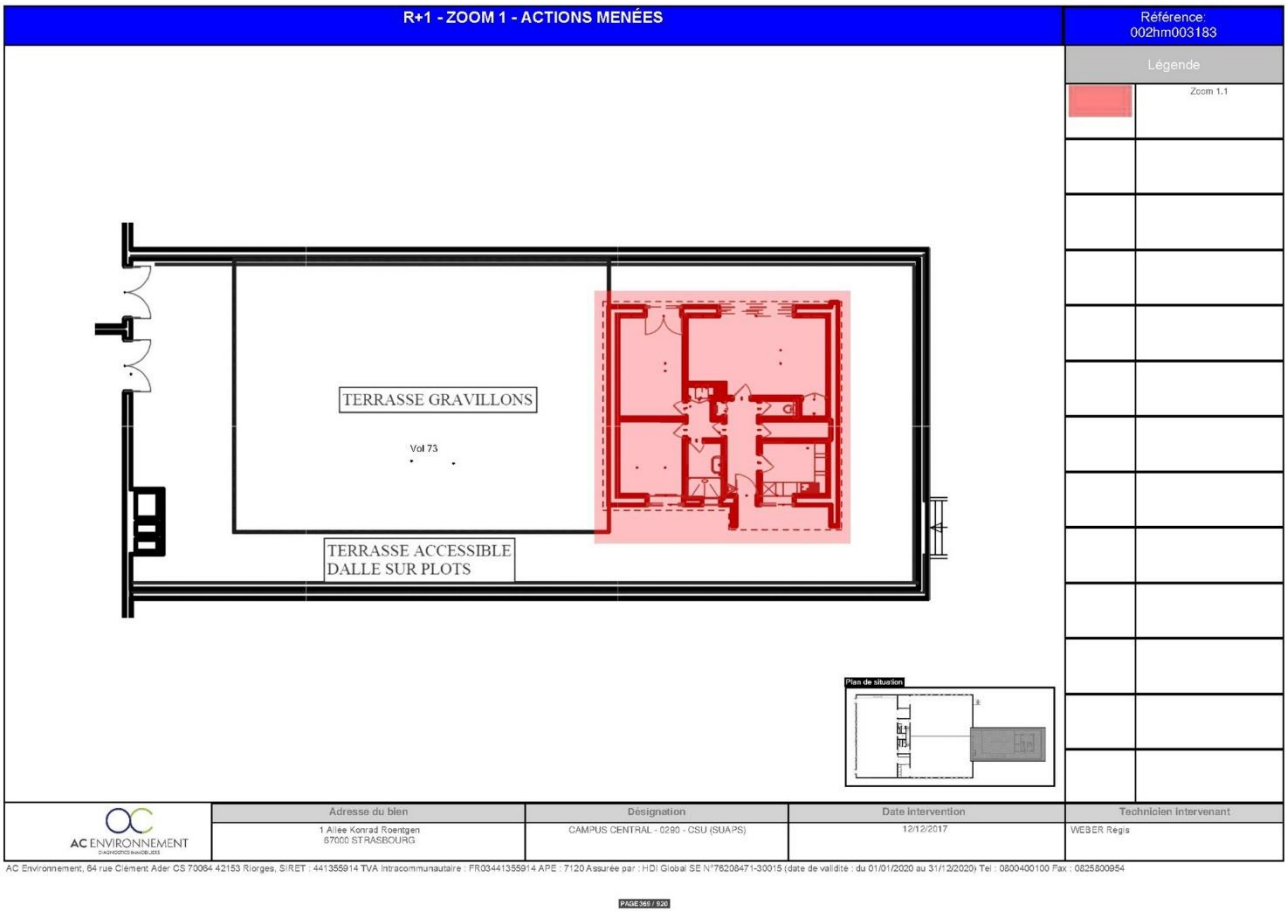

R+1 - ZOOM 1 - ACTIONS MENÉES
Référence:
002hm003183
Légende
Zoom 1.1
TERRASSE GRAVILLONS
Vol 73
TERRASSE ACCESSIBLE
DALLE SUR PLOTS
Plan de situation
Adresse du bien
1 Allée Konrad Roentgen
67000 STRASBOURG
Désignation
CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS)
Date intervention
12/12/2017
Technicien intervenant
WEBER Regis
AC ENVIRONNEMENT
AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120 Assurée par : HDI Global SE N°782084?1-30015 (date de validité : du 01/01/2020 au 31/12/2020) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
PAGE 366 / 520

**R+1 - ZOOM 1.1 - ACTIONS MENÉES**

Référence: 002hm003183

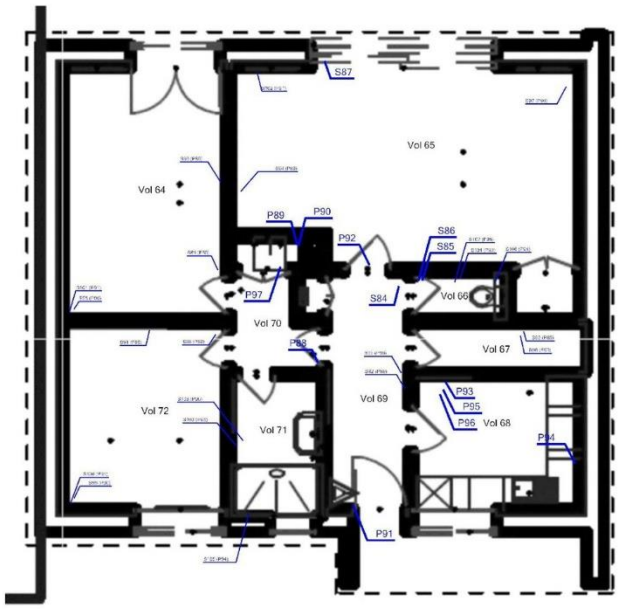



Plan de situation





Légende

| | |
|---|---|
| P | Localisation dun prélèvement |
| S | Localisation dun sondage négatif |

| Adresse du bien | Désignation | Date intervention | Technicien intervenant |
|---|---|---|---|
| 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | 12/12/2017 | WEBER Regis |

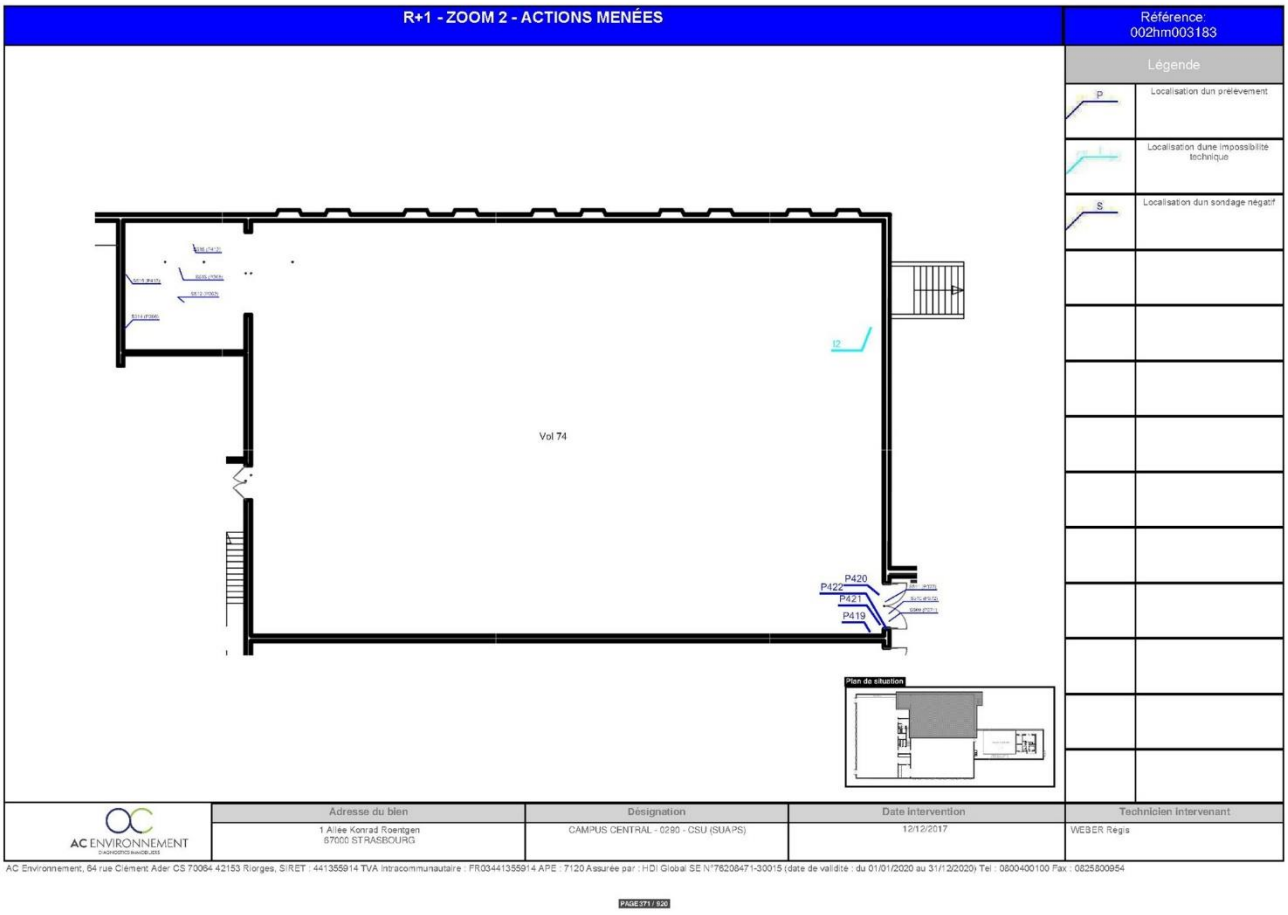

R+1 - ZOOM 2 - ACTIONS MENÉES
Référence:
002hm003183
Légende
P
Localisation dun prélèvement
Localisation dune impossibilité technique
S
Localisation dun sondage négatif
Vol 74
P420
P422
P421
P419
Plan de situation
Adresse du bien
1 Allée Konrad Roentgen
67000 STRASBOURG
Désignation
CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS)
Date intervention
12/12/2017
Technicien intervenant
WEBER Regis

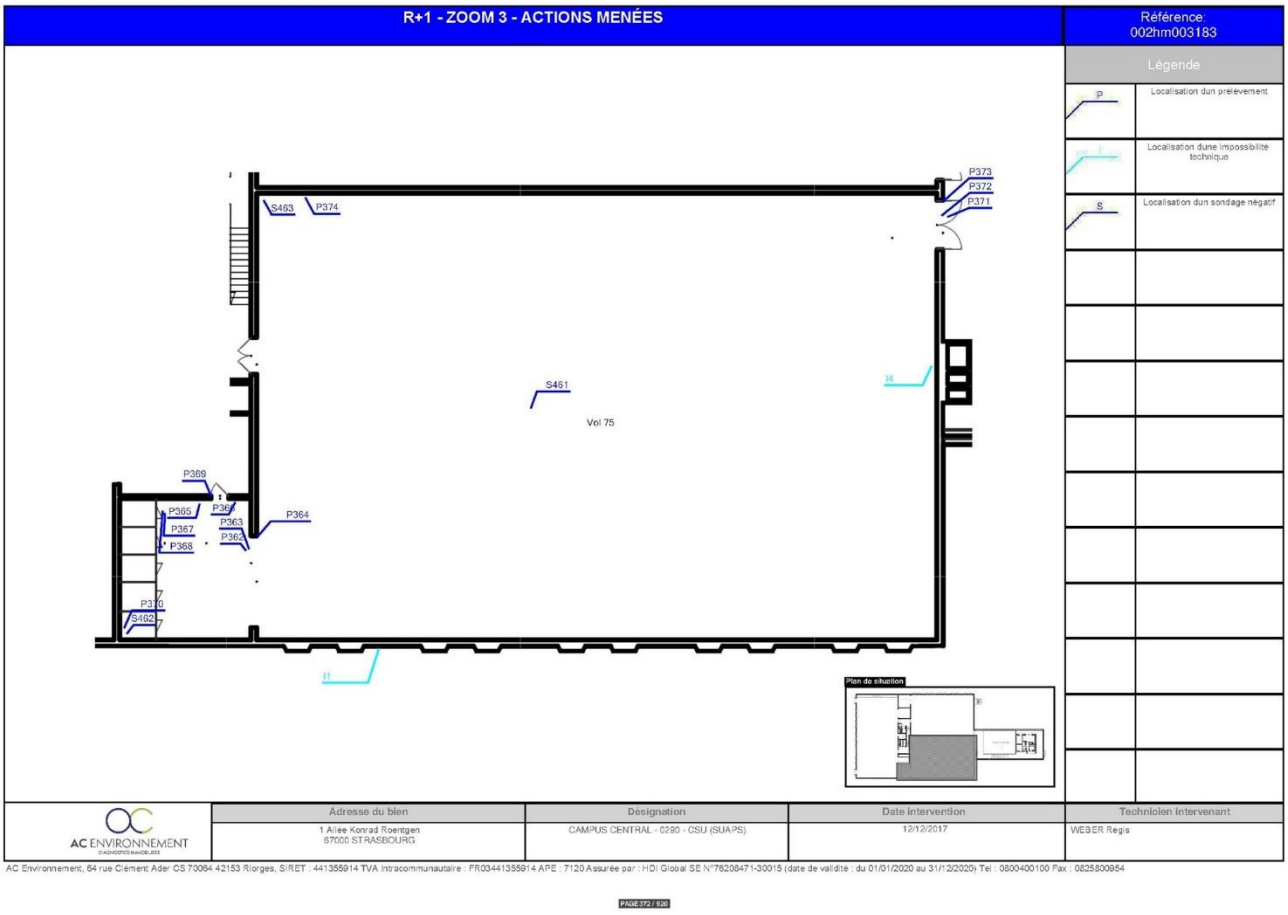
R+1 - ZOOM 3 - ACTIONS MENÉES
Référence:
002hm003183
Légende
P
Localisation dun prélèvement
Localisation dune impossibilité technique
S
Localisation dun sondage négatif
P373
P372
P371
S463
P374
S461
Vol 75
I4
P369
P365
P366
P363
P367
P368
P364
P370
S462
I1
Plan de situation
Adresse du bien
1 Allée Konrad Roentgen
67000 STRASBOURG
Désignation
CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS)
Date intervention
12/12/2017
Technicien intervenant
WEBER Regis
AC ENVIRONNEMENT
AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120 Assurée par : HDI Global SE N°782084?1-30015 (date de validité : du 01/01/2020 au 31/12/2020) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
PAGE 372 / 826

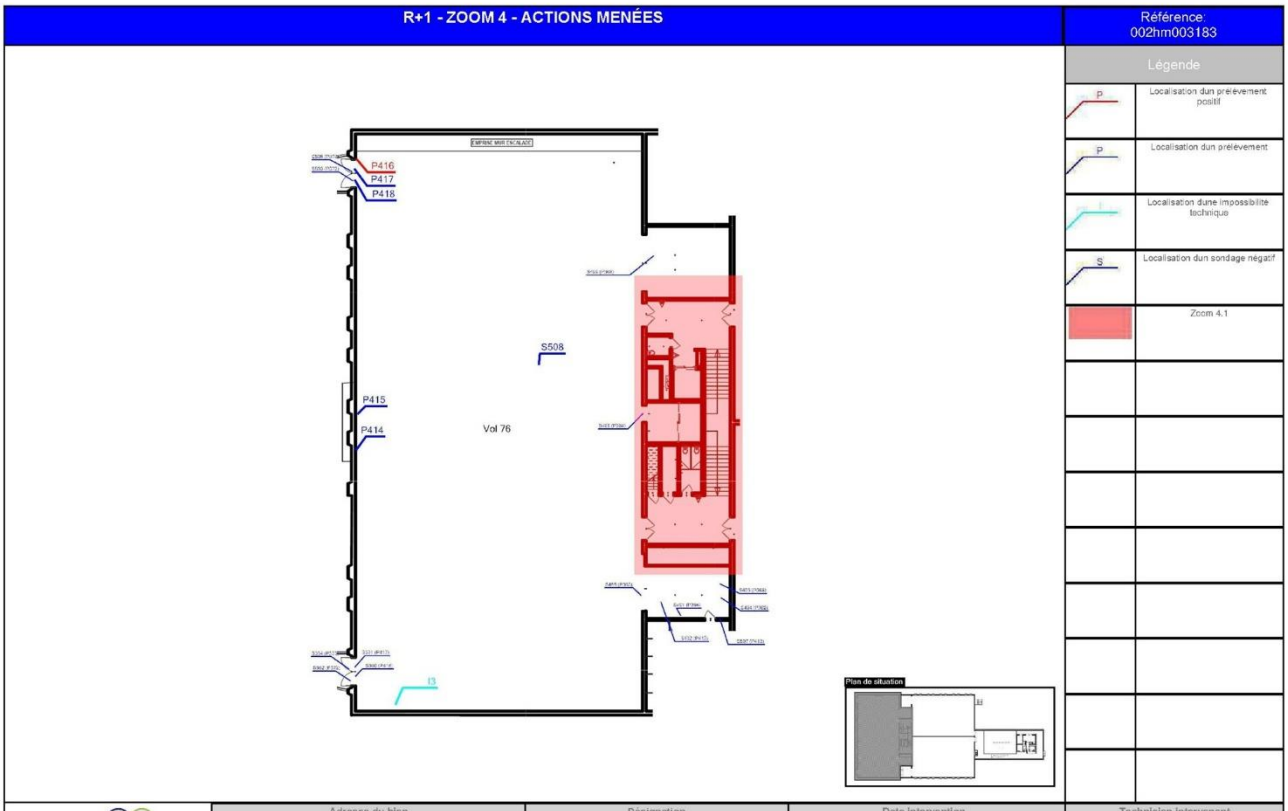
R+1 - ZOOM 4 - ACTIONS MENÉES
Référence:
002hm003183
Légende
Localisation dun prélèvement positif
Localisation dun prélèvement
Localisation dune impossibilité technique
Localisation dun sondage négatif
Zoom 4.1
P416
P417
P418
S508
P415
P414
Vol 76
I3
Plan de situation
Adresse du bien
1 Allée Konrad Roentgen
67000 STRASBOURG
Désignation
CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS)
Date intervention
12/12/2017
Technicien intervenant
WEBER Regis
AC ENVIRONNEMENT

**R+1 - ZOOM 4.1 - ACTIONS MENÉES**


Référence: 002hm003183

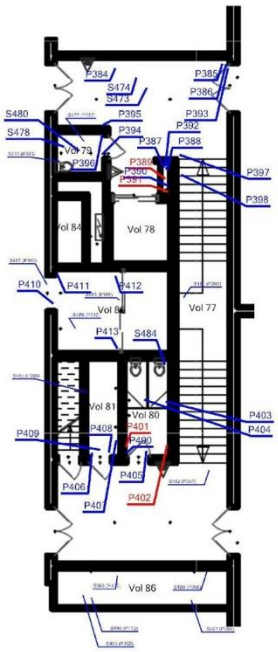



Légende

| | |
|---|---|
| P | Localisation dun prélèvement positif |
| P | Localisation dun prélèvement |
| S | Localisation dun sondage négatif |

Plan de situation



| AC ENVIRONNEMENT | Adresse du bien | Désignation | Date intervention | Technicien intervenant |
|---|---|---|---|---|
| | 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | 12/12/2017 | WEBER Regis |

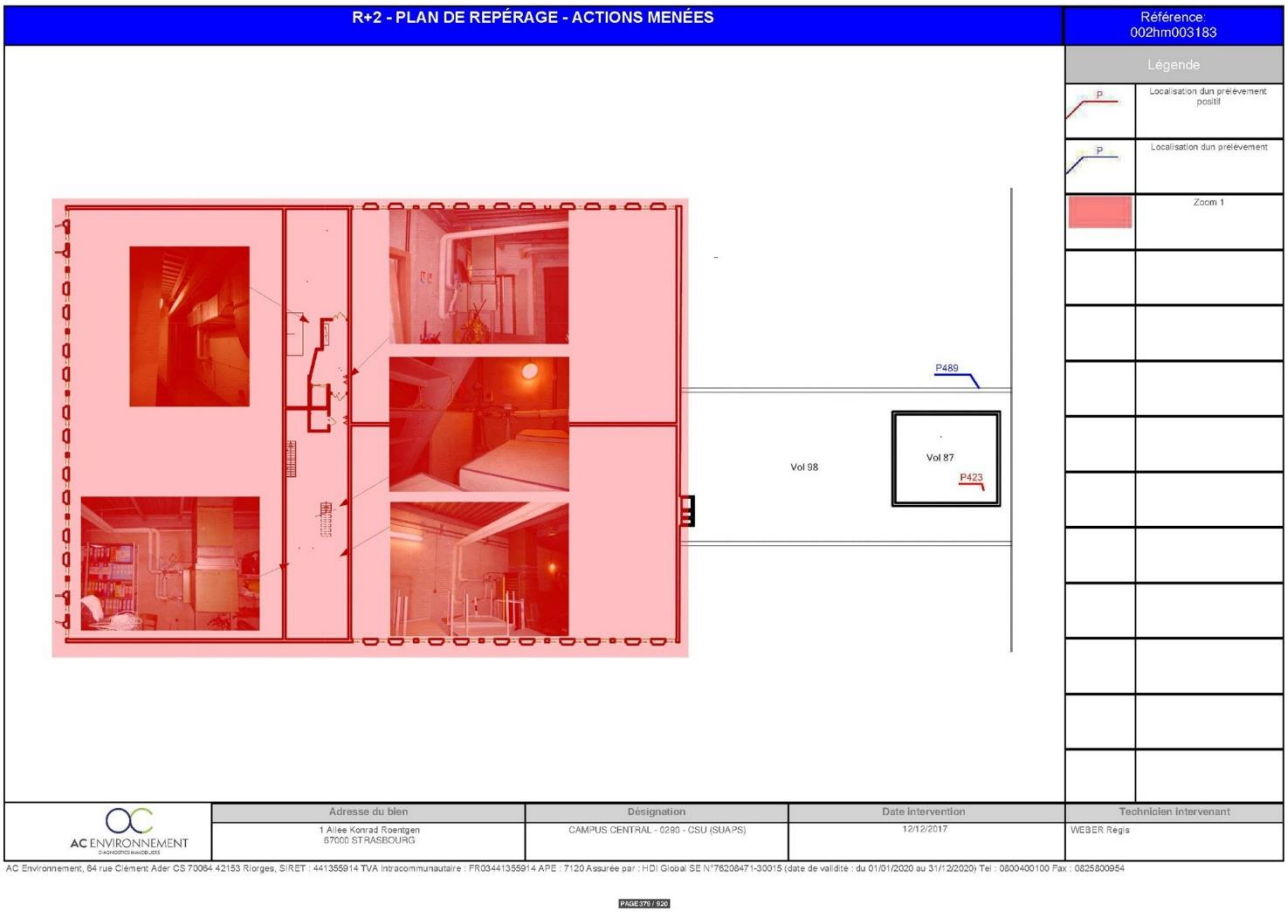
R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES
Référence:
002hm003183
Légende
Localisation dun prélèvement positif
Localisation dun prélèvement
Zoom 1
P489
Vol 98
Vol 87
P423
Adresse du bien
1 Allée Konrad Roentgen
67000 STRASBOURG
Désignation
CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS)
Date intervention
12/12/2017
Technicien intervenant
WEBER Regis
AC ENVIRONNEMENT
AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120 Assurée par : HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2020 au 31/12/2020) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
PAGE 370 / 626





AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120 Assurée par : HDI Global SE N°782084?1-30015 (date de validité : du 01/01/2020 au 31/12/2020) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954

PAGE 382 / 920

**TOITURE 1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES**

Référence: 002hm003183

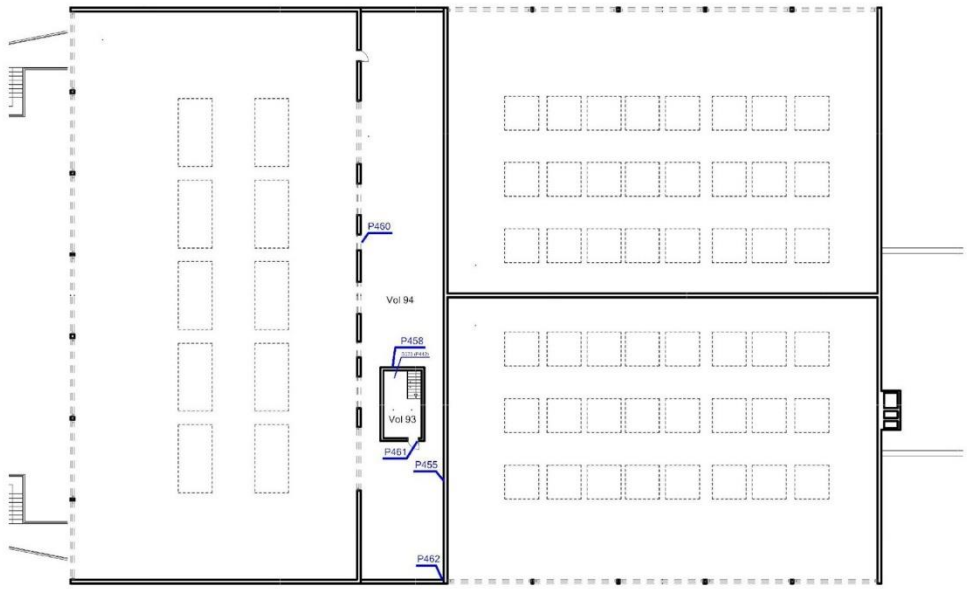



Légende

| | |
|---|---|
| P | Localisation dun prélèvement |
| S | Localisation dun sondage négatif |


| Adresse du bien | Désignation | Date intervention | Technicien intervenant |
|---|---|---|---|
| 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | 12/12/2017 | WEBER Regis |

AC ENVIRONNEMENT

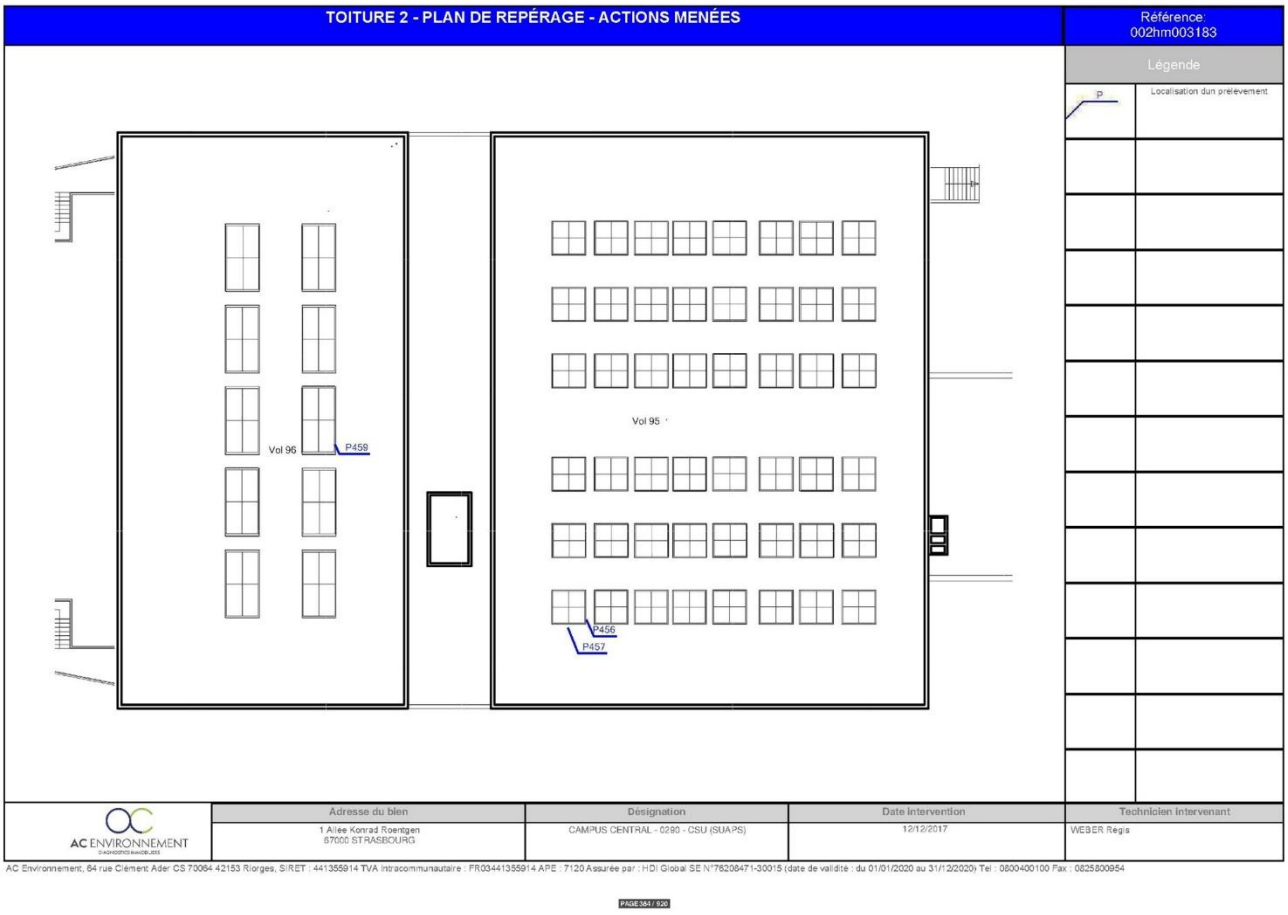
TOITURE 2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES
Référence:
002hm003183
Légende
P
Localisation dun prélèvement
Vol 96
P459
Vol 95
P456
P457
Adresse du bien
1 Allée Konrad Roentgen
67000 STRASBOURG
Désignation
CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS)
Date intervention
12/12/2017
Technicien intervenant
WEBER Regis
AC ENVIRONNEMENT
AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120 Assurée par : HDI Global SE N°782084?1-30015 (date de validité : du 01/01/2020 au 31/12/2020) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
PAGE 384 / 920

**PLAN DÉTAIL CHAUFFERIE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES**

Référence: 002hm003183

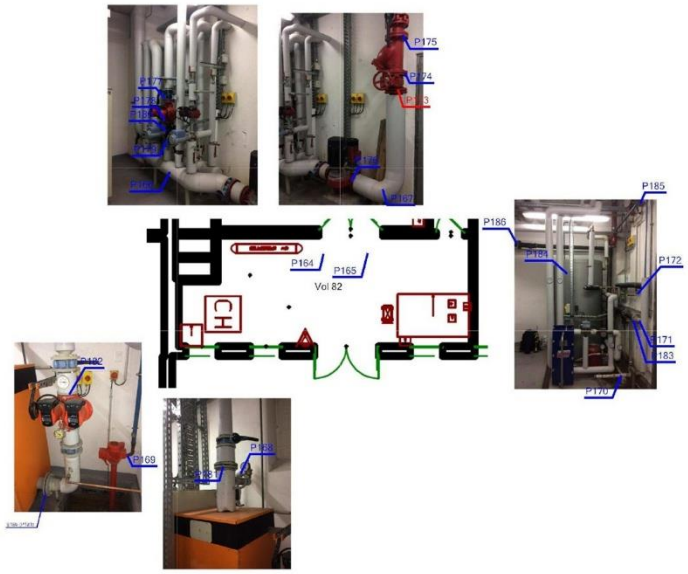


Légende

| | |
|---|---|
| P | Localisation dun prélèvement positif |
| P | Localisation dun prélèvement |
| S | Localisation dun sondage négatif |


| Adresse du bien | Désignation | Date intervention | Technicien intervenant |
|---|---|---|---|
| 1 Allee Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | 12/12/2017 | WEBER Regis |

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120 Assurée par : HDI Global SE N°782084?1-30015 (date de validité : du 01/01/2020 au 31/12/2020) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954

PAGE 385 / 626

**PLAN DÉTAIL SOUS-STATION - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES**

Référence: 002hm003183

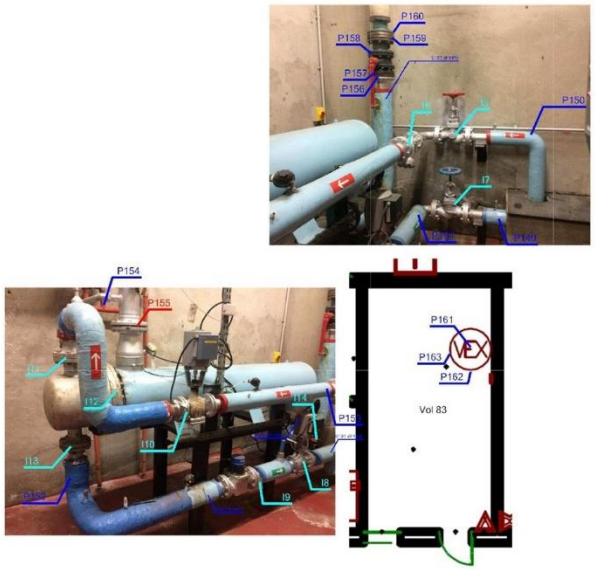


Légende

| | |
|---|---|
| P | Localisation dun prélèvement positif |
| P | Localisation dun prélèvement |
| I | Localisation dune impossibilité technique |
| S | Localisation dun sondage négatif |


| Adresse du bien | Désignation | Date intervention | Technicien intervenant |
|---|---|---|---|
| 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | 12/12/2017 | WEBER Regis |

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120 Assurée par : HDI Global SE N°782084?1-30015 (date de validité : du 01/01/2020 au 31/12/2020) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954

PAGE 388 / 626

**FAÇADES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES**

Référence: 002hm003183

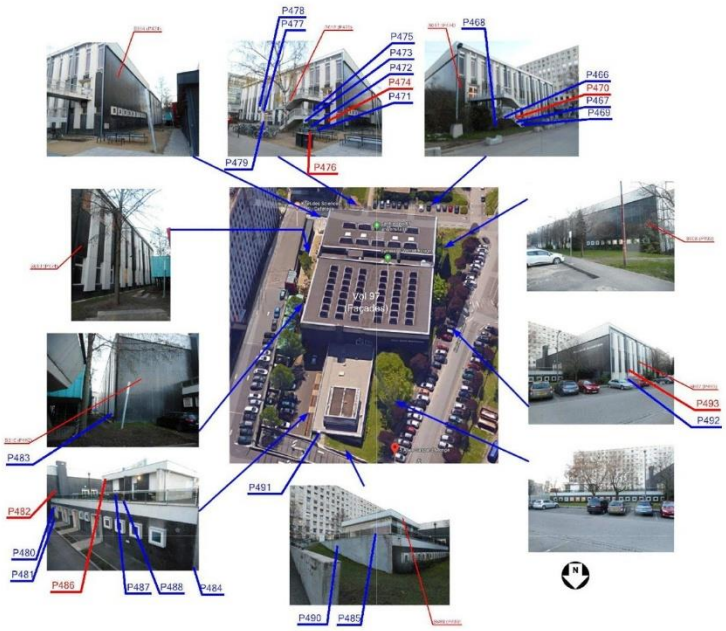


Légende

| | |
|---|---|
| P | Localisation dun prélèvement positif |
| P | Localisation dun prélèvement |
| S | Localisation dun sondage positif |

| Adresse du bien | Désignation | Date intervention | Technicien intervenant |
|---|---|---|---|
| 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG | CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | 12/12/2017 | WEBER Regis |

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120 Assurée par : HDI Global SE N°782084?1-30015 (date de validité : du 01/01/2020 au 31/12/2020) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954

PAGE 311 / 520




002HM003183 n°1 - 1 (P1) - RDC - Vol 3




002HM003183 n°2 - 1 (P2) - RDC - Vol 6




002HM003183 n°3 - 1 (P3) - RDC - Vol 1




002HM003183 n°4 - 1 (P4) - RDC - Vol 4




002HM003183 n°5 - 1 (P5) - RDC - Vol 6




002HM003183 n°6 - 1 (P6) - RDC - Vol 6




002HM003183 n°7 - 1 (P7) - RDC - Vol 6




002HM003183 n°8 - 1 (P8) - RDC - Vol 1




002HM003183 n°9 - 1 (P9) - RDC - Vol 1




002HM003183 n°10 - 1 (P10) - RDC - Vol 1




002HM003183 n°11 - 1 (P11) - RDC - Vol 1





002HM003183 n°12 - 1 (P12) - RDC - Vol 1




002HM003183 n°13 - 1 (P13) - RDC - Vol 4




002HM003183 n°14 - 1 (P14) - RDC - Vol 4

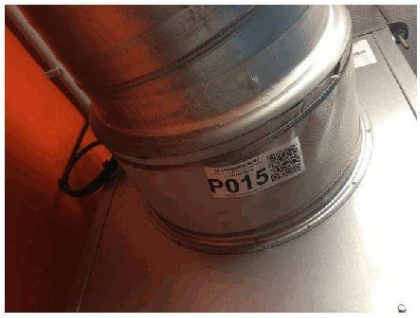


002HM003183 n°15 - 1 (P15) - RDC - Vol 4




002HM003183 n°16 - 1 (P16) - RDC - Vol 15




002HM003183 n°17 - 1 (P17) - RDC - Vol 15




002HM003183 n°18 - 1 (P18) - RDC - Vol 15



002HM003183 n°19 - 1 (P19) - RDC - Vol 15



002HM003183 n°20 - 1 (P20) - RDC - Vol 15



002HM003183 n°21 - 1 (P21) - RDC - Vol 15



002HM003183 n°22 - 1 (P22) - RDC - Vol 15



002HM003183 n°23 - 1 (P23) - RDC - Vol 15



002HM003183 n°24 - 1 (P24) - RDC - Vol 15



002HM003183 n°25 - 1 (P25) - RDC - Vol 15




002HM003183 n°26 - 1 (P26) - RDC - Vol 15




002HM003183 n°27 - 1 (P27) - RDC - Vol 15



002HM003183 n°28 - 1 (P28) - RDC - Vol 15




002HM003183 n°29 - 1 (P29) - RDC - Vol 15




002HM003183 n°30 - 1 (P30) - RDC - Vol 15

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002hm003183
1 Allée Konrad Roentgen
67000 STRASBOURG

Amiante



002HM003183 n°31 - 1 (P31) - RDC - Vol 15



002HM003183 n°32 - 1 (P32) - RDC - Vol 15



002HM003183 n°33 - 1 (P33) - RDC - Vol 15



002HM003183 n°34 - 1 (P34) - RDC - Vol 16



002HM003183 n°35 - 1 (P35) - RDC - Vol 16



002HM003183 n°36 - 1 (P36) - RDC - Vol 16

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002hm003183
1 Allée Konrad Roentgen
67000 STRASBOURG

Amiante



002HM003183 n°37 - 1 (P37) - RDC - Vol 16



002HM003183 n°38 - 1 (P38) - RDC - Vol 16



002HM003183 n°39 - 1 (P39) - RDC - Vol 16



002HM003183 n°40 - 1 (P40) - RDC - Vol 13



002HM003183 n°41 - 1 (P41) - RDC - Vol 13



002HM003183 n°42 - 1 (P42) - RDC - Vol 13




002HM003183 n°43 - 1 (P43) - RDC - Vol 13




002HM003183 n°44 - 1 (P44) - RDC - Vol 13




002HM003183 n°45 - 1 (P45) - RDC - Vol 13




002HM003183 n°46 - 1 (P46) - RDC - Vol 14




002HM003183 n°47 - 1 (P47) - RDC - Vol 14




002HM003183 n°48 - 1 (P48) - RDC - Vol 14




002HM003183 n°49 - 1 (P49) - RDC - Vol 14




002HM003183 n°50 - 1 (P50) - RDC - Vol 14




002HM003183 n°51 - 1 (P51) - RDC - Vol 14




002HM003183 n°52 - 1 (P52) - RDC - Vol 14





002HM003183 n°53 - 1 (P53) - RDC - Vol 14




002HM003183 n°54 - 1 (P54) - RDC - Vol 28




002HM003183 n°55 - 1 (P55) - RDC - Vol 28

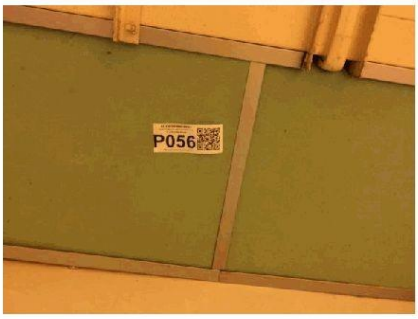


002HM003183 n°56 - 1 (P56) - RDC - Vol 28




002HM003183 n°57 - 1 (P57) - RDC - Vol 28




002HM003183 n°58 - 1 (P58) - RDC - Vol 28




002HM003183 n°59 - 1 (P59) - RDC - Vol 28




002HM003183 n°60 - 1 (P60) - RDC - Vol 28




002HM003183 n°61 - 1 (P61) - RDC - Vol 28




002HM003183 n°62 - 1 (P62) - RDC - Vol 28




002HM003183 n°63 - 1 (P63) - RDC - Vol 28




002HM003183 n°64 - 1 (P64) - RDC - Vol 28




002HM003183 n°65 - 1 (P65) - RDC - Vol 28




002HM003183 n°66 - 1 (P66) - RDC - Vol 28




002HM003183 n°67 - 1 (P67) - RDC - Vol 28




002HM003183 n°68 - 1 (P68) - RDC - Vol 28




002HM003183 n°69 - 1 (P69) - RDC - Vol 28




002HM003183 n°70 - 1 (P70) - RDC - Vol 28




002HM003183 n°71 - 1 (P71) - RDC - Vol 28




002HM003183 n°72 - 1 (P72) - RDC - Vol 28




002HM003183 n°73 - 1 (P73) - RDC - Vol 28




002HM003183 n°74 - 1 (P74) - RDC - Vol 28




002HM003183 n°75 - 1 (P75) - RDC - Vol 28




002HM003183 n°76 - 1 (P76) - RDC - Vol 28




002HM003183 n°77 - 1 (P77) - RDC - Vol 21




002HM003183 n°78 - 1 (P78) - RDC - Vol 21




002HM003183 n°79 - 1 (P79) - RDC - Vol 21




002HM003183 n°80 - 1 (P80) - RDC - Vol 21




002HM003183 n°81 - 1 (P81) - RDC - Vol 21




002HM003183 n°82 - 1 (P82) - RDC - Vol 21




002HM003183 n°83 - 1 (P83) - RDC - Vol 21




002HM003183 n°84 - 1 (P84) - RDC - Vol 21




002HM003183 n°85 - 1 (P85) - RDC - Vol 21




002HM003183 n°86 - 1 (P86) - RDC - Vol 21




002HM003183 n°87 - 1 (P87) - RDC - Vol 21




002HM003183 n°88 - 1 (P88) - R+1 - Vol 70




002HM003183 n°89 - 1 (P89) - R+1 - Vol 70




002HM003183 n°90 - 1 (P90) - R+1 - Vol 70




002HM003183 n°91 - 1 (P91) - R+1 - Vol 69




002HM003183 n°92 - 1 (P92) - R+1 - Vol 69




002HM003183 n°93 - 1 (P93) - R+1 - Vol 68




002HM003183 n°94 - 1 (P94) - R+1 - Vol 68



002HM003183 n°95 - 1 (P95) - R+1 - Vol 68




002HM003183 n°96 - 1 (P96) - R+1 - Vol 68




002HM003183 n°97 - 1 (P97) - R+1 - Vol 69




002HM003183 n°98 - 1 (P98) - RDC - Vol 20




002HM003183 n°99 - 1 (P99) - RDC - Vol 20




002HM003183 n°100 - 1 (P100) - RDC - Vol 20




002HM003183 n°101 - 1 (P101) - RDC - Vol 20




002HM003183 n°102 - 1 (P102) - RDC - Vol 20




002HM003183 n°103 - 1 (P103) - RDC - Vol 20




002HM003183 n°104 - 1 (P104) - RDC - Vol 24




002HM003183 n°105 - 1 (P105) - RDC - Vol 24




002HM003183 n°106 - 1 (P106) - RDC - Vol 24




002HM003183 n°107 - 1 (P107) - RDC - Vol 25




002HM003183 n°108 - 1 (P108) - RDC - Vol 25




002HM003183 n°109 - 1 (P109) - RDC - Vol 25




002HM003183 n°110 - 1 (P110) - RDC - Vol 19




002HM003183 n°111 - 1 (P111) - RDC - Vol 19




002HM003183 n°112 - 1 (P112) - RDC - Vol 19




002HM003183 n°113 - 1 (P113) - RDC - Vol 19




002HM003183 n°114 - 1 (P114) - RDC - Vol 19

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002hm003183
1 Allée Konrad Roentgen
67000 STRASBOURG

Amiante



002HM003183 n°116 - 1 (P116) - RDC - Vol 22



002HM003183 n°117 - 1 (P117) - RDC - Vol 23



002HM003183 n°118 - 1 (P118) - RDC - Vol 18



002HM003183 n°119 - 1 (P119) - RDC - Vol 18



002HM003183 n°120 - 1 (P120) - RDC - Vol 18



002HM003183 n°121 - 1 (P121) - RDC - Vol 17




002HM003183 n°122 - 1 (P122) - RDC - Vol 10




002HM003183 n°123 - 1 (P123) - RDC - Vol 11




002HM003183 n°124 - 1 (P124) - RDC - Vol 11




002HM003183 n°125 - 1 (P125) - RDC - Vol 11




002HM003183 n°126 - 1 (P126) - RDC - Vol 12




002HM003183 n°127 - 1 (P127) - RDC - Vol 11




002HM003183 n°128 - 1 (P128) - RDC - Vol 11




002HM003183 n°129 - 1 (P129) - RDC - Vol 11




002HM003183 n°130 - 1 (P130) - RDC - Vol 11




002HM003183 n°131 - 1 (P131) - RDC - Vol 11



002HM003183 n°132 - 1 (P132) - RDC - Vol 11




002HM003183 n°133 - 1 (P133) - RDC - Vol 10




002HM003183 n°134 - 1 (P134) - RDC - Vol 10




002HM003183 n°135 - 1 (P135) - RDC - Vol 12




002HM003183 n°136 - 1 (P136) - RDC - Vol 10




002HM003183 n°137 - 1 (P137) - RDC - Vol 9




002HM003183 n°138 - 1 (P138) - RDC - Vol 9




002HM003183 n°139 - 1 (P139) - RDC - Vol 9




002HM003183 n°140 - 1 (P140) - RDC - Vol 9




002HM003183 n°141 - 1 (P141) - RDC - Vol 8




002HM003183 n°142 - 1 (P142) - RDC - Vol 8



002HM003183 n°143 - 1 (P143) - RDC - Vol 8




002HM003183 n°144 - 1 (P144) - RDC - Vol 9




002HM003183 n°145 - 1 (P145) - RDC - Vol 9



002HM003183 n°146 - 1 (P146) - RDC - Vol 9



002HM003183 n°147 - 1 (P147) - RDC - Vol 8



002HM003183 n°148 - 1 (P148) - RDC - Vol 9



002HM003183 n°149 - 1 (P149) - Plan détail sous-station - Vol 83



)02HM003183 n°150 - 1 (P150) - Plan détail sous-statior - Vol 83



002HM003183 n°151 - 1 (P151) - Plan détail sous-station - Vol 83




)02HM003183 n°152 - 1 (P152) - Plan détail sous-statior - Vol 83




002HM003183 n°153 - 1 (P153) - Plan détail sous-station - Vol 83




)02HM003183 n°154 - 1 (P154) - Plan détail sous-statior - Vol 83




002HM003183 n°155 - 1 (P155) - Plan détail sous-station - Vol 83




)02HM003183 n°156 - 1 (P156) - Plan détail sous-statior - Vol 83




002HM003183 n°157 - 1 (P157) - Plan détail sous-station - Vol 83




)02HM003183 n°158 - 1 (P158) - Plan détail sous-statior - Vol 83




002HM003183 n°159 - 1 (P159) - Plan détail sous-station - Vol 83




)02HM003183 n°160 - 1 (P160) - Plan détail sous-statior - Vol 83




002HM003183 n°161 - 1 (P161) - Plan détail sous-station - Vol 83




)02HM003183 n°162 - 1 (P162) - Plan détail sous-statior - Vol 83




002HM003183 n°163 - 1 (P163) - Plan détail sous-station - Vol 83




002HM003183 n°164 - 1 (P164) - Plan détail chaufferie - Vol 82




002HM003183 n°165 - 1 (P165) - Plan détail chaufferie - Vol 82




002HM003183 n°166 - 1 (P166) - Plan détail chaufferie - Vol 82




002HM003183 n°167 - 1 (P167) - Plan détail chaufferie - Vol 82




002HM003183 n°168 - 1 (P168) - Plan détail chaufferie - Vol 82




002HM003183 n°169 - 1 (P169) - Plan détail chaufferie - Vol 82




002HM003183 n°170 - 1 (P170) - Plan détail chaufferie - Vol 82




002HM003183 n°171 - 1 (P171) - Plan détail chaufferie - Vol 82




002HM003183 n°172 - 1 (P172) - Plan détail chaufferie - Vol 82




002HM003183 n°173 - 1 (P173) - Plan détail chaufferie - Vol 82




002HM003183 n°174 - 1 (P174) - Plan détail chaufferie - Vol 82




002HM003183 n°175 - 1 (P175) - Plan détail chaufferie - Vol 82




002HM003183 n°176 - 1 (P176) - Plan détail chaufferie - Vol 82




002HM003183 n°177 - 1 (P177) - Plan détail chaufferie - Vol 82




002HM003183 n°178 - 1 (P178) - Plan détail chaufferie - Vol 82




002HM003183 n°179 - 1 (P179) - Plan détail chaufferie - Vol 82




002HM003183 n°180 - 1 (P180) - Plan détail chaufferie - Vol 82




002HM003183 n°181 - 1 (P181) - Plan détail chaufferie - Vol 82




002HM003183 n°182 - 1 (P182) - Plan détail chaufferie - Vol 82




002HM003183 n°183 - 1 (P183) - Plan détail chaufferie - Vol 82




002HM003183 n°184 - 1 (P184) - Plan détail chaufferie - Vol 82




002HM003183 n°185 - 1 (P185) - Plan détail chaufferie - Vol 82




002HM003183 n°186 - 1 (P186) - Plan détail chaufferie - Vol 82




002HM003183 n°187 - 1 (P187) - RDC - Vol 12

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002hm003183
1 Allée Konrad Roentgen
67000 STRASBOURG

Amiante



002HM003183 n°188 - 1 (P188) - RDC - Vol 12



002HM003183 n°189 - 1 (P189) - RDC - Vol 12



002HM003183 n°190 - 1 (P190) - RDC - Vol 12



002HM003183 n°191 - 1 (P191) - RDC - Vol 7



002HM003183 n°192 - 1 (P192) - RDC - Vol 7



002HM003183 n°193 - 1 (P193) - RDC - Vol 7




002HM003183 n°194 - 1 (P194) - RDC - Vol 7




002HM003183 n°195 - 1 (P195) - RDC - Vol 7




002HM003183 n°196 - 1 (P196) - RDC - Vol 7




002HM003183 n°197 - 1 (P197) - RDC - Vol 7




002HM003183 n°198 - 1 (P198) - RDC - Vol 7




002HM003183 n°199 - 1 (P199) - RDC - Vol 7




002HM003183 n°200 - 1 (P200) - RDC - Vol 7




002HM003183 n°201 - 1 (P201) - RDC - Vol 7




002HM003183 n°202 - 1 (P202) - RDC - Vol 7




002HM003183 n°203 - 1 (P203) - RDC - Vol 7




002HM003183 n°204 - 1 (P204) - RDC - Vol 7




002HM003183 n°205 - 1 (P205) - RDC - Vol 7




002HM003183 n°206 - 1 (P206) - RDC - Vol 7




002HM003183 n°208 - 1 (P208) - RDC - Vol 26




002HM003183 n°209 - 1 (P209) - RDC - Vol 26




002HM003183 n°210 - 1 (P210) - RDC - Vol 26




002HM003183 n°211 - 1 (P211) - RDC - Vol 26




002HM003183 n°212 - 1 (P212) - RDC - Vol 26




002HM003183 n°213 - 1 (P213) - RDC - Vol 26




002HM003183 n°214 - 1 (P214) - RDC - Vol 52




002HM003183 n°215 - 1 (P215) - RDC - Vol 52




002HM003183 n°216 - 1 (P216) - RDC - Vol 52




002HM003183 n°217 - 1 (P217) - RDC - Vol 52





002HM003183 n°218 - 1 (P218) - RDC - Vol 52




002HM003183 n°219 - 1 (P219) - RDC - Vol 52




002HM003183 n°220 - 1 (P220) - RDC - Vol 52

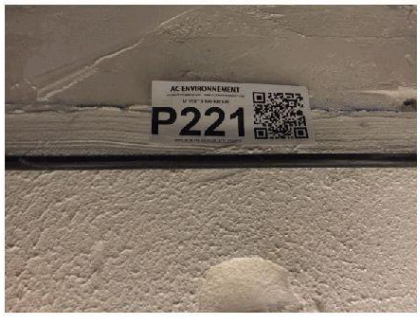


002HM003183 n°221 - 1 (P221) - RDC - Vol 52




002HM003183 n°222 - 1 (P222) - RDC - Vol 52




002HM003183 n°223 - 1 (P223) - RDC - Vol 52




002HM003183 n°224 - 1 (P224) - RDC - Vol 26




002HM003183 n°225 - 1 (P225) - RDC - Vol 46




002HM003183 n°226 - 1 (P226) - RDC - Vol 46




002HM003183 n°227 - 1 (P227) - RDC - Vol 46




002HM003183 n°228 - 1 (P228) - RDC - Vol 46




002HM003183 n°229 - 1 (P229) - RDC - Vol 46




002HM003183 n°230 - 1 (P230) - RDC - Vol 46

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002hm003183
1 Allée Konrad Roentgen
67000 STRASBOURG

Amiante



002HM003183 n°231 - 1 (P231) - RDC - Vol 43



002HM003183 n°232 - 1 (P232) - RDC - Vol 43



002HM003183 n°233 - 1 (P233) - RDC - Vol 43



002HM003183 n°234 - 1 (P234) - RDC - Vol 43



002HM003183 n°235 - 1 (P235) - RDC - Vol 43



002HM003183 n°236 - 1 (P236) - RDC - Vol 43




002HM003183 n°237 - 1 (P237) - RDC - Vol 43




002HM003183 n°238 - 1 (P238) - RDC - Vol 43



002HM003183 n°239 - 1 (P239) - RDC - Vol 43




002HM003183 n°240 - 1 (P240) - RDC - Vol 43




002HM003183 n°241 - 1 (P241) - RDC - Vol 43




002HM003183 n°242 - 1 (P242) - RDC - Vol 43




002HM003183 n°243 - 1 (P243) - RDC - Vol 46




002HM003183 n°244 - 1 (P244) - RDC - Vol 46




002HM003183 n°245 - 1 (P245) - RDC - Vol 7




002HM003183 n°246 - 1 (P246) - RDC - Vol 7




002HM003183 n°247 - 1 (P247) - RDC - Vol 7




002HM003183 n°248 - 1 (P248) - RDC - Vol 7



002HM003183 n°249 - 1 (P249) - RDC - Vol 52



002HM003183 n°250 - 1 (P250) - RDC - Vol 50



002HM003183 n°251 - 1 (P251) - RDC - Vol 50



002HM003183 n°252 - 1 (P252) - RDC - Vol 38



002HM003183 n°253 - 1 (P253) - RDC - Vol 38



002HM003183 n°254 - 1 (P254) - RDC - Vol 52




002HM003183 n°255 - 1 (P255) - RDC - Vol 52




002HM003183 n°256 - 1 (P256) - RDC - Vol 52




002HM003183 n°257 - 1 (P257) - RDC - Vol 57




002HM003183 n°258 - 1 (P258) - RDC - Vol 57




002HM003183 n°259 - 1 (P259) - RDC - Vol 52




002HM003183 n°260 - 1 (P260) - RDC - Vol 52




002HM003183 n°261 - 1 (P261) - RDC - Vol 52




002HM003183 n°262 - 1 (P262) - RDC - Vol 63




002HM003183 n°263 - 1 (P263) - RDC - Vol 63




002HM003183 n°264 - 1 (P264) - RDC - Vol 63




002HM003183 n°265 - 1 (P265) - RDC - Vol 63




002HM003183 n°266 - 1 (P266) - RDC - Vol 63




002HM003183 n°267 - 1 (P267) - RDC - Vol 63




002HM003183 n°268 - 1 (P268) - RDC - Vol 63




002HM003183 n°269 - 1 (P269) - RDC - Vol 63




002HM003183 n°270 - 1 (P270) - RDC - Vol 63




002HM003183 n°271 - 1 (P271) - RDC - Vol 63




002HM003183 n°272 - 1 (P272) - RDC - Vol 63




002HM003183 n°273 - 1 (P273) - RDC - Vol 44




002HM003183 n°274 - 1 (P274) - RDC - Vol 44




002HM003183 n°275 - 1 (P275) - RDC - Vol 44




002HM003183 n°276 - 1 (P276) - RDC - Vol 44




002HM003183 n°277 - 1 (P277) - RDC - Vol 45




002HM003183 n°278 - 1 (P278) - RDC - Vol 44




002HM003183 n°279 - 1 (P279) - RDC - Vol 44




002HM003183 n°280 - 1 (P280) - RDC - Vol 45




002HM003183 n°281 - 1 (P281) - RDC - Vol 45




002HM003183 n°282 - 1 (P282) - RDC - Vol 44




002HM003183 n°283 - 1 (P283) - RDC - Vol 44




002HM003183 n°284 - 1 (P284) - RDC - Vol 44




002HM003183 n°285 - 1 (P285) - RDC - Vol 44




002HM003183 n°286 - 1 (P286) - RDC - Vol 44




002HM003183 n°287 - 1 (P287) - RDC - Vol 44




002HM003183 n°288 - 1 (P288) - RDC - Vol 44




002HM003183 n°289 - 1 (P289) - RDC - Vol 44




002HM003183 n°290 - 1 (P290) - RDC - Vol 45




002HM003183 n°291 - 1 (P291) - RDC - Vol 44




002HM003183 n°292 - 1 (P292) - RDC - Vol 60




002HM003183 n°293 - 1 (P293) - RDC - Vol 60




002HM003183 n°294 - 1 (P294) - RDC - Vol 59




002HM003183 n°295 - 1 (P295) - RDC - Vol 59




002HM003183 n°296 - 1 (P296) - RDC - Vol 59




002HM003183 n°298 - 1 (P298) - RDC - Vol 61




002HM003183 n°299 - 1 (P299) - RDC - Vol 62




002HM003183 n°300 - 1 (P300) - RDC - Vol 62




002HM003183 n°301 - 1 (P301) - RDC - Vol 62




002HM003183 n°303 - 2 (P303) - RDC - Vol 59




002HM003183 n°303 - 1 (P303) - RDC - Vol 59




002HM003183 n°305 - 1 (P305) - RDC - Vol 58




002HM003183 n°306 - 1 (P306) - RDC - Vol 58




002HM003183 n°307 - 1 (P307) - RDC - Vol 58




002HM003183 n°308 - 1 (P308) - RDC - Vol 58




002HM003183 n°309 - 1 (P309) - RDC - Vol 58




002HM003183 n°310 - 1 (P310) - RDC - Vol 58




002HM003183 n°311 - 1 (P311) - RDC - Vol 58




002HM003183 n°312 - 1 (P312) - RDC - Vol 58




002HM003183 n°313 - 1 (P313) - RDC - Vol 58




002HM003183 n°314 - 1 (P314) - RDC - Vol 58




002HM003183 n°315 - 1 (P315) - RDC - Vol 47




002HM003183 n°316 - 1 (P316) - RDC - Vol 47




002HM003183 n°317 - 1 (P317) - RDC - Vol 47




002HM003183 n°318 - 1 (P318) - RDC - Vol 49




002HM003183 n°319 - 1 (P319) - RDC - Vol 49




002HM003183 n°320 - 1 (P320) - RDC - Vol 49




002HM003183 n°321 - 1 (P321) - RDC - Vol 49




002HM003183 n°322 - 1 (P322) - RDC - Vol 49




002HM003183 n°323 - 1 (P323) - RDC - Vol 49




002HM003183 n°324 - 1 (P324) - RDC - Vol 49




002HM003183 n°325 - 1 (P325) - RDC - Vol 40




002HM003183 n°326 - 1 (P326) - RDC - Vol 40




002HM003183 n°327 - 1 (P327) - RDC - Vol 40




002HM003183 n°328 - 1 (P328) - RDC - Vol 42




002HM003183 n°329 - 1 (P329) - RDC - Vol 42




002HM003183 n°330 - 1 (P330) - RDC - Vol 42




002HM003183 n°331 - 1 (P331) - RDC - Vol 42




002HM003183 n°332 - 1 (P332) - RDC - Vol 41




002HM003183 n°333 - 1 (P333) - RDC - Vol 41




002HM003183 n°334 - 1 (P334) - RDC - Vol 41




002HM003183 n°335 - 1 (P335) - RDC - Vol 41




002HM003183 n°336 - 1 (P336) - RDC - Vol 42




002HM003183 n°337 - 1 (P337) - RDC - Vol 42




002HM003183 n°338 - 1 (P338) - RDC - Vol 42




002HM003183 n°339 - 1 (P339) - RDC - Vol 42




002HM003183 n°340 - 1 (P340) - RDC - Vol 42



002HM003183 n°341 - 1 (P341) - RDC - Vol 42



002HM003183 n°342 - 1 (P342) - RDC - Vol 54



002HM003183 n°343 - 1 (P343) - RDC - Vol 54



002HM003183 n°344 - 1 (P344) - RDC - Vol 54



002HM003183 n°345 - 1 (P345) - RDC - Vol 51



002HM003183 n°346 - 1 (P346) - RDC - Vol 51




002HM003183 n°347 - 1 (P347) - RDC - Vol 51




002HM003183 n°348 - 1 (P348) - RDC - Vol 51




002HM003183 n°349 - 1 (P349) - RDC - Vol 51




002HM003183 n°350 - 1 (P350) - RDC - Vol 51





002HM003183 n°351 - 1 (P351) - RDC - Vol 51




002HM003183 n°352 - 1 (P352) - RDC - Vol 51




002HM003183 n°353 - 1 (P353) - RDC - Vol 51

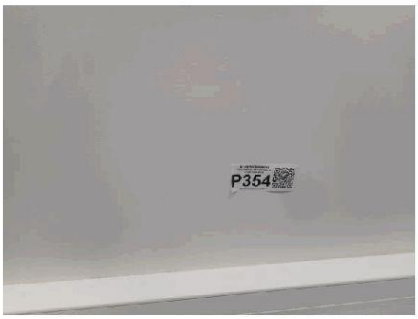


002HM003183 n°354 - 1 (P354) - RDC - Vol 51




002HM003183 n°355 - 1 (P355) - RDC - Vol 51




002HM003183 n°356 - 1 (P356) - RDC - Vol 51




002HM003183 n°357 - 1 (P357) - RDC - Vol 29




002HM003183 n°358 - 1 (P358) - RDC - Vol 29




002HM003183 n°359 - 1 (P359) - RDC - Vol 29




002HM003183 n°360 - 1 (P360) - RDC - Vol 33




002HM003183 n°361 - 1 (P361) - RDC - Vol 29




002HM003183 n°362 - 1 (P362) - R+1 - Vol 75




002HM003183 n°363 - 1 (P363) - R+1 - Vol 75




002HM003183 n°364 - 1 (P364) - R+1 - Vol 75

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS






002HM003183 n°365 - 1 (P365) - R+1 - Vol 75




002HM003183 n°366 - 1 (P366) - R+1 - Vol 75




002HM003183 n°367 - 1 (P367) - R+1 - Vol 75




002HM003183 n°368 - 1 (P368) - R+1 - Vol 75




002HM003183 n°369 - 1 (P369) - R+1 - Vol 75




002HM003183 n°370 - 1 (P370) - R+1 - Vol 75




002HM003183 n°371 - 1 (P371) - R+1 - Vol 75




002HM003183 n°372 - 1 (P372) - R+1 - Vol 75




002HM003183 n°373 - 1 (P373) - R+1 - Vol 75




002HM003183 n°374 - 1 (P374) - R+1 - Vol 75




002HM003183 n°375 - 1 (P375) - RDC - Vol 27




002HM003183 n°376 - 1 (P376) - RDC - Vol 27



002HM003183 n°377 - 1 (P377) - RDC - Vol 27



002HM003183 n°378 - 1 (P378) - RDC - Vol 27



002HM003183 n°379 - 1 (P379) - RDC - Vol 53



002HM003183 n°380 - 1 (P380) - RDC - Vol 53



002HM003183 n°381 - 1 (P381) - RDC - Vol 53



002HM003183 n°382 - 1 (P382) - RDC - Vol 39




002HM003183 n°383 - 1 (P383) - RDC - Vol 39




002HM003183 n°384 - 1 (P384) - R+1 - Vol 77




002HM003183 n°385 - 1 (P385) - R+1 - Vol 77




002HM003183 n°386 - 1 (P386) - R+1 - Vol 78




002HM003183 n°387 - 1 (P387) - R+1 - Vol 77




002HM003183 n°388 - 1 (P388) - R+1 - Vol 77

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002hm003183
1 Allée Konrad Roentgen
67000 STRASBOURG

Amiante



002HM003183 n°389 - 1 (P389) - R+1 - Vol 79



002HM003183 n°390 - 1 (P390) - R+1 - Vol 77



002HM003183 n°391 - 1 (P391) - R+1 - Vol 77



002HM003183 n°392 - 1 (P392) - R+1 - Vol 77



002HM003183 n°393 - 1 (P393) - R+1 - Vol 77



002HM003183 n°394 - 1 (P394) - R+1 - Vol 79

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002hm003183
1 Allée Konrad Roentgen
67000 STRASBOURG

Amiante



002HM003183 n°395 - 1 (P395) - R+1 - Vol 77



002HM003183 n°396 - 1 (P396) - R+1 - Vol 79



002HM003183 n°397 - 1 (P397) - R+1 - Vol 77



002HM003183 n°398 - 1 (P398) - R+1 - Vol 77



002HM003183 n°399 - 1 (P399) - RDC - Vol 52



002HM003183 n°400 - 1 (P400) - R+1 - Vol 80



002HM003183 n°401 - 1 (P401) - R+1 - Vol 80



002HM003183 n°402 - 1 (P402) - R+1 - Vol 80



002HM003183 n°403 - 1 (P403) - R+1 - Vol 80



002HM003183 n°404 - 1 (P404) - R+1 - Vol 80



002HM003183 n°405 - 1 (P405) - R+1 - Vol 80



002HM003183 n°406 - 1 (P406) - R+1 - Vol 81




002HM003183 n°407 - 1 (P407) - R+1 - Vol 81




002HM003183 n°408 - 1 (P408) - R+1 - Vol 81




002HM003183 n°409 - 1 (P409) - R+1 - Vol 81




002HM003183 n°410 - 1 (P410) - R+1 - Vol 85




002HM003183 n°411 - 1 (P411) - R+1 - Vol 85




002HM003183 n°412 - 1 (P412) - R+1 - Vol 85




002HM003183 n°413 - 1 (P413) - R+1 - Vol 85




002HM003183 n°414 - 1 (P414) - R+1 - Vol 76




002HM003183 n°415 - 1 (P415) - R+1 - Vol 76




002HM003183 n°416 - 1 (P416) - R+1 - Vol 76




002HM003183 n°417 - 1 (P417) - R+1 - Vol 76




002HM003183 n°418 - 1 (P418) - R+1 - Vol 76




002HM003183 n°419 - 1 (P419) - R+1 - Vol 74




002HM003183 n°420 - 1 (P420) - R+1 - Vol 74




002HM003183 n°421 - 1 (P421) - R+1 - Vol 74




002HM003183 n°422 - 1 (P422) - R+1 - Vol 74



002HM003183 n°423 - 1 (P423) - R+2 - Vol 87



002HM003183 n°423 - 2 (P423) - R+2 - Vol 87




002HM003183 n°424 - 1 (P424) - RDC - Vol 32




002HM003183 n°425 - 1 (P425) - RDC - Vol 32




002HM003183 n°426 - 1 (P426) - RDC - Vol 32




002HM003183 n°427 - 1 (P427) - RDC - Vol 32




002HM003183 n°428 - 1 (P428) - RDC - Vol 31




002HM003183 n°429 - 1 (P429) - RDC - Vol 31



002HM003183 n°430 - 1 (P430) - RDC - Vol 31



002HM003183 n°431 - 1 (P431) - RDC - Vol 31



002HM003183 n°432 - 1 (P432) - RDC - Vol 31



002HM003183 n°433 - 1 (P433) - RDC - Vol 31



002HM003183 n°434 - 1 (P434) - RDC - Vol 36



002HM003183 n°435 - 1 (P435) - RDC - Vol 36




002HM003183 n°436 - 1 (P436) - RDC - Vol 36




002HM003183 n°437 - 1 (P437) - RDC - Vol 36




002HM003183 n°438 - 1 (P438) - RDC - Vol 36




002HM003183 n°439 - 1 (P439) - RDC - Vol 36




002HM003183 n°440 - 1 (P440) - RDC - Vol 36




002HM003183 n°441 - 1 (P441) - R+2 - Vol 89




002HM003183 n°442 - 1 (P442) - R+2 - Vol 88




002HM003183 n°443 - 1 (P443) - R+2 - Vol 88




002HM003183 n°444 - 1 (P444) - R+2 - Vol 88




002HM003183 n°445 - 1 (P445) - R+2 - Vol 88




002HM003183 n°447 - 1 (P447) - R+2 - Vol 88




002HM003183 n°448 - 1 (P448) - R+2 - Vol 88



002HM003183 n°449 - 1 (P449) - R+2 - Vol 88



002HM003183 n°450 - 1 (P450) - R+2 - Vol 88



002HM003183 n°451 - 1 (P451) - R+2 - Vol 92



002HM003183 n°453 - 1 (P453) - R+2 - Vol 88



002HM003183 n°453 - 2 (P453) - R+2 - Vol 88



002HM003183 n°454 - 1 (P454) - R+2 - Vol 92




002HM003183 n°455 - 1 (P455) - Toiture 1 - Vol 94




002HM003183 n°456 - 1 (P456) - Toiture 2 - Vol 95




002HM003183 n°457 - 1 (P457) - Toiture 2 - Vol 95




002HM003183 n°458 - 1 (P458) - Toiture 1 - Vol 94




002HM003183 n°459 - 1 (P459) - Toiture 2 - Vol 96




002HM003183 n°460 - 1 (P460) - Toiture 1 - Vol 94




002HM003183 n°461 - 1 (P461) - Toiture 1 - Vol 93




002HM003183 n°462 - 1 (P462) - Toiture 1 - Vol 94




002HM003183 n°463 - 1 (P463) - RDC - Vol 34




002HM003183 n°464 - 1 (P464) - RDC - Vol 34




002HM003183 n°465 - 1 (P465) - RDC - Vol 34




002HM003183 n°466 - 1 (P466) - Façades - Vol 97 (Façades)




002HM003183 n°467 - 1 (P467) - Façades - Vol 97 (Façades)



002HM003183 n°468 - 1 (P468) - Façades - Vol 97 (Façades)




002HM003183 n°469 - 1 (P469) - Façades - Vol 97 (Façades)




002HM003183 n°470 - 1 (P470) - Façades - Vol 97 (Façades)




002HM003183 n°471 - 1 (P471) - Façades - Vol 97 (Façades)




002HM003183 n°472 - 1 (P472) - Façades - Vol 97 (Façades)




002HM003183 n°473 - 1 (P473) - Façades - Vol 97 (Façades)




002HM003183 n°474 - 1 (P474) - Façades - Vol 97 (Façades)




002HM003183 n°475 - 1 (P475) - Façades - Vol 97 (Façades)




002HM003183 n°476 - 1 (P476) - Façades - Vol 97 (Façades)




002HM003183 n°477 - 1 (P477) - Façades - Vol 97 (Façades)




002HM003183 n°478 - 1 (P478) - Façades - Vol 97 (Façades)




002HM003183 n°479 - 1 (P479) - Façades - Vol 97 (Façades)




002HM003183 n°480 - 1 (P480) - Façades - Vol 97 (Façades)




002HM003183 n°481 - 1 (P481) - Façades - Vol 97 (Façades)




002HM003183 n°482 - 1 (P482) - Façades - Vol 97 (Façades)




002HM003183 n°483 - 1 (P483) - Façades - Vol 97 (Façades)




002HM003183 n°484 - 1 (P484) - Façades - Vol 97 (Façades)




002HM003183 n°485 - 1 (P485) - Façades - Vol 97 (Façades)




002HM003183 n°486 - 1 (P486) - Façades - Vol 97 (Façades)




002HM003183 n°487 - 1 (P487) - Façades - Vol 97 (Façades)




002HM003183 n°488 - 1 (P488) - Façades - Vol 97 (Façades)




002HM003183 n°489 - 1 (P489) - R+2 - Vol 98




002HM003183 n°490 - 1 (P490) - Façades - Vol 97 (Façades)




002HM003183 n°491 - 1 (P491) - Façades - Vol 97 (Façades)




002HM003183 n°492 - 1 (P492) - Façades - Vol 97 (Façades)




002HM003183 n°493 - 1 (P493) - Façades - Vol 97 (Façades)




I1 - 1 - R+1 - Vol 75




I2 - 1 - R+1 - Vol 74




I3 - 1 - R+1 - Vol 76




S1 - 1 (S1) - RDC - Vol 1




S5 - 1 (S5) - RDC - Vol 2




S6 - 1 (S6) - RDC - Vol 2




S7 - 1 (S7) - RDC - Vol 2




S9 - 1 (S9) - RDC - Vol 1




S10 - 2 (S10) - RDC - Vol 1



S10 - 1 (S10) - RDC - Vol 1




S44 - 1 (S44) - RDC - Vol 16




S73 - 1 (S73) - RDC - Vol 13




S83 - 1 (S83) - RDC - Vol 28




S84 - 1 (S84) - R+1 - Vol 69




S85 - 1 (S85) - R+1 - Vol 66




S86 - 1 (S86) - R+1 - Vol 66



S87 - 1 (S87) - R+1 - Vol 65




S109 - 1 (S109) - RDC - Vol 20




S198 - 1 (S198) - RDC - Vol 26




S213 - 1 (S213) - RDC - Vol 46




S285 - 1 (S285) - RDC - Vol 48




S459 - 1 (S459) - RDC - Vol 33




S461 - 1 (S461) - R+1 - Vol 75




S462 - 1 (S462) - R+1 - Vol 75




S473 - 1 (S473) - R+1 - Vol 77




S474 - 1 (S474) - R+1 - Vol 77




S478 - 1 (S478) - R+1 - Vol 79




S484 - 1 (S484) - R+1 - Vol 80




S508 - 1 (S508) - R+1 - Vol 76




S517 - 1 (S517) - RDC - Vol 32




S553 - 2 (S553) - R+2 - Vol 92




S553 - 1 (S553) - R+2 - Vol 92




S559 - 1 (S559) - R+2 - Vol 89



S570 - 1 (S570) - R+2 - Vol 89




S595 - 1 (S595) - RDC - Vol 35




S596 - 1 (S596) - RDC - Vol 34



002HM003183 n°494 - 2 - Plan détail sous-station - Vol 83

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123544 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

| | |
|---|---|
| Client : AC ENVIRONNEMENT<br>64 rue Clément Ader<br>42153 RIORGES | Réf. Commande ITGA : IT0717-123544<br>Réf. Commande Client : 002HM003183 |

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/12/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Technique Analytique(s) :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

ou

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51594 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183001 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 3 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Papier | | |
| Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51595 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183002 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 6 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples en faible quantité / Papier | | |
| Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + papier non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123544 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51596 |
| Réf échantillon client : 002HM003183003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 1 | | Description ITGA : | | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51597 |
| Réf échantillon client : 002HM003183004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 4 | | Description ITGA : | | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51598 |
| Réf échantillon client : 002HM003183005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 6 | | Description ITGA : | | Enduit beige en vrac / Peinture |
| ▸ Enduit beige en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51599 |
| Réf échantillon client : 002HM003183006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 6 | | Description ITGA : | | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51600 |
| Réf échantillon client : 002HM003183007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 6 | | Description ITGA : | | Enduit blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac |
| ▸ Enduit blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Matériau gris en vrac | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51601 |
| Réf échantillon client : 002HM003183008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 1 | | Description ITGA : | | Enduit beige en vrac |
| ▸ Enduit beige en vrac | META | 1 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123544 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51602 |
| Réf échantillon client : 002HM003183009 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Joint sur support / Vol 1 | | Description ITGA : | | Matériau souple noir avec poussières |
| ▸ Matériau souple noir avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51603 |
| Réf échantillon client : 002HM003183010 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 1 | | Description ITGA : | | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau gris en vrac |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51604 |
| Réf échantillon client : 002HM003183011 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 1 | | Description ITGA : | | Matériau souple blanc avec poussières |
| ▸ Matériau souple blanc avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51605 |
| Réf échantillon client : 002HM003183012 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 1 | | Description ITGA : | | Matériau souple noir avec poussières |
| ▸ Matériau souple noir avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51606 |
| Réf échantillon client : 002HM003183013 / Equipements divers et accessoires / Radiateurs / Tresses / Vol 4 | | Description ITGA : | | Matériau fibreux marron avec poussières / Peintures multiples / Matériau gris en vrac |
| ▸ Matériau fibreux marron avec poussières non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51607 |
| Réf échantillon client : 002HM003183014 / Equipements divers et accessoires / Radiateurs / Peinture anti-condensation / Vol 4 | | Description ITGA : | | Peintures multiples en vrac |
| ▸ Peintures multiples en vrac | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123544 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51608 |
| Réf échantillon client : 002HM003183015 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Joint entre éléments / Vol 4 | | Description ITGA : | | Matériau fibreux gris avec poussières |
| ▸ Matériau fibreux gris avec poussières | MOLP Confirmé au MET | 2 | 30/12/2017 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51609 |
| Réf échantillon client : 002HM003183016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 15 | | Description ITGA : | | Revêtement souple vert / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage rose / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité / Peinture en faible quantité |
| ▸ Revêtement souple vert | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51610 |
| Réf échantillon client : 002HM003183017 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 15 | | Description ITGA : | | Colle grise en vrac / Couche plâtreuse blanche en vrac |
| ▸ Colle grise en vrac + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51611 |
| Réf échantillon client : 002HM003183018 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 15 | | Description ITGA : | | Colle grise en vrac / Peinture en faible quantité |
| ▸ Colle grise en vrac + peinture en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51612 |
| Réf échantillon client : 002HM003183019 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 15 | | Description ITGA : | | Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Peintures multiples / Matériau souple blanc en faible quantité / Joint cassant blanc / Carrelage |
| ▸ Couche plâtreuse blanche + peintures multiples non séparable | META | 1 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Matériau souple blanc en faible quantité non séparable + joint cassant blanc non séparable | META | 1 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Carrelage | META | 1 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Colle grise | META | 2 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123544 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51613 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183020 / Equipements divers et accessoires / Sanitaires / Joint d'étanchéité / Vol 15 | | Description ITGA : Matériau souple blanc / Peinture en faible quantité / Matériau beige en vrac | | |
| ▸ Matériau souple blanc + peinture en faible quantité non séparable + matériau beige en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51614 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183021 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 15 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture | | |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51615 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183022 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 15 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac | | |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51616 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183023 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 15 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples | | |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51617 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183024 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 15 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Matériau gris en vrac | | |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51618 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183025 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Habillage platre / Vol 15 | | Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Peintures multiples | | |
| ▸ Matériau plâtreux blanc + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123544 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51619 |
| Réf échantillon client : 002HM003183026 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 15 | | Description ITGA : | | Enduit compact gris / Peintures multiples / Matériau blanc en vrac |
| ▸ Enduit compact gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Peintures multiples non séparable + matériau blanc en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51620 |
| Réf échantillon client : 002HM003183027 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Joint entre éléments / Vol 15 | | Description ITGA : | | Matériau marron en vrac |
| ▸ Matériau marron en vrac | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51621 |
| Réf échantillon client : 002HM003183028 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Tresses / Vol 15 | | Description ITGA : | | Matériau fibreux marron avec poussières / Peinture |
| ▸ Matériau fibreux marron avec poussières non séparable + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51622 |
| Réf échantillon client : 002HM003183029 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 15 | | Description ITGA : | | Colle grise / Matériau gris en vrac hétérogène / Carrelage |
| ▸ Colle grise non séparable + matériau gris en vrac hétérogène | META | 1 | 02/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Carrelage | --- | | | Non analysé |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51623 |
| Réf échantillon client : 002HM003183030 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (plâtre) / Vol 15 | | Description ITGA : | | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51624 |
| Réf échantillon client : 002HM003183031 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 15 | | Description ITGA : | | Enduit compact beige / Matériau plâtreux blanc en vrac |
| ▸ Enduit compact beige + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123544 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51625 |
| Réf échantillon client : 002HM003183032 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Joint entre éléments / Vol 15 | | Description ITGA : | | Mousse noire avec poussières |
| ▸ Mousse noire avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51626 |
| Réf échantillon client : 002HM003183033 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Joint entre éléments / Vol 15 | | Description ITGA : | | Ruban adhésif gris / Toile fibreuse blanche / Matériau en vrac |
| ▸ Ruban adhésif gris non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau en vrac non séparable | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51627 |
| Réf échantillon client : 002HM003183034 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 16 | | Description ITGA : | | Matériau souple noir |
| ▸ Matériau souple noir | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51628 |
| Réf échantillon client : 002HM003183035 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 16 | | Description ITGA : | | Matériau souple noir |
| ▸ Matériau souple noir | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51629 |
| Réf échantillon client : 002HM003183036 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 16 | | Description ITGA : | | Matériau souple blanc avec poussières / Peinture en faible quantité |
| ▸ Matériau souple blanc avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51630 |
| Réf échantillon client : 002HM003183037 / Façades / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 16 | | Description ITGA : | | Matériau souple incolore avec poussières |
| ▸ Matériau souple incolore avec poussières | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123544 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | IT071712-51631 | |
| Réf échantillon client : 002HM003183038 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 16 | | Description ITGA : | Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en vrac | |
| Colle bitumineuse noire | MOLP | 2 | 30/12/2017 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Ragréage gris en vrac | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | IT071712-51632 | |
| Réf échantillon client : 002HM003183039 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 16 | | Description ITGA : | Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture en faible quantité | |
| Revêtement souple beige | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | IT071712-51633 | |
| Réf échantillon client : 002HM003183040 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 13 | | Description ITGA : | Revêtement souple gris / Colle polymère jaune avec poussières / Peinture | |
| Revêtement souple gris | META | 1 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable | META | 1 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | IT071712-51634 | |
| Réf échantillon client : 002HM003183041 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 13 | | Description ITGA : | Revêtement souple noir / Colle polymère blanche avec poussières / Papier jaune | |
| Revêtement souple noir | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Colle polymère blanche avec poussières non séparable + papier jaune non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | IT071712-51635 | |
| Réf échantillon client : 002HM003183042 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (plâtre) / Vol 13 | | Description ITGA : | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples | |
| Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123544 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51636 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183043 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 13 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Matériau rouge en vrac | | |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau rouge en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51637 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183044 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 13 | | Description ITGA : Tampon bitumineux noir | | |
| ▸ Tampon bitumineux noir | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51638 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183045 / Equipements divers et accessoires / Evier / Mastic étanchéité / Vol 13 | | Description ITGA : Matériau souple blanc avec poussières | | |
| ▸ Matériau souple blanc avec poussières | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51639 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183046 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (plâtre) / Vol 14 | | Description ITGA : Enduit blanc en vrac / Peinture / Matériau rose en faible quantité | | |
| ▸ Enduit blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau rose en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51640 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183047 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 14 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples | | |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123544 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51641 |
| Réf échantillon client : 002HM003183048 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 14 | | Description ITGA : | | Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac / Ragréage rose en vrac / Peinture / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité |
| ▸ Revêtement souple beige | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Ragréage rose en vrac + peinture non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51642 |
| Réf échantillon client : 002HM003183049 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe (lésplastique) / Vol 14 | | Description ITGA : | | Colle polymère jaune avec poussières / Matériau compact blanc en faible quantité |
| ▸ Colle polymère jaune avec poussières + matériau compact blanc en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51643 |
| Réf échantillon client : 002HM003183050 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 14 | | Description ITGA : | | Colle grise / Joint cassant blanc / Peinture en faible quantité / Carrelage |
| ▸ Colle grise | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Joint cassant blanc + peinture en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Carrelage | --- | | | Non analysé |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123545 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

| | |
|---|---|
| Client : AC ENVIRONNEMENT<br>64 rue Clément Ader<br>42153 RIORGES | Réf. Commande ITGA : IT0717-123545<br>Réf. Commande Client : 002HM003183 |

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/12/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Technique Analytique(s) : - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

ou
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51644 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183051 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 14 | | Description ITGA : Colle grise / Joint cassant blanc / Carrelage / Peintures multiples | | |
| Colle grise + joint cassant blanc non séparable + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Carrelage | --- | | | Non analysé |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51645 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183052 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 14 | | Description ITGA : Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Matériau gris | | |
| Colle grise + matériau gris non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Couche plâtreuse blanche | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123545 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51646 |
| Réf échantillon client : 002HM003183053 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 14 | | Description ITGA : | | Colle beige avec poussières / Carrelage / Matériau gris en vrac |
| ▸ Colle beige avec poussières + matériau gris en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Carrelage | --- | | | Non analysé |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51647 |
| Réf échantillon client : 002HM003183054 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 28 | | Description ITGA : | | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51648 |
| Réf échantillon client : 002HM003183055 / Equipements divers et accessoires / Tuyauteries / Tresses / Vol 28 | | Description ITGA : | | Matériau fibreux marron / Peinture |
| ▸ Matériau fibreux marron + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51649 |
| Réf échantillon client : 002HM003183056 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 28 | | Description ITGA : | | Matériau fibreux jaune avec poussières / Peinture / Couche fibreuse blanche |
| ▸ Matériau fibreux jaune avec poussières + peinture non séparable + couche fibreuse blanche non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51650 |
| Réf échantillon client : 002HM003183057 / Equipements divers et accessoires / Support / Enduit / Vol 28 | | Description ITGA : | | Peintures multiples en vrac |
| ▸ Peintures multiples en vrac | META | 1 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123545 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51651 |
| Réf échantillon client : 002HM003183058 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 28 | | Description ITGA : | | Bois massif / Colle polymère jaune / Matériau souple gris avec couche fibreuse / Ragréage gris / Matériau beige en faible quantité |
| Bois massif | --- | | | Non analysé |
| Colle polymère jaune non séparable + matériau souple gris avec couche fibreuse + ragréage gris non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51652 |
| Réf échantillon client : 002HM003183059 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 28 | | Description ITGA : | | Matériau plâtreux blanc / Carton / Papier / Peintures multiples |
| Matériau plâtreux blanc + carton non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51653 |
| Réf échantillon client : 002HM003183060 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 28 | | Description ITGA : | | Enduit blanc |
| Enduit blanc | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51654 |
| Réf échantillon client : 002HM003183061 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Manchon / Vol 28 | | Description ITGA : | | Matériau mousse grise |
| Matériau mousse grise | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51655 |
| Réf échantillon client : 002HM003183062 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Joint entre éléments / Vol 28 | | Description ITGA : | | Mousse grise |
| Mousse grise | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51656 |
| Réf échantillon client : 002HM003183063 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 28 | | Description ITGA : | | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples |
| Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123545 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51657 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183064 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 28 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peintures multiples / Matériau blanc | | |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable + matériau blanc non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51658 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183065 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Isolant intérieur / Vol 28 | | Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières | | |
| ▸ Matériau fibreux jaune avec poussières | MOLP Confirmé au MET | 2 | 30/12/2017 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51659 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183066 / Equipements divers et accessoires / Radiateurs / Tresses / Vol 28 | | Description ITGA : Matériau fibreux marron avec poussières / Peinture en faible quantité en vrac | | |
| ▸ Matériau fibreux marron avec poussières + peinture en faible quantité en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51660 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183067 / Equipements divers et accessoires / Radiateurs / Peinture anti-condensation / Vol 28 | | Description ITGA : Peinture en vrac avec poussières | | |
| ▸ Peinture en vrac avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51661 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183068 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 28 | | Description ITGA : Matériau souple noir | | |
| ▸ Matériau souple noir | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51662 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183069 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 28 | | Description ITGA : Matériau souple noir | | |
| ▸ Matériau souple noir | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123545 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51663 |
| Réf échantillon client : 002HM003183070 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 28 | | Description ITGA : | | Matériau souple blanc |
| ▸ Matériau souple blanc | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51664 |
| Réf échantillon client : 002HM003183071 / Façades / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 28 | | Description ITGA : | | Matériau souple incolore avec poussières |
| ▸ Matériau souple incolore avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51665 |
| Réf échantillon client : 002HM003183072 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 28 | | Description ITGA : | | Matériau souple incolore avec poussières |
| ▸ Matériau souple incolore avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51666 |
| Réf échantillon client : 002HM003183073 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 28 | | Description ITGA : | | Mousse grise avec poussières |
| ▸ Mousse grise avec poussières | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51667 |
| Réf échantillon client : 002HM003183074 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 28 | | Description ITGA : | | Mousse verte / Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en faible quantité |
| ▸ Mousse verte + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51668 |
| Réf échantillon client : 002HM003183075 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 28 | | Description ITGA : | | Matériau souple incolore avec poussières |
| ▸ Matériau souple incolore avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123545 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51669 |
| Réf échantillon client : 002HM003183076 / Façades / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 28 | | Description ITGA : | | Matériau blanc en vrac |
| ▸ Matériau blanc en vrac | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51670 |
| Réf échantillon client : 002HM003183077 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 21 | | Description ITGA : | | Enduit plâtreux blanc avec poussières |
| ▸ Enduit plâtreux blanc avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51671 |
| Réf échantillon client : 002HM003183078 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 21 | | Description ITGA : | | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51672 |
| Réf échantillon client : 002HM003183079 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 21 | | Description ITGA : | | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51673 |
| Réf échantillon client : 002HM003183080 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 21 | | Description ITGA : | | Matériau compact gris / Peinture |
| ▸ Matériau compact gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Peinture | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51674 |
| Réf échantillon client : 002HM003183081 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 21 | | Description ITGA : | | Peinture / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité / Ragréage rose / Matériau gris hétérogène |
| ▸ Peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + ragréage rose + matériau gris hétérogène non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123545 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51675 |
| Réf échantillon client : 002HM003183082 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 21 | | Description ITGA : | | Peintures multiples / Colle polymère noire avec poussières / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité / Colle polymère jaune |
| ▸ Peintures multiples non séparable + colle polymère noire avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51676 |
| Réf échantillon client : 002HM003183083 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 21 | | Description ITGA : | | Revêtement souple gris |
| ▸ Revêtement souple gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51677 |
| Réf échantillon client : 002HM003183084 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Plinthe / Vol 21 | | Description ITGA : | | Matériau compact gris / Peintures multiples |
| ▸ Matériau compact gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Peintures multiples | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51678 |
| Réf échantillon client : 002HM003183085 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Habillage platre / Vol 21 | | Description ITGA : | | Matériau plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples |
| ▸ Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51679 |
| Réf échantillon client : 002HM003183086 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 21 | | Description ITGA : | | Matériau souple noir / Peinture |
| ▸ Matériau souple noir + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51680 |
| Réf échantillon client : 002HM003183087 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 21 | | Description ITGA : | | Enduit gris en vrac / Peinture |
| ▸ Enduit gris en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123545 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51681 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183088 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 70 | | Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche | | |
| ▸ Revêtement souple gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Colle polymère jaune | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51682 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183089 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 70 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture | | |
| ▸ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51683 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183090 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 70 | | Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture | | |
| ▸ Enduit gris en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51684 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183091 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 69 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Papier / Peinture / Matériau blanc | | |
| ▸ Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + peinture non séparable + matériau blanc non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51685 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183092 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 69 | | Description ITGA : Matériau beige en vrac / Peinture / Bois | | |
| ▸ Matériau beige en vrac + peinture non séparable + bois non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123545 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51686 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183093 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 68 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité | | |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51687 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183094 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 68 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Carton / Papier / Matériau blanc | | |
| ▸ Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier non séparable + matériau blanc non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51688 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183095 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 68 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Matériau compact gris en vrac | | |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau compact gris en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51689 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183096 / Plafond et faux-plafonds / Gaines et coffre horizontaux / Jonction entre panneaux / Vol 68 | | Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Papier | | |
| ▸ Matériau plâtreux blanc + papier non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51690 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183097 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 69 | | Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène | | |
| ▸ Matériau compact gris hétérogène | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123545 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51691 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183098 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 20 | | Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche | | |
| Colle bitumineuse noire + sous couche de ragréage blanche non séparable | MOLP | 2 | 30/12/2017 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Ragréage gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51692 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183099 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 20 | | Description ITGA : Revêtement cassant rouge / Colle polymère jaune / Peintures multiples | | |
| Revêtement cassant rouge | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Colle polymère jaune non séparable + peintures multiples | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51693 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183100 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 20 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples | | |
| Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | META | 1 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123546 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

| | |
|---|---|
| Client : AC ENVIRONNEMENT<br>64 rue Clément Ader<br>42153 RIORGES | Réf. Commande ITGA : IT0717-123546<br>Réf. Commande Client : 002HM003183 |

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/12/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Technique Analytique(s) :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

ou

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51711 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183101 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 20 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture | | |
| Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51712 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183102 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 20 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture | | |
| Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123546 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51713 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183103 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés / Vol 20 | | Description ITGA : Matériau fibreux beige avec poussières / Peinture blanche | | |
| ▸ Matériau fibreux beige avec poussières + peinture blanche non séparable | META | 1 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51714 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183104 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 24 | | Description ITGA : Colle grise en vrac / Peinture en faible quantité | | |
| ▸ Colle grise en vrac + peinture en faible quantité non séparable | META | 1 | 03/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51715 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183105 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 24 | | Description ITGA : Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Peinture / Carrelage | | |
| ▸ Colle grise | META | 1 | 02/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| ▸ Couche plâtreuse blanche | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Peinture | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Carrelage | --- | | | Non analysé |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51716 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183106 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (plâtre) / Vol 24 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture | | |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51717 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183107 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 25 | | Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Colle polymère jaune / Ragréage gris | | |
| ▸ Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable | MOLP | 2 | 30/12/2017 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| ▸ Ragréage gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123546 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51718 |
| Réf échantillon client : 002HM003183108 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 25 | | Description ITGA : | | Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières |
| ▸ Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51719 |
| Réf échantillon client : 002HM003183109 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 25 | | Description ITGA : | | Revêtement souple gris avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Matériau blanc en faible quantité |
| ▸ Revêtement souple gris avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + matériau blanc en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51720 |
| Réf échantillon client : 002HM003183110 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 19 | | Description ITGA : | | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en faible quantité en vrac |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51721 |
| Réf échantillon client : 002HM003183111 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 19 | | Description ITGA : | | Matériau souple incolore avec poussières |
| ▸ Matériau souple incolore avec poussières | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51722 |
| Réf échantillon client : 002HM003183112 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 19 | | Description ITGA : | | Matériau souple noir avec poussières |
| ▸ Matériau souple noir avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51723 |
| Réf échantillon client : 002HM003183113 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 19 | | Description ITGA : | | Matériau souple incolore avec poussières |
| ▸ Matériau souple incolore avec poussières | META | 3 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123546 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51724 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183114 / Façades / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 19 | | Description ITGA : Matériau souple incolore / Matériau blanc en faible quantité | | |
| ▸ Matériau souple incolore + matériau blanc en faible quantité non séparable | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51725 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183115 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint / Vol 19 | | Description ITGA : Matériau mou orange avec poussières | | |
| ▸ Matériau mou orange avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51726 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183116 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 22 | | Description ITGA : Colle grise / Joint cassant blanc / Couche plâtreuse blanche en faible quantité | | |
| ▸ Colle grise + joint cassant blanc non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable | META | 2 | 03/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51727 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183117 / Equipements divers et accessoires / Tuyauteries / Tresses / Vol 23 | | Description ITGA : Matériau fibreux marron avec poussières / Peinture | | |
| ▸ Matériau fibreux marron avec poussières non séparable + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51728 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183118 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 18 | | Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris en faible quantité / Matériau souple incolore / Matériau souple blanc en faible quantité / Bois sous forme de fibres | | |
| ▸ Revêtement souple bleu | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau souple incolore non séparable + matériau souple blanc en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Bois sous forme de fibres | --- | | | Non analysé |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123546 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51729 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183119 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 18 | | Description ITGA : Colle bitumineuse noire avec couche en mousse / Ragréage rose / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture / Matériau compact gris hétérogène | | |
| Colle bitumineuse noire avec couche en mousse | MOLP | 2 | 30/12/2017 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Matériau compact gris hétérogène | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Ragréage rose non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51730 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183120 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint mousse / Vol 18 | | Description ITGA : Matériau souple gris / Peinture / Matériau souple gris | | |
| Matériau souple gris + peinture non séparable + matériau souple gris non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51731 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183121 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 17 | | Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Carton / Toile fibreuse blanche | | |
| Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51732 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183122 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 10 | | Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peintures multiples | | |
| Matériau compact gris hétérogène | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Peintures multiples | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51733 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183123 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 11 | | Description ITGA : Matériau compact gris / Peintures multiples | | |
| Matériau compact gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Peintures multiples | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123546 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51734 |
| Réf échantillon client : 002HM003183124 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 11 | | Description ITGA : | | Matériau compact gris hétérogène / Peinture |
| ▸ Matériau compact gris hétérogène | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Peinture | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51735 |
| Réf échantillon client : 002HM003183125 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 11 | | Description ITGA : | | Matériau compact gris hétérogène / Peinture |
| ▸ Matériau compact gris hétérogène | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Peinture | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51736 |
| Réf échantillon client : 002HM003183126 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 12 | | Description ITGA : | | Enduit compact gris / Peinture |
| ▸ Enduit compact gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Peinture | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51737 |
| Réf échantillon client : 002HM003183127 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 11 | | Description ITGA : | | Enduit blanc / Peintures multiples / Matériau compact gris |
| ▸ Enduit blanc non séparable + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Matériau compact gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51738 |
| Réf échantillon client : 002HM003183128 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 11 | | Description ITGA : | | Enduit gris en vrac / Peinture |
| ▸ Enduit gris en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51739 |
| Réf échantillon client : 002HM003183129 / Parois verticales intérieures et enduits / Gaines et coffre verticaux / Enduits ciment / Vol 11 | | Description ITGA : | | Enduit compact gris / Peinture |
| ▸ Enduit compact gris | META | 1 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Peinture | META | 1 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123546 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51740 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183130 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Conduit / Vol 11 | | Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture | | |
| ▸ Matériau gris en vrac hétérogène + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51741 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183131 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre agglos / Vol 11 | | Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture / Matériau blanc | | |
| ▸ Matériau compact gris hétérogène | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Peinture non séparable + matériau blanc non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51742 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183132 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 11 | | Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières | | |
| ▸ Matériau cotonneux blanc avec poussières | MOLP Confirmé au MET | 3 | 30/12/2017 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51743 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183133 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 10 | | Description ITGA : Enduit blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac | | |
| ▸ Enduit blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Matériau gris en vrac | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51744 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183134 / Equipements divers et accessoires / Tuyauteries / Tresses / Vol 10 | | Description ITGA : Matériau fibreux marron avec poussières / Peinture en faible quantité | | |
| ▸ Matériau fibreux marron avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51745 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183135 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 12 | | Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture | | |
| ▸ Enduit gris en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123546 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51746 |
| Réf échantillon client : 002HM003183136 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 10 | | Description ITGA : | | Revêtement cassant vert avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac / Peintures multiples |
| ▸ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Revêtement cassant vert avec couche en toile | META | 5 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51747 |
| Réf échantillon client : 002HM003183137 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 9 | | Description ITGA : | | Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture |
| ▸ Matériau gris en vrac hétérogène + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51748 |
| Réf échantillon client : 002HM003183138 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 9 | | Description ITGA : | | Matériau gris en vrac hétérogène |
| ▸ Matériau gris en vrac hétérogène | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51749 |
| Réf échantillon client : 002HM003183139 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (ciment) / Vol 9 | | Description ITGA : | | Enduit gris / Matériau compact gris hétérogène |
| ▸ Enduit gris non séparable + matériau compact gris hétérogène | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51750 |
| Réf échantillon client : 002HM003183140 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 9 | | Description ITGA : | | Enduit gris en vrac hétérogène |
| ▸ Enduit gris en vrac hétérogène | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51751 |
| Réf échantillon client : 002HM003183141 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 8 | | Description ITGA : | | Enduit gris en vrac hétérogène / Bois en faible quantité |
| ▸ Enduit gris en vrac hétérogène | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Bois en faible quantité | --- | | | Non analysé |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123546 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51752 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183142 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint / Vol 8 | | Description ITGA : Matériau fibreux marron avec poussières | | |
| ▸ Matériau fibreux marron avec poussières | MOLP Confirmé au MET | 2 | 30/12/2017 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51753 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183143 / Equipements divers et accessoires / Bac / Béton / Vol 8 | | Description ITGA : Matériau compact gris avec fibres / Peinture | | |
| ▸ Matériau compact gris avec fibres + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51754 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183144 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 9 | | Description ITGA : Matériau souple incolore avec poussières | | |
| ▸ Matériau souple incolore avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51755 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183145 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 9 | | Description ITGA : Matériau souple incolore avec poussières / Matériau gris en faible quantité en vrac | | |
| ▸ Matériau souple incolore avec poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51756 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183146 / Façades / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 9 | | Description ITGA : Matériau souple gris / Peinture en faible quantité | | |
| ▸ Matériau souple gris + peinture en faible quantité non séparable | META | 2 | 03/01/2018 | Présence de fibres d'amiante (*) / Trémolite |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51757 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183147 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 8 | | Description ITGA : Matériau gris en vrac / Peintures multiples avec poussières | | |
| ▸ Matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples avec poussières non séparable | META | 2 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123546 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51758 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183148 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 9 | | Description ITGA : Matériau fibreux marron / Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton marron / Toile fibreuse blanche / Peinture | | |
| ▸ Matériau fibreux marron non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton marron non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable | META | 4 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51759 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183149 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 83 | | Description ITGA : Matériau fibreux blanc / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture | | |
| ▸ Matériau fibreux blanc non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | META | 2 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51760 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183150 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 83 | | Description ITGA : Matériau fibreux blanc / Toile blanche plâtrée / Peinture | | |
| ▸ Matériau fibreux blanc non séparable + toile blanche plâtrée non séparable + peinture non séparable | META | 3 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |

**(*) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées**

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123547 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

| | |
|---|---|
| Client : AC ENVIRONNEMENT<br>64 rue Clément Ader<br>42153 RIORGES | Réf. Commande ITGA : IT0717-123547<br>Réf. Commande Client : 002HM003183 |

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/12/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

ou

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

ou

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51761 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183151 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 83 | | Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières / Toile blanche plâtrée / Peinture | | |
| Matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + toile blanche plâtrée non séparable + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51762 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183152 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 83 | | Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières / Toile blanche plâtrée / Matériau fibreux blanc / Peintures multiples | | |
| Matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + toile blanche plâtrée non séparable + matériau fibreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123547 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51763 |
| Réf échantillon client : 002HM003183153 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 83 | | Description ITGA : | | Matériau fibreux jaune / Toile blanche plâtrée / Carton / Peinture |
| ▸ Matériau fibreux jaune non séparable + toile blanche plâtrée non séparable + carton non séparable + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51764 |
| Réf échantillon client : 002HM003183154 / Equipements divers et accessoires / Tuyauteries / Tresses / Vol 83 | | Description ITGA : | | Matériau fibreux marron / Matériau gris en faible quantité |
| ▸ Matériau fibreux marron + matériau gris en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51765 |
| Réf échantillon client : 002HM003183155 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint de bride / Vol 83 | | Description ITGA : | | Matériau rose en vrac avec fibres visibles |
| ▸ Matériau rose en vrac avec fibres visibles | MOLP | 2 | 30/12/2017 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51766 |
| Réf échantillon client : 002HM003183156 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint de bride / Vol 83 | | Description ITGA : | | Matériau marron en vrac |
| ▸ Matériau marron en vrac | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51767 |
| Réf échantillon client : 002HM003183157 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint de bride / Vol 83 | | Description ITGA : | | Matériau beige en vrac avec poussières / Peinture |
| ▸ Matériau beige en vrac avec poussières + peinture non séparable | META | 2 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51768 |
| Réf échantillon client : 002HM003183158 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint de bride / Vol 83 | | Description ITGA : | | Matériau beige en vrac avec poussières |
| ▸ Matériau beige en vrac avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123547 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51769 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183159 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint de bride / Vol 83 | | Description ITGA : Matériau beige en vrac avec fibres / Peinture | | |
| ▸ Matériau beige en vrac avec fibres + peinture non séparable | META | 2 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51770 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183160 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint de bride / Vol 83 | | Description ITGA : Matériau beige en vrac avec poussières / Peinture | | |
| ▸ Matériau beige en vrac avec poussières + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51771 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183161 / Equipements divers et accessoires / Tuyauteries / Tresses / Vol 83 | | Description ITGA : Matériau fibreux marron / Peinture avec couche d'aluminium | | |
| ▸ Matériau fibreux marron + peinture avec couche d'aluminium non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51772 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183162 / Equipements divers et accessoires / Ballon / Tresses / Vol 83 | | Description ITGA : Matériau fibreux marron / Matériau gris en faible quantité | | |
| ▸ Matériau fibreux marron + matériau gris en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51773 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183163 / Equipements divers et accessoires / Vase d'expension / Peinture / Vol 83 | | Description ITGA : Peinture en vrac (i) | | |
| ▸ Peinture en vrac | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51774 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183164 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 82 | | Description ITGA : Matériau fibreux marron / Matériau plâtreux blanc / Peinture / Carton | | |
| ▸ Matériau fibreux marron + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable + carton non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123547 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51775 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183165 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 82 | | Description ITGA : Matériau fibreux blanc / Carton marron / Matériau fibreux marron / Toile fibreuse blanche / Peinture | | |
| ▸ Matériau fibreux blanc + carton marron non séparable + matériau fibreux marron non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51776 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183166 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 82 | | Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières | | |
| ▸ Matériau fibreux jaune avec poussières | MOLP Confirmé au MET | 2 | 30/12/2017 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51777 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183167 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 82 | | Description ITGA : Matériau fibreux blanc avec poussières | | |
| ▸ Matériau fibreux blanc avec poussières | MOLP Confirmé au MET | 2 | 30/12/2017 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51778 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183168 / Equipements divers et accessoires / Tuyauteries / Tresses / Vol 82 | | Description ITGA : Matériau fibreux marron / Peinture / Matériau gris en faible quantité | | |
| ▸ Matériau fibreux marron + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51779 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183169 / Equipements divers et accessoires / Tuyauteries / Tresses / Vol 82 | | Description ITGA : Matériau fibreux marron / Peinture | | |
| ▸ Matériau fibreux marron + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51780 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183170 / Equipements divers et accessoires / Tuyauteries / Tresses / Vol 82 | | Description ITGA : Matériau fibreux marron / Peinture / Matériau gris en vrac | | |
| ▸ Matériau fibreux marron + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123547 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51781 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183171 / Equipements divers et accessoires / Tuyauteries / Tresses / Vol 82 | | Description ITGA : Matériau fibreux marron / Matériau gris en faible quantité / Peinture | | |
| ▸ Matériau fibreux marron + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51782 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183172 / Equipements divers et accessoires / Tuyauteries / Tresses / Vol 82 | | Description ITGA : Matériau fibreux marron / Matériau blanc en faible quantité en vrac avec poussières | | |
| ▸ Matériau fibreux marron + matériau blanc en faible quantité en vrac avec poussières non séparable | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51783 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183173 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint de bride / Vol 82 | | Description ITGA : Matériau rose en vrac avec fibres visibles / Peinture | | |
| ▸ Matériau rose en vrac avec fibres visibles + peinture non séparable | MOLP | 2 | 30/12/2017 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51784 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183174 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint de bride / Vol 82 | | Description ITGA : Matériau beige en vrac / Peintures multiples | | |
| ▸ Matériau beige en vrac + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51785 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183175 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint de bride / Vol 82 | | Description ITGA : Matériau beige en vrac / Peintures multiples en faible quantité | | |
| ▸ Matériau beige en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51786 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183176 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint de bride / Vol 82 | | Description ITGA : Matériau beige en vrac avec fibres | | |
| ▸ Matériau beige en vrac avec fibres | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123547 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51787 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183177 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint de bride / Vol 82 | | Description ITGA : Matériau beige en vrac avec fibres / Peintures multiples | | |
| ▸ Matériau beige en vrac avec fibres + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51788 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183178 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint de bride / Vol 82 | | Description ITGA : Matériau gris avec fibres / Peinture | | |
| ▸ Matériau gris avec fibres + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51789 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183179 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint de bride / Vol 82 | | Description ITGA : Matériau mou gris | | |
| ▸ Matériau mou gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51790 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183180 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint de bride / Vol 82 | | Description ITGA : Matériau mou gris / Peinture | | |
| ▸ Matériau mou gris + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51791 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183181 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint de bride / Vol 82 | | Description ITGA : Matériau gris en vrac avec fibres | | |
| ▸ Matériau gris en vrac avec fibres | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51792 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183182 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint de bride / Vol 82 | | Description ITGA : Matériau souple noir / Matériau beige en vrac | | |
| ▸ Matériau souple noir non séparable + matériau beige en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123547 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51793 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183183 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint de bride / Vol 82 | | Description ITGA : Matériau beige en vrac avec fibres / Peintures multiples | | |
| ▸ Matériau beige en vrac avec fibres + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51794 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183184 / Equipements divers et accessoires / Ballon ECS / Isolant / Vol 82 | | Description ITGA : Matériau mousse grise | | |
| ▸ Matériau mousse grise | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51795 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183185 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint de bride / Vol 82 | | Description ITGA : Matériau souple noir / Peinture | | |
| ▸ Matériau souple noir + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51796 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183186 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint de bride / Vol 82 | | Description ITGA : Matériau souple noir | | |
| ▸ Matériau souple noir | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51797 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183187 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 12 | | Description ITGA : Matériau fibreux marron / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc / Carton | | |
| ▸ Matériau fibreux marron non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51798 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183188 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 12 | | Description ITGA : Matériau fibreux multicolore avec poussières / Carton marron / Toile fibreuse blanche | | |
| ▸ Matériau fibreux multicolore avec poussières + carton marron non séparable + toile fibreuse blanche non séparable | MOLP Confirmé au MET | 2 | 30/12/2017 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123547 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51799 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183189 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint de bride / Vol 12 | | Description ITGA : Matériau mou gris / Peinture | | |
| ▸ Matériau mou gris + peinture non séparable | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51800 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183190 / Equipements divers et accessoires / Tuyauteries / Tresses / Vol 12 | | Description ITGA : Matériau fibreux marron / Peinture / Matériau gris en faible quantité | | |
| ▸ Matériau fibreux marron + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51801 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183191 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 7 | | Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en vrac | | |
| ▸ Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac non séparable | MOLP | 2 | 30/12/2017 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51802 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183192 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 7 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples | | |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | META | 1 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51803 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183193 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 7 | | Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières | | |
| ▸ Matériau souple noir avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51804 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183194 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 7 | | Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières | | |
| ▸ Matériau souple noir avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123547 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51805 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183195 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 7 | | Description ITGA : Matériau souple noir | | |
| ▸ Matériau souple noir | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51806 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183196 / Façades / Menuiseries / **Reprise d'étanchéité / Vol 7** | | Description ITGA : Matériau mou gris / Matériau blanc en faible quantité | | |
| ▸ Matériau mou gris + matériau blanc en faible quantité non séparable | META | 2 | 02/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Anthophyllite |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51807 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183197 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 7 | | Description ITGA : Matériau fibreux multicolore avec poussières | | |
| ▸ Matériau fibreux multicolore avec poussières | MOLP Confirmé au MET | 2 | 30/12/2017 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51808 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183198 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 7 | | Description ITGA : Matériau fibreux jaune / Peinture blanche / Couche fibreuse blanche | | |
| ▸ Matériau fibreux jaune + peinture blanche non séparable + couche fibreuse blanche non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51809 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183199 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Mastics / Vol 7 | | Description ITGA : Matériau bitumineux noir en vrac / Peinture | | |
| ▸ Matériau bitumineux noir en vrac + peinture non séparable | META | 2 | 02/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile-Anthophyllite |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51810 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183200 / Equipements divers et accessoires / Radiateurs / Tresses / Vol 7 | | Description ITGA : Matériau fibreux marron / Matériau gris en faible quantité | | |
| ▸ Matériau fibreux marron + matériau gris en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

(i) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour l'analyse

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123548 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

| | |
|---|---|
| Client : AC ENVIRONNEMENT<br>64 rue Clément Ader<br>42153 RIORGES | Réf. Commande ITGA : IT0717-123548<br>Réf. Commande Client : 002HM003183 |

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/12/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Technique Analytique(s) :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

ou

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51811 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183201 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 7 | | Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Matériau plâtreux blanc / Papier / Peintures multiples | | |
| Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51812 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183202 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 7 | | Description ITGA : Dalle dure cassante verte / Colle polymère jaune / Ragréage gris | | |
| Dalle dure cassante verte | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123548 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51813 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183203 / Parois verticales intérieures et enduits / Gaines et coffre verticaux / Enduits plâtre / Vol 7 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture | | |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51814 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183204 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 7 | | Description ITGA : Enduit beige en vrac | | |
| ▸ Enduit beige en vrac | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51815 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183205 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 7 | | Description ITGA : Matériau fibreux marron avec poussières | | |
| ▸ Matériau fibreux marron avec poussières | MOLP Confirmé au MET | 2 | 30/12/2017 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51816 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183206 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 7 | | Description ITGA : Matériau fibreux multicolore avec poussières | | |
| ▸ Matériau fibreux multicolore avec poussières | MOLP Confirmé au MET | 2 | 30/12/2017 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51817 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183208 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 26 | | Description ITGA : Colle beige / Matériau gris en faible quantité / Joint cassant gris | | |
| ▸ Colle beige + matériau gris en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Joint cassant gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51818 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183209 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 26 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture | | |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123548 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51819 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183210 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 26 | | Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières | | |
| ▸ Matériau fibreux jaune avec poussières | MOLP Confirmé au MET | 2 | 30/12/2017 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51820 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183211 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 26 | | Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Matériau plâtreux blanc / Peinture | | |
| ▸ Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable | META | 1 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51821 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183212 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 26 | | Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture | | |
| ▸ Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable | META | 1 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51822 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183213 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Flocages / Vol 26 | | Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières | | |
| ▸ Matériau cotonneux blanc avec poussières | MOLP Confirmé au MET | 3 | 30/12/2017 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51823 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183214 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 52 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture | | |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123548 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51824 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183215 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 52 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture | | |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51825 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183216 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 52 | | Description ITGA : Colle grise / Matériau rose | | |
| ▸ Colle grise + matériau rose non séparable | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51826 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183217 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 52 | | Description ITGA : Colle beige / Joint cassant gris | | |
| ▸ Colle beige | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Joint cassant gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51827 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183218 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 52 | | Description ITGA : Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant gris / Peinture | | |
| ▸ Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant gris non séparable + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51828 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183219 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 52 | | Description ITGA : Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Joint cassant gris | | |
| ▸ Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène | META | 1 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Joint cassant gris | META | 1 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123548 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51829 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183220 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Plot de colle / Vol 52 | | Description ITGA : Colle beige en vrac / Peinture | | |
| ▸ Colle beige en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51830 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183221 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 52 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture | | |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51831 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183222 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 52 | | Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier | | |
| ▸ Matériau plâtreux blanc en vrac + papier non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51832 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183223 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (ciment) / Vol 52 | | Description ITGA : Enduit marron en vrac hétérogène / Peinture | | |
| ▸ Enduit marron en vrac hétérogène + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51833 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183224 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 26 | | Description ITGA : Colle beige / Matériau compact gris hétérogène / Joint cassant gris | | |
| ▸ Colle beige non séparable + matériau compact gris hétérogène | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Joint cassant gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51834 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183225 / Equipements divers et accessoires / Evier / Mastic étanchéité / Vol 46 | | Description ITGA : Matériau souple blanc avec poussières | | |
| ▸ Matériau souple blanc avec poussières | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123548 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51835 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183226 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 46 | | Description ITGA : Colle grise en vrac / Peinture | | |
| ▸ Colle grise en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51836 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183227 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 46 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture | | |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51837 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183228 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 46 | | Description ITGA : Colle grise / Joint cassant gris / Matériau compact rose hétérogène | | |
| ▸ Colle grise non séparable + joint cassant gris non séparable + matériau compact rose hétérogène | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51838 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183229 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de maçonnerie / Vol 46 | | Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture en faible quantité | | |
| ▸ Matériau compact gris hétérogène + peinture en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51839 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183230 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 46 | | Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières / Peinture | | |
| ▸ Matériau fibreux jaune avec poussières + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51840 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183231 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 43 | | Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières | | |
| ▸ Matériau souple noir avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123548 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | IT071712-51841 | |
| Réf échantillon client : 002HM003183232 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 43 | | Description ITGA : | Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Matériau plâtreux blanc / Peintures multiples | |
| ▸ Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | IT071712-51842 | |
| Réf échantillon client : 002HM003183233 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 43 | | Description ITGA : | Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton avec poussières / Papier / Peintures multiples | |
| ▸ Matériau plâtreux blanc en vrac + carton avec poussières non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | IT071712-51843 | |
| Réf échantillon client : 002HM003183234 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 43 | | Description ITGA : | Enduit gris en vrac hétérogène | |
| ▸ Enduit gris en vrac hétérogène | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | IT071712-51844 | |
| Réf échantillon client : 002HM003183235 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 43 | | Description ITGA : | Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage rose / Sous couche de ragréage grise hétérogène | |
| ▸ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Ragréage rose + sous couche de ragréage grise hétérogène non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | IT071712-51845 | |
| Réf échantillon client : 002HM003183236 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques / Vol 43 | | Description ITGA : | Revêtement souple gris / Peinture | |
| ▸ Revêtement souple gris + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123548 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51846 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183237 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 43 | | Description ITGA : Matériau fibreux beige / Peinture | | |
| ▸ Matériau fibreux beige + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51847 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183238 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 43 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples | | |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51848 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183239 / Plafond et faux-plafonds / Poutres et charpentes / Flocages / Vol 43 | | Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières | | |
| ▸ Matériau cotonneux blanc avec poussières | MOLP Confirmé au MET | 3 | 30/12/2017 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51849 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183240 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 43 | | Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec couche fibreuse / Peinture | | |
| ▸ Matériau fibreux jaune avec couche fibreuse + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51850 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183241 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Joint entre éléments / Vol 43 | | Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Matériau souple rouge / Peinture | | |
| ▸ Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + matériau souple rouge + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51851 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183242 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 43 | | Description ITGA : Matériau souple gris / Bois / Bois aggloméré | | |
| ▸ Matériau souple gris non séparable + bois non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Bois aggloméré | --- | | | Non analysé |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123548 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51852 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183243 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Rebouchage / Vol 46 | | Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène avec fibres | | |
| ▸ Matériau compact gris hétérogène avec fibres | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51853 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183244 / Equipements divers et accessoires / Radiateurs / Tresses / Vol 46 | | Description ITGA : Matériau fibreux marron / Peinture en vrac | | |
| ▸ Matériau fibreux marron + peinture en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51854 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183245 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Carton / Vol 7 | | Description ITGA : Matériau cartonné / Peinture / Matériau noir en vrac | | |
| ▸ Matériau cartonné non séparable + peinture non séparable + matériau noir en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51855 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183246 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 7 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris hétérogène / Peintures multiples | | |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris hétérogène non séparable + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51856 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183247 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Joint entre éléments / Vol 7 | | Description ITGA : Peinture | | |
| ▸ Peinture | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51857 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183248 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 7 | | Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène / Matériau souple jaune | | |
| ▸ Enduit gris en vrac hétérogène | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Matériau souple jaune | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123548 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51858 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183249 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 52 | | Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture | | |
| ▸ Matériau plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51859 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183250 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 50 | | Description ITGA : Colle beige avec poussières / Joint cassant gris | | |
| ▸ Colle beige avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Joint cassant gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51860 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183251 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 50 | | Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Joint cassant gris | | |
| ▸ Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Joint cassant gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123549 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

| | |
|---|---|
| Client : AC ENVIRONNEMENT<br>64 rue Clément Ader<br>42153 RIORGES | Réf. Commande ITGA : IT0717-123549<br>Réf. Commande Client : 002HM003183 |

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/12/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

ou
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51861 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183252 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 38 | | Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peintures multiples | | |
| Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51862 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183253 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / plinthe / Vol 38 | | Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peintures multiples | | |
| Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51863 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183254 / Plafond et faux-plafonds / Poutres et charpentes / Peinture / Vol 52 | | Description ITGA : Peinture en vrac | | |
| Peinture en vrac | META | 1 | 02/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123549 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51864 |
| Réf échantillon client : 002HM003183255 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Joint de bride / Vol 52 | | Description ITGA : | | Peinture en vrac |
| ▸ Peinture en vrac | META | 4 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51865 |
| Réf échantillon client : 002HM003183256 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Mastics / Vol 52 | | Description ITGA : | | Matériau souple gris |
| ▸ Matériau souple gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51866 |
| Réf échantillon client : 002HM003183257 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 57 | | Description ITGA : | | Colle grise / Peinture |
| ▸ Colle grise + peinture non séparable | META | 3 | 03/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51867 |
| Réf échantillon client : 002HM003183258 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint entre agglos / Vol 57 | | Description ITGA : | | Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture |
| ▸ Matériau gris en vrac hétérogène + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51868 |
| Réf échantillon client : 002HM003183259 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons / Vol 52 | | Description ITGA : | | Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51869 |
| Réf échantillon client : 002HM003183260 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 52 | | Description ITGA : | | Colle grise en vrac / Joint cassant gris |
| ▸ Colle grise en vrac non séparable + joint cassant gris | META | 1 | 02/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123549 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51870 |
| Réf échantillon client : 002HM003183261 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 52 | | Description ITGA : | | Matériau souple noir avec poussières |
| ▸ Matériau souple noir avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51871 |
| Réf échantillon client : 002HM003183262 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 63 | | Description ITGA : | | Matériau compact gris |
| ▸ Matériau compact gris | META | 2 | 02/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51872 |
| Réf échantillon client : 002HM003183263 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 63 | | Description ITGA : | | Matériau gris en vrac |
| ▸ Matériau gris en vrac | META | 2 | 02/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51873 |
| Réf échantillon client : 002HM003183264 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 63 | | Description ITGA : | | Mousse blanche avec poussières |
| ▸ Mousse blanche avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51874 |
| Réf échantillon client : 002HM003183265 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 63 | | Description ITGA : | | Mousse noire |
| ▸ Mousse noire | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51875 |
| Réf échantillon client : 002HM003183266 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 63 | | Description ITGA : | | Matériau souple incolore avec poussières |
| ▸ Matériau souple incolore avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51876 |
| Réf échantillon client : 002HM003183267 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 63 | | Description ITGA : | | Matériau souple noir |
| ▸ Matériau souple noir | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123549 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51877 |
| Réf échantillon client : 002HM003183268 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 63 | | Description ITGA : | | Matériau souple incolore avec poussières |
| Matériau souple incolore avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51878 |
| Réf échantillon client : 002HM003183269 / Façades / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 63 | | Description ITGA : | | Matériau souple incolore avec poussières |
| Matériau souple incolore avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51879 |
| Réf échantillon client : 002HM003183270 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 63 | | Description ITGA : | | Matériau gris en vrac |
| Matériau gris en vrac | META | 1 | 02/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51880 |
| Réf échantillon client : 002HM003183271 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 63 | | Description ITGA : | | Matériau souple noir avec poussières |
| Matériau souple noir avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51881 |
| Réf échantillon client : 002HM003183272 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 63 | | Description ITGA : | | Matériau souple incolore avec poussières |
| Matériau souple incolore avec poussières | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51882 |
| Réf échantillon client : 002HM003183273 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 44 | | Description ITGA : | | Colle grise / Joint cassant blanc / Carrelage en faible quantité |
| Joint cassant blanc | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Carrelage en faible quantité | --- | | | Non analysé |
| Colle grise | META | 4 | 03/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123549 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51883 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183274 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 44 | | Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène | | |
| ▸ Matériau compact gris hétérogène | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51884 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183275 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 44 | | Description ITGA : Colle grise / Matériau beige / Joint cassant blanc en vrac | | |
| ▸ Colle grise + matériau beige non séparable + joint cassant blanc en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51885 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183276 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 44 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac | | |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac | META | 3 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51886 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183277 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 45 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec poussières / Peintures multiples | | |
| ▸ Enduit plâtreux blanc avec poussières + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51887 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183278 / Equipements divers et accessoires / Radiateurs / Tresses / Vol 44 | | Description ITGA : Matériau fibreux marron avec poussières / Peinture | | |
| ▸ Matériau fibreux marron avec poussières non séparable + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51888 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183279 / Equipements divers et accessoires / Radiateurs / Peinture / Vol 44 | | Description ITGA : Peinture en vrac | | |
| ▸ Peinture en vrac | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123549 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51889 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183280 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Isolant intérieur / Vol 45 | | Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières | | |
| ▸ Matériau fibreux jaune avec poussières | MOLP Confirmé au MET | 2 | 30/12/2017 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51890 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183281 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 45 | | Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène | | |
| ▸ Enduit compact gris hétérogène | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51891 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183282 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 44 | | Description ITGA : Matériau gris en vrac / Peinture | | |
| ▸ Matériau gris en vrac + peinture non séparable | META | 2 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51892 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183283 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 44 | | Description ITGA : Matériau souple incolore avec poussières | | |
| ▸ Matériau souple incolore avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51893 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183284 / Façades / Menuiseries / **Reprise d'étanchéité / Vol 44** | | Description ITGA : Matériau mou gris avec poussières / Peinture | | |
| ▸ Matériau mou gris avec poussières + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51894 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183285 / Façades / Menuiseries / **Joint d'étanchéité / Vol 44** | | Description ITGA : Matériau souple gris avec poussières | | |
| ▸ Matériau souple gris avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51895 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183286 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Manchon / Vol 44 | | Description ITGA : Toile fibreuse grise | | |
| ▸ Toile fibreuse grise | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123549 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51896 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183287 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Carton / Vol 44 | | Description ITGA : Matériau cartonné avec poussières | | |
| ▸ Matériau cartonné avec poussières | META | 1 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51897 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183288 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint entre éléments / Vol 44 | | Description ITGA : Matériau fibreux noir avec poussières | | |
| ▸ Matériau fibreux noir avec poussières | MOLP Confirmé au MET | 2 | 30/12/2017 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51898 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183289 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Mastics / Vol 44 | | Description ITGA : Matériau compact noir | | |
| ▸ Matériau compact noir | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51899 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183290 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Mastics / Vol 45 | | Description ITGA : Matériau gris en vrac / Peinture | | |
| ▸ Matériau gris en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51900 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183291 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Joint entre éléments / Vol 44 | | Description ITGA : Matériau noir en vrac | | |
| ▸ Matériau noir en vrac | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51901 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183292 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 60 | | Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture | | |
| ▸ Matériau gris en vrac hétérogène + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51902 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183293 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 60 | | Description ITGA : Colle grise en vrac | | |
| ▸ Colle grise en vrac | META | 1 | 02/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123549 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51903 |
| Réf échantillon client : 002HM003183294 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 59 | | Description ITGA : | | Peinture / Ragréage gris |
| ▸ Peinture non séparable + ragréage gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51904 |
| Réf échantillon client : 002HM003183295 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 59 | | Description ITGA : | | Colle grise en vrac hétérogène |
| ▸ Colle grise en vrac hétérogène | META | 1 | 02/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51905 |
| Réf échantillon client : 002HM003183296 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Joint entre éléments / Vol 59 | | Description ITGA : | | Mousse noire |
| ▸ Mousse noire | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51906 |
| Réf échantillon client : 002HM003183297 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 61 | | Description ITGA : | | Enduit plâtreux blanc / Carton / Papier / Peinture |
| ▸ Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51907 |
| Réf échantillon client : 002HM003183298 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 61 | | Description ITGA : | | Enduit compact gris / Peintures multiples |
| ▸ Enduit compact gris + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51908 |
| Réf échantillon client : 002HM003183299 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 62 | | Description ITGA : | | Matériau compact gris hétérogène / Peinture |
| ▸ Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123549 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | IT071712-51909 | |
| Réf échantillon client : 002HM003183300 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 62 | | Description ITGA : | Colle grise en vrac hétérogène | |
| ▸ Colle grise en vrac hétérogène | META | 1 | 02/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | IT071712-51910 | |
| Réf échantillon client : 002HM003183301 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 62 | | Description ITGA : | Enduit compact gris hétérogène / Peinture | |
| ▸ Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123550 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

| | |
|---|---|
| Client : AC ENVIRONNEMENT<br>64 rue Clément Ader<br>42153 RIORGES | Réf. Commande ITGA : IT0717-123550<br>Réf. Commande Client : 002HM003183 |

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/12/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Technique Analytique(s) :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

ou

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51931 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183302 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 61 | | Description ITGA : Matériau souple noir / Peinture | | |
| Matériau souple noir + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51932 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183303 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Mastics / Vol 59 | | Description ITGA : Matériau souple gris / Peintures multiples | | |
| Matériau souple gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Peintures multiples | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123550 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51933 |
| Réf échantillon client : 002HM003183304 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Mastics / Vol 59 | | Description ITGA : | | Matériau souple gris / Peinture |
| ▸ Matériau souple gris + peinture non séparable | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51934 |
| Réf échantillon client : 002HM003183305 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 58 | | Description ITGA : | | Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peintures multiples / Sous couche de ragréage grise hétérogène |
| ▸ Revêtement souple gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Peintures multiples non séparable + sous couche de ragréage grise hétérogène | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51935 |
| Réf échantillon client : 002HM003183306 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 58 | | Description ITGA : | | Colle beige / Matériau gris / Peinture |
| ▸ Colle beige + matériau gris non séparable + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51936 |
| Réf échantillon client : 002HM003183307 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 58 | | Description ITGA : | | Colle grise / Carrelage |
| Carrelage | --- | | | Non analysé |
| ▸ Colle grise | META | 2 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51937 |
| Réf échantillon client : 002HM003183308 / Equipements divers et accessoires / Lavabo / Joint d'étanchéité / Vol 58 | | Description ITGA : | | Matériau souple blanc avec poussières |
| ▸ Matériau souple blanc avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123550 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51938 |
| Réf échantillon client : 002HM003183309 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 58 | | Description ITGA : | | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Bois aggloméré |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Bois aggloméré | --- | | | Non analysé |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51939 |
| Réf échantillon client : 002HM003183310 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 58 | | Description ITGA : | | Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture |
| ▸ Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51940 |
| Réf échantillon client : 002HM003183311 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint de bride / Vol 58 | | Description ITGA : | | Matériau souple noir avec poussières |
| ▸ Matériau souple noir avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51941 |
| Réf échantillon client : 002HM003183312 / Plafond et faux-plafonds / Gaines et coffre horizontaux / Panneaux / Vol 58 | | Description ITGA : | | Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières / Bois massif / Matériau souple gris |
| ▸ Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + bois massif + matériau souple gris non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51942 |
| Réf échantillon client : 002HM003183313 / Parois verticales intérieures et enduits / Gaines et coffre verticaux / Jonction entre panneaux / Vol 58 | | Description ITGA : | | Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier |
| ▸ Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + papier | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51943 |
| Réf échantillon client : 002HM003183314 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 58 | | Description ITGA : | | Enduit gris en vrac hétérogène / Peintures multiples |
| ▸ Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123550 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51944 |
| Réf échantillon client : 002HM003183315 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 47 | | Description ITGA : | | Colle grise |
| Colle grise | META | 1 | 02/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51945 |
| Réf échantillon client : 002HM003183316 / Equipements divers et accessoires / Tuyauteries / Tresses / Vol 47 | | Description ITGA : | | Matériau fibreux beige avec poussières |
| Matériau fibreux beige avec poussières | MOLP Confirmé au MET | 2 | 30/12/2017 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51946 |
| Réf échantillon client : 002HM003183317 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 47 | | Description ITGA : | | Revêtement souple gris / Colle polymère jaune avec poussières / Peinture / Ragréage gris avec couche fibreuse / Revêtement souple blanc |
| Revêtement souple gris + revêtement souple blanc | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris avec couche fibreuse | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51947 |
| Réf échantillon client : 002HM003183318 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 49 | | Description ITGA : | | Revêtement souple gris / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage rose / Ragréage gris |
| Revêtement souple gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Ragréage gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51948 |
| Réf échantillon client : 002HM003183319 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (plâtre) / Vol 49 | | Description ITGA : | | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples |
| Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123550 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51949 |
| Réf échantillon client : 002HM003183320 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 49 | | Description ITGA : | | Matériau souple noir |
| ▸ Matériau souple noir | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51950 |
| Réf échantillon client : 002HM003183321 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 49 | | Description ITGA : | | Matériau souple blanc / Peinture |
| ▸ Matériau souple blanc | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Peinture | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51951 |
| Réf échantillon client : 002HM003183322 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 49 | | Description ITGA : | | Matériau souple noir avec poussières |
| ▸ Matériau souple noir avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51952 |
| Réf échantillon client : 002HM003183323 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 49 | | Description ITGA : | | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51953 |
| Réf échantillon client : 002HM003183324 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 49 | | Description ITGA : | | Mousse blanche avec poussières |
| ▸ Mousse blanche avec poussières | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51954 |
| Réf échantillon client : 002HM003183325 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 40 | | Description ITGA : | | Colle beige / Colle grise / Peinture / Carrelage |
| ▸ Colle beige non séparable + colle grise + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Carrelage | --- | | | Non analysé |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123550 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51955 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183326 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (plâtre) / Vol 40 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples | | |
| Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51956 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183327 / Equipements divers et accessoires / Lavabo / Joint d'étanchéité / Vol 40 | | Description ITGA : Matériau souple blanc avec poussières | | |
| Matériau souple blanc avec poussières | META | 5 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51957 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183328 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 42 | | Description ITGA : Colle beige / Peinture / Matériau souple blanc / Carrelage | | |
| Colle beige + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Matériau souple blanc | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Carrelage | --- | | | Non analysé |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51958 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183329 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 42 | | Description ITGA : Colle grise / Joint cassant blanc / Colle beige / Carrelage | | |
| Colle beige | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Carrelage | --- | | | Non analysé |
| Colle grise + joint cassant blanc non séparable | META | 2 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51959 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183330 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 42 | | Description ITGA : Colle grise / Joint cassant blanc / Carrelage | | |
| Colle grise | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Joint cassant blanc | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Carrelage | --- | | | Non analysé |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123550 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51960 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183331 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 42 | | Description ITGA : Colle grise / Couche plâtreuse blanche en faible quantité | | |
| Colle grise + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51961 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183332 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 41 | | Description ITGA : Matériau fibreux marron / Carton / Toile fibreuse blanche / Peintures multiples | | |
| Matériau fibreux marron + carton + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51962 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183333 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 41 | | Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières | | |
| Matériau souple noir avec poussières | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51963 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183334 / Façades / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 41 | | Description ITGA : Matériau souple blanc avec poussières | | |
| Matériau souple blanc avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51964 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183335 / Façades / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 41 | | Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières | | |
| Matériau souple noir avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51965 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183336 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 42 | | Description ITGA : Colle beige / Peinture | | |
| Colle beige + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123550 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51966 |
| Réf échantillon client : 002HM003183337 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 42 | | Description ITGA : | | Colle beige / Matériau compact gris / Couche plâtreuse blanche en faible quantité |
| Colle beige + matériau compact gris non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51967 |
| Réf échantillon client : 002HM003183338 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de briques de verre / Vol 42 | | Description ITGA : | | Matériau compact gris en vrac hétérogène / Peinture |
| Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51968 |
| Réf échantillon client : 002HM003183339 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 42 | | Description ITGA : | | Colle beige |
| Colle beige | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51969 |
| Réf échantillon client : 002HM003183340 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 42 | | Description ITGA : | | Matériau souple noir avec poussières |
| Matériau souple noir avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51970 |
| Réf échantillon client : 002HM003183341 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 42 | | Description ITGA : | | Matériau souple blanc / Matériau gris en faible quantité |
| Matériau souple blanc + matériau gris en faible quantité non séparable | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51971 |
| Réf échantillon client : 002HM003183342 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 54 | | Description ITGA : | | Colle grise / Matériau compact blanc / Carrelage |
| Colle grise | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Matériau compact blanc | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Carrelage | --- | | | Non analysé |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123550 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51972 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183343 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (plâtre) / Vol 54 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples | | |
| Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51973 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183344 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 54 | | Description ITGA : Colle beige / Colle blanche / Matériau compact gris hétérogène | | |
| Colle beige + colle blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable | META | 2 | 03/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51974 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183345 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 51 | | Description ITGA : Revêtement souple gris avec couche en mousse / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche | | |
| Revêtement souple gris avec couche en mousse | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Colle polymère jaune | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51975 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183346 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe / Vol 51 | | Description ITGA : Colle beige / Peintures multiples | | |
| Colle beige + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51976 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183347 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 51 | | Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières / Peinture | | |
| Matériau fibreux jaune avec poussières + peinture non séparable | META | 3 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51977 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183348 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 51 | | Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture | | |
| Matériau compact gris hétérogène | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Peinture | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123550 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51978 |
| Réf échantillon client : 002HM003183349 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 51 | | Description ITGA : | | Matériau compact gris hétérogène / Enduit plâtreux blanc / Peinture |
| ▸ Enduit plâtreux blanc non séparable + peinture | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Matériau compact gris hétérogène | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51979 |
| Réf échantillon client : 002HM003183350 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de lissage / Vol 51 | | Description ITGA : | | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51980 |
| Réf échantillon client : 002HM003183351 / Parois verticales intérieures et enduits / Gaines et coffre verticaux / Jonction entre panneaux / Vol 51 | | Description ITGA : | | Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc / Peinture |
| ▸ Matériau plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123551 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

| | |
|---|---|
| Client : AC ENVIRONNEMENT<br>64 rue Clément Ader<br>42153 RIORGES | Réf. Commande ITGA : IT0717-123551<br>Réf. Commande Client : 002HM003183 |

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/12/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Technique Analytique(s) :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

ou

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51981 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183352 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Plinthe ciment / Vol 51 | | Description ITGA : Matériau compact gris / Peintures multiples | | |
| Matériau compact gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Peintures multiples | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51982 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183353 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 51 | | Description ITGA : Enduit compact gris en vrac / Peinture | | |
| Enduit compact gris en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123551 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51983 |
| Réf échantillon client : 002HM003183354 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 51 | | Description ITGA : | | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51984 |
| Réf échantillon client : 002HM003183355 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Sous-couches des tissus muraux / Vol 51 | | Description ITGA : | | Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Matériau plâtreux blanc / Matériau mousse verte |
| ▸ Revêtement souple orange + colle polymère jaune non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau mousse verte non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51985 |
| Réf échantillon client : 002HM003183356 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 51 | | Description ITGA : | | Matériau souple noir |
| ▸ Matériau souple noir | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51986 |
| Réf échantillon client : 002HM003183357 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 29 | | Description ITGA : | | Revêtement cassant multicolore / Colle polymère incolore avec poussières |
| ▸ Revêtement cassant multicolore + colle polymère incolore avec poussières non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51987 |
| Réf échantillon client : 002HM003183358 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 29 | | Description ITGA : | | Revêtement cassant blanc en faible quantité / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Revêtement cassant beige |
| ▸ Revêtement cassant blanc en faible quantité non séparable + revêtement cassant beige | META | 1 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable | META | 1 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123551 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51988 |
| Réf échantillon client : 002HM003183359 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Peinture de plinthe / Vol 29 | | Description ITGA : | | Peintures multiples / Bois |
| ▸ Peintures multiples | META | 1 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Bois | --- | | | Non analysé |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51989 |
| Réf échantillon client : 002HM003183360 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 33 | | Description ITGA : | | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable | META | 1 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51990 |
| Réf échantillon client : 002HM003183361 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Sous-couches des tissus muraux / Vol 29 | | Description ITGA : | | Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Peinture / Matériau plâtreux blanc |
| ▸ Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51991 |
| Réf échantillon client : 002HM003183362 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 75 | | Description ITGA : | | Matériau compact gris / Peintures multiples |
| ▸ Matériau compact gris + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51992 |
| Réf échantillon client : 002HM003183363 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle de barre de seuil / Vol 75 | | Description ITGA : | | Colle polymère noire avec poussières |
| ▸ Colle polymère noire avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123551 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51993 |
| Réf échantillon client : 002HM003183364 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 75 | | Description ITGA : | | Enduit compact gris / Peintures multiples |
| Enduit compact gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Peintures multiples | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51994 |
| Réf échantillon client : 002HM003183365 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 75 | | Description ITGA : | | Enduit gris en vrac / Peintures multiples |
| Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51995 |
| Réf échantillon client : 002HM003183366 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Plinthe ciment / Vol 75 | | Description ITGA : | | Matériau compact gris / Peintures multiples |
| Matériau compact gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Peintures multiples | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51996 |
| Réf échantillon client : 002HM003183367 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 75 | | Description ITGA : | | Enduit blanc en vrac / Peintures multiples / Matériau gris en vrac |
| Enduit blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51997 |
| Réf échantillon client : 002HM003183368 / Plafond et faux-plafonds / Poutres / Peinture / Vol 75 | | Description ITGA : | | Peinture en vrac |
| Peinture en vrac | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-51998 |
| Réf échantillon client : 002HM003183369 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 75 | | Description ITGA : | | Matériau souple noir / Peintures multiples |
| Matériau souple noir | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Peintures multiples | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123551 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-51999 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183370 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit de rebouchage / Vol 75 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples | | |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52000 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183371 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 75 | | Description ITGA : Matériau souple noir | | |
| ▸ Matériau souple noir | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52001 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183372 / Façades / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 75 | | Description ITGA : Matériau souple noir | | |
| ▸ Matériau souple noir | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52002 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183373 / Façades / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 75 | | Description ITGA : Matériau mou gris / Peinture | | |
| ▸ Matériau mou gris + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52003 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183374 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 75 | | Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peintures multiples | | |
| ▸ Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52004 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183375 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 27 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier | | |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123551 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52005 |
| Réf échantillon client : 002HM003183376 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 27 | | Description ITGA : | | Matériau gris en vrac / Peintures multiples |
| ▸ Matériau gris en vrac | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Peintures multiples | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52006 |
| Réf échantillon client : 002HM003183377 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 27 | | Description ITGA : | | Matériau souple noir |
| ▸ Matériau souple noir | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52007 |
| Réf échantillon client : 002HM003183378 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 27 | | Description ITGA : | | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Matériau gris en vrac |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52008 |
| Réf échantillon client : 002HM003183379 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 53 | | Description ITGA : | | Enduit compact gris / Peinture |
| ▸ Enduit compact gris + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52009 |
| Réf échantillon client : 002HM003183380 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Tresses / Vol 53 | | Description ITGA : | | Matériau fibreux marron / Peinture |
| ▸ Matériau fibreux marron + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52010 |
| Réf échantillon client : 002HM003183381 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 53 | | Description ITGA : | | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123551 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52011 |
| Réf échantillon client : 002HM003183382 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 39 | | Description ITGA : | | Colle grise / Matériau gris hétérogène |
| Colle grise non séparable + matériau gris hétérogène | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52012 |
| Réf échantillon client : 002HM003183383 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 39 | | Description ITGA : | | Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Peinture / Joint cassant blanc |
| Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Joint cassant blanc | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52013 |
| Réf échantillon client : 002HM003183384 / Plafond et faux-plafonds / Poutres / Peinture / Vol 77 | | Description ITGA : | | Peintures multiples en vrac |
| Peintures multiples en vrac | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52014 |
| Réf échantillon client : 002HM003183385 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 77 | | Description ITGA : | | Colle blanche / Ragréage rose hétérogène |
| Colle blanche + ragréage rose hétérogène non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52015 |
| Réf échantillon client : 002HM003183386 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 78 | | Description ITGA : | | Colle grise |
| Colle grise | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52016 |
| Réf échantillon client : 002HM003183387 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 77 | | Description ITGA : | | Colle grise / Couche plâtreuse blanche avec couche souple / Carrelage / Joint cassant gris en vrac |
| Colle grise + couche plâtreuse blanche avec couche souple non séparable + joint cassant gris en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Carrelage | --- | | | Non analysé |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123551 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52017 |
| Réf échantillon client : 002HM003183388 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 77 | | Description ITGA : | | Colle beige / Joint cassant gris |
| Colle beige | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Joint cassant gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52018 |
| Réf échantillon client : 002HM003183389 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage **(faïence) / Vol 79** | | Description ITGA : | | Colle grise / Couche plâtreuse blanche |
| Colle grise | META | 1 | 02/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Couche plâtreuse blanche | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52019 |
| Réf échantillon client : 002HM003183390 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit taloché / Vol 77 | | Description ITGA : | | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples |
| Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52020 |
| Réf échantillon client : 002HM003183391 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 77 | | Description ITGA : | | Colle grise / Peintures multiples |
| Colle grise + peintures multiples non séparable | META | 1 | 03/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52021 |
| Réf échantillon client : 002HM003183392 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 77 | | Description ITGA : | | Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau blanc |
| Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau blanc non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52022 |
| Réf échantillon client : 002HM003183393 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (ciment) / Vol 77 | | Description ITGA : | | Enduit gris en vrac / Peintures multiples |
| Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123551 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52023 |
| Réf échantillon client : 002HM003183394 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 79 | | Description ITGA : | | Colle grise |
| Colle grise | META | 2 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52024 |
| Réf échantillon client : 002HM003183395 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 77 | | Description ITGA : | | Mousse blanche avec poussières / Peinture |
| Mousse blanche avec poussières + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52025 |
| Réf échantillon client : 002HM003183396 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 79 | | Description ITGA : | | Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau blanc / Matériau gris en faible quantité |
| Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52026 |
| Réf échantillon client : 002HM003183397 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Bande podotactile / Vol 77 | | Description ITGA : | | Matériau souple noir / Colle polymère incolore avec couche en toile et poussières |
| Matériau souple noir | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Colle polymère incolore avec couche en toile et poussières | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52027 |
| Réf échantillon client : 002HM003183398 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Nez de marche / Vol 77 | | Description ITGA : | | Peinture / Matériau plâtreux blanc |
| Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52028 |
| Réf échantillon client : 002HM003183399 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 52 | | Description ITGA : | | Matériau plâtreux blanc / Peinture / Papier |
| Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123551 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | IT071712-52029 | |
| Réf échantillon client : 002HM003183400 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 80 | | Description ITGA : | Colle grise / Matériau beige hétérogène | |
| Colle grise + matériau beige hétérogène non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | IT071712-52030 | |
| Réf échantillon client : 002HM003183401 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 80 | | Description ITGA : | Colle grise / Matériau beige hétérogène / Joint cassant gris | |
| Colle grise + matériau beige hétérogène non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Joint cassant gris | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123552 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

| | |
|---|---|
| Client : AC ENVIRONNEMENT<br>64 rue Clément Ader<br>42153 RIORGES | Réf. Commande ITGA : IT0717-123552<br>Réf. Commande Client : 002HM003183 |

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/12/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Technique Analytique(s) : - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

ou
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52043 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183402 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 80 | | Description ITGA : Colle grise / Couche plâtreuse blanche | | |
| ▸ Colle grise | META | 1 | 02/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| ▸ Couche plâtreuse blanche | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52044 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183403 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 80 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples | | |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123552 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52045 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183404 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 80 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples | | |
| Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52046 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183405 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 80 | | Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture / Toile fibreuse blanche en faible quantité / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac | | |
| Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52047 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183406 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 81 | | Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peintures multiples | | |
| Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52048 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183407 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 81 | | Description ITGA : Enduit rose en vrac hétérogène / Peinture | | |
| Enduit rose en vrac hétérogène + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52049 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183408 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de lisage / Vol 81 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture | | |
| Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123552 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52050 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183409 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 81 | | Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac | | |
| ▸ Enduit gris en vrac + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52051 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183410 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 85 | | Description ITGA : Matériau compact gris / Matériau compact blanc / Peinture en faible quantité | | |
| ▸ Matériau compact gris non séparable + matériau compact blanc + peinture en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52052 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183411 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 85 | | Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peinture / Papier | | |
| ▸ Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable + papier | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52053 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183412 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 85 | | Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture | | |
| ▸ Enduit gris en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52054 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183413 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 85 | | Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture | | |
| ▸ Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52055 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183414 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 76 | | Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène / Peintures multiples | | |
| ▸ Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123552 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52056 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183415 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 76 | | Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peintures multiples | | |
| ▸ Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable | META | 2 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52057 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183416 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (plâtre) / Vol 76 | | Description ITGA : Enduit compact gris / Peinture / Matériau plâtreux blanc | | |
| ▸ Enduit compact gris non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc | META | 1 | 02/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52058 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183417 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 76 | | Description ITGA : Matériau souple incolore avec poussières | | |
| ▸ Matériau souple incolore avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52059 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183418 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 76 | | Description ITGA : Mousse noire | | |
| ▸ Mousse noire | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52060 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183419 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 74 | | Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène / Peintures multiples | | |
| ▸ Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52061 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183420 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 74 | | Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture | | |
| ▸ Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123552 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52062 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183421 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Tresses / Vol 74 | | Description ITGA : Matériau fibreux marron / Matériau gris en faible quantité | | |
| ▸ Matériau fibreux marron + matériau gris en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52063 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183422 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 74 | | Description ITGA : Matériau souple blanc avec poussières | | |
| ▸ Matériau souple blanc avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52064 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183423 / Toiture et étanchéité / Eléments ponctuels / Mitron / Vol 87 | | Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles / Mousse végétale | | |
| ▸ Fibrociment gris avec fibres visibles + mousse végétale | MOLP | 2 | 02/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile-Crocidolite |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52065 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183424 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Calorifugeage / Vol 32 | | Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières | | |
| ▸ Matériau fibreux jaune avec poussières | MOLP Confirmé au MET | 2 | 30/12/2017 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52066 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183425 / Plafond et faux-plafonds / Gaines et coffre horizontaux / Jonction entre panneaux / Vol 32 | | Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier | | |
| ▸ Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52067 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183426 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 32 | | Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières | | |
| ▸ Revêtement souple beige | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Colle polymère jaune avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123552 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52068 |
| Réf échantillon client : 002HM003183427 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 32 | | Description ITGA : | | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52069 |
| Réf échantillon client : 002HM003183428 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 31 | | Description ITGA : | | Revêtement souple gris / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage rose |
| ▸ Revêtement souple gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52070 |
| Réf échantillon client : 002HM003183429 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 31 | | Description ITGA : | | Revêtement cassant gris en vrac avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris |
| ▸ Revêtement cassant gris en vrac avec couche en toile | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52071 |
| Réf échantillon client : 002HM003183430 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 31 | | Description ITGA : | | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52072 |
| Réf échantillon client : 002HM003183431 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 31 | | Description ITGA : | | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52073 |
| Réf échantillon client : 002HM003183432 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 31 | | Description ITGA : | | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123552 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52074 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183433 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de tattami / Vol 31 | | Description ITGA : Matériau souple gris avec poussières | | |
| ▸ Matériau souple gris avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52075 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183434 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 36 | | Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Peintures multiples | | |
| ▸ Matériau gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52076 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183435 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 36 | | Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Peintures multiples | | |
| ▸ Matériau gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52077 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183436 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits projetés / Vol 36 | | Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture | | |
| ▸ Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52078 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183437 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits projetés / Vol 36 | | Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture / Matériau beige en vrac | | |
| ▸ Enduit gris en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52079 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183438 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (ciment) / Vol 36 | | Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture | | |
| ▸ Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable | META | 2 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123552 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52080 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183439 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 36 | | Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture | | |
| ▸ Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52081 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183440 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 36 | | Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton / Papier | | |
| ▸ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52082 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183441 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 89 | | Description ITGA : Colle polymère jaune / Peinture en faible quantité / Ragréage gris | | |
| ▸ Colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52083 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183442 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 88 | | Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène | | |
| ▸ Matériau compact gris hétérogène | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52084 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183443 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 88 | | Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier | | |
| ▸ Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52085 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183444 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 88 | | Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène | | |
| ▸ Enduit gris en vrac hétérogène | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123552 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52086 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183445 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint entre maçonnerie / Vol 88 | | Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène | | |
| ▸ Matériau gris en vrac hétérogène | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52087 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183446 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Enveloppe de calorifuge / Vol 88 | | Description ITGA : Carton marron / Toile blanche plâtrée / Peinture en vrac | | |
| ▸ Carton marron non séparable + toile blanche plâtrée non séparable + peinture en vrac non séparable | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52088 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183447 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 88 | | Description ITGA : Matériau fibreux multicolore avec poussières | | |
| ▸ Matériau fibreux multicolore avec poussières | MOLP Confirmé au MET | 2 | 30/12/2017 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52089 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183448 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 88 | | Description ITGA : Matériau fibreux multicolore / Peinture en faible quantité | | |
| ▸ Matériau fibreux multicolore + peinture en faible quantité non séparable | META | 1 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52090 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183449 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 88 | | Description ITGA : Matériau fibreux blanc avec poussières | | |
| ▸ Matériau fibreux blanc avec poussières | MOLP Confirmé au MET | 2 | 30/12/2017 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52091 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183450 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 88 | | Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières | | |
| ▸ Matériau fibreux jaune avec poussières | MOLP Confirmé au MET | 2 | 30/12/2017 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123552 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52092 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183451 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Joint entre éléments / Vol 92 | | Description ITGA : Matériau souple blanc avec poussières / Peinture | | |
| Matériau souple blanc avec poussières + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123553 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

| | |
|---|---|
| Client : AC ENVIRONNEMENT<br>64 rue Clément Ader<br>42153 RIORGES | Réf. Commande ITGA : IT0717-123553<br>Réf. Commande Client : 002HM003183 |

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/12/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Technique Analytique(s) :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

ou

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52118 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183452 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint de bride / Vol 88 | | Description ITGA : Matériau compact marron avec fibres / Peinture | | |
| ▸ Matériau compact marron avec fibres + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52119 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183453 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Tresses / Vol 88 | | Description ITGA : Matériau fibreux marron avec poussières / Matériau gris en faible quantité en vrac | | |
| ▸ Matériau fibreux marron avec poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123553 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52120 |
| Réf échantillon client : 002HM003183454 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 92 | | Description ITGA : | | Enduit gris en vrac |
| ▸ Enduit gris en vrac | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52121 |
| Réf échantillon client : 002HM003183455 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 94 | | Description ITGA : | | Enduit gris en vrac |
| ▸ Enduit gris en vrac | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52122 |
| Réf échantillon client : 002HM003183456 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 95 | | Description ITGA : | | Matériau souple incolore avec poussières |
| ▸ Matériau souple incolore avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52123 |
| Réf échantillon client : 002HM003183457 / Façades / Bardages / Peinture / Vol 95 | | Description ITGA : | | Peinture / Matériau marron en vrac |
| ▸ Peinture non séparable + matériau marron en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52124 |
| Réf échantillon client : 002HM003183458 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Joint entre éléments / Vol 94 | | Description ITGA : | | Matériau gris en vrac |
| ▸ Matériau gris en vrac | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52125 |
| Réf échantillon client : 002HM003183459 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 96 | | Description ITGA : | | Matériau souple noir avec poussières |
| ▸ Matériau souple noir avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52126 |
| Réf échantillon client : 002HM003183460 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 94 | | Description ITGA : | | Matériau mou gris avec poussières |
| ▸ Matériau mou gris avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123553 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52127 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183461 / Façades / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 93 | | Description ITGA : Mousse rouge / Peinture avec poussières | | |
| Mousse rouge non séparable + peinture avec poussières non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52128 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183462 / Façades / Baguette métallique / Reprise d'étanchéité / Vol 94 | | Description ITGA : Matériau souple incolore / Matériau beige en faible quantité en vrac hétérogène | | |
| Matériau souple incolore + matériau beige en faible quantité en vrac hétérogène non séparable | META | 3 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52129 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183463 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 34 | | Description ITGA : Revêtement souple vert avec couche en mousse / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène / Peinture | | |
| Revêtement souple vert avec couche en mousse | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52130 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183464 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe / Vol 34 | | Description ITGA : Colle polymère beige / Peinture en faible quantité | | |
| Colle polymère beige + peinture en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52131 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183465 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 34 | | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples | | |
| Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52132 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183466 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 97 (Façades) | | Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture | | |
| Enduit gris en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123553 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52133 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183467 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 97 (Façades) | | Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture | | |
| Enduit gris en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52134 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183468 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 97 (Façades) | | Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène | | |
| Matériau gris en vrac hétérogène | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52135 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183469 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 97 (Façades) | | Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture | | |
| Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52136 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183470 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Nez de marche / Vol 97 (Façades) | | Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières | | |
| Matériau souple noir avec poussières | META | 2 | 03/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52137 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183471 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 97 (Façades) | | Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène avec poussières | | |
| Matériau compact gris hétérogène avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : IT071712-52138 | | |
| Réf échantillon client : 002HM003183472 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 97 (Façades) | | Description ITGA : Matériau compact hétérogène / Mousse végétale en faible quantité | | |
| Matériau compact hétérogène + mousse végétale en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123553 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52139 |
| Réf échantillon client : 002HM003183473 / Façades / Murs / Colle de carrelage / Vol 97 (Façades) | | Description ITGA : | | Colle blanche en vrac avec poussières |
| ▸ Colle blanche en vrac avec poussières | META | 2 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52140 |
| Réf échantillon client : 002HM003183474 / Façades / Murs / Colle de carrelage / Vol 97 (Façades) | | Description ITGA : | | Colle beige en vrac hétérogène |
| ▸ Colle beige en vrac hétérogène | META | 1 | 02/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52141 |
| Réf échantillon client : 002HM003183475 / Façades / Poteau / Reprise d'étanchéité / Vol 97 (Façades) | | Description ITGA : | | Matériau souple noir / Matériau gris / Peinture en faible quantité |
| ▸ Matériau souple noir | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Matériau gris + peinture en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52142 |
| Réf échantillon client : 002HM003183476 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Joint de dilatation / Vol 97 (Façades) | | Description ITGA : | | Matériau bitumineux noir avec poussières / Matériau beige en faible quantité |
| ▸ Matériau bitumineux noir avec poussières + matériau beige en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52143 |
| Réf échantillon client : 002HM003183477 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 97 (Façades) | | Description ITGA : | | Matériau bitumineux noir avec poussières |
| ▸ Matériau bitumineux noir avec poussières | META | 2 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52144 |
| Réf échantillon client : 002HM003183478 / Toiture et étanchéité / Solin / Reprise d'étanchéité / Vol 97 (Façades) | | Description ITGA : | | Matériau souple incolore avec poussières |
| ▸ Matériau souple incolore avec poussières | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123553 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52145 |
| Réf échantillon client : 002HM003183479 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 97 (Façades) | | Description ITGA : | | Enduit compact blanc hétérogène / Peinture |
| ▸ Enduit compact blanc hétérogène + peinture non séparable | META | 2 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52146 |
| Réf échantillon client : 002HM003183480 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 97 (Façades) | | Description ITGA : | | Enduit gris en vrac |
| ▸ Enduit gris en vrac | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52147 |
| Réf échantillon client : 002HM003183481 / Façades / Murs / Colle de carrelage / Vol 97 (Façades) | | Description ITGA : | | Colle grise en vrac / Carrelage en faible quantité |
| ▸ Colle grise en vrac | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Carrelage en faible quantité | --- | | | Non analysé |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52148 |
| Réf échantillon client : 002HM003183482 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 97 (Façades) | | Description ITGA : | | Colle beige / Matériau compact gris hétérogène / Carrelage |
| ▸ Colle beige | META | 1 | 02/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| ▸ Matériau compact gris hétérogène | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Carrelage | --- | | | Non analysé |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52149 |
| Réf échantillon client : 002HM003183483 / Façades / Murs / Colle de carrelage / Vol 97 (Façades) | | Description ITGA : | | Colle blanche en vrac / Matériau gris en faible quantité |
| ▸ Colle blanche en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52150 |
| Réf échantillon client : 002HM003183484 / Façades / Murs / Joint de dilatation / Vol 97 (Façades) | | Description ITGA : | | Matériau souple gris / Matériau fibreux blanc avec poussières |
| ▸ Matériau souple gris | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▸ Matériau fibreux blanc avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123553 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52151 |
| Réf échantillon client : 002HM003183485 / Façades / Murs / Joint de parement / Vol 97 (Façades) | | Description ITGA : | | Matériau gris en vrac / Matériau beige en vrac |
| ▸ Matériau gris en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52152 |
| Réf échantillon client : 002HM003183486 / Façades / Murs / Colle de carrelage / Vol 97 (Façades) | | Description ITGA : | | Colle beige en vrac / Joint cassant gris en vrac |
| ▸ Colle beige en vrac non séparable + joint cassant gris en vrac non séparable | META | 1 | 02/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52153 |
| Réf échantillon client : 002HM003183487 / Façades / Murs / Colle de carrelage / Vol 97 (Façades) | | Description ITGA : | | Colle grise en vrac |
| ▸ Colle grise en vrac | META | 3 | 03/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52154 |
| Réf échantillon client : 002HM003183488 / Toiture et étanchéité / Solin / Reprise d'étanchéité / Vol 97 (Façades) | | Description ITGA : | | Matériau souple incolore avec poussières |
| ▸ Matériau souple incolore avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52155 |
| Réf échantillon client : 002HM003183489 / Façades / Garde corps / Masticvitrier / Vol 98 | | Description ITGA : | | Matériau souple incolore avec poussières |
| ▸ Matériau souple incolore avec poussières | META | 2 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52156 |
| Réf échantillon client : 002HM003183490 / Façades / Murs / Joints entre prémurs béton brut / Vol 97 (Façades) | | Description ITGA : | | Matériau souple gris avec poussières |
| ▸ Matériau souple gris avec poussières | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-123553 EN DATE DU 03/01/2018
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|---|---|---|---|
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52157 |
| Réf échantillon client : 002HM003183491 / Façades / Murs / Bardeaux bitumé (type "Shingle") / Vol 97 (Façades) | | Description ITGA : | | Matériau bitumineux avec gravillons |
| ▸ Matériau bitumineux avec gravillons | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52158 |
| Réf échantillon client : 002HM003183492 / Façades / Murs / Colle de carrelage / Vol 97 (Façades) | | Description ITGA : | | Colle blanche |
| ▸ Colle blanche | META | 1 | 02/01/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) 5 rue Gaspard Monge - 67000 STRASBOURG CAMPUS CENTRAL - 0290 - CSU (SUAPS) | | Réf échantillon ITGA : | | IT071712-52159 |
| Réf échantillon client : 002HM003183493 / Façades / Murs / Colle de carrelage / Vol 97 (Façades) | | Description ITGA : | | Colle grise hétérogène |
| ▸ Colle grise hétérogène | META | 1 | 02/01/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



***Nota :*** ***Ces documents annexés sont des extraits de rapports émis par d'autres entreprises ou des documentations d'information complémentaires, ils ne peuvent engager la responsabilité de l'opérateur de repérage M WEBER Régis ni de l'entreprise DIAGOBAH.***

## Annexe - Certifications



# Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

Certificat diagnostiqueur immobilier numérique

## N° CPDI3476 Version 012

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

***Monsieur WEBER Régis***

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

| | |
|---|---|
| Amiante avec mention | Amiante Avec Mention (1)<br>Date d'effet : 21/10/2022 - Date d'expiration : 20/10/2029 |
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention (1)<br>Date d'effet : 21/10/2022 - Date d'expiration : 20/10/2029 |
| Plomb | Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1)<br>Date d'effet : 28/11/2022 - Date d'expiration : 27/11/2029 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée en scannant le QR code ou à l'adresse suivante : https://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/
Valide à partir du 31/03/2026.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

cofrac
ACCREDITATION N° 4-0522 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PERSONNES

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev23

## Annexe - Attestation sur l'honneur

DIAGOBAH
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

1 Rue René Laennec – 67300 SCHILTIGHEIM
03 67 97 45 50 - contact@diagobah.com - www.diagobah.fr

**Déclaration sur l'honneur**
Conformément aux articles R. 2143-3, R. 2143-6 à 10 du CCP
(Documents justificatifs et autres moyens de preuve de l'absence de motifs d'exclusion)

Je soussigné,

Nom, Prénom : **SACCOMANDI Bastian**

Représentant l'entreprise : **DIAGOBAH**

Adresse : **1 Rue René Laennec 67300 SCHILTIGHEIM**

N° SIRET : **884 296 856 00039**

**Déclare et atteste sur l'honneur :**

- N'entrer dans un cas d'interdictions de soumissionner aux marchés publics mentionnés aux articles du CCP suivants, à la date de la présente attestation :

**Exclusions de plein droit**

- L. 2141-1 (relatif aux infractions au Code général des impôts)
- L. 2141-2 (relatif aux déclarations et à l'acquittement des taxes, impôts et cotisations sociales),
- L. 2141-3 (relatif aux liquidations judiciaires, faillites, redressement judiciaire, interdiction de gérer, prévus au Code de Commerce),
- L. 2141-4 et notamment aux 1° et β° (relatif aux sanctions ou condamnations en lien avec le Code du travail et le Code Pénal),
- L. 2141-5 (relatif à une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du Code du travail),

**Exclusions à l'appréciation de l'acheteur**

- L. 2141-7 (relatif à une résiliation ou une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat de la commande publique antérieur),
- L. 2147-8 (relatif à d'éventuelles interventions, influences ou transmission d'informations trompeuses susceptibles de fausser le processus décisionnel de l'acheteur, ainsi qu'à la participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la présente procédure de passation du marché),
- L. 2147-9 (relatif aux ententes avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence),
- L. 2141-10 (relatif aux conflits d'intérêts direct ou indirect),
- L. 2141-11 (relatif à l'égalité de traitement entre candidats lors de la procédure d'attribution),
  - Satisfaire aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail (relatifs aux obligations en termes d'emploi des travailleurs handicapés),
  - Dans le cas où j'emploie des salariés, que le travail sera réalisé par des salariés employés régulièrement au regard :
- Des articles L. 3243-1, -2 et -4 (Bulletin de paie), R. 3243-1 à -5 (Paiement du salaire), L. 1221-10 à 12 et R. 1221-1 (Déclaration préalable à l'embauche) du Code du travail,
- Des articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail (relatifs à la lutte contre le travail illégal, le travail dissimulé, les travailleurs détachés et les cocontractants établis à l'étranger).

*Nom et signature*

DIAGOBAH
03 67 97 45 50 | contact@diagobah.com
1 rue René Laennec 67300 SCHILTIGHEIM
Siret : 884 296 856 00013

## Annexe – Assurance

Dominique ROSANO
Agent Général AXA
59, avenue Clemenceau
57100 THIONVILLE
Tel : 03 82 53 58 11
Fax : 03 82 53 58 02
N° ORIAS : 14 005 882

**ATTESTATION D'ASSURANCE**
CONTRAT N° 10825380704

Je, soussigné Dominique ROSANO, Agent Général AXA FRANCE, dont le siège est 313 Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE Cedex,

Atteste par la présente que la SAS DIAGOBAH est titulaire auprès de notre agence d'une police « Responsabilité Civile » n°**10825380704** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'elle pourrait encourir dans l'exercice de ses activités :

*Diagnostic de Performance énergétique collectif (DPE)*
*Audit Energétique (AE)*
*Diagnostic Technique Amiante (DTA) (avant-vente, avant-location, avant-travaux et démolition)*
*Contrôle visuel après travaux de désamiantage*
*Diagnostic Plomb (CREP, DRIPP, avant travaux et démolition, plomb dans l'eau)*
*Etat d'installation intérieure Electricité*
*Etat d'installation intérieure Gaz*
*Diagnostic technique Global*
*Diagnostic gestion des déchets issues de la démolition*

Cette attestation est valable du 01/07/2025 au 30/06/2026 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des assurances ou par le contrat.
Elle ne peut nous engager au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Thionville, le 29/12/2025, pour servir et valoir ce que de droit,

D. ROSANO
Votre agent général

Dominique ROSANO
AGENT GÉNÉRAL AXA
Assurances-Banque-Patrimoine-Conseil
59, Avenue Clemenceau
57100 THIONVILLE
Tél. 03 82 53 58 11 - Fax 03 82 53 58 02
N° ORIAS 14 005 882
