Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 131 RUE GRANDE RUE 62200 BOULOGNE SUR MER

Référence client : SP BOULOGNE SUR MER

Désignation : SP BOULOGNE SUR MER

Date de construction : En 2022

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société PRÉFECTURE DE LA RÉGION HAUTS DE FRANCE
12 RUE JEAN-SANS-PEUR CS 20003 - CS 20003
59800 LILLE

Donneur d'ordre :
Société PRÉFECTURE DE LA RÉGION HAUTS DE FRANCE
12 RUE JEAN-SANS-PEUR CS 20003 - CS 20003
59800 LILLE

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : FERREIRA FALLON

Accompagnateur : ()

Date de repérage 12/01/2023

Numéro attestation : CPDI6332

Délivré le : 15/03/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 26/01/2023

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 26/01/2023

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC - Vol 1 (Entrée)	RDC - Vol 2 (Circulation 1)
RDC - Vol 3 (Circulation 2)	RDC - Vol 4 (Bureau 1)
RDC - Vol 5 (Remise)	RDC - Vol 6 (Bureau 2)
RDC - Vol 7 (Bureau 3)	RDC - Vol 8 (Bureau 4)
RDC - Vol 9 (Guichet)	RDC - Vol 10 (Couloir)
RDC - Vol 11 (Accès étage)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Réfection complète

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Réfection complète du RDC

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Façades	RDC	Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Circulation 2) - Vol 5 (Remise) - Vol 8 (Bureau 4)	
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Circulation 1) - Vol 3 (Circulation 2) - Vol 4 (Bureau 1) - Vol 5 (Remise) - Vol 6 (Bureau 2) - Vol 7 (Bureau 3) - Vol 8 (Bureau 4) - Vol 9 (Guichet) - Vol 10 (Couloir)	
Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Circulation 1) - Vol 3 (Circulation 2) - Vol 4 (Bureau 1) - Vol 5 (Remise) - Vol 6 (Bureau 2) - Vol 7 (Bureau 3) - Vol 8 (Bureau 4) - Vol 9 (Guichet) - Vol 10 (Couloir)	
Revêtement de mur	RDC	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Circulation 1) - Vol 3 (Circulation 2)	
Revêtement de sol	RDC	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Circulation 1) - Vol 3 (Circulation 2) - Vol 4 (Bureau 1) - Vol 5 (Remise) - Vol 6 (Bureau 2) - Vol 7 (Bureau 3) - Vol 8 (Bureau 4) - Vol 9 (Guichet) - Vol 10 (Couloir)	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucun

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Aucune

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Aucune

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 6 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P1
Vol 5 (Remise)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P1
Vol 4 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P1
Vol 3 (Circulation 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P1
Vol 7 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P1
Vol 8 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P1
Vol 9 (Guichet)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P1
Vol 2 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P1
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P1
Vol 10 (Couloir)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P1
Vol 6 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P2
Vol 5 (Remise)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P2
Vol 4 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P2
Vol 3 (Circulation 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P2
Vol 2 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P2
Vol 9 (Guichet)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P2
Vol 8 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P2
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P2
Vol 10 (Couloir)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P2
Vol 7 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P2
Vol 6 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P3
Vol 6 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P4

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Façades

2 - Parois verticales intérieures et enduits

3 - Plafond et faux-plafonds

4 - Revêtement de sol

5 - Revêtement de mur

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 5 (Remise)	Menuiseries	Joint à lèvre	P18	Réalisation d'un prélevement		002ER 32872 5 n°18 - 1	P18	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Remise)	Menuiseries	Joint à lèvre	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER 32872 5 n°18 - 1	P18	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Joint à lèvre	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER 32872 5 n°18 - 1	P18	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Bureau 4)	Menuiseries	Joint à lèvre	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER 32872 5 n°18 - 1	P18	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Remise) - Vol 1 (Entrée) - Vol 8 (Bureau 4)	Menuiseries	Joint à lèvre	S76 - S77 - S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER 32872 5 n°18 - 1	P18	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Remise)	Menuiseries	Joint vitrier	P19	Réalisation d'un prélevement		002ER 32872 5 n°19 - 1	P19	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Remise)	Menuiseries	Joint vitrier	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ER 32872 5 n°19 - 1	P19	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3 (Circulation 2)	Menuiseries	Joint vitrier	P20	Réalisation d'un prélevement		002ER 32872 5 n°20 - 1	P20	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Circulation 2)	Menuiseries	Joint vitrier	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER 32872 5 n°20 - 1	P20	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P11	Réalisation d'un prélevement		002ER 32872 5 n°11 - 1	P11	Plâtre / Papier - Pulvérulent / Souple Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 32872 5 n°11 - 1	P11	Plâtre / Papier - Pulvérulent / Souple Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 32872 5 n°11 - 1	P11	Plâtre / Papier - Pulvérulent / Souple Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S28 - S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 32872 5 n°11 - 1	P11	Plâtre / Papier - Pulvérulent / Souple Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Circulation 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P12	Réalisation d'un prélevement		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Circulation 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Circulation 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Circulation 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3 (Circulation 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Circulation 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Circulation 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Circulation 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Circulation 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3 (Circulation 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 4 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Remise)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Remise)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Remise)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 7 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 9 (Guichet)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (Guichet)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Couloir)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Couloir)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 2 (Circulation 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Circulation 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Circulation 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3 (Circulation 2) - Vol 4 (Bureau 1) - Vol 5 (Remise) - Vol 6 (Bureau 2) - Vol 7 (Bureau 3) - Vol 8 (Bureau 4) - Vol 9 (Guichet) - Vol 1 (Entrée) - Vol 10 (Couloir) - Vol 2 (Circulation 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S30 - S31 - S32 - S33 - S34 - S35 - S36 - S37 - S38 - S39 - S40 - S41 - S42 - S43 - S44 - S45 - S46 - S47 - S48 - S49 - S50 - S51 - S52 - S53 - S54 - S55 - S56 - S57 - S58 - S59 - S60 - S61 - S62 - S63 - S64 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER 32872 5 n°12 - 1	P12	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
				S65							
RDC	Vol 2 (Circulation 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P13	Réalisation d'un prélevement		002ER32872 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Violet / Blanc / Blanc / Beige /	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 9 (Guichet)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER32872 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Violet / Blanc / Blanc / Beige /	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 2 (Circulation 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER32872 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Violet / Blanc / Blanc / Beige /	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 10 (Couloir)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 32872 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Violet / Blanc / Blanc / Beige /	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 9 (Guichet) - Vol 2 (Circulation 1) - Vol 10 (Couloir)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S66 - S67 - S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER32872 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Violet / Blanc / Blanc / Beige /	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3 (Circulation 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P14	Réalisation d'un prélevement		002ER32872 5 n°14 - 1	P14	Faux-plafond / Matériau - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 5 (Remise)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 32872 5 n°14 - 1	P14	Faux-plafond / Matériau - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Bureau 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 32872 5 n°14 - 1	P14	Faux-plafond / Matériau - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Bureau 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 32872 5 n°14 - 1	P14	Faux-plafond / Matériau - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Remise) - Vol 4 (Bureau 1) - Vol 6 (Bureau 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S69 - S70 - S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 32872 5 n°14 - 1	P14	Faux-plafond / Matériau - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 7 (Bureau 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P15	Réalisation d'un prélevement		002ER 32872 5 n°15 - 1	P15	Laine / Matériau / Matériau - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (Guichet)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P16	Réalisation d'un prélevement		002ER 32872 5 n°16 - 1	P16	Laine / Matériau / Matériau - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Bureau 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER 32872 5 n°16 - 1	P16	Laine / Matériau / Matériau - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 2 (Circulation 1)	Plafonds	Enduits plâtre	P17	Réalisation d'un prélevement		002ER 32872 5 n°17 - 1	P17	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Circulation 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER 32872 5 n°17 - 1	P17	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduits plâtre	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER 32872 5 n°17 - 1	P17	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 10 (Couloir)	Plafonds	Enduits plâtre	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER 32872 5 n°17 - 1	P17	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Circulation 2) - Vol 1 (Entrée) - Vol 10 (Couloir)	Plafonds	Enduits plâtre	S73 - S74 - S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER 32872 5 n°17 - 1	P17	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	P1	Réalisation d'un prélevement		002ER 32872 5 n°1 - 1	P1	Mortier - Effritable - Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 5 (Remise)	Revêtement de sol	Chape maigre	S1 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 32872 5 n°1 - 1	P1	Mortier - Effritable - Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 4 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	S2 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 32872 5 n°1 - 1	P1	Mortier - Effritable - Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3 (Circulation 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S3 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 32872 5 n°1 - 1	P1	Mortier - Effritable - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 7 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Chape maigre	S4 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 32872 5 n°1 - 1	P1	Mortier - Effritable - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 8 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Chape maigre	S5 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 32872 5 n°1 - 1	P1	Mortier - Effritable - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 9 (Guichet)	Revêtement de sol	Chape maigre	S6 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 32872 5 n°1 - 1	P1	Mortier - Effritable - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 2 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	S7 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 32872 5 n°1 - 1	P1	Mortier - Effritable - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Chape maigre	S8 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 32872 5 n°1 - 1	P1	Mortier - Effritable - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 10 (Couloir)	Revêtement de sol	Chape maigre	S9 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 32872 5 n°1 - 1	P1	Mortier - Effritable - Gris	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P2	Réalisation d'un prélevement		002ER 32872 5 n°2 - 1	P2	Mortier - Effritable - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 5 (Remise)	Revêtement de sol	Ragréage	S10 (P2)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 32872 5 n°2 - 1	P2	Mortier - Effritable - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 4 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S11 (P2)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 32872 5 n°2 - 1	P2	Mortier - Effritable - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 3 (Circulation 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S12 (P2)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 32872 5 n°2 - 1	P2	Mortier - Effritable - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 2 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S13 (P2)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 32872 5 n°2 - 1	P2	Mortier - Effritable - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 9 (Guichet)	Revêtement de sol	Ragréage	S14 (P2)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 32872 5 n°2 - 1	P2	Mortier - Effritable - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 8 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S15 (P2)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 32872 5 n°2 - 1	P2	Mortier - Effritable - Gris	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S16 (P2)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER32872 5 n°2 - 1	P2	Mortier - Effritable - Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 10 (Couloir)	Revêtement de sol	Ragréage	S17 (P2)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER32872 5 n°2 - 1	P2	Mortier - Effritable - Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 7 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S18 (P2)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER32872 5 n°2 - 1	P2	Mortier - Effritable - Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 6 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P3	Réalisation d'un prélevement		002ER32872 5 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle / Matériau - Dur / Bitumineux / Effritable - Vert / Noir / Blanc Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 6 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P4	Réalisation d'un prélevement		002ER32872 5 n°4 - 1	P4	Matériau / Ragréage / Colle - Effritable / Effritable / Bitumineux - Beige / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 6 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P5	Réalisation d'un prélevement		002ER32872 5 n°5 - 1	P5 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Vert Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P5	Réalisation d'un prélevement		002ER 32872 5 n°5 - 1	P5 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Remise)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P6	Réalisation d'un prélevement		002ER 32872 5 n°6 - 1	P6 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 32872 5 n°6 - 1	P6 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Remise)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P6	Réalisation d'un prélevement		002ER 32872 5 n°6 - 1	P6 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 32872 5 n°6 - 1	P6 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Circulation 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P7	Réalisation d'un prélevement		002ER 32872 5 n°7 - 1	P7	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Circulation 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 32872 5 n°7 - 1	P7	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 32872 5 n°7 - 1	P7	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Circulation 1) - Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S20 - S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 32872 5 n°7 - 1	P7	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P9	Réalisation d'un prélevement		002ER 32872 5 n°9 - 1	P9	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (Guichet)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 32872 5 n°9 - 1	P9	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 32872 5 n°9 - 1	P9	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (Guichet) - Vol 8 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S24 - S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 32872 5 n°9 - 1	P9	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 7 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P10	Réalisation d'un prélevement		002ER 32872 5 n°10 - 1	P10 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (Guichet)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 32872 5 n°10 - 1	P10 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 32872 5 n°10 - 1	P10 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (Guichet) - Vol 8 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S26 - S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 32872 5 n°10 - 1	P10 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P10	Réalisation d'un prélevement		002ER 32872 5 n°10 - 1	P10 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (Guichet)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 32872 5 n°10 - 1	P10 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 8 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 32872 5 n°10 - 1	P10 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (Guichet) - Vol 8 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S26 - S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 32872 5 n°10 - 1	P10 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Couloir)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P21	Réalisation d'un prélevement		002ER 32872 5 n°21 - 1	P21 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Couloir)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P21	Réalisation d'un prélevement		002ER 32872 5 n°21 - 1	P21 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3 (Circulation 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P8	Réalisation d'un prélevement		002ER 32872 5 n°8 - 1	P8	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Circulation 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER 32872 5 n°8 - 1	P8	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur


Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER 32872 5 n°8 - 1	P8	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Circulation 1) - Vol 1 (Entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S22 - S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER 32872 5 n°8 - 1	P8	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC	RDC - MPCA Revêtement de sol

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER328725

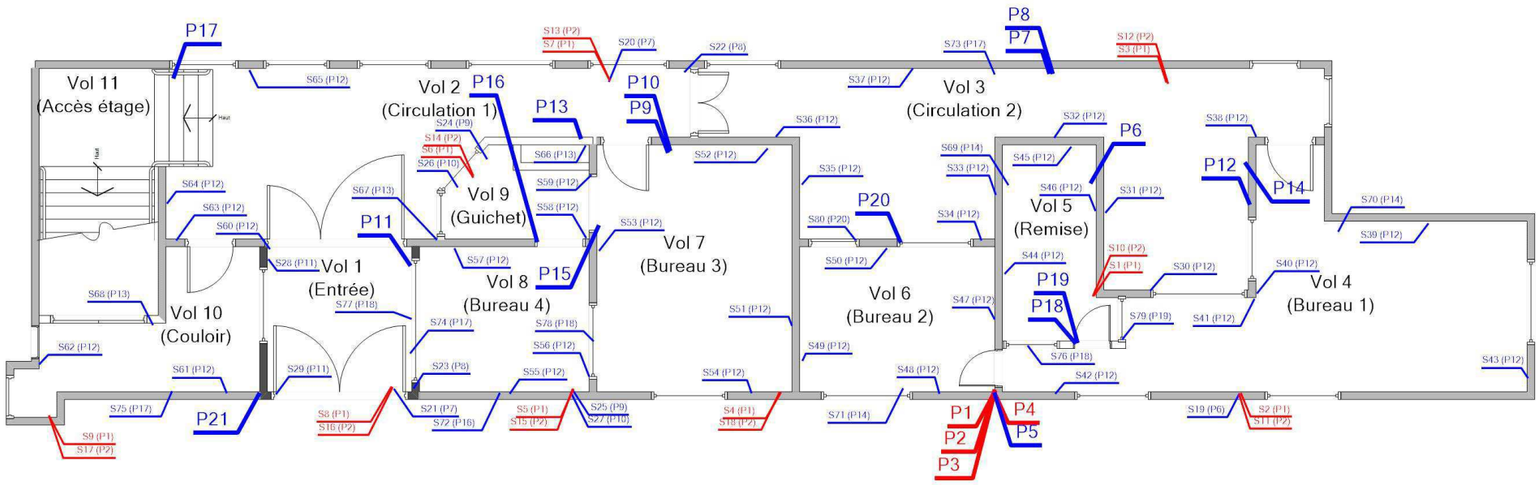


Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
131 RUE GRANDE RUE 62200 BOULOGNE SUR MER	SP BOULOGNE SUR MER	12/01/2023	FERREIRA FALLON

RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER328725

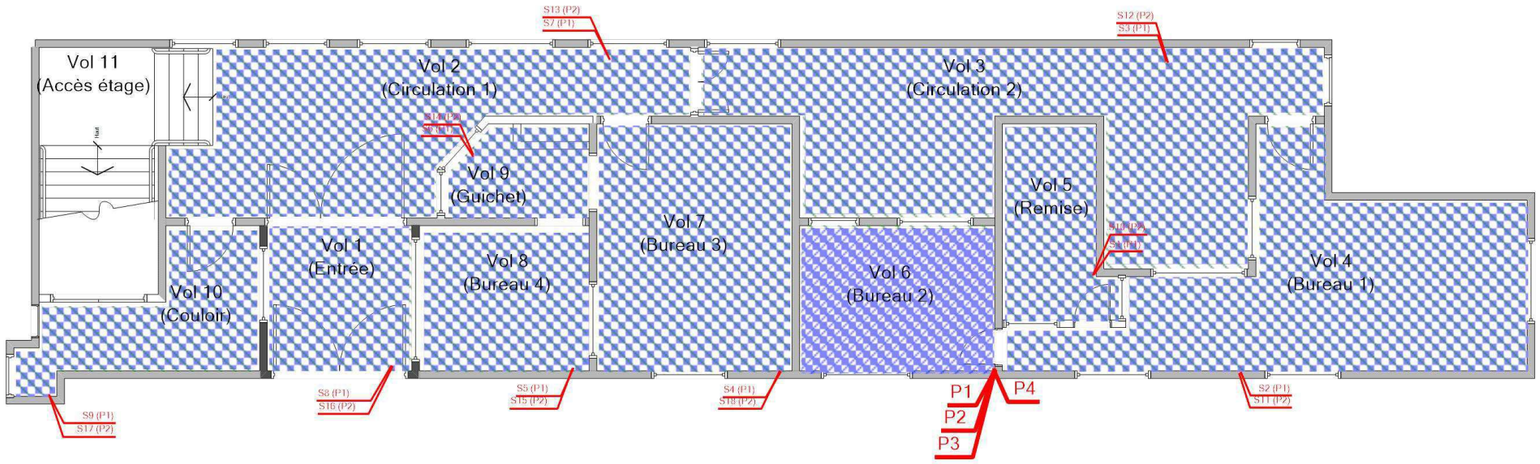


Légende

	P3 : Dalles plastiques
	P4 : Colles de revêtement de sol
	P1 : Chape maigre
	P2 : Ragréage

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
131 RUE GRANDE RUE 62200 BOULOGNE SUR MER	SP BOULOGNE SUR MER	12/01/2023	FERREIRA FALLON

RDC - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER328725

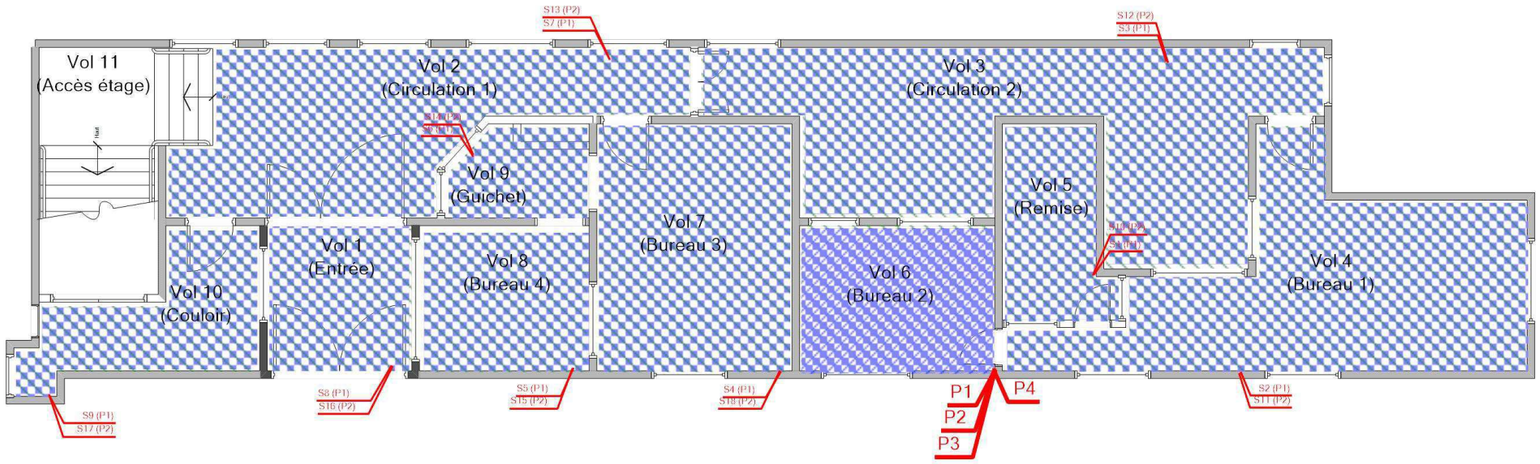

Légende

	P3 : Dalles plastiques
	P4 : Colles de revêtement de sol
	P1 : Chape maigre
	P2 : Ragréage

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
131 RUE GRANDE RUE 62200 BOULOGNE SUR MER	SP BOULOGNE SUR MER	12/01/2023	FERREIRA FALLON

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER328725 n°1 - 1 (P1)	RDC - Vol 6 (Bureau 2)	Prélevement positif
002ER328725 n°2 - 1 (P2)	RDC - Vol 6 (Bureau 2)	Prélevement positif
002ER328725 n°3 - 1 (P3)	RDC - Vol 6 (Bureau 2)	Prélevement positif
002ER328725 n°4 - 1 (P4)	RDC - Vol 6 (Bureau 2)	Prélevement positif
002ER328725 n°5 - 1 (P5)	RDC - Vol 6 (Bureau 2)	Prélevement négatif
002ER328725 n°6 - 1 (P6)	RDC - Vol 5 (Remise)	Prélevement négatif
002ER328725 n°7 - 1 (P7)	RDC - Vol 3 (Circulation 2)	Prélevement négatif
002ER328725 n°8 - 1 (P8)	RDC - Vol 3 (Circulation 2)	Prélevement négatif
002ER328725 n°9 - 1 (P9)	RDC - Vol 7 (Bureau 3)	Prélevement négatif
002ER328725 n°10 - 1 (P10)	RDC - Vol 7 (Bureau 3)	Prélevement négatif
002ER328725 n°11 - 1 (P11)	RDC - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002ER328725 n°12 - 1 (P12)	RDC - Vol 3 (Circulation 2)	Prélevement négatif
002ER328725 n°13 - 1 (P13)	RDC - Vol 2 (Circulation 1)	Prélevement négatif
002ER328725 n°17 - 1 (P17)	RDC - Vol 2 (Circulation 1)	Prélevement négatif
002ER328725 n°14 - 1 (P14)	RDC - Vol 3 (Circulation 2)	Prélevement négatif
002ER328725 n°15 - 1 (P15)	RDC - Vol 7 (Bureau 3)	Prélevement négatif
002ER328725 n°16 - 1 (P16)	RDC - Vol 9 (Guichet)	Prélevement négatif
002ER328725 n°18 - 1 (P18)	RDC - Vol 5 (Remise)	Prélevement négatif
002ER328725 n°19 - 1 (P19)	RDC - Vol 5 (Remise)	Prélevement négatif
002ER328725 n°20 - 1 (P20)	RDC - Vol 3 (Circulation 2)	Prélevement négatif
002ER328725 n°21 - 1 (P21)	RDC - Vol 10 (Couloir)	Prélevement négatif



002ER328725 n°1 - 1 (P1) - RDC - Vol 6 (Bureau 2)



002ER328725 n°2 - 1 (P2) - RDC - Vol 6 (Bureau 2)



002ER328725 n°3 - 1 (P3) - RDC - Vol 6 (Bureau 2)



002ER328725 n°4 - 1 (P4) - RDC - Vol 6 (Bureau 2)



002ER328725 n°5 - 1 (P5) - RDC - Vol 6 (Bureau 2)



002ER328725 n°6 - 1 (P6) - RDC - Vol 5 (Remise)



002ER328725 n°7 - 1 (P7) - RDC - Vol 3 (Circulation 2)



002ER328725 n°8 - 1 (P8) - RDC - Vol 3 (Circulation 2)



002ER328725 n°9 - 1 (P9) - RDC - Vol 7 (Bureau 3)



002ER328725 n°10 - 1 (P10) - RDC - Vol 7 (Bureau 3)



002ER328725 n°11 - 1 (P11) - RDC - Vol 1 (Entrée)



002ER328725 n°12 - 1 (P12) - RDC - Vol 3 (Circulation 2)



002ER328725 n°13 - 1 (P13) - RDC - Vol 2 (Circulation 1)



002ER328725 n°17 - 1 (P17) - RDC - Vol 2 (Circulation 1)



002ER328725 n°14 - 1 (P14) - RDC - Vol 3 (Circulation 2)



002ER328725 n°15 - 1 (P15) - RDC - Vol 7 (Bureau 3)



002ER328725 n°16 - 1 (P16) - RDC - Vol 9 (Guichet)



002ER328725 n°18 - 1 (P18) - RDC - Vol 5 (Remise)



002ER328725 n°19 - 1 (P19) - RDC - Vol 5 (Remise)



002ER328725 n°20 - 1 (P20) - RDC - Vol 3 (Circulation 2)



002ER328725 n°21 - 1 (P21) - RDC - Vol 10 (Couloir)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Effritable - Gris - -	RDC - Vol 6 (Bureau 2)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Effritable - Gris - -	RDC - Vol 6 (Bureau 2)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Matériau - Dur / Bitumineux / Effritable - Vert / Noir / Blanc Gris - -	RDC - Vol 6 (Bureau 2)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Ragréage / Colle - Effritable / Effritable / Bitumineux - Beige / Gris / Noir - -	RDC - Vol 6 (Bureau 2)	
P5 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Vert Rose - -	RDC - Vol 6 (Bureau 2)	
P5 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - -	RDC - Vol 6 (Bureau 2)	
P6 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Bleu Gris - -	RDC - Vol 5 (Remise)	
P6 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - -	RDC - Vol 5 (Remise)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Effritable - Gris - -	RDC - Vol 3 (Circulation 2)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Effritable - Gris - -	RDC - Vol 3 (Circulation 2)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose Gris - -	RDC - Vol 7 (Bureau 3)	
P10 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Beige Gris - -	RDC - Vol 7 (Bureau 3)	
P10 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose - -	RDC - Vol 7 (Bureau 3)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre / Papier - Pulvérulent / Souple Fibreux - Blanc / Beige - -	RDC - Vol 1 (Entrée)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige - -	RDC - Vol 3 (Circulation 2)	

P13	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Violet / Blanc / Blanc / Beige / - -	RDC - Vol 2 (Circulation 1)
P14	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux-plafond / Matériau - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc - -	RDC - Vol 3 (Circulation 2)
P15	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine / Matériau / Matériau - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Blanc - -	RDC - Vol 7 (Bureau 3)
P16	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine / Matériau / Matériau - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Blanc - -	RDC - Vol 9 (Guichet)
P17	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc - -	RDC - Vol 2 (Circulation 1)
P18	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Noir - -	RDC - Vol 5 (Remise)
P19	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Noir - -	RDC - Vol 5 (Remise)
P20	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Noir - -	RDC - Vol 3 (Circulation 2)
P21 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris - -	RDC - Vol 10 (Couloir)
P21 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - -	RDC - Vol 10 (Couloir)

AC LABS
PRÉLÈVEMENTS & ANALYSES

CHANTIER

Référence	**C012023625661**
Adresse	Commande : 002ER328725 Affaire : SP BOULOGNE SUR MER 131 RUE GRANDE RUE 62200 BOULOGNE SUR MER

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 26/01/2023

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012023625661
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC Environnement
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER328725_001

Référence labo	PM05347816	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/01/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	26/01/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	SP BOULOGNE SUR MER - Vol 6 (Bureau 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	FOU	Chrysotile	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER328725_002

Référence labo	PM05347817	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/01/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	25/01/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	SP BOULOGNE SUR MER - Vol 6 (Bureau 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	FOU	Chrysotile	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER328725_003

Référence labo	PM05347818	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/01/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	26/01/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	SP BOULOGNE SUR MER - Vol 6 (Bureau 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Vert	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	FOU	Chrysotile	●
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Blanc Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER328725_004

Référence labo	PM05347819	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/01/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	26/01/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	SP BOULOGNE SUR MER - Vol 6 (Bureau 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	FOU	Chrysotile	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
	3	Colle Bitumineux Noir	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Bitumineux / Noir est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER328725_005

Référence labo	PM05347820	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/01/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	26/01/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	SP BOULOGNE SUR MER - Vol 6 (Bureau 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Fibreux Vert Rose	2	2	NNZ	-	-	-	-	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	FOU	Non détecté	●
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Ragréage / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002ER328725_006

Référence labo	PM05347821	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/01/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	26/01/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	SP BOULOGNE SUR MER - Vol 5 (Remise)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Bleu Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FOU	Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	FOU	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER328725_007

Référence labo	PM05347822	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/01/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	25/01/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	SP BOULOGNE SUR MER - Vol 3 (Circulation 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FOU	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER328725_008

Référence labo	PM05347823	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/01/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	26/01/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	SP BOULOGNE SUR MER - Vol 3 (Circulation 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FOU	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER328725_009

Référence labo	PM05347824	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/01/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	25/01/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	SP BOULOGNE SUR MER - Vol 7 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	FOU	Non détecté ●
	2	Ragréage Effritable Rose Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER328725_010

Référence labo	PM05347825	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/01/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	26/01/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	SP BOULOGNE SUR MER - Vol 7 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Beige Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FOU	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	FOU	Non détecté	●
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Ragréage / Effritable / Rose est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002ER328725_011

Référence labo	PM05347826	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/01/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	26/01/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	SP BOULOGNE SUR MER - Vol 1 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
	2	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	NNZ						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER328725_012

Référence labo	PM05347827	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/01/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	26/01/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	SP BOULOGNE SUR MER - Vol 3 (Circulation 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FOU	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER328725_013

Référence labo	PM05347828	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/01/2023	**Analyse réglementaire**	Non
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	26/01/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	SP BOULOGNE SUR MER - Vol 2 (Circulation 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Violet	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	NNZ					
	4	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	NNZ					
	5	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	6	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	NNZ					
	7	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			3 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4, 5, 6, 7 non dissociables analysées avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches. Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée. Couches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER328725_014

Référence labo	PM05347829	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/01/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	26/01/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	SP BOULOGNE SUR MER - Vol 3 (Circulation 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Faux-plafond Fibreux Effritable Beige	2	2	NNZ	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER328725_015

Référence labo	PM05347830	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/01/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	26/01/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	SP BOULOGNE SUR MER - Vol 7 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	1	1	NNZ	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
	2	Matériau Souple Fibreux Blanc	2	2	NNZ						
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER328725_016

Référence labo	PM05347831	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/01/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	26/01/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	SP BOULOGNE SUR MER - Vol 9 (Guichet)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	1	1	NNZ	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
	2	Matériau Souple Fibreux Blanc	2	2	NNZ						
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER328725_017

Référence labo	PM05347832	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/01/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	26/01/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	SP BOULOGNE SUR MER - Vol 2 (Circulation 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FOU	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER328725_018

Référence labo	PM05347833	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/01/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	26/01/2023
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint à lèvre		
Zone de prélèvement	SP BOULOGNE SUR MER - Vol 5 (Remise)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	FOU	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER328725_019

Référence labo	PM05347834	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/01/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	26/01/2023
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint vitrier		
Zone de prélèvement	SP BOULOGNE SUR MER - Vol 5 (Remise)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	FOU	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER328725_020

Référence labo	PM05347835	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/01/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	26/01/2023
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint vitrier		
Zone de prélèvement	SP BOULOGNE SUR MER - Vol 3 (Circulation 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	FOU	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER328725_021

Référence labo	PM05347836	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	12/01/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	26/01/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	SP BOULOGNE SUR MER - Vol 10 (Couloir)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FOU	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	FOU	Non détecté	●
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence dossier: RSC012023625661

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 10 MOLP et 24 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 24/25

Suppléant Responsable Equipe
Jonathan Marchal




Accréditation N°1-6940 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2023 01/02

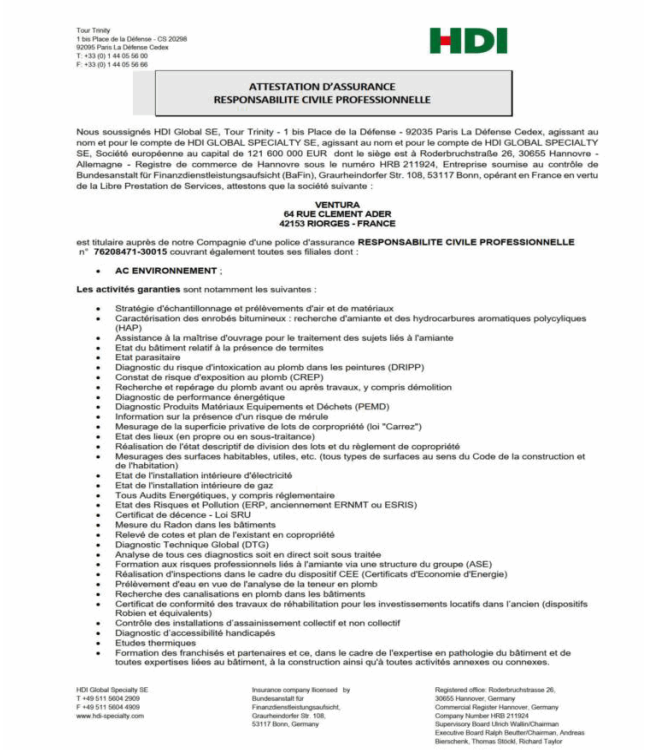

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T. +33 (0) 1 44 05 56 00
F. +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 600 000 EUR dont le siège est à Roderbruchstraße 26, 30655 Hannovre - Allemagne - Registre de commerce de Hannovre sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société suivante :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également toutes ses filiales dont :

- **AC ENVIRONNEMENT** ;

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5604 2909
F +49 511 5604 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26, 30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Wallin/Chairman
Executive Board Ralph Beutler/Chairman, Andreas Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor

Assurance AC 2023 02/02



HDI

- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :


RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITÉ CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2023 au 31/12/2023, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le vendredi 23 décembre 2022 – VL/SH/SJB

HDI

Attestation AC 2022

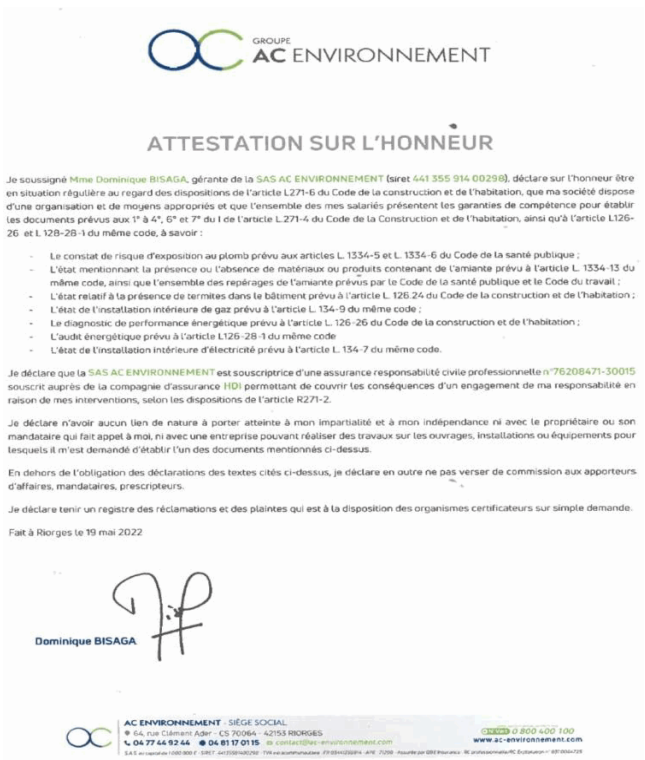

GROUPE AC ENVIRONNEMENT

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, gérante de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L.126-26 et L.128-2-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.


Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 19 mai 2022

Dominique BISAGA

AC ENVIRONNEMENT - SIÈGE SOCIAL
64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
04 77 44 92 44 04 81 17 01 15 contact@ac-environnement.com
0 800 400 100
www.ac-environnement.com

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6332

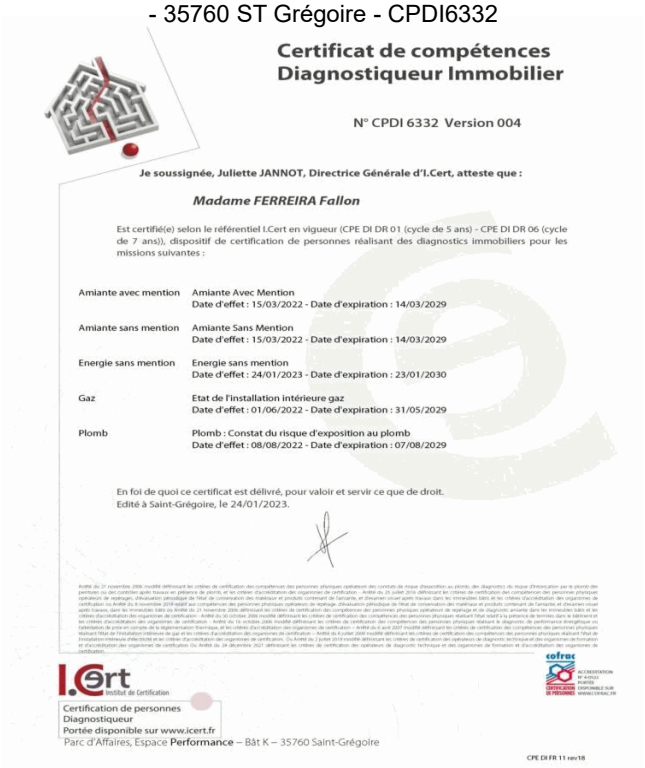

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 6332 Version 004

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Madame FERREIRA Fallon

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 15/03/2022 - Date d'expiration : 14/03/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 15/03/2022 - Date d'expiration : 14/03/2029
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 24/01/2023 - Date d'expiration : 23/01/2030
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 01/06/2022 - Date d'expiration : 31/05/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 08/08/2022 - Date d'expiration : 07/08/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 24/01/2023.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 nov18

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6332



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 6332 Version 004

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Madame FERREIRA Fallon

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 15/03/2022 - Date d'expiration : 14/03/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 15/03/2022 - Date d'expiration : 14/03/2029
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 24/01/2023 - Date d'expiration : 23/01/2030
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 01/06/2022 - Date d'expiration : 31/05/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 08/08/2022 - Date d'expiration : 07/08/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 24/01/2023.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev18
