
Planning Prévisionnel
Travaux anticipés

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**ETUDES TRAVAUX ANTICIPES**	**142 jrs?**	**Mer 13/05/26**	**Ven 25/12/26**
2	**APD lot travaux anticipés**	**37 jrs**	**Mer 13/05/26**	**Ven 10/07/26**
3	Production de l'APD	28,88 jrs	Mer 13/05/26	Ven 26/06/26
4	Validation de l'APD par la MOA	8 jrs	Lun 29/06/26	Ven 10/07/26
5	**PRO/ DCE Travaux anticipés**	**35 jrs**	**Lun 13/07/26**	**Ven 04/09/26**
6	Production du PRO Travaux principaux	17 jrs	Lun 13/07/26	Ven 07/08/26
7	Validation du PRO par la MOA	16 jrs	Lun 10/08/26	Ven 04/09/26
8	**ACT lot travaux anticpés**	**56,88 jrs**	**Lun 28/09/26**	**Ven 25/12/26**
9	Consultation des entreprises	26 jrs	Lun 28/09/26	Ven 06/11/26
10	analyse des offres	21 jrs	Lun 09/11/26	Ven 11/12/26
11	Mise au point des marchés	8 jrs	Lun 14/12/26	Ven 25/12/26
12	**TRAVAUX ANTICIPES**	**70 jrs**	**Ven 25/12/26**	**Jeu 15/04/27**
13	Ordre de service de démarrage travaux anticipés	0 jr	Ven 25/12/26	Ven 25/12/26
14	Installation de chantier	7 jrs	Mer 30/12/26	Ven 08/01/27
15	Abattage des arbres + élagage et protection	30 jrs	Lun 11/01/27	Ven 26/02/27
16	Dévoiement des réseaux TSA	20 jrs	Ven 26/02/27	Mer 31/03/27
17	Dévoiment des réseaux MLS - Nord Ouest	15 jrs	Mer 10/02/27	Ven 05/03/27
18	Dévoiement des réseaux MLS - EST	25 jrs	Lun 08/03/27	Jeu 15/04/27
19	**OPR Travaux anticipés**	**0 jr**	**Jeu 01/04/27**	**Jeu 01/04/27**
20	**Réception Travaux anticipés**	**0 jr**	**Ven 16/04/27**	**Ven 16/04/27**

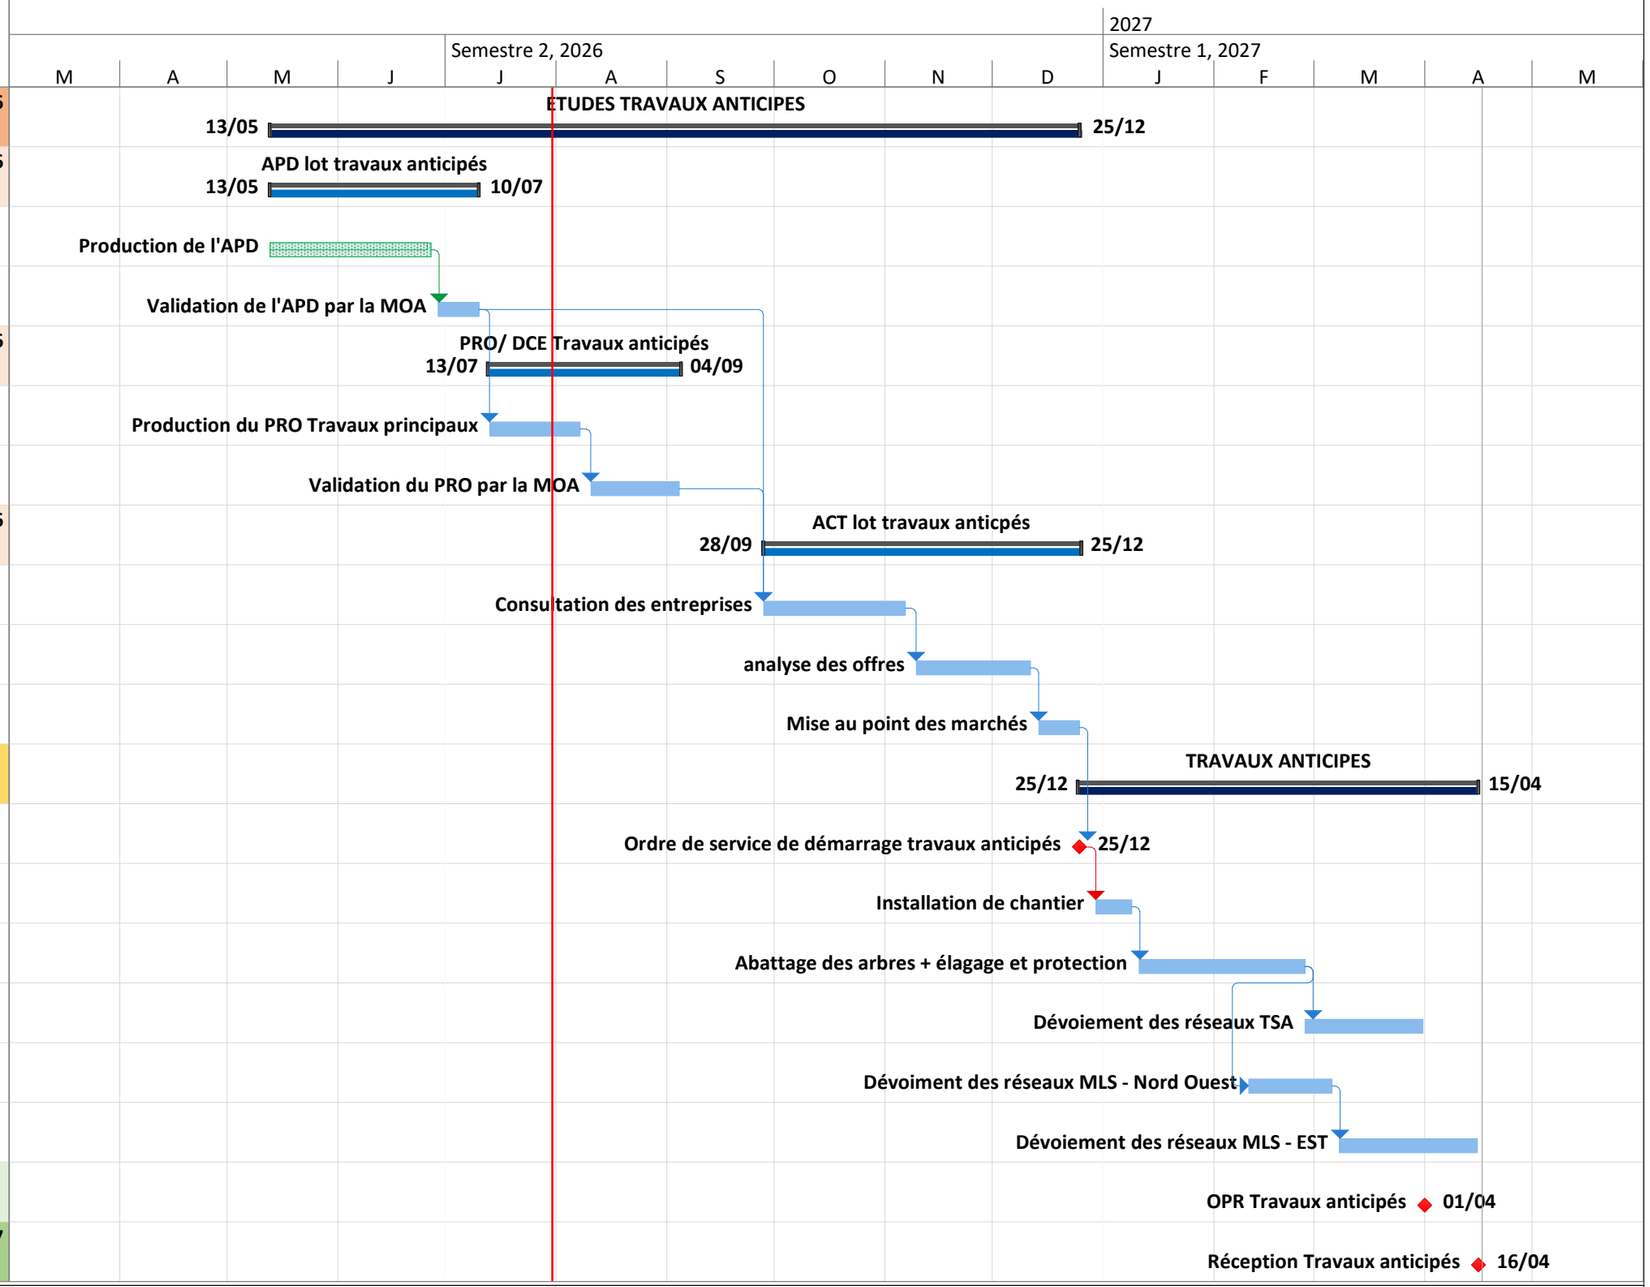

Projet : msproj11
Date : Ven 31/07/26

Tâche		Tâches externes		Tâche manuelle		Fin uniquement	
Fractionnement		Jalons externes		Durée uniquement		Échéance	
jalon		Tâche inactive		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulative		Jalon inactif		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif inactif		Début uniquement		Retard	
