
Tâche	Jours	Dates
Chantier - Tranche 01 / 02 / 03 / 04	722 jours	janv. 1 → déc. 22
Chantier - Tranche 01 - R+1 - sous sol - trémies accès CES	212 jours	janv. 1 → juil. 31
Préparation de chantier	31 jours	janv. 1 → janv. 31
Installation de chantier - Tranche 01	17 jours	janv. 15 → janv. 31
Déménagement bureaux - R+1 + archives + ELSM RDC	17 jours	janv. 15 → janv. 31
Curage / démolition - Tranche 01 : R+1	14 jours	févr. 1 → févr. 14
Déménagement temp. bureaux R+2 R+3 trémies	14 jours	févr. 12 → févr. 25
Curage / démolition - Tranche 01 : RDC / Sous-sol / étages	14 jours	févr. 15 → févr. 28
Sécurisation et déplacement portes accès bureaux étages	5 jours	mars 1 → mars 5
Trémies sous-sol à R+3	14 jours	mars 6 → mars 19
Plancher local archive	29 jours	mars 20 → avr. 17
Rampe et accès CES	44 jours	avr. 18 → mai 31
Fermeture des trémies RDC / R+1 / R+2 / R+3	5 jours	mai 1 → mai 5
Cloisons et doublage couloirs - R+1	48 jours	mars 1 → avr. 17
Soffites et joues bureaux - R+1	17 jours	avr. 1 → avr. 17
Reprises faux plafonds - R+1	14 jours	avr. 17 → avr. 30
Doublages - Sous-sol	17 jours	juin 29 → juil. 15
Pose des cloisons amovibles	29 jours	mai 18 → juin 15
Fermeture faux plafonds - R+1	15 jours	juin 16 → juin 30
Fourniture châssis et blocs portes - R+1	31 jours	mars 1 → mars 31
Reprises des tablettes bois - R+1	30 jours	avr. 1 → avr. 30
Pose des vitrages et portes - R+1	14 jours	mai 18 → mai 31
Pose des supports signalétique	8 jours	juin 1 → juin 8
Ragréage sol / pose de la moquette - R+1	31 jours	avr. 18 → mai 18
Peinture des murs et plafonds placo - R+1	13 jours	avr. 18 → avr. 30
Peinture des huisseries (vernis) / tablettes bois	13 jours	avr. 18 → avr. 30
Peinture des doublages - Sous-sol	12 jours	mai 20 → mai 31
Pose de la signalétique / vitrophanie	10 jours	juin 9 → juin 18
Portes, escalier et trappes - Sous-sol	12 jours	avr. 19 → avr. 30
Serrurerie et grille rampe accès - RDC	18 jours	juin 1 → juin 18
Coupure et consignation des équipements	14 jours	janv. 18 → janv. 31
Installation CTA local archive sous-sol	17 jours	mars 1 → mars 17
Gaines verticales du sous-sol au R+3	14 jours	mars 18 → mars 31
Déploiement équipements plateau R+1	16 jours	avr. 1 → avr. 16
Mise en service équipements	13 jours	juin 18 → juin 30
Coupure et consignation des équipements	14 jours	janv. 18 → janv. 31
Déploiement équipements plateau R+1	16 jours	avr. 1 → avr. 16
Mise en service équipements	13 jours	juin 18 → juin 30
AOR : Tranche 01 - R+1 / Sous-sol	42 jours	juin 18 → juil. 29
Livraison : Tranche 01	2 jours	juil. 29 → juil. 30

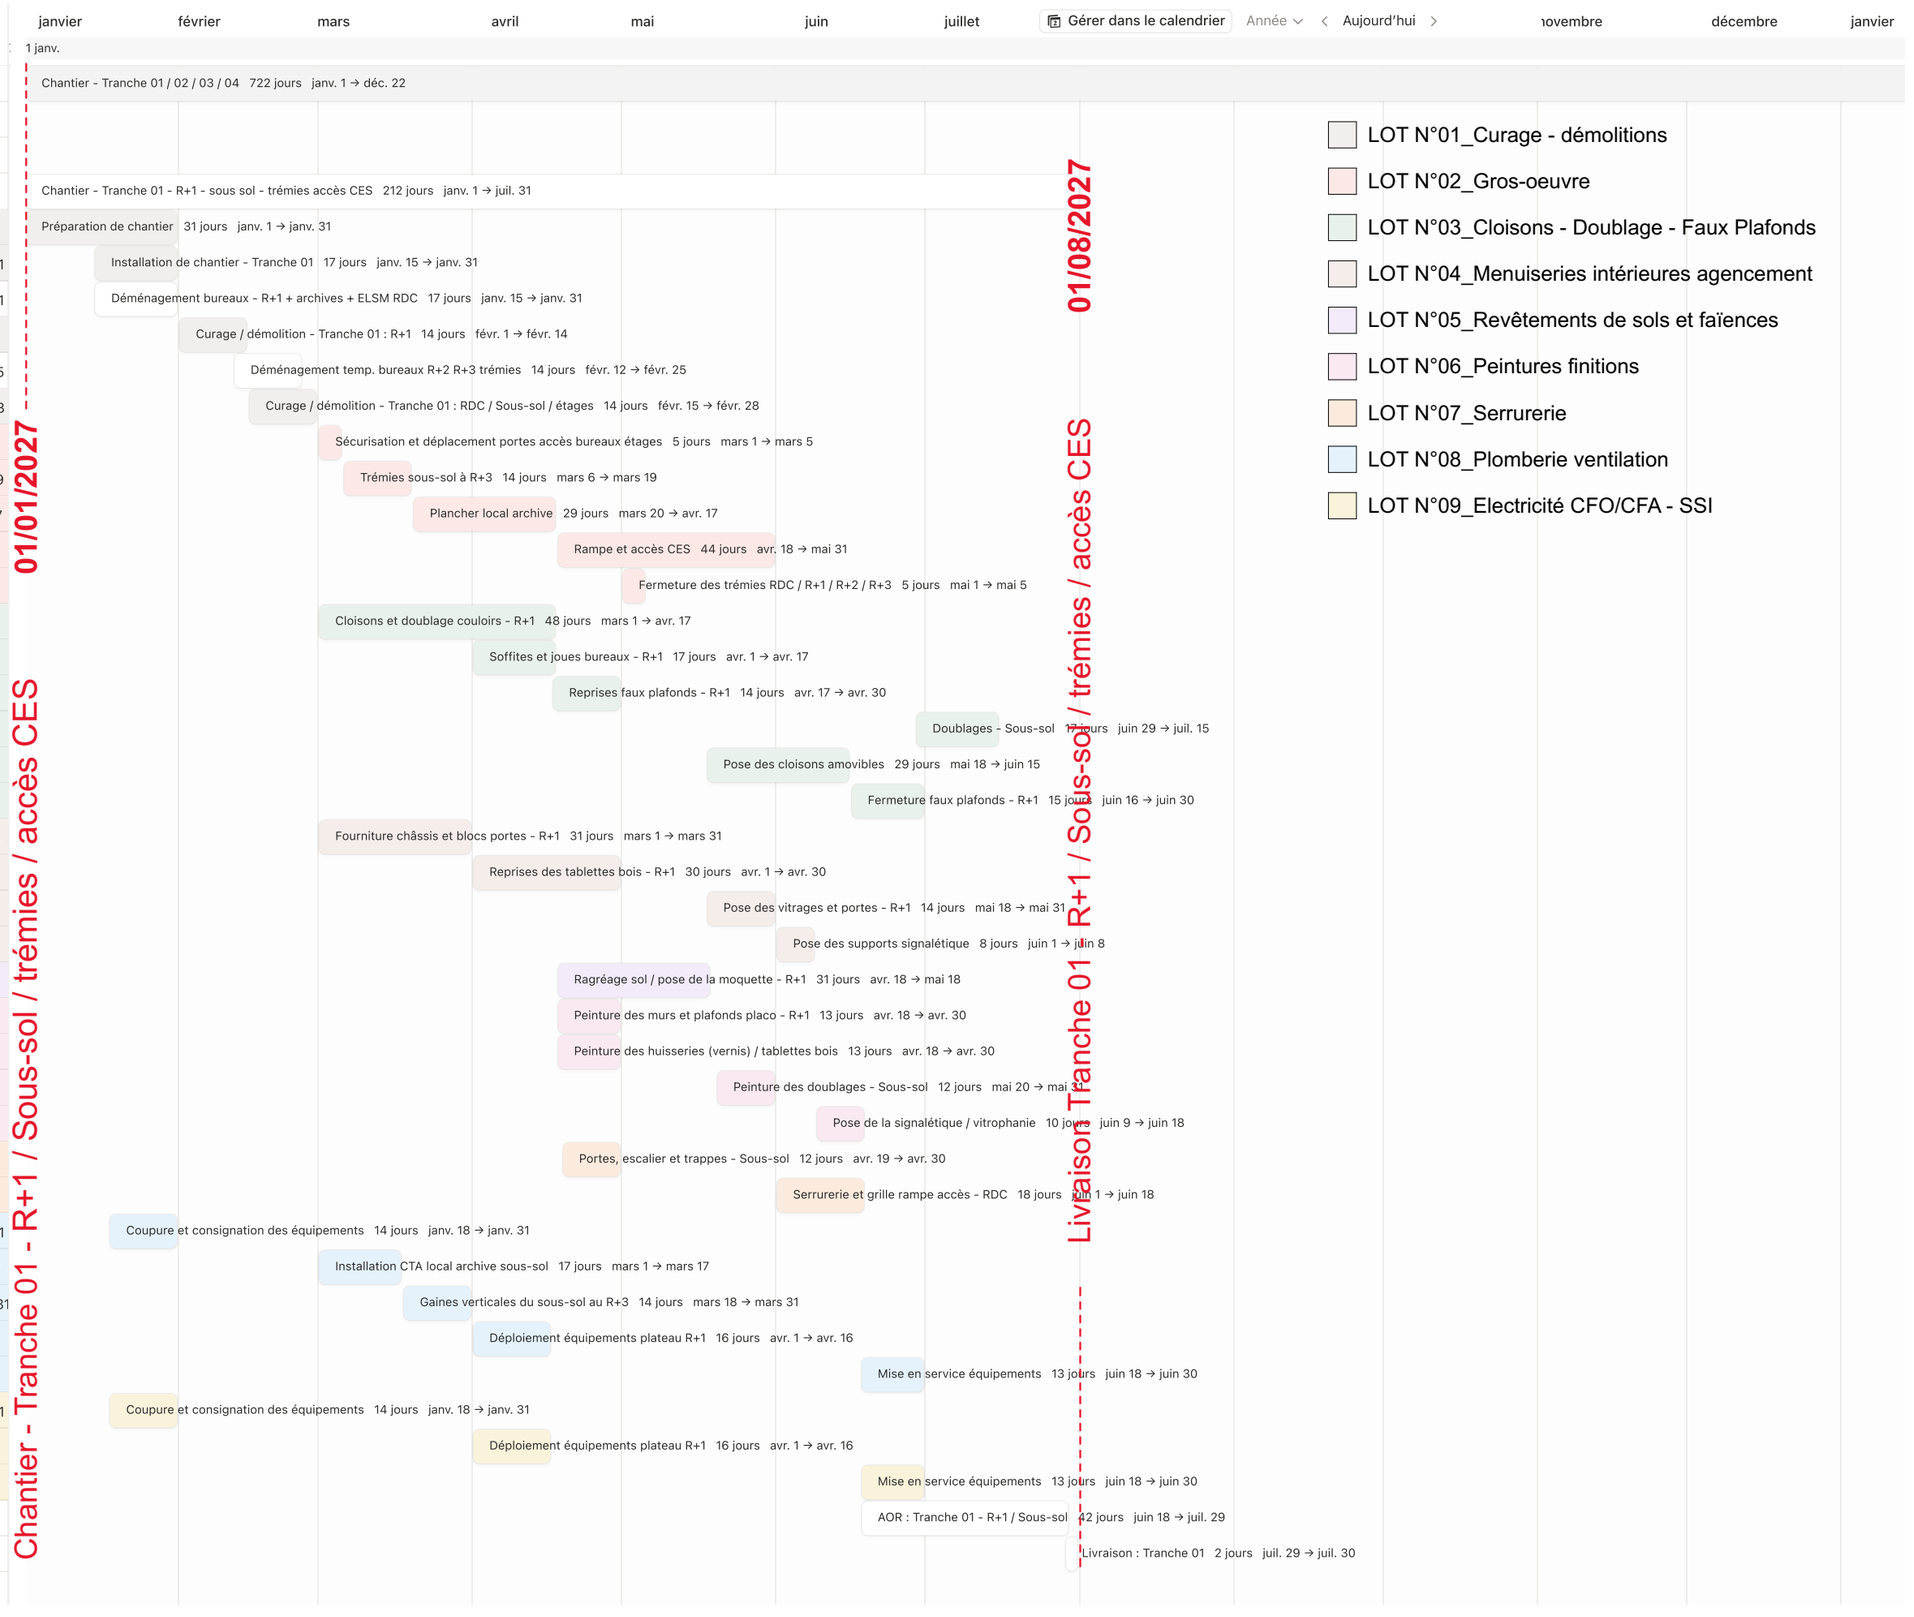

CPAM de l'Aude 2 allées bezons, 11 000 Carcassonne LAURENCE.CAVAGNE@assurance-maladie.fr>	**Charrière & Jacob** 8 rue Saint Joseph 31400 Toulouse agence@charrierejacob.fr 05 61 53 49 54	**taaac** 61bis rue des fontaines 31300 Toulouse contact@taaac.fr 0685111847	**LS Ingénierie** 1949, boulevard François Xavier Fafeur, 11000 Carcassonne d.leblay@ls-ing.fr 0680685509	**BET LAUMONT** 79 Avenue de Bordeaux - 11000 Narbonne nadine.bousquet@laumont-ing.fr 0688737161	**BUREAU VERITAS** Avenue du Forum - 11000 Narbonne morgane.buisson@bureauveritas.com 0676873559			**DOSSIER DCE** **suivi des modifications** **date** 24/09/2026 **ind** - **modifications** dossier définitif			**TR01 - Tranche 01 - Planning** CPAM Carcassonne - Réhabilitation du siège de la CPAM à Carcassonne				
maîtrise d'ouvrage	**architecte (m)**	**architecte**	**bet structure**	**bet CVC / elec / SSI**	**bureau de contrôle**			CPA **projet**	16/10/2026 **date**	DCE **phase**	ARC **auteur**	TR01 **type**	 **niveau**	A3 **format**	 **échelle**
