
Chantier - Tranche 02 - RDC	230 jours	juil. 15 → févr. 29
Installation de chantier - Tranche 02-A	17 jours	juil. 15 → juil. 31
Déménagement bureaux RDC côté CES	17 jours	juil. 15 → juil. 31
Démolition - Tranche 02-A : porte CES et allège	8 jours	août 1 → août 8
Pose MEX porte accès CES	8 jours	août 9 → août 16
Habillage MEX finitions temporaires - RDC	9 jours	août 17 → août 25
Cloisons et aménagements Tranche A/B - RDC	9 jours	août 17 → août 25
Curage / démolition - Tranche 02-A - côté CES	25 jours	août 1 → août 25
Déménagement accueil - côté futur CES	8 jours	août 25 → sept. 1
Curage / démolition - Tranche 02-A	15 jours	sept. 1 → sept. 15
Cloisons et doublage	26 jours	sept. 16 → oct. 11
Soffites et joues bureaux	11 jours	oct. 1 → oct. 11
Reprises faux plafonds	15 jours	oct. 12 → oct. 26
Fermeture faux plafonds	6 jours	oct. 26 → oct. 31
Fourniture châssis et blocs portes	25 jours	sept. 17 → oct. 11
Pose des vitrages et portes	12 jours	oct. 11 → oct. 22
Déplacement des lettres boxs	4 jours	oct. 28 → oct. 31
Reprises sol - carrelage	15 jours	sept. 16 → sept. 30
Peinture des murs et plafonds placo	13 jours	oct. 10 → oct. 22
Peinture des huisseries (vernis)	10 jours	oct. 22 → oct. 31
Pose de la signalétique / vitrophanie	4 jours	oct. 28 → oct. 31
Coupure et consignation des équipements	14 jours	août 1 → août 14
Déploiement équipements RDC A	25 jours	oct. 1 → oct. 25
Mise en service équipements RDC A	6 jours	oct. 26 → oct. 31
Coupure et consignation des équipements	14 jours	août 1 → août 14
Déploiement équipements RDC A	26 jours	oct. 1 → oct. 26
Mise en service équipements RDC A	5 jours	oct. 27 → oct. 31
AOR : Tranche 02-A - côté cité	18 jours	oct. 27 → nov. 13
Livraison : Tranche 02-A - côté cité	2 jours	nov. 13 → nov. 14
Déménagement accueil côté cité	16 jours	nov. 15 → nov. 30
Curage / démolition - Tranche 02-B	15 jours	déc. 1 → déc. 15
Cloisons et doublage	33 jours	déc. 16 → janv. 17
Soffites et joues bureaux	18 jours	déc. 31 → janv. 17
Reprises faux plafonds	13 jours	janv. 17 → janv. 29
Fermeture faux plafonds	6 jours	févr. 1 → févr. 6
Fourniture châssis et blocs portes	33 jours	déc. 17 → janv. 18
Pose des vitrages et portes	12 jours	janv. 19 → janv. 30
Reprises sol - carrelage	25 jours	déc. 16 → janv. 9
Faïences et revêtements muraux	9 jours	janv. 1 → janv. 9
Peinture des murs et plafonds placo	23 jours	janv. 9 → janv. 31
Peinture des huisseries (vernis)	11 jours	janv. 31 → févr. 10
Pose de la signalétique / vitrophanie	4 jours	févr. 11 → févr. 14
Coupure et consignation des équipements	14 jours	oct. 31 → nov. 13
Déploiement équipements RDC B	31 jours	janv. 1 → janv. 31
Mise en service équipements RDC B	9 jours	févr. 1 → févr. 9
Coupure et consignation des équipements	14 jours	oct. 31 → nov. 13
Déploiement équipements RDC B	31 jours	janv. 1 → janv. 31
Mise en service équipements RDC B	9 jours	févr. 1 → févr. 9
AOR : Tranche 02-B - côté CES	26 jours	févr. 1 → févr. 26
Livraison : Tranche 02-B - côté CES	3 jours	févr. 27 → févr. 29

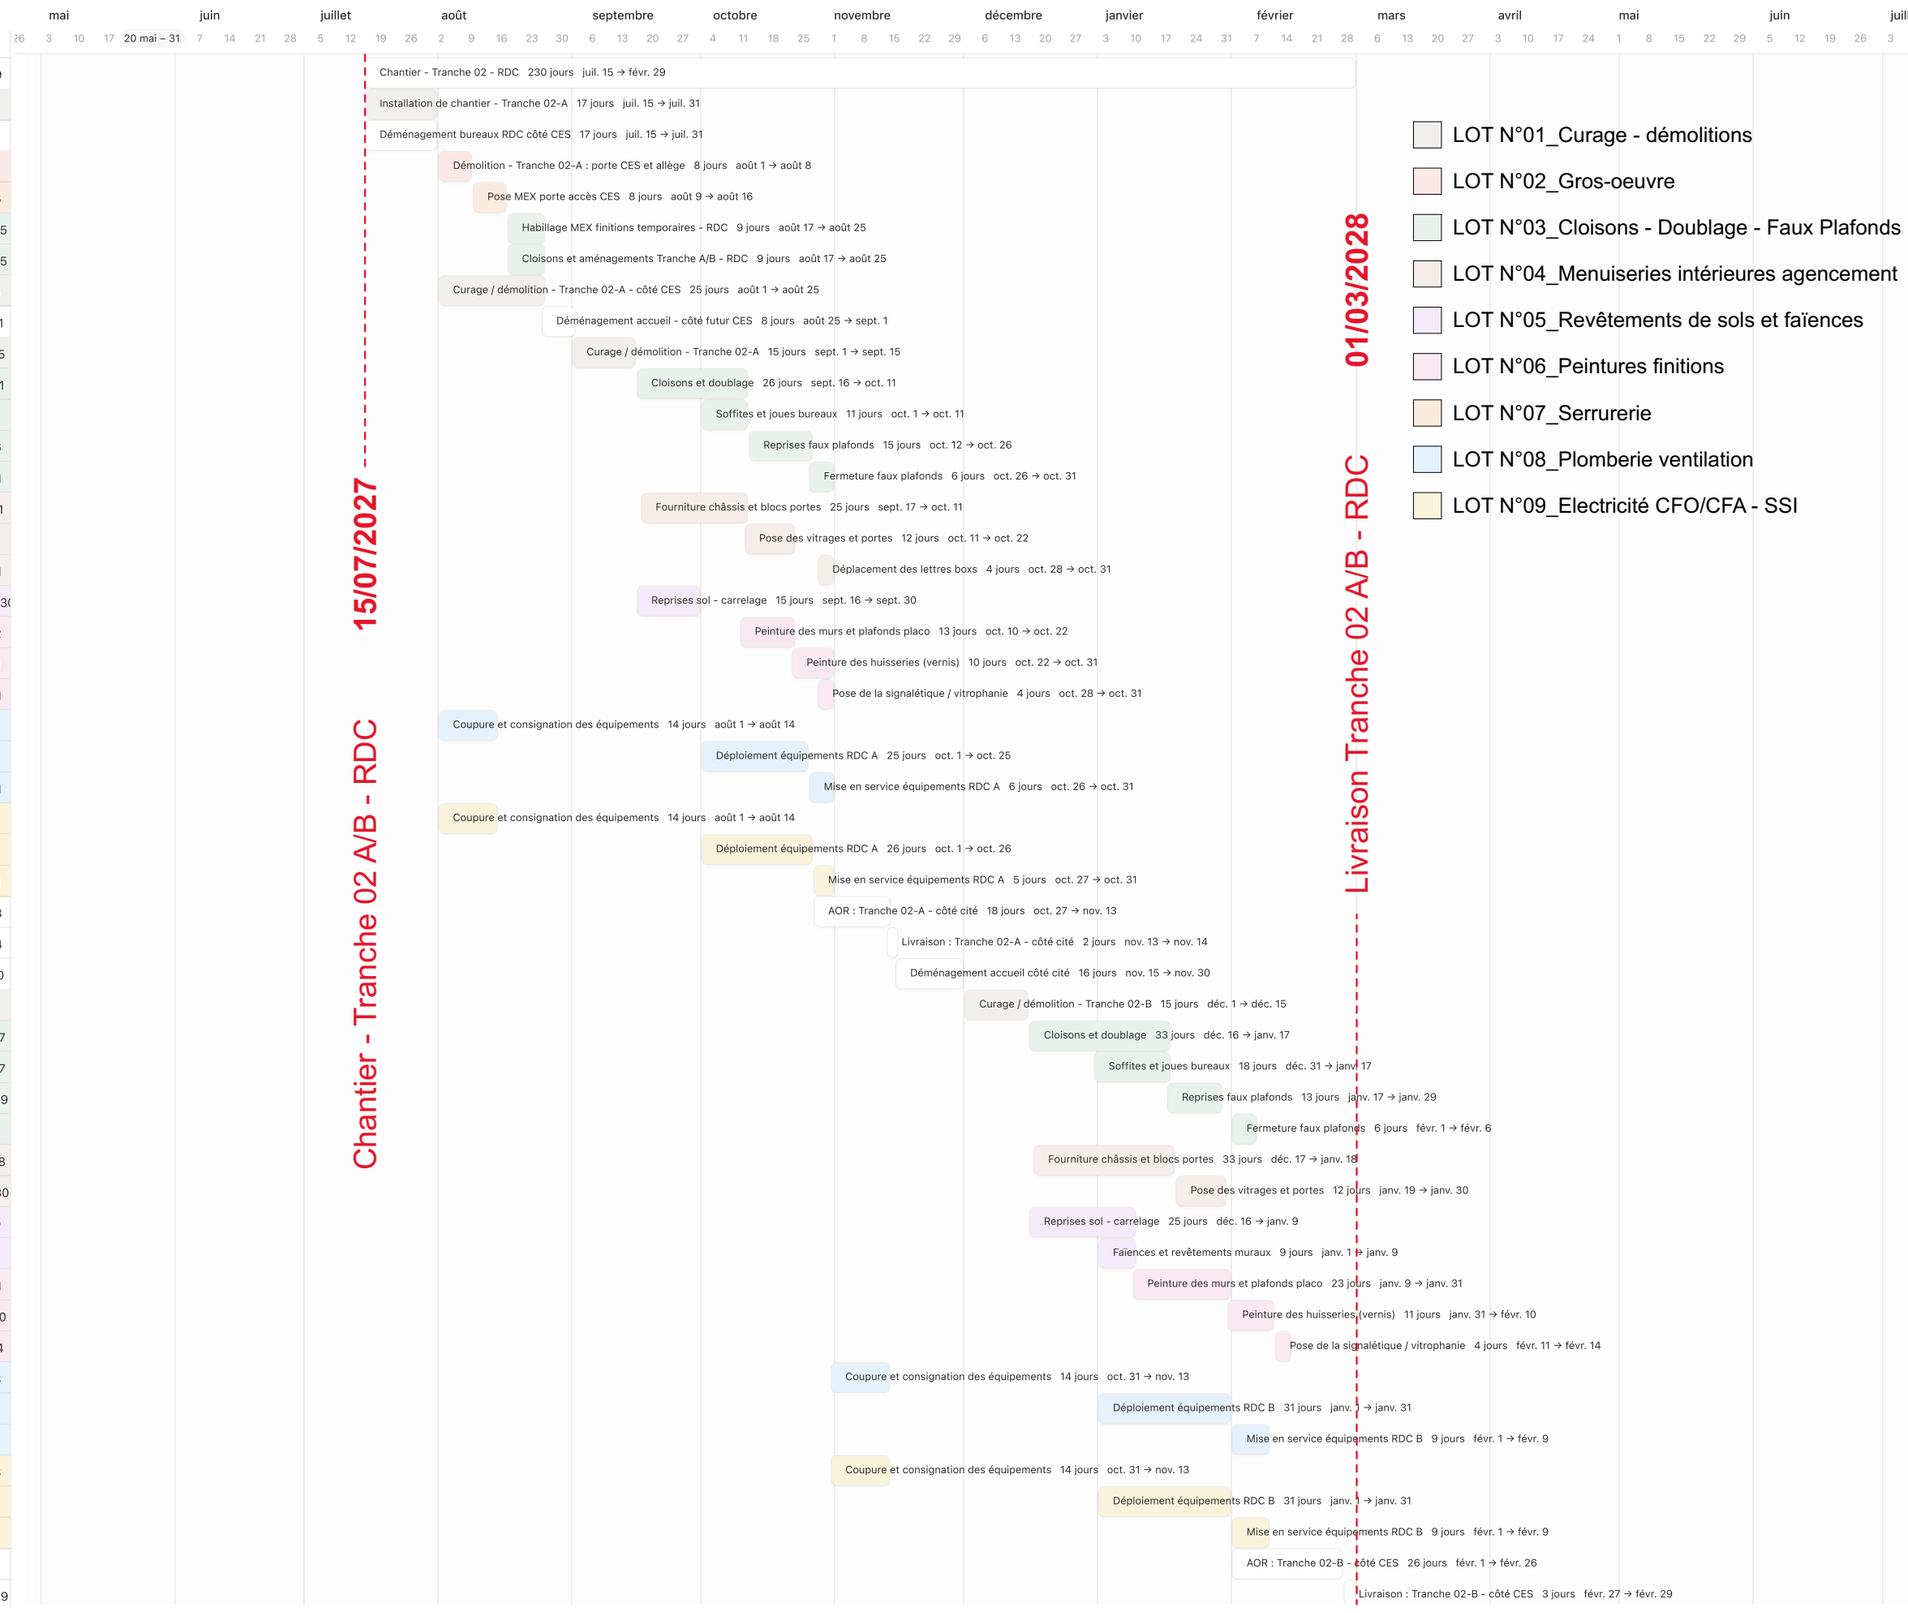

CPAM de l'Aude 2 allées bezons, 11 000 Carcassonne LAURENCE.CAVAGNE@assurance-maladie.fr>	**Charrière & Jacob** 8 rue Saint Joseph 31400 Toulouse agence@charrierejacob.fr 05 61 53 49 54	**taaac** 61bis rue des fontaines 31300 Toulouse contact@taaac.fr 0685111847	**LS Ingénierie** 1949, boulevard François Xavier Fafeur, 11000 Carcassonne d.leblay@ls-ing.fr 0680685509	**BET LAUMONT** 79 Avenue de Bordeaux - 11000 Narbonne nadine.bousquet@laumont-ing.fr 0688737161	**BUREAU VERITAS** Avenue du Forum - 11000 Narbonne morgane.buisson@bureauveritas.com 0676873559			

DOSSIER DCE
suivi des modifications

date	ind	modifications
24/09/2026	-	dossier définitif

TR02 - Tranche 02 - Planning

CPAM Carcassonne - Réhabilitation du siège de la CPAM à Carcassonne

CPA	16/10/2026	DCE	ARC	TR02		A3	*1:0,87*
projet	**date**	**phase**	**auteur**	**type**	**niveau**	**format**	**échelle**

maîtrise d'ouvrage | **architecte (m)** | **architecte** | **bet structure** | **bet CVC / elec / SSI** | **bureau de contrôle**
