
Chantier - Tranche 04 - R+3 / R+4	170 jours	juil. 15 → déc. 31
Installation de chantier - Tranche 04	17 jours	juil. 15 → juil. 31
Déménagement bureaux - R+3	17 jours	juil. 15 → juil. 31
Curage / démolition - Tranche 04 : R+3	14 jours	août 1 → août 14
Cloisons et doublage couloirs - R+3	38 jours	août 15 → sept. 21
Soffites et joues bureaux - R+3	17 jours	sept. 6 → sept. 22
Reprises faux plafonds - R+3	15 jours	sept. 23 → oct. 7
Pose des cloisons amovibles	29 jours	nov. 2 → nov. 30
Fermeture faux plafonds - R+3	9 jours	déc. 1 → déc. 9
Fourniture châssis et blocs portes - R+3	31 jours	août 7 → sept. 6
Eléments de cuisine R+3 / R+4	10 jours	sept. 7 → sept. 16
Reprises des tablettes bois - R+3	16 jours	sept. 7 → sept. 22
Pose des vitrages et portes - R+3	14 jours	nov. 1 → nov. 14
Pose des supports signalétique	8 jours	nov. 15 → nov. 22
Faïence et revêtements muraux	19 jours	sept. 23 → oct. 11
Ragréage sol / pose de la moquette - R+3	21 jours	oct. 12 → nov. 1
Peinture des murs et plafonds placo - R+3	13 jours	sept. 29 → oct. 11
Peinture des huisseries (vernis) / tablettes bois	13 jours	sept. 29 → oct. 11
Pose de la signalétique / vitrophanie	8 jours	nov. 15 → nov. 22
Coupure et consignation des équipements	14 jours	juil. 18 → juil. 31
Déploiement équipements plateau R+3 / R+4	16 jours	sept. 7 → sept. 22
Mise en service équipements	15 jours	nov. 21 → déc. 5
Coupure et consignation des équipements	14 jours	juil. 18 → juil. 31
Déploiement équipements plateau R+3 / R+4	16 jours	sept. 7 → sept. 22
Mise en service équipements	15 jours	nov. 21 → déc. 5
AOR : Tranche 04 - R+3 / R+4	32 jours	nov. 20 → déc. 21
Livraison : Tranche 04	2 jours	déc. 21 → déc. 22

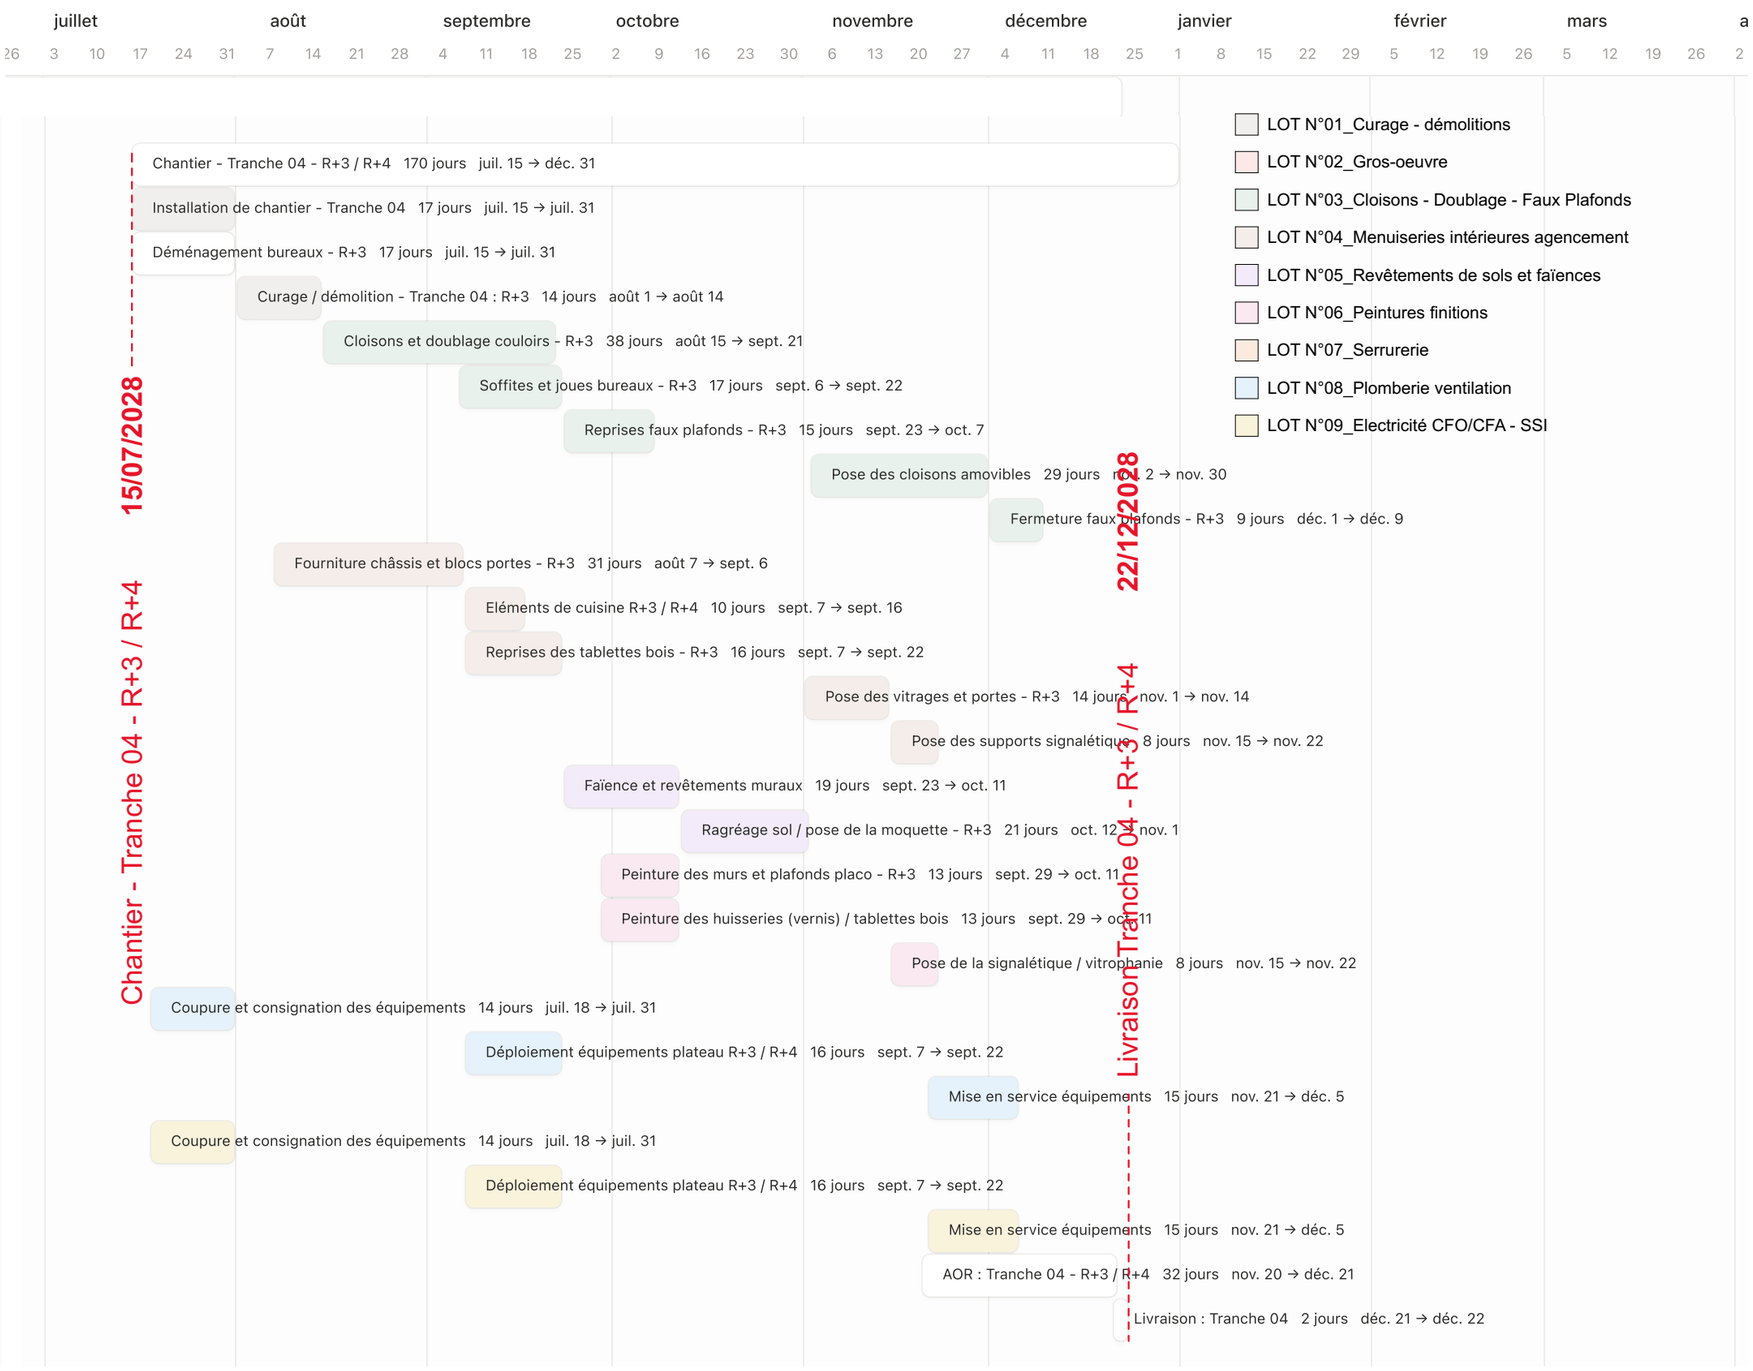

CPAM de l'Aude 2 allées bezons, 11 000 Carcassonne LAURENCE.CAVAGNE@assurance-maladie.fr>	**Charrière & Jacob** 8 rue Saint Joseph 31400 Toulouse agence@charrierejacob.fr 05 61 53 49 54	**taaac** 61bis rue des fontaines 31300 Toulouse contact@taaac.fr 0685111847	**LS Ingénierie** 1949, boulevard François Xavier Fafeur, 11000 Carcassonne d.leblay@ls-ing.fr 0680685509	**BET LAUMONT** 79 Avenue de Bordeaux - 11000 Narbonne nadine.bousquet@laumont-ing.fr 0688737161	**BUREAU VERITAS** Avenue du Forum - 11000 Narbonne morgane.buisson@bureauveritas.com 0676873559			**DOSSIER DCE** **suivi des modifications** date 24/09/2026 · ind - · modifications dossier définitif			**TR04 - Tranche 04 - Planning** CPAM Carcassonne - Réhabilitation du siège de la CPAM à Carcassonne		
maîtrise d'ouvrage	**architecte (m)**	**architecte**	**bet structure**	**bet CVC / elec / SSI**	**bureau de contrôle**			CPA **projet**	16/10/2026 **date**	DCE **phase**	ARC **auteur**	TR04 **type**	 **niveau**	A3 **format**	 **échelle**
