
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**PRO**	**30 jours**	**Ven 12/06/26**	**Jeu 23/07/26**
4	Publication du DCE	0 jour	Ven 24/07/26	Ven 24/07/26
5	**ACT**	**70 jours**	**Ven 24/07/26**	**Jeu 29/10/26**
9	**TRAVAUX**	**635 jours?**	**Jeu 29/10/26**	**Jeu 05/04/29**
10	**TRANCHE FERME**	**555 jours?**	**Jeu 29/10/26**	**Jeu 14/12/28**
11	**Ordre de Service**	**0 jour**	**Jeu 29/10/26**	**Jeu 29/10/26**
12	Etudes	60 jours	Ven 30/10/26	Jeu 21/01/27
13	**Délais d'approvisionnement**	**60 jours**	**Ven 30/10/26**	**Jeu 21/01/27**
17	Présentation témoin de façade	0 jour	Jeu 18/03/27	Jeu 18/03/27
18	Déploiement installations de chantier	10 jours	Ven 13/11/26	Jeu 26/11/26
19	**PHASE 0 : LT en SS**	**20 jours**	**Ven 22/01/27**	**Jeu 18/02/27**
20	**Lots CFO CFA**	**20 jours**	**Ven 22/01/27**	**Jeu 18/02/27**
21	Mise en place du TGBT	20 jours	Ven 22/01/27	Jeu 18/02/27
22	**PHASE 1 : Bâtiment B**	**120 jours**	**Ven 27/11/26**	**Jeu 13/05/27**
23	**Curage démolition**	**30 jours**	**Ven 27/11/26**	**Jeu 07/01/27**
29	**Clos couvert**	**85 jours**	**Ven 15/01/27**	**Jeu 13/05/27**
33	**Lots CFO CFA**	**15 jours**	**Ven 08/01/27**	**Jeu 28/01/27**
37	**Lot CVC**	**40 jours**	**Ven 08/01/27**	**Jeu 04/03/27**
41	**CEA**	**20 jours**	**Ven 19/02/27**	**Jeu 18/03/27**
44	Levées des non conformités TF PHASE 1	10 jours	Ven 14/05/27	Jeu 27/05/27
45	**MADA PHASE 1**	**0 jour**	**Jeu 27/05/27**	**Jeu 27/05/27**
46	**PHASE 2 : Bâtiment D**	**100 jours**	**Ven 28/05/27**	**Jeu 14/10/27**
47	**Curage démolition**	**40 jours**	**Ven 28/05/27**	**Jeu 22/07/27**
53	**Clos couvert**	**60 jours**	**Ven 23/07/27**	**Jeu 14/10/27**
57	**Lots CFO CFA**	**35 jours**	**Ven 23/07/27**	**Jeu 09/09/27**
62	**Lot CVC**	**30 jours**	**Ven 23/07/27**	**Jeu 02/09/27**
67	**CEA**	**20 jours**	**Ven 20/08/27**	**Jeu 16/09/27**
70	Levées des non conformités TF PHASE 2	10 jours	Ven 15/10/27	Jeu 28/10/27
71	**Dates de fermeture été 2027**	**16 jours**	**Lun 26/07/27**	**Lun 16/08/27**
73	**MADA PHASE 2**	**0 jour**	**Jeu 28/10/27**	**Jeu 28/10/27**
74	**PHASE 3 : bâtiment A**	**80 jours**	**Ven 29/10/27**	**Jeu 17/02/28**
75	**Curage démolition**	**37 jours**	**Ven 29/10/27**	**Lun 20/12/27**
81	**Clos couvert**	**43 jours**	**Mar 21/12/27**	**Jeu 17/02/28**



N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
85	**Lots CFO CFA**	**25 jours**	**Mar 21/12/27**	**Lun 24/01/28**
89	**Lot CVC**	**20 jours**	**Mar 21/12/27**	**Lun 17/01/28**
93	**CEA**	**20 jours**	**Mar 04/01/28**	**Lun 31/01/28**
96	Levées des non conformités TF PHASE 3	10 jours	Ven 18/02/28	Jeu 02/03/28
97	**MADA PHASE 3**	**0 jour**	**Jeu 02/03/28**	**Jeu 02/03/28**
98	**PHASE 4 : Bâtiment C**	**100 jours**	**Ven 03/03/28**	**Jeu 20/07/28**
99	**Curage démolition**	**40 jours**	**Ven 03/03/28**	**Jeu 27/04/28**
105	**Clos couvert**	**45 jours**	**Ven 28/04/28**	**Jeu 29/06/28**
109	**Lots CFO CFA**	**55 jours**	**Ven 28/04/28**	**Jeu 13/07/28**
113	**Lot CVC**	**50 jours**	**Ven 28/04/28**	**Jeu 06/07/28**
118	**CEA**	**20 jours**	**Ven 23/06/28**	**Jeu 20/07/28**
121	Levées des non conformités TF PHASE 4	10 jours	Ven 21/07/28	Jeu 03/08/28
122	**MADA Phase 4**	**0 jour**	**Jeu 03/08/28**	**Jeu 03/08/28**
123	**Raccordement au réseau de chaleur**	**60 jours?**	**Jeu 01/06/28**	**Mer 23/08/28**
127	**PHASE 5 : Pavillon**	**65 jours**	**Ven 04/08/28**	**Jeu 02/11/28**
128	**Curage démolition**	**25 jours**	**Ven 04/08/28**	**Jeu 07/09/28**
134	**Clos couvert**	**40 jours**	**Ven 08/09/28**	**Jeu 02/11/28**
139	**Lots CFO CFA**	**10 jours**	**Ven 08/09/28**	**Jeu 21/09/28**
141	**Lot CVC**	**20 jours**	**Ven 08/09/28**	**Jeu 05/10/28**
145	**CEA**	**20 jours**	**Ven 06/10/28**	**Jeu 02/11/28**
148	Levées des non conformités TF PHASE 5	10 jours	Ven 03/11/28	Jeu 16/11/28
149	**MADA Phase 5**	**0 jour**	**Jeu 16/11/28**	**Jeu 16/11/28**
150	**RECEPTION TRAVAUX TOUTES ZONES**	**20 jours**	**Ven 17/11/28**	**Jeu 14/12/28**
151	Commisions de sécurité	0 jour	Jeu 16/11/28	Jeu 16/11/28
152	**TRANCHE CONDITIONNELLE: Accessbilité**	**70 jours**	**Ven 15/12/28**	**Jeu 22/03/29**
153	OS Travaux TC	0 jour	Ven 15/12/28	Ven 15/12/28
154	Etudes	20 jours	Ven 15/12/28	Jeu 11/01/29
155	Délais d'approvisionnement	20 jours	Ven 12/01/29	Jeu 08/02/29
156	**Mises au normes accessibilité**	**30 jours**	**Ven 09/02/29**	**Jeu 22/03/29**
161	Levées des non conformités TC	10 jours	Ven 23/03/29	Jeu 05/04/29

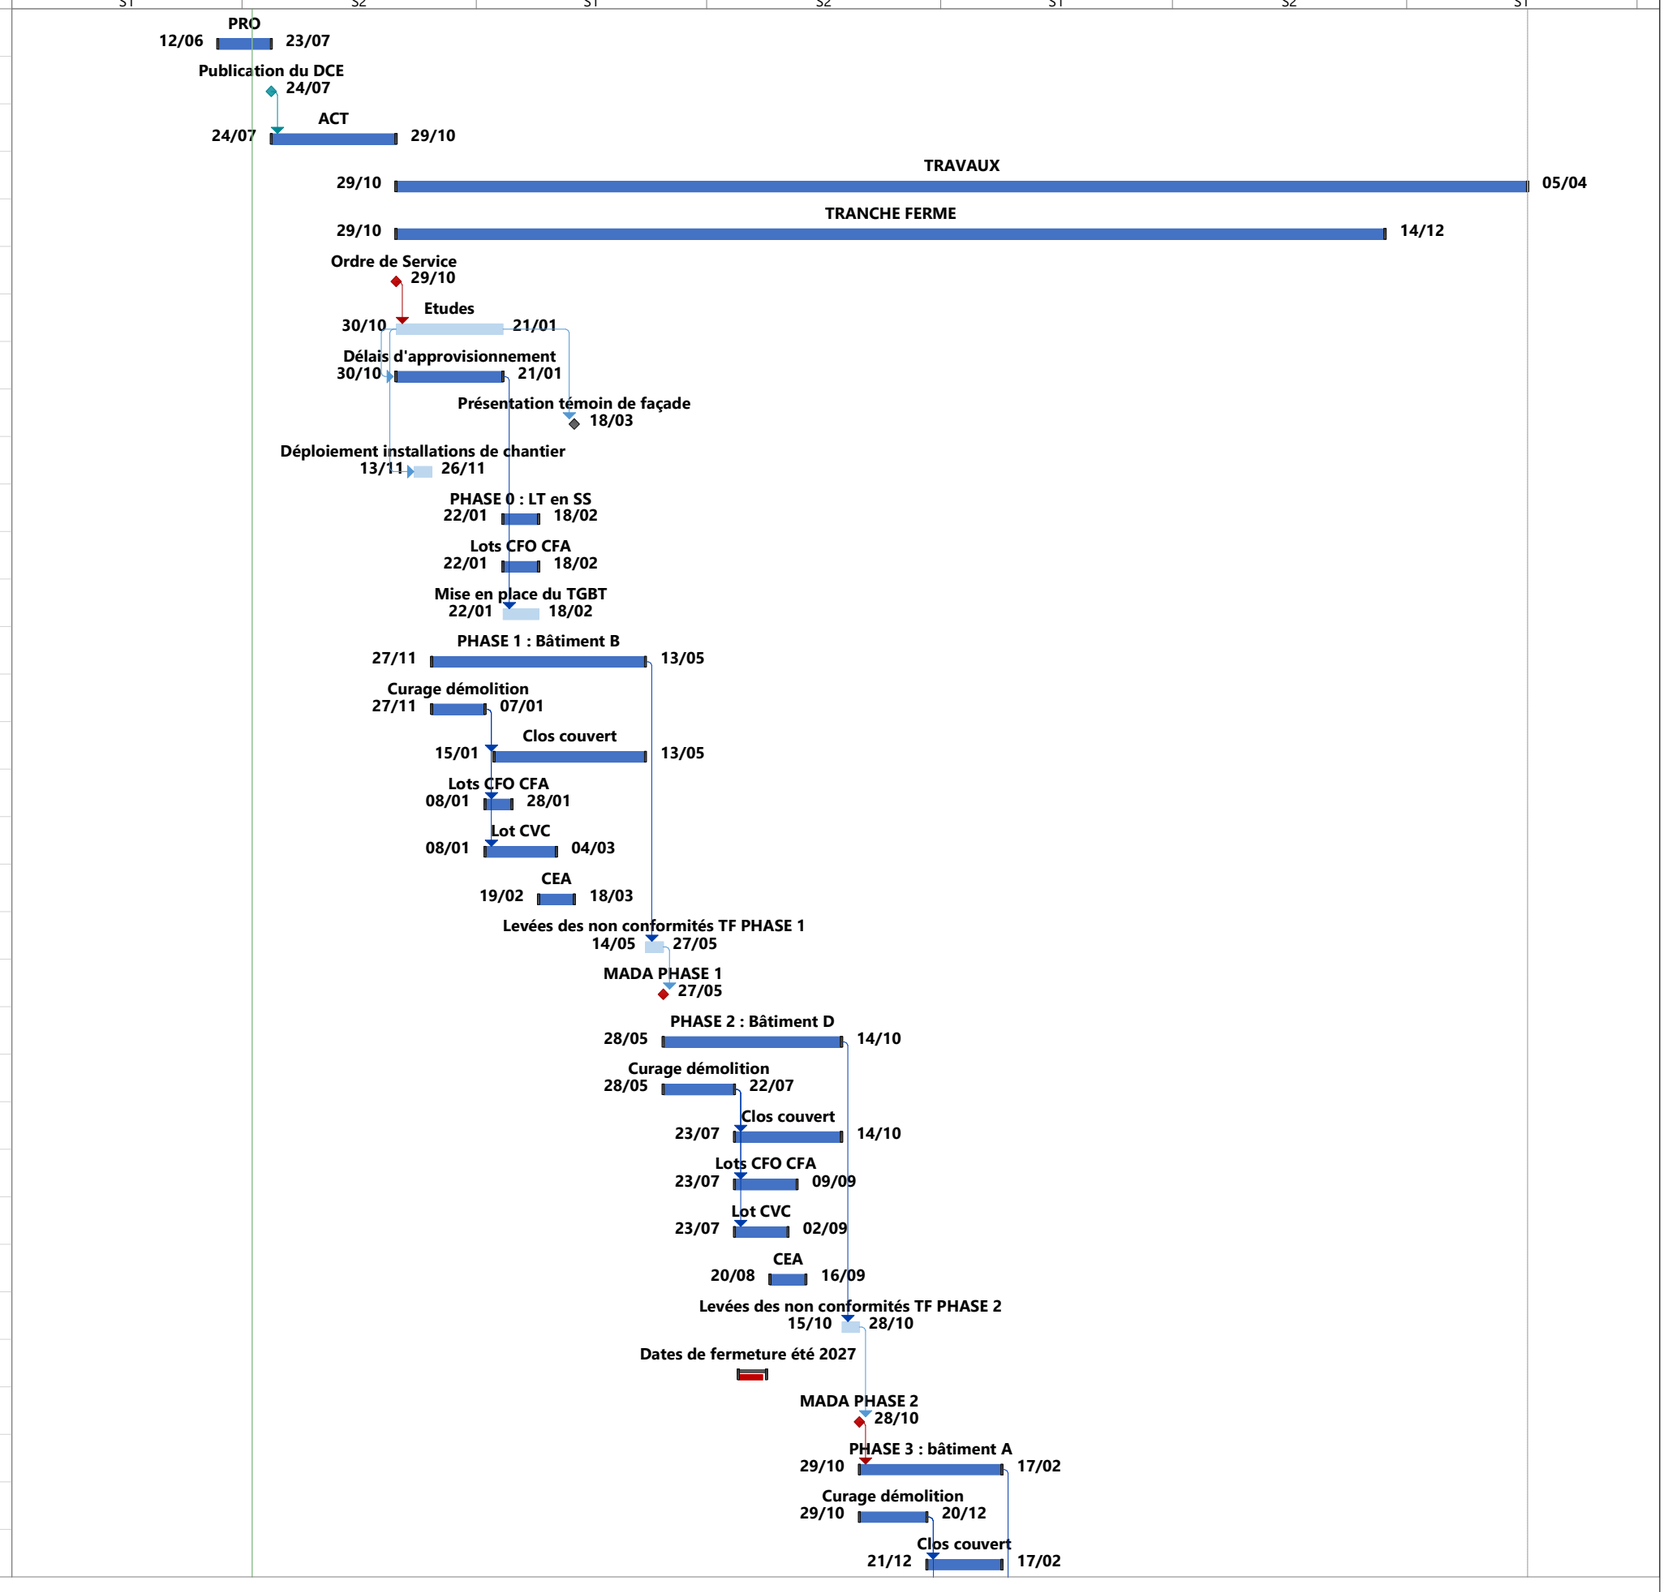
