QUALITAT EXPERTISES

92/98, Bd Victor Hugo 92115 CLICHY
Tel : 01 41 27 93 47 / Mail : courriel@qualitat.fr
www.qualitat.fr

PRE-RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION D'UN IMMEUBLE BÂTI

(SELON LA NORME NF X46-020)

Référence rapport	64342-2	Commande : du 19/06/2025
Adresse du site	ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE	
Type	Immeuble	
Date de construction / Permis de construire	Antérieur à 1997	
Localisation	Bât : Centre commercial	
N° de lot(s) copropriété	NC	
Références client	Immeuble : -	Lot gestion : -

Propriétaire	GRAND PARIS AMENAGEMENT 11, rue de Cambrai - BP CS 10052 75945 PARIS CEDEX 19
Donneur d'ordre	ADVIES CONSEIL 60 rue de Gonrat 73000 BASSENS
Accompagnateur	Absence d'accompagnateur
Laboratoire d'analyse	ITGA IDF Parc Edonia - Bât R - Rue de la Terre Adélie 35760 SAINT GREGOIRE n° 1-5967
Opérateur de repérage	Le présent rapport est établi par une personne, CHEVREL Etienne, dont les compétences sont certifiées par DEKRA Certification - Immeuble La Boursidière - Rue de la Boursidière - 92350 Le Plessis-Robinson - Certification n° DTI 2532 Date de validité : 23/06/2031
Date(s) de repérage	Du 23 au 27/06/2025
Date d'édition du rapport	16/07/2025

Rédacteur : CHEVREL Etienne	**Vérificateur :** LUIS Thierry
	

Ce rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes comprises

Historique des mises à jour		
Date	**Objet**	**Modifications**
16/07/2025	Création rapport	Sans objet

En cas de mise à jour du rapport, la dernière version émise annule et remplace la version précédente.

Sommaire

A. Conclusions 3
B. Contexte de la mission 11
1. Partie(s) d'immeuble concernées par la démolition 11
2. Programme de repérage 11
3. Limites ou extensions de la mission fixées par le donneur d'ordre 11
4. Documents fournis par le donneur d'ordre 12
C. Résultats détaillés du repérage 13
1. Liste des locaux visités 13
2. Matériaux et produits repérés 13
3. Matériaux et produits repérés par local ou zone 29
D. Fiches d'identification et de cotation 33
E. Conditions générales de réalisation du repérage 95
1. Objet de la mission 95
2. Limite de mission et de responsabilité 100
3. Références réglementaires 100
4. Présentation des résultats 101
F. Obligations de conservation et transmission 102
G. Attestations d'assurance, de compétence, d'impartialité. 103

Annexe : Cartographie des prélèvements, sondages et matériaux contenant de l'amiante
Annexe : Procès-verbaux d'analyse des échantillons en laboratoire
Annexe : Procès-verbaux d'analyse HAP en laboratoire

A. Conclusions

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission, le Donneur d'Ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, **Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

Avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant

N°	Type matériau / produit	Conclusion fondée sur
42	Conduit fibres-ciment gris, 30x30.	Analyse laboratoire
Localisation / ZPSO :		
R-1 : CIRCULATION **BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE **BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE		

N°	Type matériau / produit	Conclusion fondée sur
48	Conduit fibres-ciment rond, diamètre 15cm.	Analyse laboratoire
Localisation / ZPSO :		
R-1 : CIRCULATION **BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE **BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE		

N°	Type matériau / produit	Conclusion fondée sur
84	Colle beige + joint beige fin derrière faïence 10x10 blanche.	Analyse laboratoire
Localisation / ZPSO :		
BAT 3 / RDC : FRANPRIX		

N°	Type matériau / produit	Conclusion fondée sur
85	Colle beige + joint beige fin derrière faïence 15x15 blanche.	Analyse laboratoire
Localisation / ZPSO :		
BAT 3 / RDC : FRANPRIX		

N°	Type matériau / produit	Conclusion fondée sur
86	Colle beige + joint beige fin derrière faïence petit format orangée.	Analyse laboratoire
Localisation / ZPSO :		
BAT 3 / RDC : FRANPRIX		

N°	Type matériau / produit	Conclusion fondée sur
95	Joint de bride blanc en jonction réseaux eau et CTA.	Analyse laboratoire
Localisation / ZPSO :		
BAT 3 / RDC : FRANPRIX		

N°	Type matériau / produit	Conclusion fondée sur
101	Joint noir rigide en jonction de la CTA et de la gaine de ventilation en acier.	Analyse laboratoire
Localisation / ZPSO :		
BAT 3 / RDC : FRANPRIX		

N°	Type matériau / produit	Conclusion fondée sur
114	Coffrage perdu rond diamètre 30cm.	Analyse laboratoire
Localisation / ZPSO :		
R-1 : CIRCULATION		

N°	Type matériau / produit	Conclusion fondée sur
115	Plaques fibres-ciment type tôles ondulées en dépôt.	Analyse laboratoire
Localisation / ZPSO :		
R-1 : CIRCULATION		

N°	Type matériau / produit	Conclusion fondée sur
116	Plaques fibres-ciment type panneaux planes en dépôt.	Analyse laboratoire
Localisation / ZPSO :		
R-1 : CIRCULATION		

N°	Type matériau / produit	Conclusion fondée sur
123	Coffrage perdu carré, 15x15cm.	Analyse laboratoire
Localisation / ZPSO :		
PARVIS : PARVIS		

Précisions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante

Sans objet

Il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués :

N°	Type matériau / produit	Raisons de l'impossibilité de conclure
17	Conduit fibres-ciment rond, évacuation de fumée.	Matériau nécessitant des moyens d'accès spécifiques
Localisation / ZPSO :		
BAT 1 : FAÇADES		

Notes :
- La liste de l'ensemble des matériaux et produits repérés, dont le cas échéant ceux ne contenant pas d'amiante, figure au chapitre C.2. du présent rapport.
- En cas de présence d'amiante, l'estimation de la quantité des matériaux et produits contenant de l'amiante repérés figure dans la cartographie en annexe.

Certains locaux compris dans le périmètre de la mission n'ont pas pu être visités. Ces locaux devront faire l'objet d'un complément de repérage :

Locaux non visités	Justification
BAT 3 / RDC / COURS	Absence de clé
R-1 / LOCAUX DIVERS (dont FRANPRIX)	Locaux complétement encombrés / non praticables et/ou absence de clé (cf. cartographie en annexe)
BAT 3 / R-1 à RDC / GAINE ET CABINE MONTE CHARGE	Nécessite l'assistance d'un ascensoriste ou l'intervention équipé d'une clef d'accès spécifique
BAT 1 / TOITURE	Nécessite des moyens d'accès spécifiques
BAT 2 / TOITURE	
BAT 3 / TOITURE	
BAT 4 / TOITURE	
BAT 4 / Ensemble des locaux	Nécessite la libération des locaux de tout occupant
BAT 2 / CAFE	Nécessite la libération des locaux de tout occupant
BAT 1 / Ensemble des locaux (sauf taxi phone)	Nécessite la sécurisation du site ainsi que l'ouverture des locaux

Liste des investigations approfondies à mettre en place pour mener la mission à son terme

Visiter les locaux présents dans le tableau ci-dessus n'ayant pas pu l'être.
La visite de ces locaux nécessite la mise en place de moyen particulier.

- Une partie des locaux devra faire l'objet d'un désencombrement, en particulier dans le sous-sol et dans le bâtiment 2.
- Faire intervenir une nacelle ou des systèmes d'accès en hauteur pour visiter les toitures de l'ensemble des bâtiments.
- Faire intervenir un ascensoriste ou l'intervention équipé d'une clef d'accès spécifique
- Réaliser des ouvertures de portes / palissades métallique pour accéder aux locaux inaccessibles
- Réaliser une sécurisation et une mise en accès de l'ensemble du bâtiment 1.

Prélever le conduit fibre ciment CO17 dans le bâtiment 1.

Observations et/ou investigations complémentaires

BÂTIMENT 1, 2 et 3 :

Les façades ne sont pas intégralement accessibles car partiellement occultés par des bardages et des tôles de sécurisation. Une partie des vitrines ont fait l'objet d'investigations depuis l'intérieurs des locaux accessibles, toute fois, il n'est pas à exclure la présence de matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante. En cas de découverte d'un matériau ou produit non référencé dans le présent rapport lors de la démolition, il sera nécessaire de réaliser des investigations complémentaires.







BÂTIMENT 2 / BOULANGERIE/COIFFURE et BÂTIMENT 1 / TAXI PHONE :

Les locaux ont été squattés, il existe dans ces locaux des amas de meubles et de déchets divers. Les locaux sont partiellement inondés. Dans ces conditions et malgré nos investigations poussées, il n'est pas à exclure la présence de matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante. En cas de découverte d'un matériau ou produit non référencé dans le présent rapport lors de la démolition, il sera nécessaire de réaliser des investigations complémentaires.

BÂTIMENT 2 / BOULANGERIE/COIFFURE



BÂTIMENT 1 / TAXI PHONE



BÂTIMENT 3 / FRANPRIX

Les gaines de ventilation métallique présent dans le plénum ont été investiguées, il n'a pas été repéré de matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante.



Une partie des vitrines située dans la zone d'entrée date de 2001, date de fabrication postérieure à la date interdiction de l'amiante.



R-1 SOUS SOL

De nombreuses parties sont non accessibles, car fermés à clef, trop encombrés ou encore occupés.



















RDC / PARVIS :

Il n'a pas été repéré d'étanchéité en surface du parvis. Il est possible qu'une étanchéité soit présente sous une dalle en béton de protection. Cela nécessitera l'intervention d'une carotteuse afin de traverser la dalle ou fera l'objet d'investigation complémentaire lors de la démolition.

La présence de réseaux électriques contenant de l'amiante n'a pas été observée dans les locaux. Cependant, les réseaux étant sous tension, des investigations exhaustives n'ont pu être réalisées. En cas de découverte de réseaux suspects lors du curage, ils devront être consignés pour investigations et sondages.

En écart aux recommandations de la norme NF X 46-020 d'août 2017, certains matériaux pour lesquels 2 PV d'analyses sont recommandés pour conclure n'ont fait l'objet que d'un seul prélèvement et d'un seul PV. Ce cas concerne en particulier les matériaux présents sur de faibles étendues. Cet écart ne remet pas en cause les conclusions et la validité du présent rapport

Les conduits enterrés et ouvrages souterrains (cuves, fosses et fondations) sont susceptibles de contenir de l'amiante. Il est impossible d'identifier leur présence et de déterminer leur nature sans réalisation de travaux lourds de terrassement. En cas de travaux les concernant, le donneur d'ordre devra faire procéder à un repérage complémentaire.

B. Contexte de la mission

1. Partie(s) d'immeuble concernées par la démolition

Ensemble du centre commercial.

2. Programme de repérage

Le programme de repérage est défini dans la liste C de l'annexe 13-9 du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 et dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

3. Limites ou extensions de la mission fixées par le donneur d'ordre

Ce tableau décrit les limites, exclusions ou extensions du cadre de la mission qui ont été apportées par le donneur d'ordre (venant éventuellement modifier le périmètre et/ou le programme de repérage tel qu'il a été défini contractuellement au moment de l'offre ou du contrat). Les ouvrages ou parties d'ouvrages concernés sont indiqués dans le tableau ci-après, et exclus ou ajoutés au champ de la mission couverte par le présent rapport.

Locaux concernés	Ouvrages / parties d'ouvrages concernés	Limites, exclusions ou extensions fixées par le donneur d'ordre
Néant	/	/

4. Documents fournis par le donneur d'ordre

Les documents ci-dessous ont été fournis par le donneur d'ordre ou son représentant :

Rapports de repérage

Date rapport	Type rapport	Référence rapport	Nom du rédacteur	Société	Type de repérage	Conclusions
Aucun document fourni						

Note : Le cas échéant, le détail des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés dans les rapports antérieurs et de nouveau repérés au cours de la mission de repérage objet du présent rapport figure dans les fiches d'identification et de cotation au chapitre D.

Autres documents

Date document	Type document	Référence document	Nom du rédacteur	Société
Aucun document fourni				

C. Résultats détaillés du repérage

1. Liste des locaux visités

R-1 :
CIRCULATION
BAT 1 / R-1 :
TAXI PHONE
BAT 1 / RDC :
PASSAGE, TAXI PHONE
BAT 1 :
FAÇADES
BAT 2 / R-1 :
BOULANGERIE
BAT 2 / RDC :
BOULANGERIE - COIFFURE
BAT 2 :
FAÇADES
BAT 3 / R-1 À RDC :
ESCALIER
BAT 3 / RDC :
FRANPRIX
BAT 3 :
FAÇADES
BAT 4 :
FAÇADES
PARVIS :
PARVIS

2. Matériaux et produits repérés

Le tableau ci-dessous recense les matériaux et produits inclus au périmètre et au programme de repérage qui ont été repérés, et leur localisation (locaux constituant les ZPSO).

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
1	Etanchéité bitumineuse avec couche aluminisé en pied de façades.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 : FAÇADES				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
2	Enduit mortier gris épais sur murs maçonnés.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 1 : FAÇADES **BAT 2 :** FAÇADES **BAT 3 :** FAÇADES **PARVIS :** PARVIS				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
3	Colle grise cimenteuse + joint épais gris sur parement en briquettes collées.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 : FAÇADES **BAT 3 :** FAÇADES				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
4	Joint noir souple de finition sur menuiseries alu simple vitrage.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 : FAÇADES				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
5	Enduit beige plâtreux fin en sous face de plancher béton.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 : FAÇADES				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
6	Joint mortier gris ciment épais sur maçonnerie en briques pleines.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	3	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 1 / R-1 : TAXI PHONE **BAT 1 / RDC :** PASSAGE, TAXI PHONE **BAT 1 :** FAÇADES **BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE **BAT 2 :** FAÇADES **BAT 4 :** FAÇADES				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
7	Colle grise dure + joint gris sous faïence 10x10 beige.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 1 : FAÇADES				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
8	Enduit mortier gris épais sur murs en béton.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 1 : FAÇADES **PARVIS :** PARVIS				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
9	Joint vitrier blanc dure en pourtour de vitrages simples sur allèges et fenêtres.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 1 : FAÇADES				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
10	Mastic blanc souple sur panneaux de bardages métalliques rapportés.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 1 : FAÇADES				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
11	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en partie courante.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
PARVIS : PARVIS				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
12	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en rustines.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
PARVIS : PARVIS				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
13	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en partie courante.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
PARVIS : PARVIS				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
14	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en rustines.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
PARVIS : PARVIS				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
15	Enrobé bitumineux rouge, granulat moyen, épaisseur 3cm environ, en bandes.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
PARVIS : PARVIS				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
16	Enduit beige fin de finition sur murs maçonnés.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 1 : FAÇADES				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
17	Conduit fibres-ciment rond, évacuation de fumée.	Matériau nécessitant des moyens d'accès spécifiques.	0	ANALYSE ULTERIEURE
Localisation / ZPSO :				
BAT 1 : FAÇADES				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
18	Mastic blanc souple en finition entre parement briques et éléments métalliques.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 : FAÇADES				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
19	Colle blanche + joint gris sous carrelage marron imitation parquet.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / RDC : BOULANGERIE - COIFFURE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
20	Ragréage rosé épais en finition sous tapis d'entrée.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / RDC : BOULANGERIE - COIFFURE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
21	Colle beige + joint gris sous carrelage marron, sous COL19.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / RDC : BOULANGERIE - COIFFURE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
22	Colle blanche + joint gris derrière plinthe marron imitation parquet.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / RDC : BOULANGERIE - COIFFURE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
23	Enduit blanc plâtreux + bande beige en jonction de plaques de plâtre en doublage.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / R-1 : BOULANGERIE **BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
24	Enduit blanc plâtreux fin sur murs en béton.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / R-1 : BOULANGERIE **BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
25	Enduit blanc plâtreux fin sur poteaux en béton.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / RDC : BOULANGERIE - COIFFURE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
26	Enduit blanc plâtreux + bande beige en jonction de plaques de plâtre de plafond.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / RDC : BOULANGERIE - COIFFURE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
27	Enduit blanc plâtreux fin sur plafond en béton.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / R-1 : BOULANGERIE **BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
28	Plaque bitumineuse noir sous évier.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / RDC : BOULANGERIE - COIFFURE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
29	Colle grise dure + joint gris sous plinthes marron en carrelage.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / RDC : BOULANGERIE - COIFFURE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
30	Joint vitrier beige dure + mastic blanc souple sur vitrines simple vitrage en acier.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / RDC : BOULANGERIE - COIFFURE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
31	Colle épaisse type mortier + joint gris sous carrelage mosaïque beige.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / R-1 : BOULANGERIE **BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
32	Linoleum souple imitation parquet foncé, pose libre.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / RDC : BOULANGERIE - COIFFURE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
33	Linoleum beige gris moucheté + colle marron.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / RDC : BOULANGERIE - COIFFURE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
34	Colle grise + joint gris sous carrelage 50x50 beige marbré.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / RDC : BOULANGERIE - COIFFURE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
35	Colle grise + joint gris derrière plinthes en carrelage 7x50 beige marbré.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / RDC : BOULANGERIE - COIFFURE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
36	Colle blanche plâtreuse en plot derrière doublage en plaques de plâtre et polystyrène.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / R-1 : BOULANGERIE **BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
37	Enduit blanc crépi sur murs.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / R-1 : BOULANGERIE **BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
38	Enduit ciment mortier entre menuiserie aluminium et bâtis.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / RDC : BOULANGERIE - COIFFURE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
39	Colle grise + joint gris sous carrelage 30x30 noir, sur ragréage gris.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / RDC : BOULANGERIE - COIFFURE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
40	Colle blanche + joint gris sous carrelage 30x30 beige.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / R-1 : BOULANGERIE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
41	Colle beige + joint gris derrière faïence 15x15 blanche.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / R-1 : BOULANGERIE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
42	Conduit fibres-ciment gris, 30x30.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	PRESENCE
Localisation / ZPSO :				
R-1 : CIRCULATION **BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE **BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
43	Faux-plafond en laine minérale + couche blanche, de 2008.	Marquage du matériau et/ou document consulté : date de fabrication du matériau postérieure à la date d'interdiction de l'amiante dans le matériau concerné.	0	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / R-1 : BOULANGERIE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
44	Linoleum beige souple + colle translucide.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / R-1 : BOULANGERIE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
45	Enduit-Peinture rouge au sol, sur chape mortier.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / R-1 : BOULANGERIE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
46	Colle beige + joint gris derrière faïence 15x15 blanche.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / R-1 : BOULANGERIE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
47	Colle beige + joint gris derrière faïence 50x25 grise.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / R-1 : BOULANGERIE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
48	Conduit fibres-ciment rond, diamètre 15cm.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	PRESENCE
Localisation / ZPSO :				
R-1 : CIRCULATION **BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE **BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
49	Colle blanche dure en plot derrière dalle de polystyrène collée au plafond.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / R-1 : BOULANGERIE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
50	Enduit blanc plâtreux fin + ciment sur poutres béton.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / R-1 : BOULANGERIE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
51	Nez de marche noir caoutchouc sur escalier.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / R-1 : BOULANGERIE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
52	Dalle de sol fine rigide beige 30x30 + colle translucide + ragréage blanc fin.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / R-1 : BOULANGERIE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
53	Chape mortier épaisse au sol.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / R-1 : BOULANGERIE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
54	Colle beige + joint beige fin derrière faïence 15x15 blanche.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / R-1 : BOULANGERIE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
55	Colle blanche + joint gris sous carrelage beige, dans escalier.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / R-1 : BOULANGERIE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
56	Colle grise + joint gris sous carrelage 20x20 beige.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / R-1 : BOULANGERIE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
57	Colle grise + joint gris sous carrelage 20x20 blanc.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / R-1 : BOULANGERIE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
58	Colle beige + joint beige sous plinthe en carrelage bleu/gris.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / R-1 : BOULANGERIE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
59	Colle beige + joint gris derrière faïence 10x20 blanche cassée.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / R-1 : BOULANGERIE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
60	Joint noir dure sur vannes.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 2 / R-1 : BOULANGERIE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
61	Dalle de sol imitation parquet + colle translucide.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 1 / RDC : TAXI PHONE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
62	Linoleum souple imitation parquet + colle translucide.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 1 / RDC : TAXI PHONE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
63	Colle épaisse type mortier + joint gris sous carrelage mosaïque beige.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 1 / RDC : TAXI PHONE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
64	Enduit blanc plâtreux + bande beige en jonction de plaques de plâtre de doublage.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 1 / RDC : TAXI PHONE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
65	Enduit blanc crépi sur murs.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 1 / RDC : TAXI PHONE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
66	Enduit plâtreux fin + enduit mortier sur murs.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 1 / RDC : TAXI PHONE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
67	Colle blanche dure en plot derrière dalle de polystyrène collée au plafond.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 1 / RDC : TAXI PHONE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
68	Enduit blanc plâtreux fin sur plafond en béton.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 1 / R-1 : TAXI PHONE **BAT 1 / RDC :** PASSAGE, TAXI PHONE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
69	Colle blanche + joint blanc derrière faïence 20x20 blanche.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 1 / RDC : TAXI PHONE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
70	Joint vitrier marron dure souple sur vitrines simple vitrage en acier.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 1 / RDC : PASSAGE, TAXI PHONE **BAT 1 :** FAÇADES				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
71	Enduit-Peinture gris sur chape mortier épaisse.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 1 / R-1 : TAXI PHONE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
72	Colle beige fine + joint beige derrière faïence 15x15 blanche.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 1 / R-1 : TAXI PHONE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
73	Enduit plâtreux fin sur cloisons en carreaux de plâtre.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 1 / R-1 : TAXI PHONE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
74	Enduit mortier gris épais sur murs maçonnés.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 1 / R-1 : TAXI PHONE **BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE **BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
75	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 3cm environ, en partie courante.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 1 / RDC : PASSAGE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
76	Colle épaisse type mortier + joint gris sous carrelage beige 10x10.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 1 / RDC : PASSAGE **BAT 1 :** FAÇADES				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
77	Colle marron clair sous moquette.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 1 / RDC : PASSAGE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
78	Colle grise + joint gris sous carrelage 15x15 beige.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 3 / RDC : FRANPRIX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
79	Colle épaisse type mortier + joint gris sous carrelage mosaïque bleue.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 3 / RDC : FRANPRIX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
80	Colle grise cimenteuse + joint gris derrière plinthe en carrelage bleu moucheté 10x10.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 3 / RDC : FRANPRIX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
81	Enduit mortier gris épais sur murs maçonnés.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 3 / R-1 À RDC : ESCALIER **BAT 3 / RDC :** FRANPRIX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
82	Colle bitumineuse noir en plot sur murs (résidus).	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 3 / RDC : FRANPRIX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
83	Colle blanche plâtreuse en plot derrière doublage en plaques de plâtre.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 3 / RDC : FRANPRIX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
84	Colle beige + joint beige fin derrière faïence 10x10 blanche.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	PRESENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 3 / RDC : FRANPRIX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
85	Colle beige + joint beige fin derrière faïence 15x15 blanche.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	PRESENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 3 / RDC : FRANPRIX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
86	Colle beige + joint beige fin derrière faïence petit format orangée.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	PRESENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 3 / RDC : FRANPRIX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
87	Linoleum souple imitation parquet + colle marron.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 3 / RDC : FRANPRIX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
88	Joint vitrier beige dure sur anciennes vitrines en acier (vitrages déposés).	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 3 / RDC : FRANPRIX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
89	Enduit blanc plâtreux fin de lissage sur murs.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 3 / RDC : FRANPRIX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
90	Pare-vapeur bitumineux noir en sous face de lès de laine minérale en plénum.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 3 / RDC : FRANPRIX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
91	Faux-plafond en dalle perforé fibreuse blanche, 60x60 de 2001.	Marquage du matériau et/ou document consulté : date de fabrication du matériau postérieure à la date d'interdiction de l'amiante dans le matériau concerné.	0	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 3 / RDC : FRANPRIX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
92	Colle en plot blanc ancien, fixation de plafond staff.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 3 / R-1 À RDC : ESCALIER **BAT 3 / RDC :** FRANPRIX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
93	Panneau en staff, en résidus ou encore en place	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 3 / R-1 À RDC : ESCALIER **BAT 3 / RDC :** FRANPRIX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
94	Mastic blanc en jonction gaines de ventilation en alu souple et gaines en acier rigide.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 3 / RDC : FRANPRIX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
95	Joint de bride blanc en jonction réseaux eau et CTA.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	PRESENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 3 / RDC : FRANPRIX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
96	Joint gris mortier sur plafond en briques.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 3 / R-1 À RDC : ESCALIER **BAT 3 / RDC :** FRANPRIX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
97	Enduit blanc plâtreux + bande beige en jonction de plaques de plâtre des puits de lumière.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 3 / RDC : FRANPRIX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
98	Joint noir fibreux sur porte coupe-feu en bois.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 3 / RDC : FRANPRIX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
99	Joint vitrier beige en pour tour de simple vitrage sur porte intérieure en bois.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 3 / RDC : FRANPRIX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
100	Calorifuge noir mousse.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 3 / RDC : FRANPRIX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
101	Joint noir rigide en jonction de la CTA et de la gaine de ventilation en acier.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	PRESENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 3 / RDC : FRANPRIX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
102	Joint noir de finition sur trappes de visites de la CTA.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 3 / RDC : FRANPRIX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
103	Courroie noir souple sur CTA.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 3 / RDC : FRANPRIX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
104	Chape mortier ciment sur marche et contremarche.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 3 / R-1 À RDC : ESCALIER				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
105	Rebouchage blanc plâtreux en pourtour des fixations main courante.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 3 / R-1 À RDC : ESCALIER				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
106	Flocage gris cotonneux sur plafond et poutres béton.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT 3 / R-1 À RDC : ESCALIER				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
107	Chape dure grise cimenteuse au sol.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
R-1 : CIRCULATION				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
108	Enduit ciment mortier de finition ponctuel sur murs béton.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
R-1 : CIRCULATION				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
109	Joint gris ciment sur murs parpaing.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
R-1 : CIRCULATION				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
110	Enduit ciment gris de finition ponctuel (rebouchages) sur plafond béton.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
R-1 : CIRCULATION				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
111	Enveloppe de calorifuge plâtreuse avec trame textile + laine minérale.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
R-1 : CIRCULATION				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
112	Enveloppe de calorifuge bitumineuse avec trame textile + laine minérale.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
R-1 : CIRCULATION				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
113	Enveloppe de calorifuge cartonnée beige + laine minérale en fourreau.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
R-1 : CIRCULATION				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
114	Coffrage perdu rond diamètre 30cm.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	PRESENCE
Localisation / ZPSO :				
R-1 : CIRCULATION				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
115	Plaques fibres-ciment type tôles ondulées en dépôt.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	PRESENCE
Localisation / ZPSO :				
R-1 : CIRCULATION				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
116	Plaques fibres-ciment type panneaux planes en dépôt.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	PRESENCE
Localisation / ZPSO :				
R-1 : CIRCULATION				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
117	Rebouchage blanc plâtreux ponctuel sur murs.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
R-1 : CIRCULATION				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
118	Enduit ciment mortier de finition ponctuel sur murs béton (rampe).	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
PARVIS : PARVIS				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
119	Enduit ciment beige de finition ponctuel sur murs béton.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
PARVIS : PARVIS				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
120	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en partie courante.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
PARVIS : PARVIS				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
121	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en partie courante.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
PARVIS : PARVIS				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
122	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en rebouchage.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
PARVIS : PARVIS				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
123	Coffrage perdu carré, 15x15cm.	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	PRESENCE
Localisation / ZPSO :				
PARVIS : PARVIS				

3. Matériaux et produits repérés par local ou zone

Le tableau ci-dessous recense pour chaque local ou zone investigué(e) les matériaux et produits inclus au périmètre et au programme de repérage qui y ont été repérés.

R-1 / CIRCULATION

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
42 : Conduit fibres-ciment gris, 30x30.	-	PRESENCE
48 : Conduit fibres-ciment rond, diamètre 15cm.	-	PRESENCE
107 : Chape dure grise cimenteuse au sol.	107-2 : Négatif 107-1 : Négatif	ABSENCE
108 : Enduit ciment mortier de finition ponctuel sur murs béton.	108-2 : Négatif 108-1 : Négatif	ABSENCE
109 : Joint gris ciment sur murs parpaing.	109-1 : Négatif	ABSENCE
110 : Enduit ciment gris de finition ponctuel (rebouchages) sur plafond béton.	110-2 : Négatif 110-1 : Négatif	ABSENCE
111 : Enveloppe de calorifuge plâtreuse avec trame textile + laine minérale.	111-1 : Négatif	ABSENCE
112 : Enveloppe de calorifuge bitumineuse avec trame textile + laine minérale.	112-1 : Négatif	ABSENCE
113 : Enveloppe de calorifuge cartonnée beige + laine minérale en fourreau.	113-1 : Négatif	ABSENCE
114 : Coffrage perdu rond diamètre 30cm.	114-1 : Positif	PRESENCE
115 : Plaques fibres-ciment type tôles ondulées en dépôt.	115-1 : Positif	PRESENCE
116 : Plaques fibres-ciment type panneaux planes en dépôt.	116-1 : Positif	PRESENCE
117 : Rebouchage blanc plâtreux ponctuel sur murs.	117-1 : Négatif	ABSENCE

BAT 1 / R-1 / TAXI PHONE

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
6 : Joint mortier gris ciment épais sur maçonnerie en briques pleines.	6-3 : Négatif	ABSENCE
68 : Enduit blanc plâtreux fin sur plafond en béton.	-	ABSENCE
71 : Enduit-Peinture gris sur chape mortier épaisse.	71-1 : Négatif	ABSENCE
72 : Colle beige fine + joint beige derrière faïence 15x15 blanche.	72-1 : Négatif	ABSENCE
73 : Enduit plâtreux fin sur cloisons en carreaux de plâtre.	73-1 : Négatif	ABSENCE
74 : Enduit mortier gris épais sur murs maçonnés.	74-1 : Négatif	ABSENCE

BAT 1 / RDC / PASSAGE

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
6 : Joint mortier gris ciment épais sur maçonnerie en briques pleines.	-	ABSENCE
68 : Enduit blanc plâtreux fin sur plafond en béton.	-	ABSENCE
70 : Joint vitrier marron dure souple sur vitrines simple vitrage en acier.	-	ABSENCE
75 : Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 3cm environ, en partie courante.	75-1 : Négatif	ABSENCE
76 : Colle épaisse type mortier + joint gris sous carrelage beige 10x10.	76-1 : Négatif	ABSENCE
77 : Colle marron clair sous moquette.	77-1 : Négatif	ABSENCE

BAT 1 / RDC / TAXI PHONE

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
6 : Joint mortier gris ciment épais sur maçonnerie en briques pleines.	-	ABSENCE
61 : Dalle de sol imitation parquet + colle translucide.	61-1 : Négatif	ABSENCE
62 : Linoleum souple imitation parquet + colle translucide.	62-1 : Négatif	ABSENCE
63 : Colle épaisse type mortier + joint gris sous carrelage mosaïque beige.	63-1 : Négatif	ABSENCE
64 : Enduit blanc plâtreux + bande beige en jonction de plaques de plâtre de doublage.	64-1 : Négatif	ABSENCE
65 : Enduit blanc crépi sur murs.	65-1 : Négatif	ABSENCE
66 : Enduit plâtreux fin + enduit mortier sur murs.	66-1 : Négatif	ABSENCE
67 : Colle blanche dure en plot derrière dalle de polystyrène collée au plafond.	67-1 : Négatif	ABSENCE
68 : Enduit blanc plâtreux fin sur plafond en béton.	68-1 : Négatif	ABSENCE
69 : Colle blanche + joint blanc derrière faïence 20x20 blanche.	69-1 : Négatif	ABSENCE
70 : Joint vitrier marron dure souple sur vitrines simple vitrage en acier.	70-1 : Négatif	ABSENCE

BAT 1 / FAÇADES

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
2 : Enduit mortier gris épais sur murs maçonnés.	2-2 : Négatif	ABSENCE
6 : Joint mortier gris ciment épais sur maçonnerie en briques pleines.	6-2 : Négatif	ABSENCE
7 : Colle grise dure + joint gris sous faïence 10x10 beige.	7-1 : Négatif	ABSENCE
8 : Enduit mortier gris épais sur murs en béton.	8-1 : Négatif	ABSENCE
9 : Joint vitrier blanc dure en pourtour de vitrages simples sur allèges et fenêtres.	9-1 : Négatif	ABSENCE
10 : Mastic blanc souple sur panneaux de bardages métalliques rapportés.	10-1 : Négatif	ABSENCE
16 : Enduit beige fin de finition sur murs maçonnés.	16-1 : Négatif	ABSENCE
17 : Conduit fibres-ciment rond, évacuation de fumée.	-	ANALYSE ULTERIEURE
70 : Joint vitrier marron dure souple sur vitrines simple vitrage en acier.	-	ABSENCE
76 : Colle épaisse type mortier + joint gris sous carrelage beige 10x10.	-	ABSENCE

BAT 2 / R-1 / BOULANGERIE

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
23 : Enduit blanc plâtreux + bande beige en jonction de plaques de plâtre en doublage.	23-2 : Négatif	ABSENCE
24 : Enduit blanc plâtreux fin sur murs en béton.	24-2 : Négatif	ABSENCE
27 : Enduit blanc plâtreux fin sur plafond en béton.	27-2 : Négatif	ABSENCE
31 : Colle épaisse type mortier + joint gris sous carrelage mosaïque beige.	31-2 : Négatif	ABSENCE
36 : Colle blanche plâtreuse en plot derrière doublage en plaques de plâtre et polystyrène.	36-2 : Négatif	ABSENCE
37 : Enduit blanc crépi sur murs.	37-2 : Négatif	ABSENCE
40 : Colle blanche + joint gris sous carrelage 30x30 beige.	40-1 : Négatif	ABSENCE
41 : Colle beige + joint gris derrière faïence 15x15 blanche.	41-1 : Négatif	ABSENCE
42 : Conduit fibres-ciment gris, 30x30.	42-1 : Positif	PRESENCE
43 : Faux-plafond en laine minérale + couche blanche, de 2008.	-	ABSENCE
44 : Linoleum beige souple + colle translucide.	44-1 : Négatif	ABSENCE
45 : Enduit-Peinture rouge au sol, sur chape mortier.	45-1 : Négatif	ABSENCE
46 : Colle beige + joint gris derrière faïence 15x15 blanche.	46-1 : Négatif	ABSENCE
47 : Colle beige + joint gris derrière faïence 50x25 grise.	47-1 : Négatif	ABSENCE
48 : Conduit fibres-ciment rond, diamètre 15cm.	48-1 : Positif	PRESENCE
49 : Colle blanche dure en plot derrière dalle de polystyrène collée au plafond.	49-1 : Négatif	ABSENCE
50 : Enduit blanc plâtreux fin + ciment sur poutres béton.	50-1 : Négatif	ABSENCE
51 : Nez de marche noir caoutchouc sur escalier.	51-1 : Négatif	ABSENCE
52 : Dalle de sol fine rigide beige 30x30 + colle translucide + ragréage blanc fin.	52-1 : Négatif	ABSENCE
53 : Chape mortier épaisse au sol.	53-1 : Négatif	ABSENCE
54 : Colle beige + joint beige fin derrière faïence 15x15 blanche.	54-1 : Négatif	ABSENCE
55 : Colle blanche + joint gris sous carrelage beige, dans escalier.	55-1 : Négatif	ABSENCE
56 : Colle grise + joint gris sous carrelage 20x20 beige.	56-1 : Négatif	ABSENCE
57 : Colle grise + joint gris sous carrelage 20x20 blanc.	57-1 : Négatif	ABSENCE
58 : Colle beige + joint beige sous plinthe en carrelage bleu/gris.	58-1 : Négatif	ABSENCE
59 : Colle beige + joint gris derrière faïence 10x20 blanche cassée.	59-1 : Négatif	ABSENCE
60 : Joint noir dure sur vannes.	60-1 : Négatif	ABSENCE
74 : Enduit mortier gris épais sur murs maçonnés.	-	ABSENCE

BAT 2 / RDC / BOULANGERIE - COIFFURE

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
6 : Joint mortier gris ciment épais sur maçonnerie en briques pleines.	-	ABSENCE
19 : Colle blanche + joint gris sous carrelage marron imitation parquet.	19-1 : Négatif	ABSENCE
20 : Ragréage rosé épais en finition sous tapis d'entrée.	20-1 : Négatif	ABSENCE
21 : Colle beige + joint gris sous carrelage marron, sous COL19.	21-1 : Négatif	ABSENCE
22 : Colle blanche + joint gris derrière plinthe marron imitation parquet.	22-1 : Négatif	ABSENCE
23 : Enduit blanc plâtreux + bande beige en jonction de plaques de plâtre en doublage.	23-1 : Négatif	ABSENCE
24 : Enduit blanc plâtreux fin sur murs en béton.	24-1 : Négatif	ABSENCE
25 : Enduit blanc plâtreux fin sur poteaux en béton.	25-1 : Négatif	ABSENCE
26 : Enduit blanc plâtreux + bande beige en jonction de plaques de plâtre de plafond.	26-1 : Négatif	ABSENCE
27 : Enduit blanc plâtreux fin sur plafond en béton.	27-1 : Négatif	ABSENCE
28 : Plaque bitumineuse noir sous évier.	28-1 : Négatif	ABSENCE
29 : Colle grise dure + joint gris sous plinthes marron en carrelage.	29-1 : Négatif	ABSENCE
30 : Joint vitrier beige dure + mastic blanc souple sur vitrines simple vitrage en acier.	30-1 : Négatif	ABSENCE
31 : Colle épaisse type mortier + joint gris sous carrelage mosaïque beige.	31-1 : Négatif	ABSENCE
32 : Linoleum souple imitation parquet foncé, pose libre.	32-1 : Négatif	ABSENCE
33 : Linoleum beige gris moucheté + colle marron.	33-1 : Négatif	ABSENCE
34 : Colle grise + joint gris sous carrelage 50x50 beige marbré.	34-1 : Négatif	ABSENCE
35 : Colle grise + joint gris derrière plinthes en carrelage 7x50 beige marbré.	35-1 : Négatif	ABSENCE
36 : Colle blanche plâtreuse en plot derrière doublage en plaques de plâtre et polystyrène.	36-1 : Négatif	ABSENCE
37 : Enduit blanc crépi sur murs.	37-1 : Négatif	ABSENCE
38 : Enduit ciment mortier entre menuiserie aluminium et bâtis.	38-1 : Négatif	ABSENCE
39 : Colle grise + joint gris sous carrelage 30x30 noir, sur ragréage gris.	39-1 : Négatif	ABSENCE
42 : Conduit fibres-ciment gris, 30x30.	-	PRESENCE
48 : Conduit fibres-ciment rond, diamètre 15cm.	-	PRESENCE
74 : Enduit mortier gris épais sur murs maçonnés.	-	ABSENCE

BAT 2 / FAÇADES

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
1 : Etanchéité bitumineuse avec couche aluminisé en pied de façades.	1-1 : Négatif	ABSENCE
2 : Enduit mortier gris épais sur murs maçonnés.	2-1 : Négatif	ABSENCE
3 : Colle grise cimenteuse + joint épais gris sur parement en briquettes collées.	3-1 : Négatif	ABSENCE
4 : Joint noir souple de finition sur menuiseries alu simple vitrage.	4-1 : Négatif	ABSENCE
5 : Enduit beige plâtreux fin en sous face de plancher béton.	5-1 : Négatif	ABSENCE
6 : Joint mortier gris ciment épais sur maçonnerie en briques pleines.	-	ABSENCE
18 : Mastic blanc souple en finition entre parement briques et éléments métalliques.	18-1 : Négatif	ABSENCE

BAT 3 / R-1 À RDC / ESCALIER

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
81 : Enduit mortier gris épais sur murs maçonnés.	-	ABSENCE
92 : Colle en plot blanc ancien, fixation de plafond staff.	-	ABSENCE
93 : Panneau en staff, en résidus ou encore en place	-	ABSENCE
96 : Joint gris mortier sur plafond en briques.	-	ABSENCE
104 : Chape mortier ciment sur marche et contremarche.	104-1 : Négatif	ABSENCE
105 : Rebouchage blanc plâtreux en pourtour des fixations main courante.	105-1 : Négatif	ABSENCE
106 : Flocage gris cotonneux sur plafond et poutres béton.	106-1 : Négatif	ABSENCE

BAT 3 / RDC / FRANPRIX

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
78 : Colle grise + joint gris sous carrelage 15x15 beige.	78-1 : Négatif 78-2 : Négatif	ABSENCE
79 : Colle épaisse type mortier + joint gris sous carrelage mosaïque bleue.	79-2 : Négatif 79-1 : Négatif	ABSENCE
80 : Colle grise cimenteuse + joint gris derrière plinthe en carrelage bleu moucheté 10x10.	80-2 : Négatif 80-1 : Négatif	ABSENCE
81 : Enduit mortier gris épais sur murs maçonnés.	81-1 : Négatif 81-2 : Négatif	ABSENCE
82 : Colle bitumineuse noir en plot sur murs (résidus).	82-1 : Négatif	ABSENCE
83 : Colle blanche plâtreuse en plot derrière doublage en plaques de plâtre.	83-1 : Négatif	ABSENCE
84 : Colle beige + joint beige fin derrière faïence 10x10 blanche.	84-1 : Positif	PRESENCE
85 : Colle beige + joint beige fin derrière faïence 15x15 blanche.	85-1 : Positif	PRESENCE
86 : Colle beige + joint beige fin derrière faïence petit format orangée.	86-1 : Positif	PRESENCE
87 : Linoleum souple imitation parquet + colle marron.	87-1 : Négatif	ABSENCE
88 : Joint vitrier beige dure sur anciennes vitrines en acier (vitrages déposés).	88-1 : Négatif	ABSENCE
89 : Enduit blanc plâtreux fin de lissage sur murs.	89-1 : Négatif	ABSENCE
90 : Pare-vapeur bitumineux noir en sous face de lès de laine minérale en plénum.	90-1 : Négatif	ABSENCE
91 : Faux-plafond en dalle perforé fibreuse blanche, 60x60 de 2001.	-	ABSENCE
92 : Colle en plot blanc ancien, fixation de plafond staff.	92-1 : Négatif	ABSENCE
93 : Panneau en staff, en résidus ou encore en place	93-1 : Négatif	ABSENCE
94 : Mastic blanc en jonction gaines de ventilation en alu souple et gaines en acier rigide.	94-1 : Négatif	ABSENCE
95 : Joint de bride blanc en jonction réseaux eau et CTA.	95-1 : Positif	PRESENCE
96 : Joint gris mortier sur plafond en briques.	96-1 : Négatif	ABSENCE
97 : Enduit blanc plâtreux + bande beige en jonction de plaques de plâtre des puits de lumière.	97-1 : Négatif	ABSENCE
98 : Joint noir fibreux sur porte coupe-feu en bois.	98-1 : Négatif	ABSENCE
99 : Joint vitrier beige en pour tour de simple vitrage sur porte intérieure en bois.	99-1 : Négatif	ABSENCE
100 : Calorifuge noir mousse.	100-1 : Négatif	ABSENCE
101 : Joint noir rigide en jonction de la CTA et de la gaine de ventilation en acier.	101-1 : Positif	PRESENCE
102 : Joint noir de finition sur trappes de visites de la CTA.	102-1 : Négatif	ABSENCE
103 : Courroie noir souple sur CTA.	103-1 : Négatif	ABSENCE

BAT 3 / FAÇADES

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
2 : Enduit mortier gris épais sur murs maçonnés.	-	ABSENCE
3 : Colle grise cimenteuse + joint épais gris sur parement en briquettes collées.	-	ABSENCE

BAT 4 / FAÇADES

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
6 : Joint mortier gris ciment épais sur maçonnerie en briques pleines.	6-1 : Négatif	ABSENCE

PARVIS

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
2 : Enduit mortier gris épais sur murs maçonnés.	-	ABSENCE
8 : Enduit mortier gris épais sur murs en béton.	-	ABSENCE
11 : Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en partie courante.	11-1 : Négatif	ABSENCE
12 : Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en rustines.	12-1 : Négatif	ABSENCE
13 : Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en partie courante.	13-1 : Négatif	ABSENCE
14 : Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en rustines.	14-1 : Négatif	ABSENCE
15 : Enrobé bitumineux rouge, granulat moyen, épaisseur 3cm environ, en bandes.	15-1 : Négatif	ABSENCE
118 : Enduit ciment mortier de finition ponctuel sur murs béton (rampe).	118-1 : Négatif	ABSENCE
119 : Enduit ciment beige de finition ponctuel sur murs béton.	119-1 : Négatif	ABSENCE
120 : Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en partie courante.	120-1 : Négatif	ABSENCE
121 : Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en partie courante.	121-1 : Négatif	ABSENCE
122 : Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en rebouchage.	122-1 : Négatif	ABSENCE
123 : Coffrage perdu carré, 15x15cm.	123-1 : Positif	PRESENCE

D. Fiches d'identification et de cotation

Matériau / Produit N°1 : Etanchéité

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Etanchéité bitumineuse avec couche aluminisé en pied de façades.	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	

Localisation / ZPSO

BAT 2 :
FAÇADES

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
BIT1-1	**BAT 2 :** FAÇADES	23/06/2025	Etanchéité bitumineuse avec couche aluminisé en pied de façades.	ABSENCE

Matériau / Produit N°2 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Enduit mortier gris épais sur murs maçonnés.	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	

Localisation / ZPSO

BAT 1 :
FAÇADES
BAT 2 :
FAÇADES
BAT 3 :
FAÇADES
PARVIS :
PARVIS

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
END2-1	**BAT 2 :** FAÇADES	23/06/2025	Enduit mortier gris épais sur murs maçonnés.	ABSENCE
END2-2	**BAT 1 :** FAÇADES	25/06/2025	Enduit mortier gris épais sur murs maçonnés.	ABSENCE

Matériau / Produit N°3 : Colle + joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Colle grise cimenteuse + joint épais gris sur parement en briquettes collées.	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	

Localisation / ZPSO

BAT 2 :
FAÇADES
BAT 3 :
FAÇADES

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
COL3-1	**BAT 2 :** FAÇADES	23/06/2025	Colle grise cimenteuse + joint épais gris sur parement en briquettes collées.	ABSENCE

Matériau / Produit N°4 : Joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Joint noir souple de finition sur menuiseries alu simple vitrage.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 :
FAÇADES

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
JT4-1	**BAT 2 :** FAÇADES	23/06/2025	Joint noir souple de finition sur menuiseries alu simple vitrage.	ABSENCE

Matériau / Produit N°5 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit beige plâtreux fin en sous face de plancher béton.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 :
FAÇADES

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
END5-1	**BAT 2 :** FAÇADES	23/06/2025	Enduit beige plâtreux fin en sous face de plancher béton.	ABSENCE

Matériau / Produit N°6 : Joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Joint mortier gris ciment épais sur maçonnerie en briques pleines.	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	

Localisation / ZPSO

BAT 1 / R-1 :
TAXI PHONE
BAT 1 / RDC :
PASSAGE, TAXI PHONE
BAT 1 :
FAÇADES
BAT 2 / RDC :
BOULANGERIE - COIFFURE
BAT 2 :
FAÇADES
BAT 4 :
FAÇADES

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
JT6-1	**BAT 4 :** FAÇADES	23/06/2025	Joint mortier gris ciment épais sur maçonnerie en briques pleines.	ABSENCE
JT6-2	**BAT 1 :** FAÇADES	25/06/2025	Joint mortier gris ciment épais sur maçonnerie en briques pleines.	ABSENCE
JT6-3	**BAT 1 / R-1 :** TAXI PHONE	27/06/2025	Joint mortier gris ciment épais sur maçonnerie en briques pleines.	ABSENCE

Matériau / Produit N°7 : Colle + joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle grise dure + joint gris sous faïence 10x10 beige.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 1 :
FAÇADES

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
COL7-1	**BAT 1 :** FAÇADES	23/06/2025	Colle grise dure + joint gris sous faïence 10x10 beige.	ABSENCE

Matériau / Produit N°8 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit mortier gris épais sur murs en béton.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 1 :
FAÇADES
PARVIS :
PARVIS

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
END8-1	**BAT 1 :** FAÇADES	23/06/2025	Enduit mortier gris épais sur murs en béton.	ABSENCE

Matériau / Produit N°9 : Joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Joint vitrier blanc dure en pourtour de vitrages simples sur allèges et fenêtres.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 1 :
FAÇADES

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
JT9-1	**BAT 1 :** FAÇADES	23/06/2025	Joint vitrier blanc dure en pourtour de vitrages simples sur allèges et fenêtres.	ABSENCE

Matériau / Produit N°10 : Mastic

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Mastic blanc souple sur panneaux de bardages métalliques rapportés.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 1 :
FAÇADES

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
MAS10-1	**BAT 1 :** FAÇADES	23/06/2025	Mastic blanc souple sur panneaux de bardages métalliques rapportés.	ABSENCE

Matériau / Produit N°11 : Enrobé bitumineux

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en partie courante.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

PARVIS :
PARVIS

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
BIT11-1	PARVIS	23/06/2025	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en partie courante.	ABSENCE

Matériau / Produit N°12 : Enrobé bitumineux

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en rustines.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

PARVIS :
PARVIS

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
BIT12-1	PARVIS	23/06/2025	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en rustines.	ABSENCE

Matériau / Produit N°13 : Enrobé bitumineux

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en partie courante.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

PARVIS :
PARVIS

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
BIT13-1	PARVIS	23/06/2025	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en partie courante,	ABSENCE

Matériau / Produit N°14 : Enrobé bitumineux

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en rustines.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

PARVIS :
PARVIS

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
BIT14-1	PARVIS	23/06/2025	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en rustines.	ABSENCE

Matériau / Produit N°15 : Enrobé bitumineux

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Enrobé bitumineux rouge, granulat moyen, épaisseur 3cm environ, en bandes.	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	

Localisation / ZPSO

PARVIS :
PARVIS

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
BIT15-1	PARVIS	23/06/2025	Enrobé bitumineux rouge, granulat moyen, épaisseur 3cm environ, en bandes.	ABSENCE

Matériau / Produit N°16 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Enduit beige fin de finition sur murs maçonnés.	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	

Localisation / ZPSO

BAT 1 :
FAÇADES

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
END16-1	**BAT 1 :** FAÇADES	23/06/2025	Enduit beige fin de finition sur murs maçonnés.	ABSENCE

Matériau / Produit N°17 : Conduit fibres-ciment

Conclusion	Matériau pour lequel des sondages et/ou des analyses doivent être effectuées
Description	Conduit fibres-ciment rond, évacuation de fumée.
Critère de décision	Matériau nécessitant des moyens d'accès spécifiques.





Localisation / ZPSO

BAT 1 :
FAÇADES

Matériau / Produit N°18 : Mastic

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Mastic blanc souple en finition entre parement briques et éléments métalliques.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 :
FAÇADES

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
MAS18-1	**BAT 2 :** FAÇADES	23/06/2025	Mastic blanc souple en finition entre parement briques et éléments métalliques.	ABSENCE

Matériau / Produit N°19 : Colle + joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle blanche + joint gris sous carrelage marron imitation parquet.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / RDC :
BOULANGERIE - COIFFURE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
COL19-1	**BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE	24/06/2025	Colle blanche + joint gris sous carrelage marron imitation parquet.	ABSENCE

Matériau / Produit N°20 : Ragréage

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Ragréage rosé épais en finition sous tapis d'entrée.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / RDC :
BOULANGERIE - COIFFURE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
RAG20-1	**BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE	24/06/2025	Ragréage rosé épais en finition sous tapis d'entrée.	ABSENCE

Matériau / Produit N°21 : Colle + joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle beige + joint gris sous carrelage marron, sous COL19.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / RDC :
BOULANGERIE - COIFFURE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
COL21-1	**BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE	24/06/2025	Colle beige + joint gris sous carrelage marron, sous COL19.	ABSENCE

Matériau / Produit N°22 : Colle + joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle blanche + joint gris derrière plinthe marron imitation parquet.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / RDC :
BOULANGERIE - COIFFURE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
COL22-1	**BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE	24/06/2025	Colle blanche + joint gris derrière plinthe marron imitation parquet.	ABSENCE

Matériau / Produit N°23 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit blanc plâtreux + bande beige en jonction de plaques de plâtre en doublage.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / R-1 :
BOULANGERIE
BAT 2 / RDC :
BOULANGERIE - COIFFURE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
END23-1	**BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE	24/06/2025	Enduit blanc plâtreux + bande beige en jonction de plaques de plâtre en doublage.	ABSENCE
END23-2	**BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE	24/06/2025	Enduit blanc plâtreux + bande beige en jonction de plaques de plâtre en doublage.	ABSENCE

Matériau / Produit N°24 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit blanc plâtreux fin sur murs en béton.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / R-1 :
BOULANGERIE
BAT 2 / RDC :
BOULANGERIE - COIFFURE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
END24-1	**BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE	24/06/2025	Enduit blanc plâtreux fin sur murs en béton.	ABSENCE
END24-2	**BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE	24/06/2025	Enduit blanc plâtreux fin sur murs en béton.	ABSENCE

Matériau / Produit N°25 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit blanc plâtreux fin sur poteaux en béton.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / RDC :
BOULANGERIE - COIFFURE

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
END25-1	**BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE	24/06/2025	Enduit blanc plâtreux fin sur poteaux en béton.	ABSENCE

Matériau / Produit N°26 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit blanc plâtreux + bande beige en jonction de plaques de plâtre de plafond.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / RDC :
BOULANGERIE - COIFFURE

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
END26-1	**BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE	24/06/2025	Enduit blanc plâtreux + bande beige en jonction de plaques de plâtre de plafond.	ABSENCE

Matériau / Produit N°27 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit blanc plâtreux fin sur plafond en béton.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / R-1 :
BOULANGERIE
BAT 2 / RDC :
BOULANGERIE - COIFFURE

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
END27-1	**BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE	24/06/2025	Enduit blanc plâtreux fin sur plafond en béton.	ABSENCE
END27-2	**BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE	24/06/2025	Enduit blanc plâtreux fin sur plafond en béton.	ABSENCE

Matériau / Produit N°28 : Plaque bitumineuse

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Plaque bitumineuse noir sous évier.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / RDC :
BOULANGERIE - COIFFURE

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
PLB28-1	**BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE	24/06/2025	Plaque bitumineuse noir sous évier.	ABSENCE

Matériau / Produit N°29 : Colle + joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle grise dure + joint gris sous plinthes marron en carrelage.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / RDC :
BOULANGERIE - COIFFURE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
COL29-1	**BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE	24/06/2025	Colle grise dure + joint gris sous plinthes marron en carrelage.	ABSENCE

Matériau / Produit N°30 : Joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Joint vitrier beige dure + mastic blanc souple sur vitrines simple vitrage en acier.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / RDC :
BOULANGERIE - COIFFURE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
JT30-1	**BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE	24/06/2025	Joint vitrier beige dure + mastic blanc souple sur vitrines simple vitrage en acier.	ABSENCE

Matériau / Produit N°31 : Colle + joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle épaisse type mortier + joint gris sous carrelage mosaïque beige.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / R-1 :
BOULANGERIE
BAT 2 / RDC :
BOULANGERIE - COIFFURE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
COL31-1	**BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE	24/06/2025	Colle épaisse type mortier + joint gris sous carrelage mosaïque beige.	ABSENCE
COL31-2	**BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE	24/06/2025	Colle épaisse type mortier + joint gris sous carrelage mosaïque beige.	ABSENCE

Matériau / Produit N°32 : Linoleum

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Linoleum souple imitation parquet foncé, pose libre.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / RDC :
BOULANGERIE - COIFFURE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
LIN32-1	**BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE	24/06/2025	Linoleum souple imitation parquet foncé, pose libre.	ABSENCE

Matériau / Produit N°33 : Linoleum + colle

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Linoleum beige gris moucheté + colle marron.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / RDC :
BOULANGERIE - COIFFURE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
LC33-1	**BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE	24/06/2025	Linoleum beige gris moucheté + colle marron.	ABSENCE

Matériau / Produit N°34 : Colle + joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle grise + joint gris sous carrelage 50x50 beige marbré.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / RDC :
BOULANGERIE - COIFFURE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
COL34-1	**BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE	24/06/2025	Colle grise + joint gris sous carrelage 50x50 beige marbré.	ABSENCE

Matériau / Produit N°35 : Colle + joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle grise + joint gris derrière plinthes en carrelage 7x50 beige marbré.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / RDC :
BOULANGERIE - COIFFURE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
COL35-1	**BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE	24/06/2025	Colle grise + joint gris derrière plinthes en carrelage 7x50 beige marbré.	ABSENCE

Matériau / Produit N°36 : Colle

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle blanche plâtreuse en plot derrière doublage en plaques de plâtre et polystyrène.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / R-1 :
BOULANGERIE
BAT 2 / RDC :
BOULANGERIE - COIFFURE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
COL36-1	**BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE	24/06/2025	Colle blanche plâtreuse en plot derrière doublage en plaques de plâtre et polystyrène.	ABSENCE
COL36-2	**BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE	27/06/2025	Colle blanche plâtreuse en plot derrière doublage en plaques de plâtre et polystyrène.	ABSENCE

Matériau / Produit N°37 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit blanc crépi sur murs.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / R-1 :
BOULANGERIE
BAT 2 / RDC :
BOULANGERIE - COIFFURE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
END37-1	**BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE	24/06/2025	Enduit blanc crépi sur murs.	ABSENCE
END37-2	**BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE	24/06/2025	Enduit blanc crépi sur murs.	ABSENCE

Matériau / Produit N°38 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit ciment mortier entre menuiserie aluminium et bâtis.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / RDC :
BOULANGERIE - COIFFURE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
END38-1	**BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE	24/06/2025	Enduit ciment mortier entre menuiserie aluminium et bâtis.	ABSENCE

Matériau / Produit N°39 : Colle + joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle grise + joint gris sous carrelage 30x30 noir, sur ragréage gris.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / RDC :
BOULANGERIE - COIFFURE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
COL39-1	**BAT 2 / RDC :** BOULANGERIE - COIFFURE	24/06/2025	Colle grise + joint gris sous carrelage 30x30 noir, sur ragréage gris.	ABSENCE

Matériau / Produit N°40 : Colle + joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle blanche + joint gris sous carrelage 30x30 beige.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / R-1 :
BOULANGERIE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
COL40-1	**BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE	24/06/2025	Colle blanche + joint gris sous carrelage 30x30 beige.	ABSENCE

Matériau / Produit N°41 : Colle + joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle beige + joint gris derrière faïence 15x15 blanche.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / R-1 :
BOULANGERIE

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
COL41-1	**BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE	24/06/2025	Colle beige + joint gris derrière faïence 15x15 blanche.	ABSENCE

Matériau / Produit N°42 : Conduit fibres-ciment

Conclusion	Matériau contenant de l'amiante
Description	Conduit fibres-ciment gris, 30x30.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.





Localisation / ZPSO

R-1 :
CIRCULATION
BAT 2 / R-1 :
BOULANGERIE
BAT 2 / RDC :
BOULANGERIE - COIFFURE

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
CO42-1	**BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE	24/06/2025	Conduit fibres-ciment gris, 30x30.	PRESENCE

Matériau / Produit N°43 : Faux-plafond

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Faux-plafond en laine minérale + couche blanche, de 2008.
Critère de décision	Marquage du matériau et/ou document consulté : date de fabrication du matériau postérieure à la date d'interdiction de l'amiante dans le matériau concerné.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / R-1 :
BOULANGERIE

Matériau / Produit N°44 : Linoleum + colle

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Linoleum beige souple + colle translucide.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / R-1 :
BOULANGERIE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
LC44-1	**BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE	24/06/2025	Linoleum beige souple + colle translucide.	ABSENCE

Matériau / Produit N°45 : Enduit-Peinture

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit-Peinture rouge au sol, sur chape mortier.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / R-1 :
BOULANGERIE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
END45-1	**BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE	24/06/2025	Enduit-Peinture rouge au sol, sur chape mortier.	ABSENCE

Matériau / Produit N°46 : Colle + joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle beige + joint gris derrière faïence 15x15 blanche.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / R-1 :
BOULANGERIE

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
COL46-1	**BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE	24/06/2025	Colle beige + joint gris derrière faïence 15x15 blanche.	ABSENCE

Matériau / Produit N°47 : Colle + joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle beige + joint gris derrière faïence 50x25 grise.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / R-1 :
BOULANGERIE

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
COL47-1	**BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE	24/06/2025	Colle beige + joint gris derrière faïence 50x25 grise.	ABSENCE

Matériau / Produit N°48 : Conduit fibres-ciment

Conclusion	Matériau contenant de l'amiante	
Description	Conduit fibres-ciment rond, diamètre 15cm.	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	

Localisation / ZPSO

R-1 :
CIRCULATION
BAT 2 / R-1 :
BOULANGERIE
BAT 2 / RDC :
BOULANGERIE - COIFFURE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
CO48-1	**BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE	24/06/2025	Conduit fibres-ciment rond, diamètre 15cm.	PRESENCE

Matériau / Produit N°49 : Colle

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle blanche dure en plot derrière dalle de polystyrène collée au plafond.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / R-1 :
BOULANGERIE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
COL49-1	**BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE	24/06/2025	Colle blanche dure en plot derrière dalle de polystyrène collée au plafond.	ABSENCE

Matériau / Produit N°50 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit blanc plâtreux fin + ciment sur poutres béton.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / R-1 :
BOULANGERIE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
END50-1	**BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE	24/06/2025	Enduit blanc plâtreux fin + ciment sur poutres béton.	ABSENCE

Matériau / Produit N°51 : Nez de marche

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Nez de marche noir caoutchouc sur escalier.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / R-1 :
BOULANGERIE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
NM51-1	**BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE	24/06/2025	Nez de marche noir caoutchouc sur escalier.	ABSENCE

Matériau / Produit N°52 : Dalle de sol + colle + ragréage

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Dalle de sol fine rigide beige 30x30 + colle translucide + ragréage blanc fin.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / R-1 :
BOULANGERIE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
DCR52-1	**BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE	24/06/2025	Dalle de sol fine rigide beige 30x30 + colle translucide + ragréage blanc fin.	ABSENCE

Matériau / Produit N°53 : Chape

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Chape mortier épaisse au sol.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO


BAT 2 / R-1 :
BOULANGERIE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
CHAP53-1	**BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE	24/06/2025	Chape mortier épaisse au sol.	ABSENCE

Matériau / Produit N°54 : Colle + joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle beige + joint beige fin derrière faïence 15x15 blanche.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

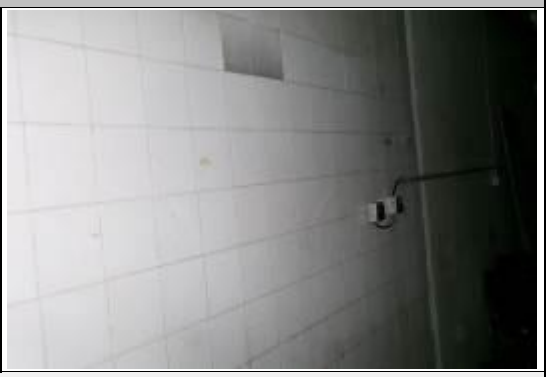

Localisation / ZPSO

BAT 2 / R-1 :
BOULANGERIE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
COL54-1	**BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE	24/06/2025	Colle beige + joint beige fin derrière faïence 15x15 blanche.	ABSENCE

Matériau / Produit N°55 : Colle + joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle blanche + joint gris sous carrelage beige, dans escalier.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / R-1 :
BOULANGERIE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
COL55-1	**BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE	24/06/2025	Colle blanche + joint gris sous carrelage beige, dans escalier.	ABSENCE

Matériau / Produit N°56 : Colle + joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle grise + joint gris sous carrelage 20x20 beige.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / R-1 :
BOULANGERIE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
COL56-1	**BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE	27/06/2025	Colle grise + joint gris sous carrelage 20x20 beige.	ABSENCE

Matériau / Produit N°57 : Colle + joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle grise + joint gris sous carrelage 20x20 blanc.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / R-1 :
BOULANGERIE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
COL57-1	**BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE	24/06/2025	Colle grise + joint gris sous carrelage 20x20 blanc.	ABSENCE

Matériau / Produit N°58 : Colle + joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle beige + joint beige sous plinthe en carrelage bleu/gris.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / R-1 :
BOULANGERIE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
COL58-1	**BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE	24/06/2025	Colle beige + joint beige sous plinthe en carrelage bleu/gris.	ABSENCE

Matériau / Produit N°59 : Colle + joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle beige + joint gris derrière faïence 10x20 blanche cassée.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / R-1 :
BOULANGERIE

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
COL59-1	**BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE	24/06/2025	Colle beige + joint gris derrière faïence 10x20 blanche cassée.	ABSENCE

Matériau / Produit N°60 : Joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Joint noir dure sur vannes.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 2 / R-1 :
BOULANGERIE

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
JT60-1	**BAT 2 / R-1 :** BOULANGERIE	24/06/2025	Joint noir dure sur vannes.	ABSENCE

Matériau / Produit N°61 : Dalle de sol + colle

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Dalle de sol imitation parquet + colle translucide.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 1 / RDC :
TAXI PHONE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
DC61-1	**BAT 1 / RDC :** TAXI PHONE	25/06/2025	Dalle de sol imitation parquet + colle translucide.	ABSENCE

Matériau / Produit N°62 : Linoleum + colle

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Linoleum souple imitation parquet + colle translucide.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 1 / RDC :
TAXI PHONE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
LC62-1	**BAT 1 / RDC :** TAXI PHONE	25/06/2025	Linoleum souple imitation parquet + colle translucide.	ABSENCE

Matériau / Produit N°63 : Colle + joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle épaisse type mortier + joint gris sous carrelage mosaïque beige.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 1 / RDC :
TAXI PHONE

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
COL63-1	**BAT 1 / RDC :** TAXI PHONE	25/06/2025	Colle épaisse type mortier + joint gris sous carrelage mosaïque beige.	ABSENCE

Matériau / Produit N°64 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit blanc plâtreux + bande beige en jonction de plaques de plâtre de doublage.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 1 / RDC :
TAXI PHONE

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
END64-1	**BAT 1 / RDC :** TAXI PHONE	25/06/2025	Enduit blanc plâtreux + bande beige en jonction de plaques de plâtre de doublage.	ABSENCE

Matériau / Produit N°65 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit blanc crépi sur murs.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 1 / RDC :
TAXI PHONE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
END65-1	**BAT 1 / RDC :** TAXI PHONE	25/06/2025	Enduit blanc crépi sur murs.	ABSENCE

Matériau / Produit N°66 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit plâtreux fin + enduit mortier sur murs.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 1 / RDC :
TAXI PHONE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
END66-1	**BAT 1 / RDC :** TAXI PHONE	25/06/2025	Enduit plâtreux fin + enduit mortier sur murs.	null

Matériau / Produit N°67 : Colle

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle blanche dure en plot derrière dalle de polystyrène collée au plafond.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 1 / RDC :
TAXI PHONE

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
COL67-1	**BAT 1 / RDC :** TAXI PHONE	25/06/2025	Colle blanche dure en plot derrière dalle de polystyrène collée au plafond.	ABSENCE

Matériau / Produit N°68 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit blanc plâtreux fin sur plafond en béton.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 1 / R-1 :
TAXI PHONE
BAT 1 / RDC :
PASSAGE, TAXI PHONE

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
END68-1	**BAT 1 / RDC :** TAXI PHONE	25/06/2025	Enduit blanc plâtreux fin sur plafond en béton.	ABSENCE

Matériau / Produit N°69 : Colle + joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle blanche + joint blanc derrière faïence 20x20 blanche.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 1 / RDC :
TAXI PHONE

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
COL69-1	**BAT 1 / RDC :** TAXI PHONE	25/06/2025	Colle blanche + joint blanc derrière faïence 20x20 blanche.	ABSENCE

Matériau / Produit N°70 : Joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Joint vitrier marron dure souple sur vitrines simple vitrage en acier.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 1 / RDC :
PASSAGE, TAXI PHONE
BAT 1 :
FAÇADES

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
JT70-1	**BAT 1 / RDC :** TAXI PHONE	25/06/2025	Joint vitrier marron dure souple sur vitrines simple vitrage en acier.	ABSENCE

Matériau / Produit N°71 : Enduit-Peinture

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Enduit-Peinture gris sur chape mortier épaisse.	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	

Localisation / ZPSO

BAT 1 / R-1 :
TAXI PHONE

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
END71-1	**BAT 1 / R-1 :** TAXI PHONE	25/06/2025	Enduit-Peinture gris sur chape mortier épaisse.	ABSENCE

Matériau / Produit N°72 : Colle + joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Colle beige fine + joint beige derrière faïence 15x15 blanche.	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	

Localisation / ZPSO

BAT 1 / R-1 :
TAXI PHONE

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
COL72-1	**BAT 1 / R-1 :** TAXI PHONE	25/06/2025	Colle beige fine + joint beige derrière faïence 15x15 blanche.	ABSENCE

Matériau / Produit N°73 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit plâtreux fin sur cloisons en carreaux de plâtre.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 1 / R-1 :
TAXI PHONE

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
END73-1	**BAT 1 / R-1 :** TAXI PHONE	25/06/2025	Enduit plâtreux fin sur cloisons en carreaux de plâtre.	ABSENCE

Matériau / Produit N°74 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit mortier gris épais sur murs maçonnés.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 1 / R-1 :
TAXI PHONE
BAT 2 / R-1 :
BOULANGERIE
BAT 2 / RDC :
BOULANGERIE - COIFFURE

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
END74-1	**BAT 1 / R-1 :** TAXI PHONE	25/06/2025	Enduit mortier gris épais sur murs maçonnés.	ABSENCE

Matériau / Produit N°75 : Enrobé bitumineux

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 3cm environ, en partie courante.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 1 / RDC :
PASSAGE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
BIT75-1	**BAT 1 / RDC :** PASSAGE	25/06/2025	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en partie courante.	ABSENCE

Matériau / Produit N°76 : Colle + joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle épaisse type mortier + joint gris sous carrelage beige 10x10.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 1 / RDC :
PASSAGE
BAT 1 :
FAÇADES

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
COL76-1	**BAT 1 / RDC :** PASSAGE	25/06/2025	Colle épaisse type mortier + joint gris sous carrelage beige 10x10.	ABSENCE

Matériau / Produit N°77 : Colle

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle marron clair sous moquette.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 1 / RDC :
PASSAGE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
COL77-1	**BAT 1 / RDC :** PASSAGE	25/06/2025	Colle marron clair sous moquette.	ABSENCE

Matériau / Produit N°78 : Colle + joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle grise + joint gris sous carrelage 15x15 beige.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 3 / RDC :
FRANPRIX

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
COL78-1	**BAT 3 / RDC :** FRANPRIX	26/06/2025	Colle grise + joint gris sous carrelage 15x15 beige.	ABSENCE
COL78-2	**BAT 3 / RDC :** FRANPRIX	26/06/2025	Colle grise + joint gris sous carrelage 15x15 beige.	ABSENCE

Matériau / Produit N°79 : Colle + joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle épaisse type mortier + joint gris sous carrelage mosaïque bleue.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 3 / RDC :
FRANPRIX

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
COL79-1	**BAT 3 / RDC :** FRANPRIX	26/06/2025	Colle épaisse type mortier + joint gris sous carrelage mosaïque bleue.	ABSENCE
COL79-2	**BAT 3 / RDC :** FRANPRIX	26/06/2025	Colle épaisse type mortier + joint gris sous carrelage mosaïque bleue.	ABSENCE

Matériau / Produit N°80 : Colle + joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle grise cimenteuse + joint gris derrière plinthe en carrelage bleu moucheté 10x10.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 3 / RDC :
FRANPRIX

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
COL80-1	**BAT 3 / RDC :** FRANPRIX	26/06/2025	Colle grise cimenteuse + joint gris derrière plinthe en carrelage bleu moucheté 10x10.	ABSENCE
COL80-2	**BAT 3 / RDC :** FRANPRIX	26/06/2025	Colle grise cimenteuse + joint gris derrière plinthe en carrelage bleu moucheté 10x10.	ABSENCE

Matériau / Produit N°81 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit mortier gris épais sur murs maçonnés.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 3 / R-1 À RDC :
ESCALIER
BAT 3 / RDC :
FRANPRIX

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
END81-1	**BAT 3 / RDC :** FRANPRIX	26/06/2025	Enduit mortier gris épais sur murs maçonnés.	ABSENCE
END81-2	**BAT 3 / RDC :** FRANPRIX	26/06/2025	Enduit mortier gris épais sur murs maçonnés.	ABSENCE

Matériau / Produit N°82 : Colle

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle bitumineuse noir en plot sur murs (résidus).
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 3 / RDC :
FRANPRIX

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
COL82-1	**BAT 3 / RDC :** FRANPRIX	26/06/2025	Colle bitumineuse noir en plot sur murs (résidus).	ABSENCE

Matériau / Produit N°83 : Colle

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle blanche plâtreuse en plot derrière doublage en plaques de plâtre.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 3 / RDC :
FRANPRIX

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
COL83-1	**BAT 3 / RDC :** FRANPRIX	26/06/2025	Colle blanche plâtreuse en plot derrière doublage en plaques de plâtre.	ABSENCE

Matériau / Produit N°84 : Colle

Conclusion	Matériau contenant de l'amiante
Description	Colle beige + joint beige fin derrière faïence 10x10 blanche.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 3 / RDC :
FRANPRIX

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
COL84-1	**BAT 3 / RDC :** FRANPRIX	26/06/2025	Colle beige + joint beige fin derrière faïence 10x10 blanche.	PRESENCE

Matériau / Produit N°85 : Colle + joint

Conclusion	Matériau contenant de l'amiante
Description	Colle beige + joint beige fin derrière faïence 15x15 blanche.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 3 / RDC :
FRANPRIX

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
COL85-1	**BAT 3 / RDC :** FRANPRIX	26/06/2025	Colle beige + joint beige fin derrière faïence 15x15 blanche.	PRESENCE

Matériau / Produit N°86 : Colle + joint

Conclusion	Matériau contenant de l'amiante
Description	Colle beige + joint beige fin derrière faïence petit format orangée.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 3 / RDC :
FRANPRIX

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
COL86-1	**BAT 3 / RDC :** FRANPRIX	26/06/2025	Colle beige + joint beige fin derrière faïence petit format orangée.	PRESENCE

Matériau / Produit N°87 : Linoleum + colle

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Linoleum souple imitation parquet + colle marron.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 3 / RDC :
FRANPRIX

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
LC87-1	**BAT 3 / RDC :** FRANPRIX	26/06/2025	Linoleum souple imitation parquet + colle marron.	ABSENCE

Matériau / Produit N°88 : Joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Joint vitrier beige dure sur anciennes vitrines en acier (vitrages déposés).
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 3 / RDC :
FRANPRIX

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
JT88-1	**BAT 3 / RDC :** FRANPRIX	26/06/2025	Joint vitrier beige dure sur anciennes vitrines en acier (vitrages déposés).	ABSENCE

Matériau / Produit N°89 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit blanc plâtreux fin de lissage sur murs.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 3 / RDC :
FRANPRIX

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
END89-1	**BAT 3 / RDC :** FRANPRIX	26/06/2025	Enduit blanc plâtreux fin de lissage sur murs.	ABSENCE

Matériau / Produit N°90 : Pare-vapeur

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Pare-vapeur bitumineux noir en sous face de lès de laine minérale en plénum.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 3 / RDC :
FRANPRIX

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
PV90-1	**BAT 3 / RDC :** FRANPRIX	26/06/2025	Pare-vapeur bitumineux noir en sous face de lès de laine minérale en plénum.	ABSENCE

Matériau / Produit N°91 : Faux-plafond

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Faux-plafond en dalle perforé fibreuse blanche, 60x60 de 2001.
Critère de décision	Marquage du matériau et/ou document consulté : date de fabrication du matériau postérieure à la date d'interdiction de l'amiante dans le matériau concerné.



Localisation / ZPSO

BAT 3 / RDC :
FRANPRIX

Matériau / Produit N°92 : Colle

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle en plot blanc ancien, fixation de plafond staff.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 3 / R-1 À RDC :
ESCALIER
BAT 3 / RDC :
FRANPRIX

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
COL92-1	**BAT 3 / RDC :** FRANPRIX	26/06/2025	Colle en plot blanc ancien, fixation de plafond staff.	ABSENCE

Matériau / Produit N°93 : Panneau

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Panneau en staff, en résidus ou encore en place
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 3 / R-1 À RDC :
ESCALIER
BAT 3 / RDC :
FRANPRIX

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
PA93-1	**BAT 3 / RDC :** FRANPRIX	26/06/2025	Panneau en staff, en résidus ou encore en place	ABSENCE

Matériau / Produit N°94 : Mastic

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Mastic blanc en jonction gaines de ventilation en alu souple et gaines en acier rigide.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 3 / RDC :
FRANPRIX

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
MAS94-1	**BAT 3 / RDC :** FRANPRIX	26/06/2025	Mastic blanc en jonction gaines de ventilation en alu souple et gaines en acier rigide.	ABSENCE

Matériau / Produit N°95 : Joint

Conclusion	Matériau contenant de l'amiante
Description	Joint de bride blanc en jonction réseaux eau et CTA.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 3 / RDC :
FRANPRIX

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
JT95-1	**BAT 3 / RDC :** FRANPRIX	26/06/2025	Joint de bride blanc en jonction réseaux eau et CTA.	PRESENCE

Matériau / Produit N°96 : Joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Joint gris mortier sur plafond en briques.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 3 / R-1 À RDC :
ESCALIER
BAT 3 / RDC :
FRANPRIX

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
JT96-1	**BAT 3 / RDC :** FRANPRIX	26/06/2025	Joint gris mortier sur plafond en briques.	ABSENCE

Matériau / Produit N°97 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit blanc plâtreux + bande beige en jonction de plaques de plâtre des puits de lumière.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 3 / RDC :
FRANPRIX

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
END97-1	**BAT 3 / RDC :** FRANPRIX	26/06/2025	Enduit blanc plâtreux + bande beige en jonction de plaques de plâtre des puits de lumière.	ABSENCE

Matériau / Produit N°98 : Joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Joint noir fibreux sur porte coupe-feu en bois.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 3 / RDC :
FRANPRIX

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
JT98-1	**BAT 3 / RDC :** FRANPRIX	26/06/2025	Joint noir fibreux sur porte coupe-feu en bois.	ABSENCE

Matériau / Produit N°99 : Joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Joint vitrier beige en pour tour de simple vitrage sur porte intérieure en bois.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 3 / RDC :
FRANPRIX

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
JT99-1	**BAT 3 / RDC :** FRANPRIX	26/06/2025	Joint vitrier beige en pour tour de simple vitrage sur porte intérieure en bois.	ABSENCE

Matériau / Produit N°100 : Calorifuge

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Calorifuge noir mousse.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 3 / RDC :
FRANPRIX

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
CA100-1	**BAT 3 / RDC :** FRANPRIX	26/06/2025	Calorifuge noir mousse.	ABSENCE

Matériau / Produit N°101 : Joint

Conclusion	Matériau contenant de l'amiante
Description	Joint noir rigide en jonction de la CTA et de la gaine de ventilation en acier.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 3 / RDC :
FRANPRIX

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
JT101-1	**BAT 3 / RDC :** FRANPRIX	26/06/2025	Joint noir rigide en jonction de la CTA et de la gaine de ventilation en acier.	PRESENCE

Matériau / Produit N°102 : Joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Joint noir de finition sur trappes de visites de la CTA.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 3 / RDC :
FRANPRIX

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
JT102-1	**BAT 3 / RDC :** FRANPRIX	26/06/2025	Joint noir de finition sur trappes de visites de la CTA.	ABSENCE

Matériau / Produit N°103 : Courroie

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Courroie noir souple sur CTA.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 3 / RDC :
FRANPRIX

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
MAT103-1	**BAT 3 / RDC :** FRANPRIX	26/06/2025	Courroie noir souple sur CTA.	ABSENCE

Matériau / Produit N°104 : Chape

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Chape mortier ciment sur marche et contremarche.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 3 / R-1 À RDC :
ESCALIER

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
CHAP104-1	**BAT 3 / R-1 À RDC :** ESCALIER	26/06/2025	Chape mortier ciment sur marche et contremarche.	ABSENCE

Matériau / Produit N°105 : Rebouchage

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Rebouchage blanc plâtreux en pourtour des fixations main courante.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 3 / R-1 À RDC :
ESCALIER

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
REB105-1	**BAT 3 / R-1 À RDC :** ESCALIER	26/06/2025	Rebouchage blanc plâtreux en pourtour des fixations main courante.	ABSENCE

Matériau / Produit N°106 : Flocage

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Flocage gris cotonneux sur plafond et poutres béton.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

BAT 3 / R-1 À RDC :
ESCALIER

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
FL106-1	**BAT 3 / R-1 À RDC :** ESCALIER	26/06/2025	Flocage gris cotonneux sur plafond et poutres béton.	ABSENCE

Matériau / Produit N°107 : Chape

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Chape dure grise cimenteuse au sol.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

R-1 :
CIRCULATION

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
CHAP107-1	**R-1 :** CIRCULATION	27/06/2025	Chape dure grise cimenteuse au sol.	ABSENCE
CHAP107-2	**R-1 :** CIRCULATION	27/06/2025	Chape dure grise cimenteuse au sol.	ABSENCE

Matériau / Produit N°108 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit ciment mortier de finition ponctuel sur murs béton.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

R-1 :
CIRCULATION

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
END108-1	**R-1 :** CIRCULATION	27/06/2025	Enduit ciment mortier de finition ponctuel sur murs béton.	ABSENCE
END108-2	**R-1 :** CIRCULATION	27/06/2025	Enduit ciment mortier de finition ponctuel sur murs béton.	ABSENCE

Matériau / Produit N°109 : Joint

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Joint gris ciment sur murs parpaing.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

R-1 :
CIRCULATION

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
JT109-1	**R-1 :** CIRCULATION	27/06/2025	Joint gris ciment sur murs parpaing.	ABSENCE

Matériau / Produit N°110 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit ciment gris de finition ponctuel (rebouchages) sur plafond béton.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

R-1 :
CIRCULATION

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
END110-1	**R-1 :** CIRCULATION	27/06/2025	Enduit ciment gris de finition ponctuel (rebouchages) sur plafond béton.	ABSENCE
END110-2	**R-1 :** CIRCULATION	27/06/2025	Enduit ciment gris de finition ponctuel (rebouchages) sur plafond béton.	ABSENCE

Matériau / Produit N°111 : Enveloppe de calorifuge

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enveloppe de calorifuge plâtreuse avec trame textile + laine minérale.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

R-1 :
CIRCULATION

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
ECA111-1	**R-1 :** CIRCULATION	27/06/2025	Enveloppe de calorifuge plâtreuse avec trame textile + laine minérale.	ABSENCE

Matériau / Produit N°112 : Enveloppe de calorifuge

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enveloppe de calorifuge bitumineuse avec trame textile + laine minérale.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

R-1 :
CIRCULATION

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
ECA112-1	**R-1 :** CIRCULATION	27/06/2025	Enveloppe de calorifuge bitumineuse avec trame textile + laine minérale.	ABSENCE

Matériau / Produit N°113 : Enveloppe de calorifuge

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enveloppe de calorifuge cartonnée beige + laine minérale en fourreau.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

R-1 :
CIRCULATION

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
ECA113-1	**R-1 :** CIRCULATION	27/06/2025	Enveloppe de calorifuge cartonnée beige + laine minérale en fourreau.	ABSENCE

Matériau / Produit N°114 : Coffrage perdu

Conclusion	Matériau contenant de l'amiante
Description	Coffrage perdu rond diamètre 30cm.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

R-1 :
CIRCULATION

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
COF114-1	**R-1 :** CIRCULATION	27/06/2025	Coffrage perdu rond diamètre 30cm.	PRESENCE

Matériau / Produit N°115 : Plaques fibres-ciment

Conclusion	Matériau contenant de l'amiante
Description	Plaques fibres-ciment type tôles ondulées en dépôt.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

R-1 :
CIRCULATION

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
PFC115-1	**R-1 :** CIRCULATION	27/06/2025	Plaques fibres-ciment type tôles ondulées en dépôt.	PRESENCE

Matériau / Produit N°116 : Plaques fibres-ciment

Conclusion	Matériau contenant de l'amiante
Description	Plaques fibres-ciment type panneaux planes en dépôt.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.





Localisation / ZPSO

R-1 :
CIRCULATION

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
PFC116-1	**R-1 :** CIRCULATION	27/06/2025	Plaques fibres-ciment type panneaux planes en dépôt.	PRESENCE

Matériau / Produit N°117 : Rebouchage

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Rebouchage blanc plâtreux ponctuel sur murs.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

R-1 :
CIRCULATION

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
REB117-1	**R-1 :** CIRCULATION	27/06/2025	Rebouchage blanc plâtreux ponctuel sur murs.	ABSENCE

Matériau / Produit N°118 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit ciment mortier de finition ponctuel sur murs béton (rampe).
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

PARVIS :
PARVIS

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
END118-1	PARVIS	27/06/2025	Enduit ciment mortier de finition ponctuel sur murs béton (rampe).	ABSENCE

Matériau / Produit N°119 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit ciment beige de finition ponctuel sur murs béton.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

PARVIS :
PARVIS

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
END119-1	PARVIS	27/06/2025	Enduit ciment beige de finition ponctuel sur murs béton.	ABSENCE

Matériau / Produit N°120 : Enrobé bitumineux

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en partie courante.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

PARVIS :
PARVIS

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
BIT120-1	PARVIS	27/06/2025	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en partie courante.	ABSENCE

Matériau / Produit N°121 : Enrobé bitumineux

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en partie courante.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

PARVIS :
PARVIS

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
BIT121-1	PARVIS	27/06/2025	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en partie courante.	ABSENCE

Matériau / Produit N°122 : Enrobé bitumineux

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en rebouchage.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

PARVIS :
PARVIS

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
BIT122-1	PARVIS	27/06/2025	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en rebouchage.	ABSENCE

Matériau / Produit N°123 : Coffrage perdu

Conclusion	Matériau contenant de l'amiante
Description	Coffrage perdu carré, 15x15cm.
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.



Localisation / ZPSO

PARVIS :
PARVIS

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
COF123-1	PARVIS	27/06/2025	Coffrage perdu carré, 15x15cm.	PRESENCE

E.Conditions générales de réalisation du repérage

1. Objet de la mission

- Notre mission consiste à identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble, ou la partie d'immeuble à démolir.

- Notre mission est réalisée selon la norme NF X 46-020 d'août 2017, l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C et l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

- Ce repérage porte sur les produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante concernés par la démolition et mentionnés dans la liste C de l'annexe 13-9 définie dans le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 ou dans l'annexe A de la norme NF X 46-020 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019. Si l'opérateur de repérage a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

- Ce repérage peut nécessiter des investigations approfondies à caractère destructif afin d'accéder à des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Liste C de l'annexe 13-9 définie dans le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
1-Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées. Ardoises. Eléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.	Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faîtages, closoirs...
2-Façades	
Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres.	Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Eléments en fibres-ciment.
3-Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
4 — Plafonds et faux-plafonds	
Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieures). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
5 — Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6 — Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
7 — Ascenseurs et monte-charges	
Portes palières. Trémie, machinerie.	Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
8 — Équipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
9 — Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
10 — Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Eléments en fibres-ciment.

Liste des matériaux de l'annexe A de la norme NF X 46-020 et de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
1-Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités	
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
	Plaques en matériaux bitumineux
	Revêtements anticondensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibrociment
	Ardoises en fibres-ciment
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation
	Conduits d'eaux pluviales
	Garnissage des joints de dilatation
	Joints de dilatation
	Couvre-joints
	Tresses d'étanchéité à l'air
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mitres, costières, etc.)
	Jonctions bitumineuses
	Solins en fibre ciment
	Colle des solins en fibre ciment
Eléments sous toiture	Pare-vapeur, pare-pluie
	Isolants fibreux en sous toiture
	Flocages, enduits projetés
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés…), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés…)
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
	Colles, produits d'accrochage
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature
	Mastics (vitriers, bitumineux…)
2- Parois verticales extérieures et façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Ardoises composites hors fibro-ciment
	Ardoises en fibro-ciment
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses
	Peintures des bardages métalliques
	Revêtements intérieurs anticondensation (hors peintures)
	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante
	Flocages, enduits projetés

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
2- Parois verticales extérieures et façades *(suite)*	
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants
	Couvre-joints
	Garnissage des joints de dilatation
	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire
	Joints de dilatation
	Peintures sur béton
	Revêtements plastiques épais (RPE)
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
	Peintures décoratives
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)
	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
3-Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Enduits de ragréage, débullage, lissage
	Flocages
	Fourreaux (carton, fibres-ciment…)
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu
Poteaux	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés
	Flocages
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich…), coffrages perdus
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre
	Flocages
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac
	Plots de colle fixant les cloisons au mur
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
	Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Flocages
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
	Panneaux (fibres-ciment, …)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Isolants intérieurs des portes
	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment
	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
4 — Plafonds et faux-plafonds	
Plafonds	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre,
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Flocages
	Bandes calicot
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes…)
	Peintures intumescentes
	Résines
	Panneaux collés vissés ou cloués
	Revêtements bitumineux
	Sous couches des tissus muraux
Poutres et charpentes	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Flocages
	Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes…)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
Gaines et coffres horizontaux	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Flocages
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
	Bandes calicot
	Panneaux (fibres-ciment, …)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Peintures intumescentes
	Protections en plâtre
Faux plafonds	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Panneaux et plaques
	Pare vapeur
5 — Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	Colle bitumineuse
	Dalles de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Colles non bitumineuses
	Dalles moquettes avec entre couche noire
	Enduit de cuvelage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Moquette
	Peintures de sol
	Revêtements de sols sportifs
	Nez de marche
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
6 — Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas…)
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Mastics
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Matelas
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
	Rubans adhésifs
Clapet / volet coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu
	Volets coupe-feu y compris ossature
Vide-ordures	Conduit et vidoir en fibres ciment
	Joint d'étanchéité des trappes
7 — Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Colles
	Isolants
	Joints
	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques…)
Matériels en machinerie	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits…
	Freins d'ascenseurs
	Joints plats
	Tresses
8 — Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, poêles à bois, à fuel, à charbon, groupes électrogènes	Bourres
	Calorifugeages
	Dispositifs anticondensation (peintures, films, etc.)
	Flocages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Tresses
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
9 — Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
10 — Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres ciment
Voiries	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces Sportifs	Revêtements de sols
Aménagements Extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures…)

2. Limite de mission et de responsabilité

- La mission est limitée aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles une mission a été confiée à l'opérateur de repérage. L'opérateur a examiné uniquement les locaux et les volumes auxquels il a pu accéder dans les conditions normales de sécurité et uniquement les zones concernées par les travaux.
- Le cas échéant, en cas de date de dépôt du permis de construire non communiquée, il a été considéré, notamment au vu même du bien, que celle-ci est bien antérieure au 01/07/1997, et que le bien lui-même a été livré avant le 1er janvier 1997.
- Le cas échéant, les inspections sur les équipements type moteur, machinerie d'ascenseur, chaudière, CTA, fours...etc, se limitent aux matériaux et produits accessibles et n'incluent pas de démontage sauf sur demande particulière du donneur d'ordre.
- Le présent rapport ne fait pas état des matériaux et produits réputés non susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le périmètre de repérage. C'est le cas notamment des parties de composants constituées des matières suivantes et non traitées ou recouvertes : PVC, fonte, verre, aluminium, métal brut, bois, des pièces de quincaillerie brute, des équipements sanitaires en porcelaine ou céramique.
- Dans certains cas, les matériaux ou produits prélevés ne sont pas visibles dans leur totalité et sont supposés être associés à un autre matériau entièrement visible (exemple : une colle que l'on a pu observer en faisant un sondage ponctuel sur des dalles de sol). **Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'absence partielle de ce matériau non visible dans sa totalité.**
- Dans certains cas, des matériaux ou produits ponctuels peuvent exister sous d'autres matériaux ou produits qui ne permettent pas une visibilité totale même au moyen d'investigations à caractère destructif, sauf à les retirer totalement ce qui est bien souvent impossible sur le plan opérationnel. **Notre responsabilité ne saurait être engagée dans ces cas.** Exemples :
  - Faible surface de colle bitumineuse sous une grande surface de dalles de sol semblables.
  - Mastic ponctuel sur une gaine de ventilation floquée.
  - Enduit anticondensation d'un calorifuge absent au niveau du sondage mais présent 1m à côté.
  - Enduit ciment de débullage ou ragréage mis en œuvre de manière hétérogène et recouvert par un revêtement enduit plâtre et/ou peinture
  - Conduits enterrés : conduits susceptibles de contenir de l'amiante, dont il est impossible d'évaluer la présence sans réalisation de travaux lourds de terrassement.
- La présente mission ne comprend pas la recherche de pollution éventuelle de matériaux ou produits situés à proximité de matériaux ou produits amiantés.
- Ce repérage peut nécessiter des investigations dites « complémentaires » : investigations à caractère exceptionnel, ne pouvant être réalisées que juste avant ou entre les différentes étapes des travaux. La nécessité de réaliser ce type d'investigation est mentionnée dans le document, et n'entraine pas la rédaction d'un « pré-rapport ».
- En cas de présence d'amiante, il est procédé à l'estimation de la quantité du ou des matériau(x) ou produit(s) concernés. Pour chacun des matériaux ou produits concernés, cette quantité est estimée à titre indicatif. Cette quantification n'a pas vocation à se substituer à la quantification nécessaire à la conception et au chiffrage des travaux, de la responsabilité de l'entreprise de travaux ou du Maître d'œuvre de l'opération. Ainsi, la responsabilité de QUALITAT EXPERTISES ne saurait être engagée si les quantités estimées indiquées dans ce rapport ne correspondaient pas aux quantités réelles présentes sur l'ouvrage.
- Seule l'intégralité du rapport original peut engager la responsabilité de la Société QUALITAT EXPERTISES (annexes comprises).

3. Références réglementaires

- Article L4412-2 du Code du Travail
- Articles R4412-96, R4412-97, R4412-97-1 à 6 du Code du Travail
- Norme NF X 46-020 d'août 2017 (contenu, méthodologie et modalités de réalisation des missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis)
- Code de la Santé Publique en vigueur à la date de la visite (notamment articles R. 1334-19 et R. 1334-22)
- Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C
- Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

4. Présentation des résultats

Zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) / Elément Témoin
Une ZPSO est une partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages et les parties d'ouvrage sont semblables.
Un élément témoin est une partie limitée représentative d'un ouvrage de référence, utilisée en vue de caractériser une ZPSO.
Des sondages sont réalisés, et leurs résultats sont comparés entre eux et à l'élément témoin représentatif de l'ouvrage de référence en vue de confirmer les similitudes d'ouvrage.
Note : les éléments témoins sont des éléments de méthodologie du repérage sur site, ils ne sont pas identifiés dans le rapport.

Matériau / Produit :
Dans les résultats présentés, un matériau ou produit est un élément de la construction – ou partie d'ouvrage – de même nature et présentant des caractéristiques intrinsèques identiques, dont la composition a pu intégrer de l'amiante pendant certaines périodes de sa fabrication.
Chaque matériau ou produit fait l'objet d'une fiche d'identification et de cotation.
Un matériau ou produit peut comporter plusieurs couches.
Dans ce rapport tous les matériaux ou produits sont indiqués par des numéros différents qui ne se suivent pas forcément.

Echantillon / Prélèvement / Sondage :
Un échantillon est une partie représentative d'un (ou plusieurs) matériau(x) ou produit(s), résultant d'un prélèvement et destinée à l'analyse en laboratoire
Le prélèvement est l'action consistant à prélever cette partie représentative.
Un même matériau ou produit peut faire l'objet de 1 ou plusieurs prélèvements. Un prélèvement permet de dissocier les différentes couches pour les examiner et pouvoir les analyser séparément.

Le sondage est l'action qui permet de s'assurer que des matériaux ou produits sont semblables dans le but, notamment, de déterminer des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans ce rapport :
- Tous les prélèvements sont indiqués et localisés. Ils sont identifiés par des lettres représentant le type de matériau + le numéro du matériau + le numéro de prélèvement effectué sur ce matériau.
- Le cas échéant, notamment dans les cas complexes et/ou suite à la réalisation d'investigations approfondies ou à l'utilisation d'outils de mesure, les sondages peuvent être indiqués et localisés. Ils sont alors identifiés par la lettre « s » + le numéro du matériau (+ la lettre « P » dans le cas où le sondage est réalisé à l'aide du Phazir™).

Exemples :
- MAS 7-1 est le 1er prélèvement réalisé sur le matériau N°7 (qui est un Mastic).
- MAS 7-2 est le 2ème prélèvement réalisé sur le même matériau N°7.
- s7 est un sondage réalisé sur le même matériau N°7.
- s7-P est un sondage réalisé sur le même matériau N°7, à l'aide du Phazir™.

Conclusion matériau :
Dans les cas où un matériau / produit comporte plusieurs couches pouvant être dissociées à l'analyse (ex : dalle de sol + colle), et qu'une seule couche contient de l'amiante (ex : seulement la colle), pour connaître précisément la couche contenant de l'amiante il convient de se référer soit à la fiche d'identification et de cotation du matériau / produit concerné, soit au procès-verbal d'analyse en Annexe.

Dans le cas où un matériau / produit a fait l'objet de plusieurs prélèvements, si les résultats d'analyse ne sont pas cohérents entre eux (par exemple un seul résultat indiquant la présence d'amiante), les hypothèses de similitude peuvent être revues.
Ces cas peuvent par exemple amener à :
- Conclure à la présence d'amiante dans la totalité du matériau / produit, malgré l'incohérence des résultats, en raison d'une possible présence d'amiante hétérogène et/ou en faible quantité, ou d'une mise en œuvre sur une surface avec des reliquats d'un produit amianté non complètement enlevé,
- Restreindre l'étendue de la ZPSO concernée par la présence du matériau amianté,
- Envisager l'hypothèse d'une pollution ponctuelle ne reflétant pas la présence effective d'amiante dans le matériau / produit,
- Préconiser la réalisation de prélèvements et analyses complémentaires pour réévaluer les hypothèses de similitude.

A ce stade, il convient de conduire une réflexion (si nécessaire collégiale, en concertation avec le Donneur d'Ordre et ses représentants) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, etc.) la cause probable de cette hétérogénéité.
Dans cette attente l'opérateur propose une conclusion à partir des éléments en sa connaissance comme indiqué ci-dessus.

Estimation des quantités de MPCA :
En cas de présence d'amiante, il est procédé à l'estimation de la quantité du ou des matériau(x) ou produit(s) concernés, exprimée selon les cas en surface (m²), en longueur (m) ou en nombre d'éléments unitaires (u).

Dans certains cas, dans l'impossibilité d'estimer la quantité même du matériau ou produit, ou lorsque cela apparait plus pertinent, il est procédé à l'estimation de quantité en incluant le support sur lequel celui-ci est présent.
Exemples : plots de colle ou bandes calicot sur doublages (estimation de la surface totale de doublage), joints mastic sur gaine (estimation de la longueur de gaines), panneaux ou isolants de portes (nombre de portes).
Le cas échéant, il est également procédé à titre d'information à l'estimation des quantités des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, pour lesquels il n'a pas été possible de conclure.
Les quantités estimées sont mentionnées dans la cartographie en annexe du rapport.

Le présent rapport ne fait pas état des quantités estimées en poids des déchets de MPCA générés en cas de retrait. En effet, cette estimation dépendant de la technique de traitement mise en œuvre et du choix ou de la nécessité de retirer le MPCA avec son support, elle n'est pas réalisable en amont de l'organisation et de la conception des éventuels travaux, et reste de la responsabilité de l'entreprise de travaux ou du Maître d'œuvre de l'opération.

F. Obligations de conservation et transmission

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il doit adresser à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, le propriétaire doit mettre à jour le contenu du « Dossier Amiante – Parties Privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du présent rapport ou pré-rapport. Il doit tenir à disposition et communiquer ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, le propriétaire doit mettre à jour le contenu du « Dossier Technique Amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du présent rapport ou pré-rapport. Il doit tenir à disposition et communiquer ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, le propriétaire doit conserver le présent rapport ou pré-rapport, et le communiquer, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

G. Attestations d'assurance, de compétence, d'impartialité.

Votre Assurance
▸ RCE PRESTATAIRES

Assurance et Banque

ATTESTATION

SAS AGENCE QUALITAT EXPERTISE
0092 BD VICTOR HUGO
92 A 98
92110 CLICHY FR

COURTIER
CARENE ASSCES PACT OFFICE
132 RUE BOSSUET
69006 LYON
Tél : 04 72 41 96 96
Fax : 04 72 40 99 96
Portefeuille : 0201351084

Vos références :
Contrat n° 4981163004
Client n° 0404/88/20

AXA France IARD, atteste que :

SAS AGENCE QUALITAT EXPERTISE
0092 BD VICTOR HUGO
92 A 98
92110 CLICHY

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 4981163004** ayant pris effet le **03/04/2017**

ACTIVITE 1 :
- Contrôle périodique amiante
- Diagnostic amiante avant travaux/avant démolition
- Diagnostic amiante avant vente
- Dossier technique amiante
- contrôle visuel amiante après travaux, conformément à la norme NF X 46 021
- Diagnostic gaz
- Diagnostic termites
- Etat parasitaire
- Exposition au plomb (CREP)
- Recherche de plomb avant travaux
- Diagnostic d'intoxication au plomb peinture (DRIP)
- Loi Carrez
- Mesurage surface utile
- Mesurage SHON (Surface Hors Œuvre Nette) et SHOB (Surface Hors Œuvre Brute)
- Mesurage surface de plancher
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de l'électricité
- Diagnostic légionellose
- Prêt conventionné et prêts à taux zéro (normes d'habitabilité)
- Calcul des tantièmes et millièmes de copropriétés
- Diagnostic technique SRU - Diagnostic technique d'immeuble
- Diagnostic accessibilité des personnes à mobilité réduite

1D6526202500.06

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2

- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de bâtiments conformément au Décret n° 2011-610 du 31 mai 2011
- Recherche de plomb dans l'eau
- Dossier Amiante Parties Privatives
- Audit Energétique avec préconisation de mesures visant à réaliser des économies d'énergie
- Etude Capacitaire
- Mesurage d'empoussiérement en fibres d'amiante
- Formation aux diagnostics immobiliers SANS DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE COMPETENCE

A L'EXCLUSION DE :

- TOUTE ACTIVITE D'EXTRACTION, D'EXPLOITATION ET D'ENLEVEMENT D'AMIANTE.

- TOUTE IMMIXTION EN MAITRISE D'ŒUVRE OU PRECONISATION TECHNIQUE PORTANT SUR DES OUVRAGES VISES PAR LES ARTICLES 1792 A 1792-6 DU CODE CIVIL ; DES MISSIONS DE CONTROLE TECHNIQUE VISEES PAR LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ; DES MISSIONS RELEVANT DE BUREAU D'ETUDES POUR LES OUVRAGES RELEVANT DES ARTICLES 1792 A 1792-6 DU CODE CIVIL.

- TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION REGLEMENTEE AUTRE QUE CELLE DE DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER TELLE QUE LE CONSEIL JURIDIQUE OU LA GESTION IMMOBILIERE ET TOUTES ACTIVITES DE CONSEIL ET DE BUREAU D'ETUDES INDUSTRIELS.

ACTIVITE 2

Prestations de relevé et modélisation 3D (B.I.M. : Building Information Modeling), pour le compte de maîtres d'ouvrages, maîtres d'œuvre et de bureaux d'études, relatives à tous types de bâtiments existants dans le cadre de
projet de rénovation/réhabilitation ou de maintenance/exploitation

A L'EXCLUSION DE TOUTE MISSION D'ARCHITECTE, DE BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ET DE TOUTE IMMIXTION EN MAITRISE D'OEUVRE OU PRECONISATION TECHNIQUE PORTANT SUR DES OUVRAGES VISES PAR LES ARTICLES 1792 A 1792-6 DU CODE CIVIL

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2025** au **01/01/2026** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 6 janvier 2025
Pour la société :

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	**9 000 000** € par année d'assurance
Dont : • **Dommages corporels**	**9 000 000 €** par année d'assurance
• **Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus**	**3 000 000** € par année d'assurance
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus) (article 3.1 des conditions générales)	**750 000 €** par année d'assurance
Dommages immatériels non consécutifs (selon extension aux conditions particulières y compris **la Responsabilité Civile Professionnelle obligatoire**)	**3 000 000** € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	**150 000** € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	**30 000** € par sinistre

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné CHEVREL Etienne, exerçant la profession d'opérateur en diagnostic immobilier, conformément à l'application de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, atteste sur l'honneur que :

- La présente prestation est réalisée en totale indépendance et impartialité.

- Je dispose des compétences requises pour effectuer le (ou les) diagnostic(s) convenu(s) ainsi qu'en atteste(nt) ma (ou mes) certification(s) de compétences, ainsi que de l'organisation et des moyens appropriés requis par les textes légaux et réglementaires.

- Certificat DEKRA
- N° de certificat : DTI2532
- Certificat délivré jusqu'au :

1. Amiante : 23/06/2031


- Certificat ICERT
- N° de certificat : CPDI7588
- Certificat délivré jusqu'au :

1. Termites : 02/02/2029

- Je suis couvert par une assurance couvrant les éventuelles conséquences qui pourraient résulter de mon intervention.

- J'ai conscience que toute fausse déclaration ainsi que toute intervention effectuée en violation des contraintes légales est passible de sanctions pénales d'un montant de 1 500 € par infraction constatée, le double en cas de récidive.

Fait à CLICHY
Le 21/02/2025
Signature





CERTIFICAT

DE COMPETENCES

Diagnostiqueur immobilier certifié

DEKRA Certification certifie que Monsieur

Etienne CHEVREL

est titulaire du certificat de compétences N°**DTI2532** pour :

Diagnostic amiante sans mention du 24/06/2024 au 23/06/2031
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Diagnostic amiante avec mention du 24/06/2024 au 23/06/2031
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

Yvan MAINGUY
Directeur Général

Le Plessis-Robinson, le 21/06/2024

Diagnostiqueur immobilier certifié
DEKRA

cofrac

Accréditation n° 4-0081
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Le non-respect des clauses contractuelles peut rendre ce certificat invalide

DEKRA Certification SAS – www.dekra-certification.fr
Immeuble La Boursidière - Porte I - Rue de la Boursidière - 92350 Le Plessis-Robinson – France

ANNEXE

CARTOGRAPHIE DES PRÉLÈVEMENTS, SONDAGES ET MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

Explications pour la lecture de la cartographie :

Les informations notées sur les cartographies comprennent au plus :

- **Les points de prélèvement :**

Ces points sont représentés par des flèches.
Tous les prélèvements sont indiqués par quelques lettres représentant le type de matériau + le numéro du matériau + le numéro de prélèvement effectué sur ce matériau.
Exemple : MAS 7-3 est le 3ème prélèvement réalisé sur le matériau N°7 (qui est un Mastic)

Tous les points de prélèvement sont indiqués sur la cartographie que les résultats d'analyses soient positifs ou négatifs

- **Les points de sondage :**

Ces points sont représentés par des flèches.
Les sondages sont identifiés par la lettre « s » + le numéro du matériau (+ la lettre « P » dans le cas où le sondage est réalisé à l'aide du Phazir™).
Exemples : s7 est un sondage réalisé sur le même matériau N°7 ; s7-P est un sondage réalisé sur le même matériau N°7, à l'aide du Phazir™.

Les points de sondage ne sont indiqués sur la cartographie que dans certains cas, notamment dans les cas complexes et/ou suite à la réalisation d'investigations approfondies.

- **Les matériaux contenant de l'amiante**

Ils sont identifiés par des zones de couleurs (cf. légende)

- **Les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante**

Si des investigations complémentaires sont nécessaires, il peut exister des matériaux pour lesquels un doute subsiste. Ces matériaux sont identifiés par des zones de couleurs (cf. légende)

- **Les zones hors champ de la mission**


Elles sont identifiées par des zones de couleurs (cf. légende)

- **Les zones qui doivent faire l'objet d'investigations ultérieures**

Elles sont identifiées par des zones de couleurs (cf. légende)

PLAN DE SITUATION

LÉGENDE	
Zone d'investigation	

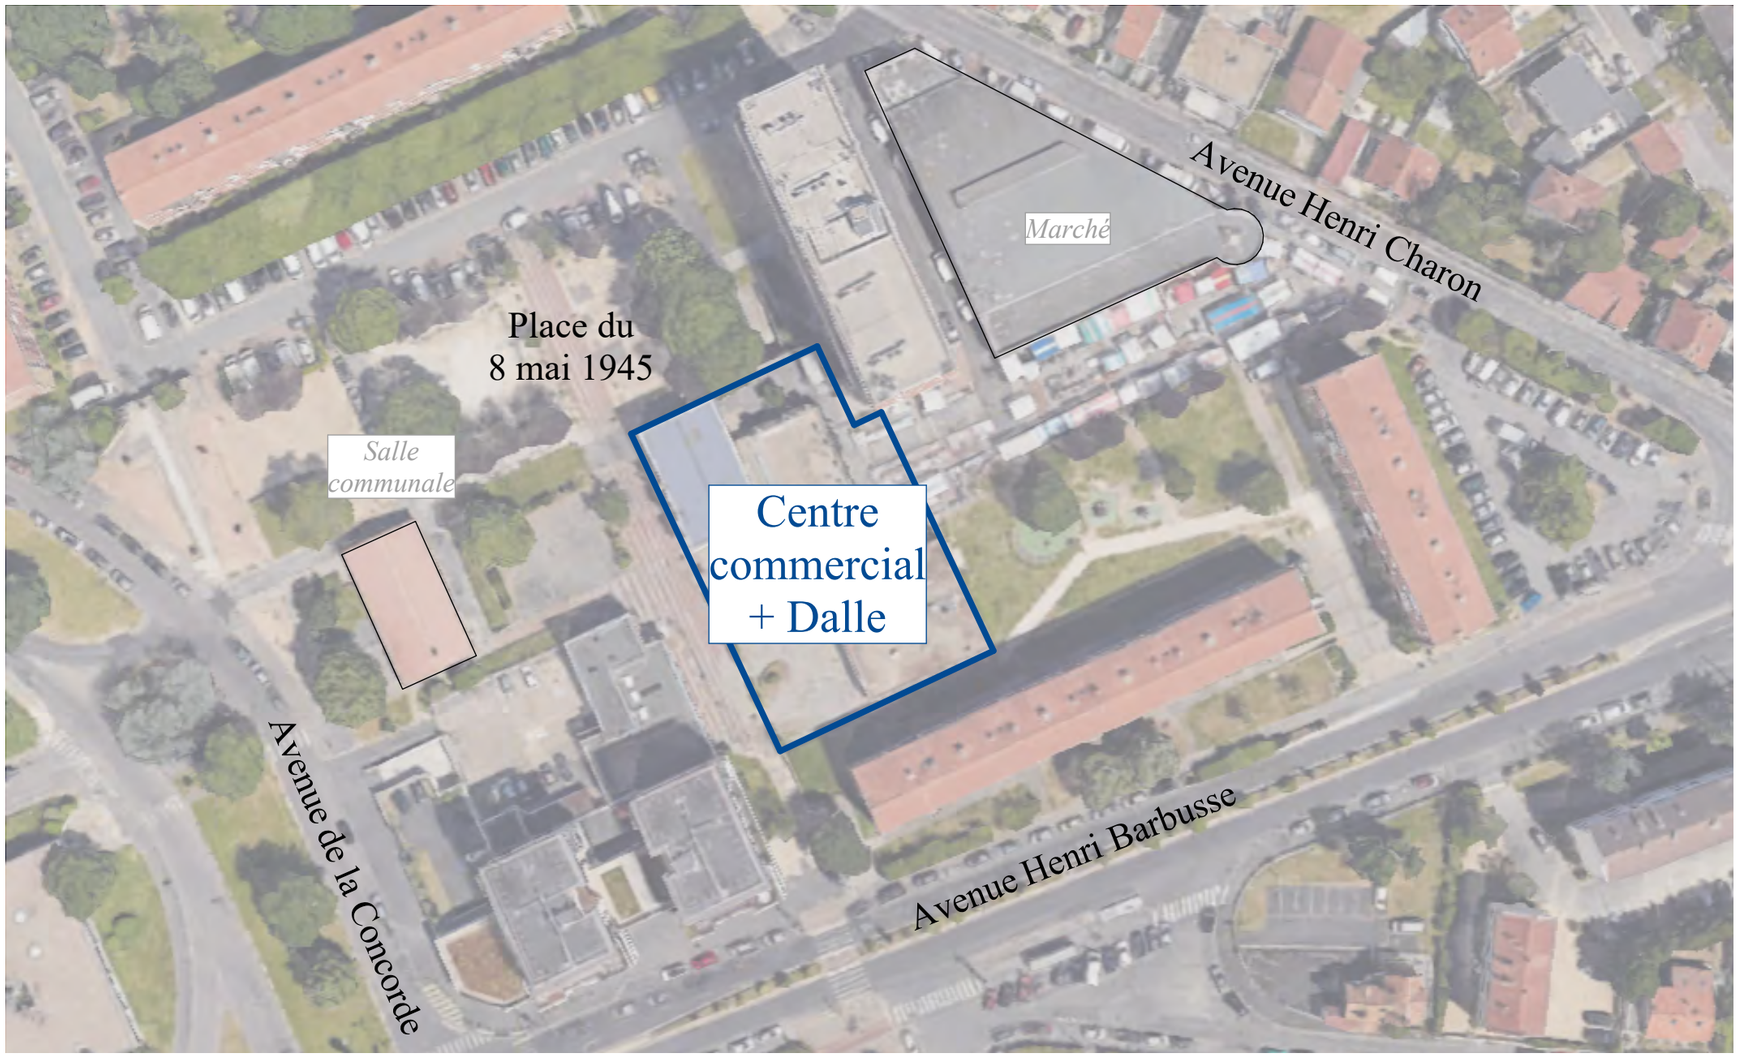


ANNEXE : CARTOGRAPHIE DES PRÉLÈVEMENTS, SONDAGES ET MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

QUALITAT EXPERTISES
92/98, Bd Victor Hugo 92110 CLICHY
01 41 27 93 47 courriel@qualitat.fr

Dossier	64342-2	ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE
Date	07/2025	
Format : A3	Page : 1/14	

CENTRE COMMERCIAL / PARVIS

LÉGENDE	
Point de prélèvement	Prél. XXX x-x

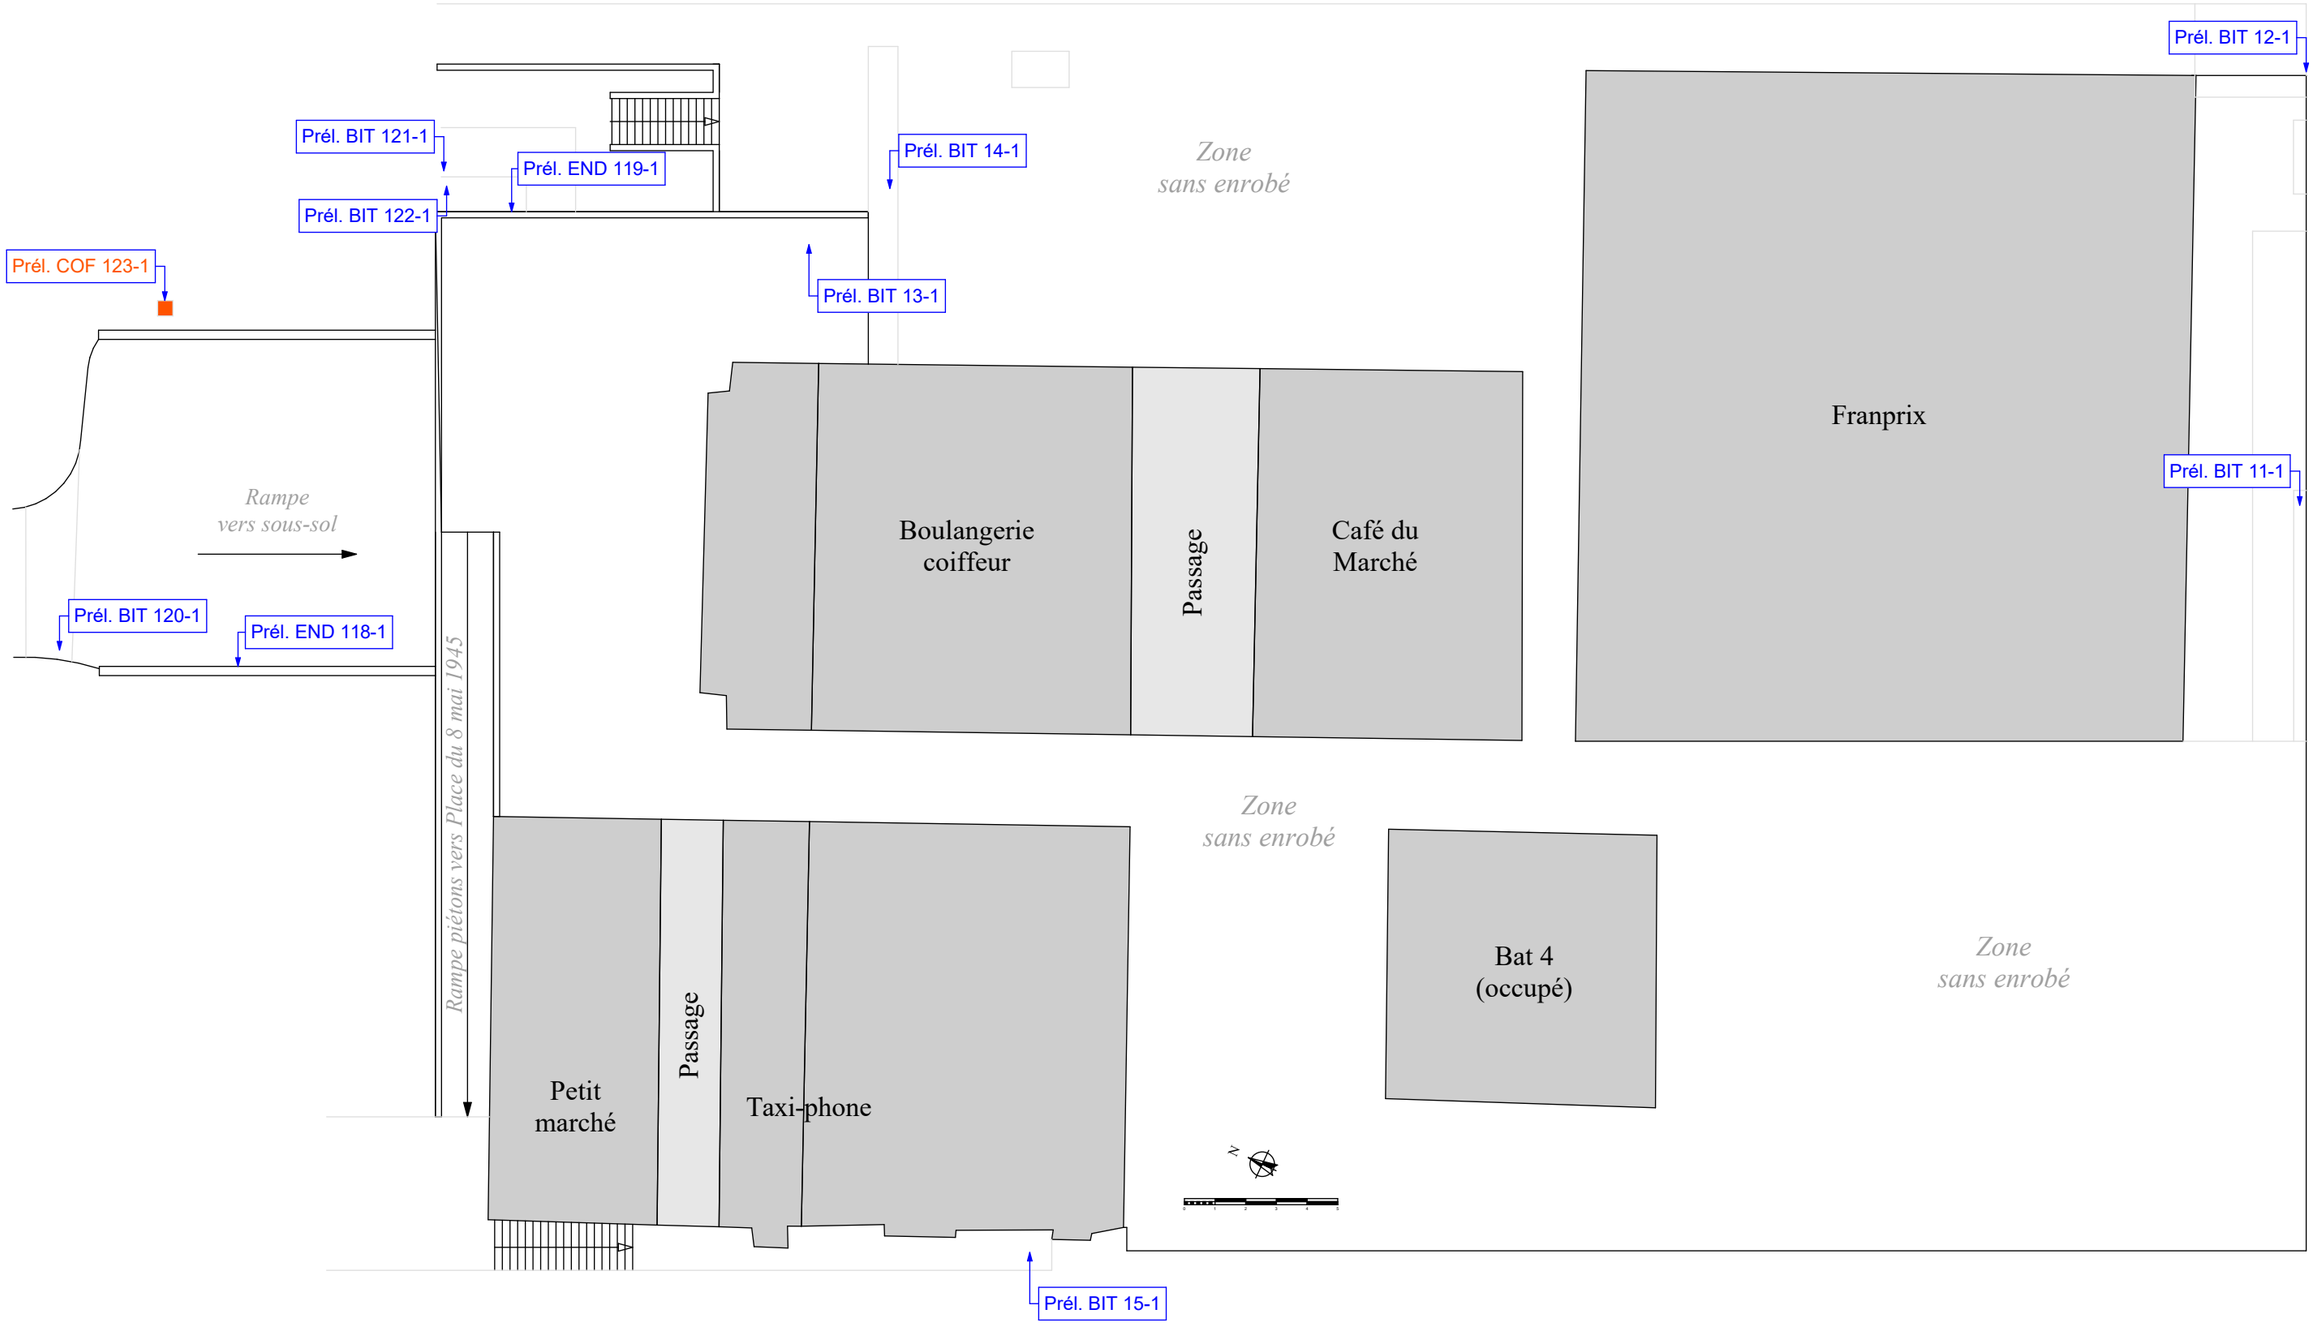

ANNEXE : CARTOGRAPHIE DES PRÉLÈVEMENTS, SONDAGES ET MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

QUALITAT EXPERTISES
92/98, Bd Victor Hugo 92110 CLICHY
01 41 27 93 47 courriel@qualitat.fr

Dossier	64342-2	ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE
Date	07/2025	
Format : A3	Page : 2/14	


MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N°	Type	Descriptif	Légende	Quantité *(estimée)*
123	Coffrage perdu	rond diamètre 30cm		1 u.

CENTRE COMMERCIAL / BAT 1 / TOITURE

INVESTIGATIONS ULTÉRIEURES	
Non visité	



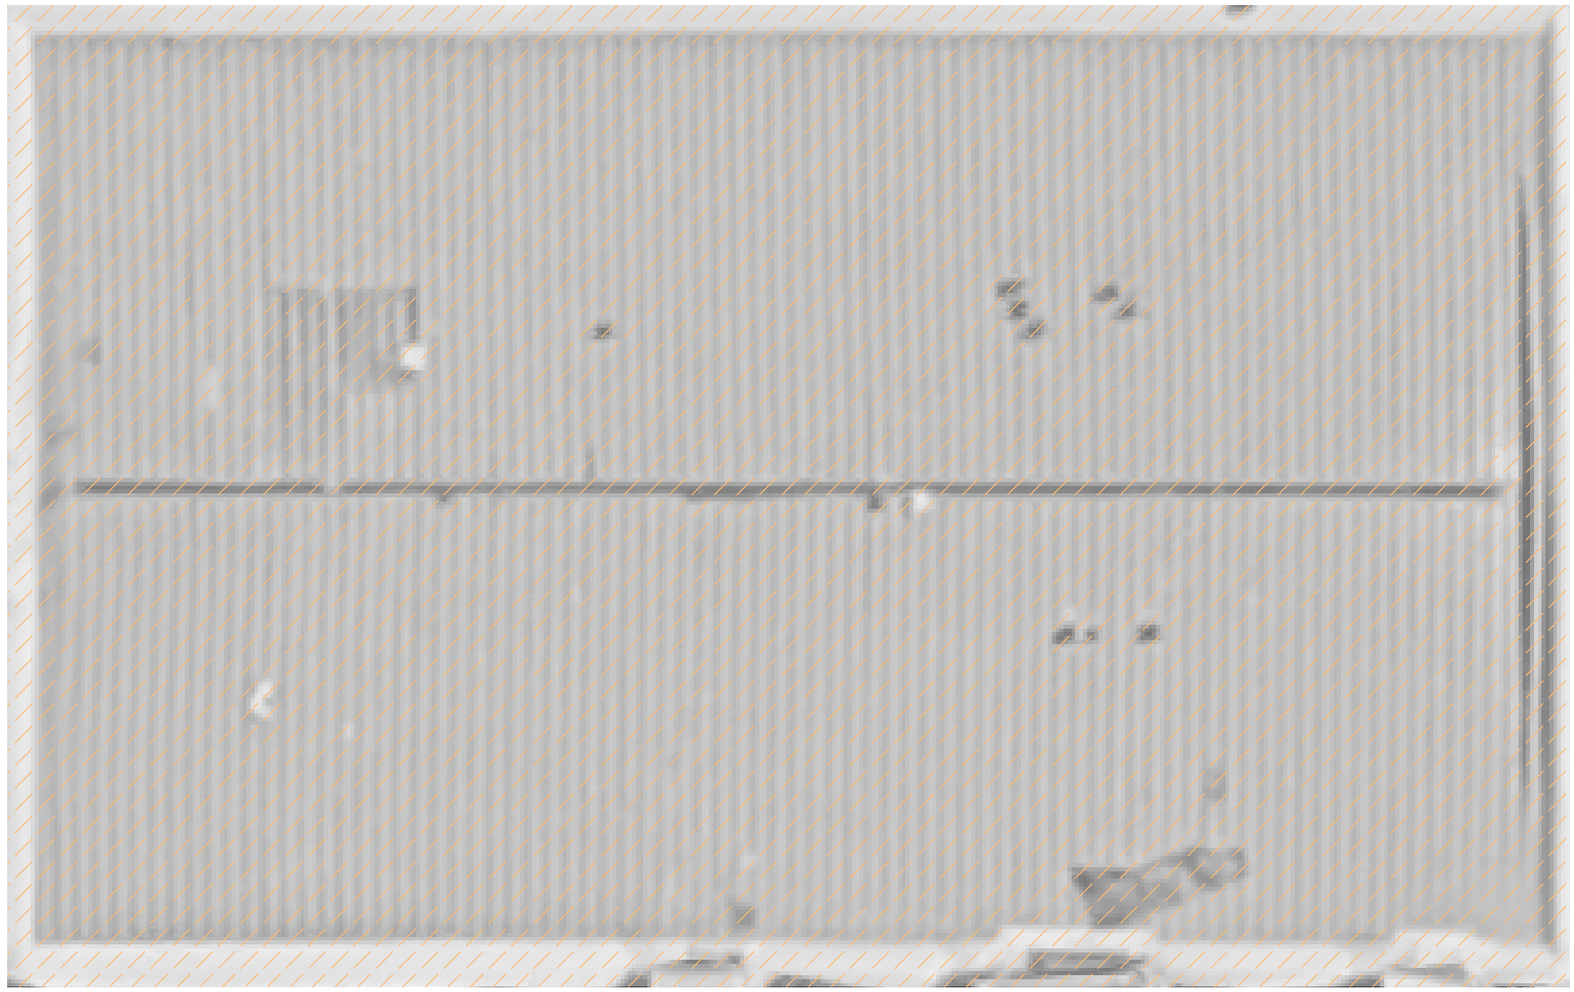

ANNEXE : CARTOGRAPHIE DES PRÉLÈVEMENTS, SONDAGES ET MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

QUALITAT EXPERTISES
92/98, Bd Victor Hugo 92110 CLICHY
01 41 27 93 47 courriel@qualitat.fr


Dossier	64342-2	ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE
Date	07/2025	
Format : A3	Page : 3/14	


CENTRE COMMERCIAL / BAT 1 / R+1 + FAÇADES

INVESTIGATIONS ULTÉRIEURES	
Non visité	

LÉGENDE	
Point de prélèvement	Prél. XXX x-x



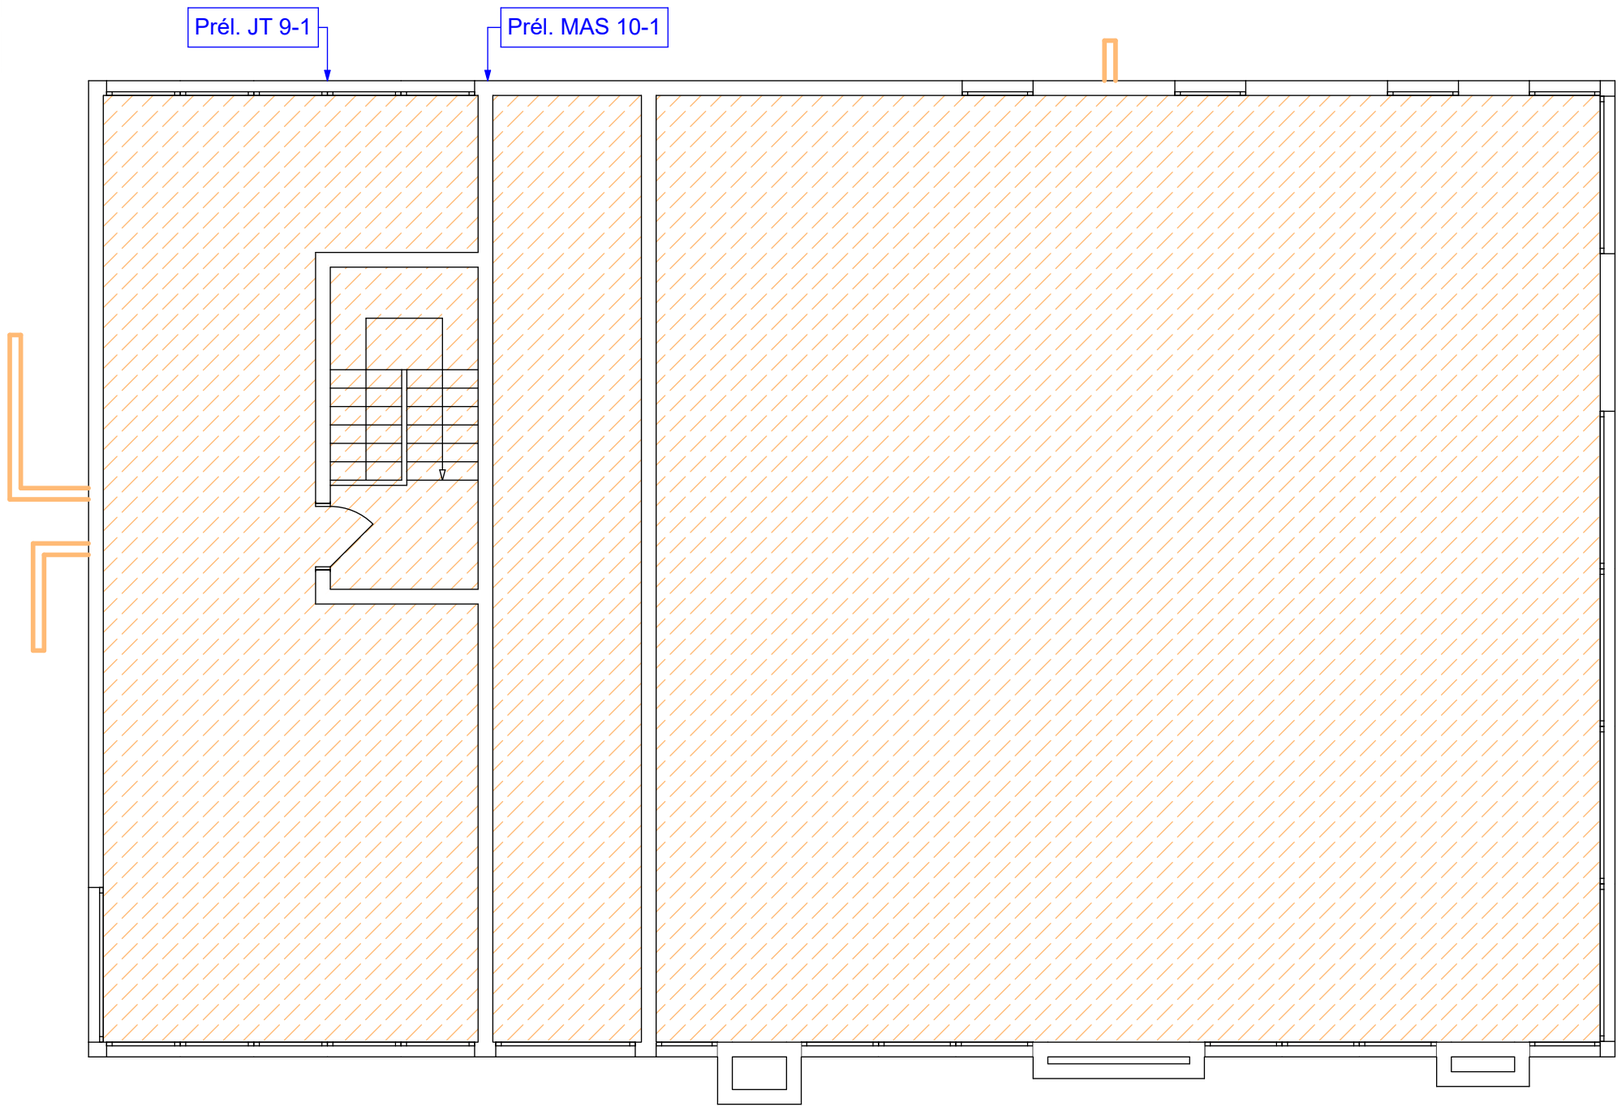



ANNEXE : CARTOGRAPHIE DES PRÉLÈVEMENTS, SONDAGES ET MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

QUALITAT EXPERTISES
92/98, Bd Victor Hugo 92110 CLICHY
01 41 27 93 47 courriel@qualitat.fr

Dossier	64342-2
Date	07/2025
Format : A3	Page : 4/14

ZAC du 8 mai 1945
91270 VIGNEUX SUR SEINE

MATÉRIAUX ET PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE


N°	Type	Descriptif	Légende	Quantité *(estimée)*
17	Conduit fibres-ciment	rond, évacuation de fumée		6 ml

CENTRE COMMERCIAL / BAT 1 / RDC (niveau Dalle) + FAÇADES

INVESTIGATIONS ULTÉRIEURES	
Non visité	

LÉGENDE	
Point de prélèvement	Prél. XXX x-x



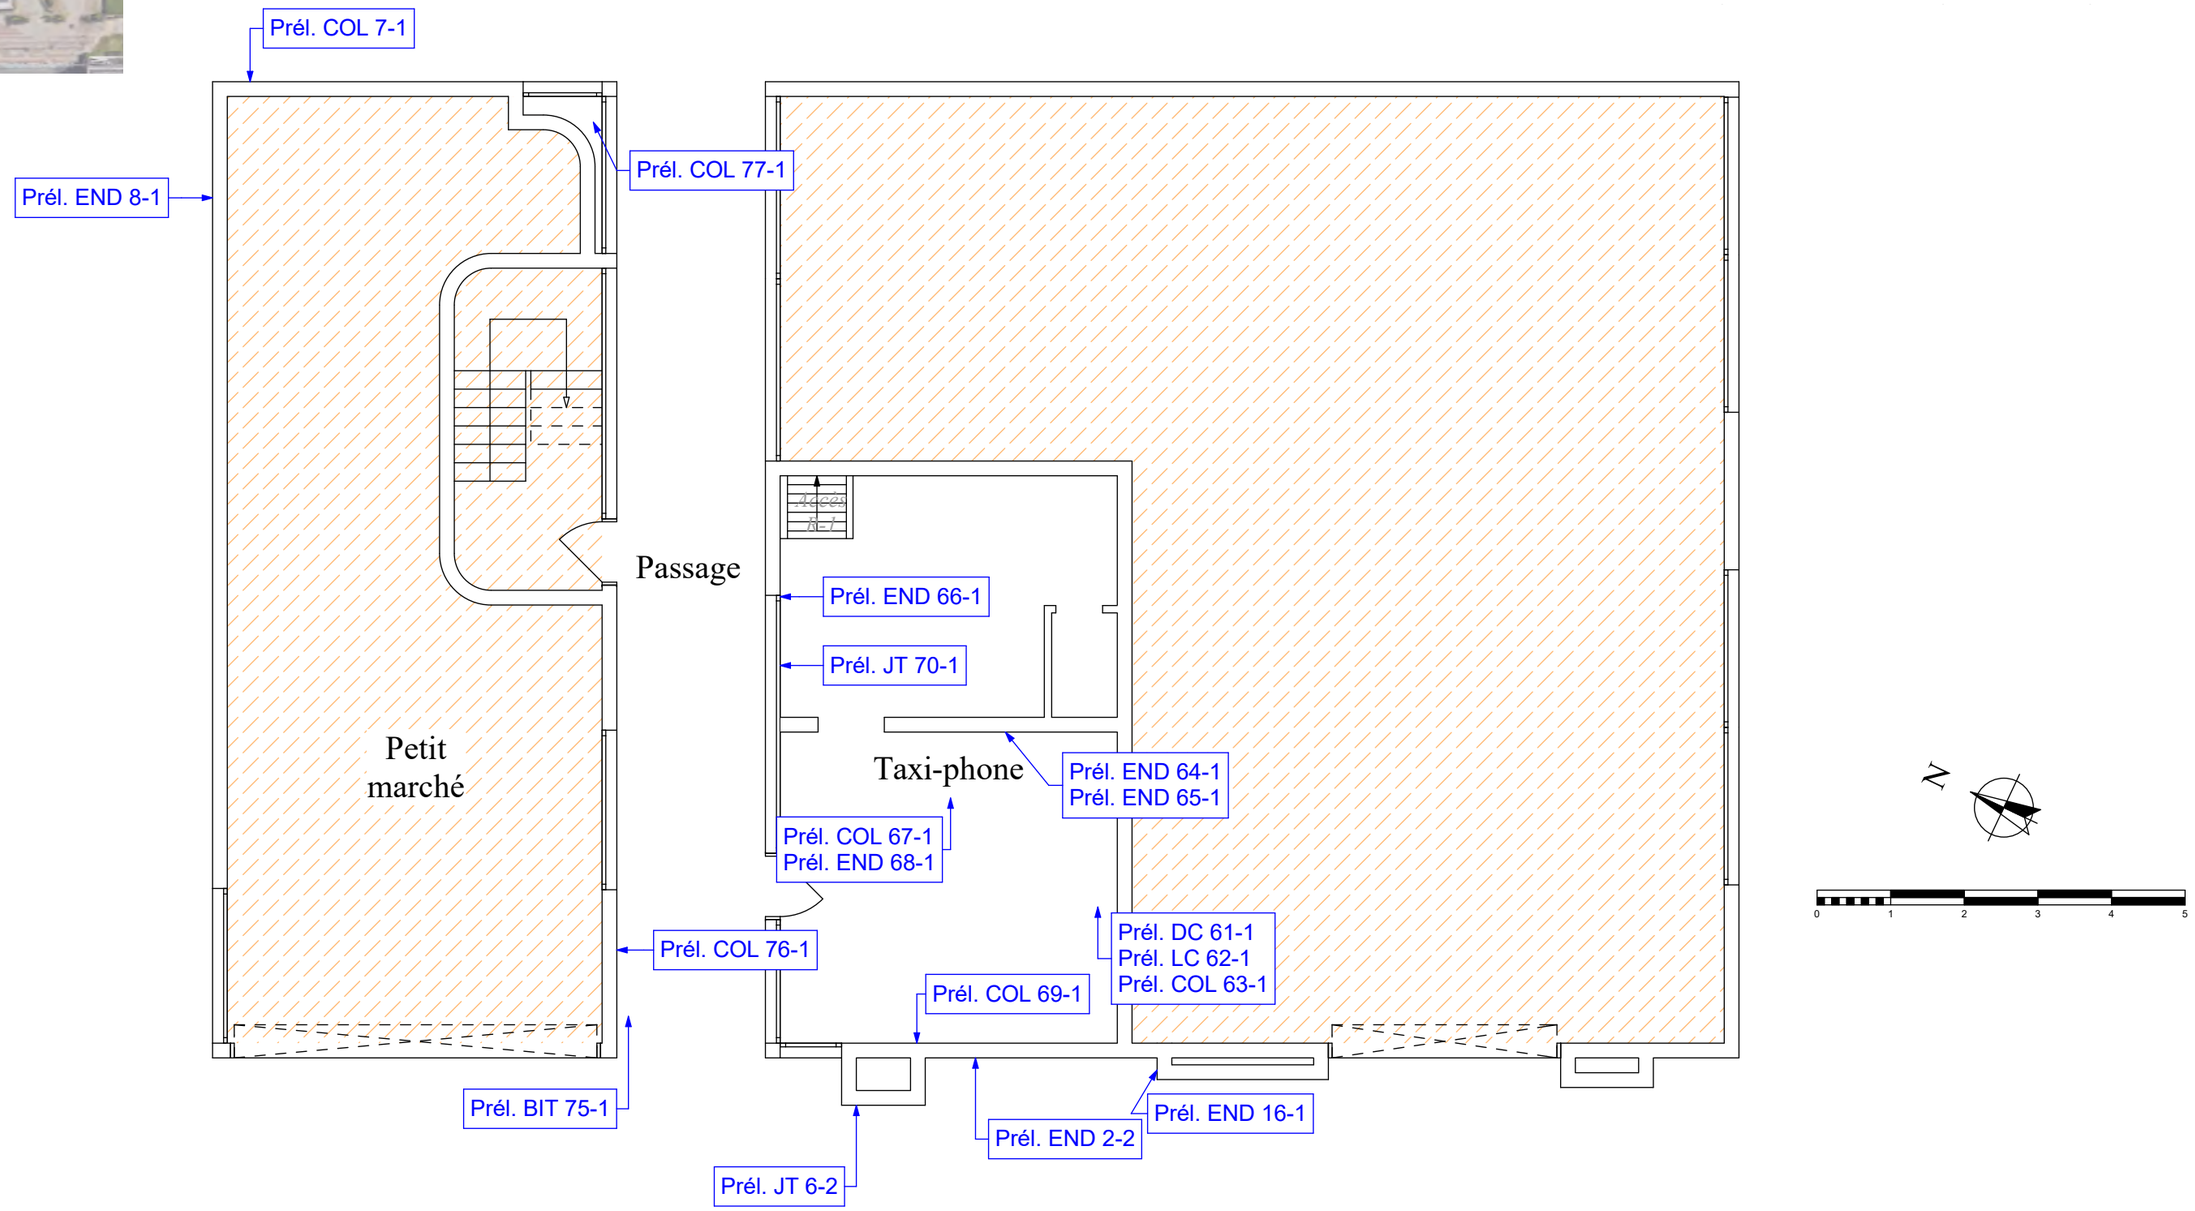

ANNEXE : CARTOGRAPHIE DES PRÉLÈVEMENTS, SONDAGES ET MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

QUALITAT EXPERTISES
92/98, Bd Victor Hugo 92110 CLICHY
01 41 27 93 47 courriel@qualitat.fr

Dossier	64342-2
Date	07/2025
Format : A3	Page : 5/14


ZAC du 8 mai 1945
91270 VIGNEUX SUR SEINE


CENTRE COMMERCIAL / BAT 1 / R-1 (niveau Place)

INVESTIGATIONS ULTÉRIEURES	
Non visité	

LÉGENDE	
Point de prélèvement	Prél. XXX x-x



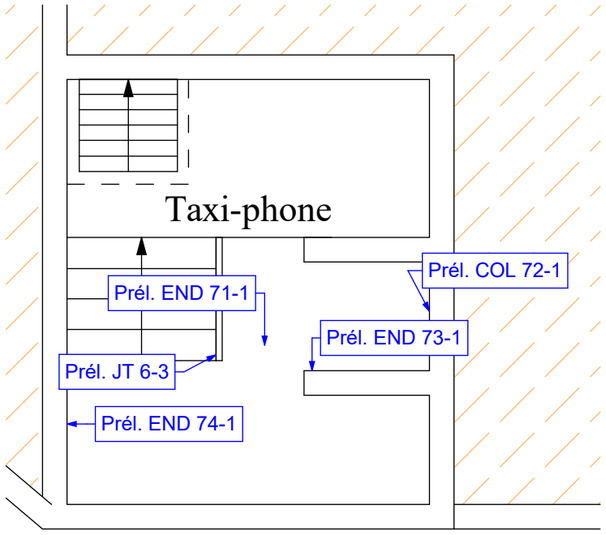



Circulation
(Cf R-1 global)

ANNEXE : CARTOGRAPHIE DES PRÉLÈVEMENTS, SONDAGES ET MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

QUALITAT EXPERTISES
92/98, Bd Victor Hugo 92110 CLICHY
01 41 27 93 47 courriel@qualitat.fr


Dossier	64342-2
Date	07/2025
Format : A3	Page : 6/14

ZAC du 8 mai 1945
91270 VIGNEUX SUR SEINE

CENTRE COMMERCIAL / BAT 2 / TOITURE

INVESTIGATIONS ULTÉRIEURES	
Non visité	



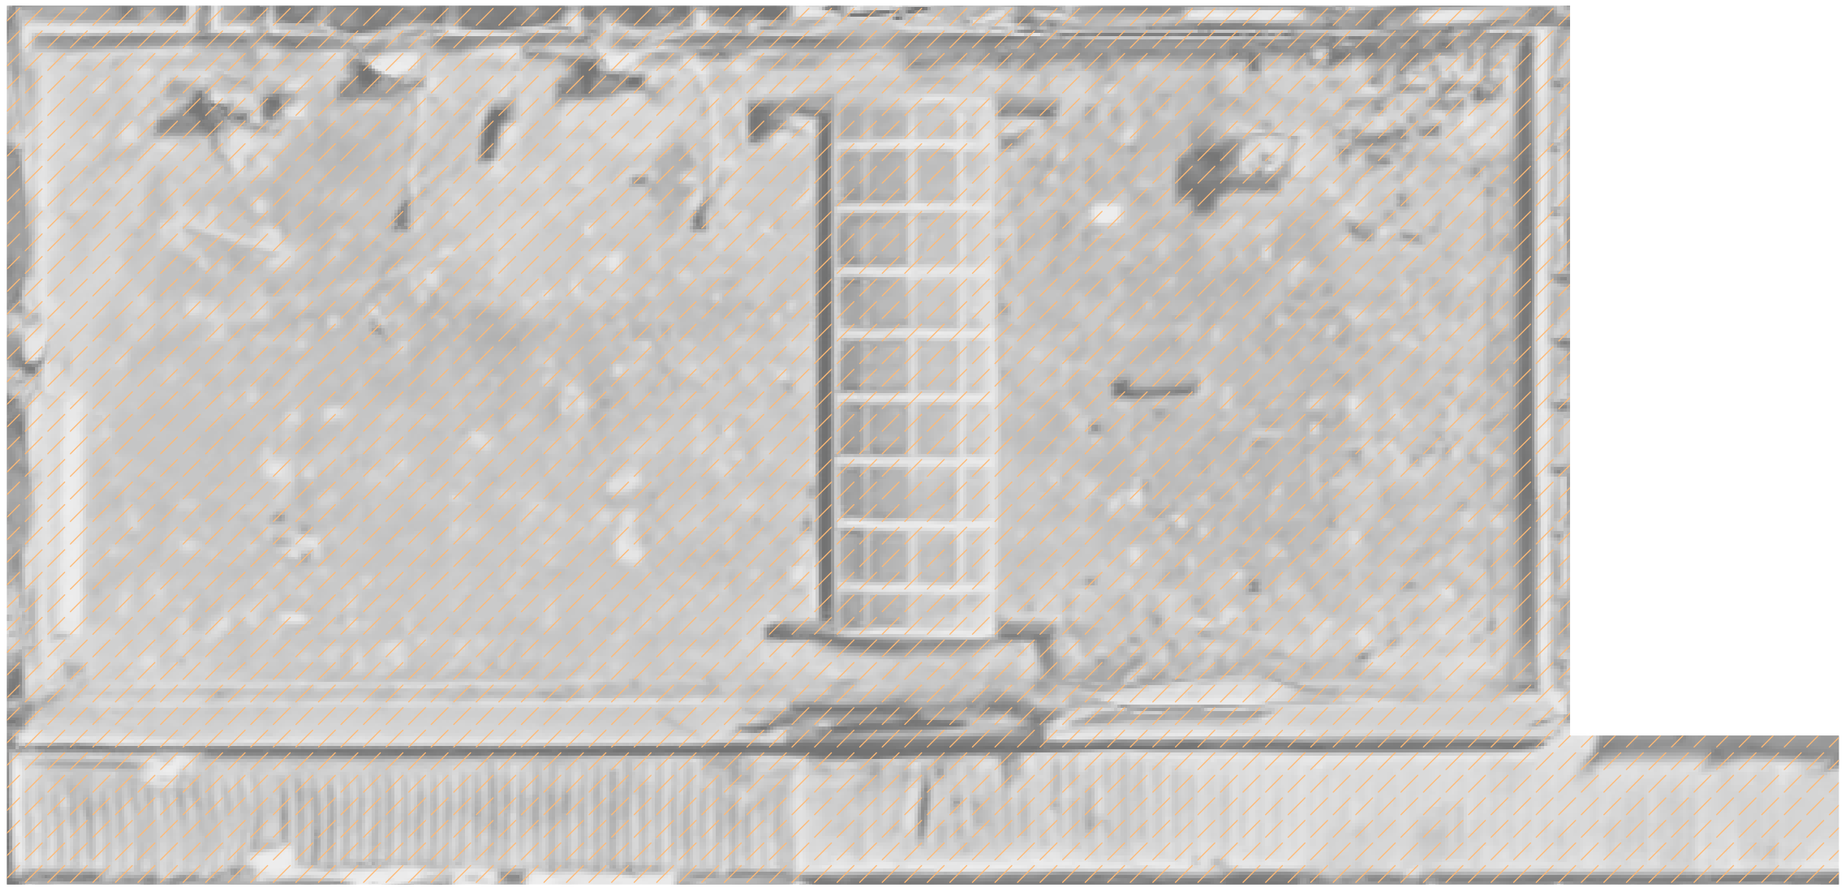

ANNEXE : CARTOGRAPHIE DES PRÉLÈVEMENTS, SONDAGES ET MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

QUALITAT EXPERTISES
92/98, Bd Victor Hugo 92110 CLICHY
01 41 27 93 47 courriel@qualitat.fr

Dossier	64342-2
Date	07/2025
Format : A3	Page : 7/14


ZAC du 8 mai 1945
91270 VIGNEUX SUR SEINE

CENTRE COMMERCIAL / BAT 2 / RDC (niveau Dalle) + FAÇADES

INVESTIGATIONS ULTÉRIEURES	
Non visité	

LÉGENDE	
Point de prélèvement	Prél. XXX x-x



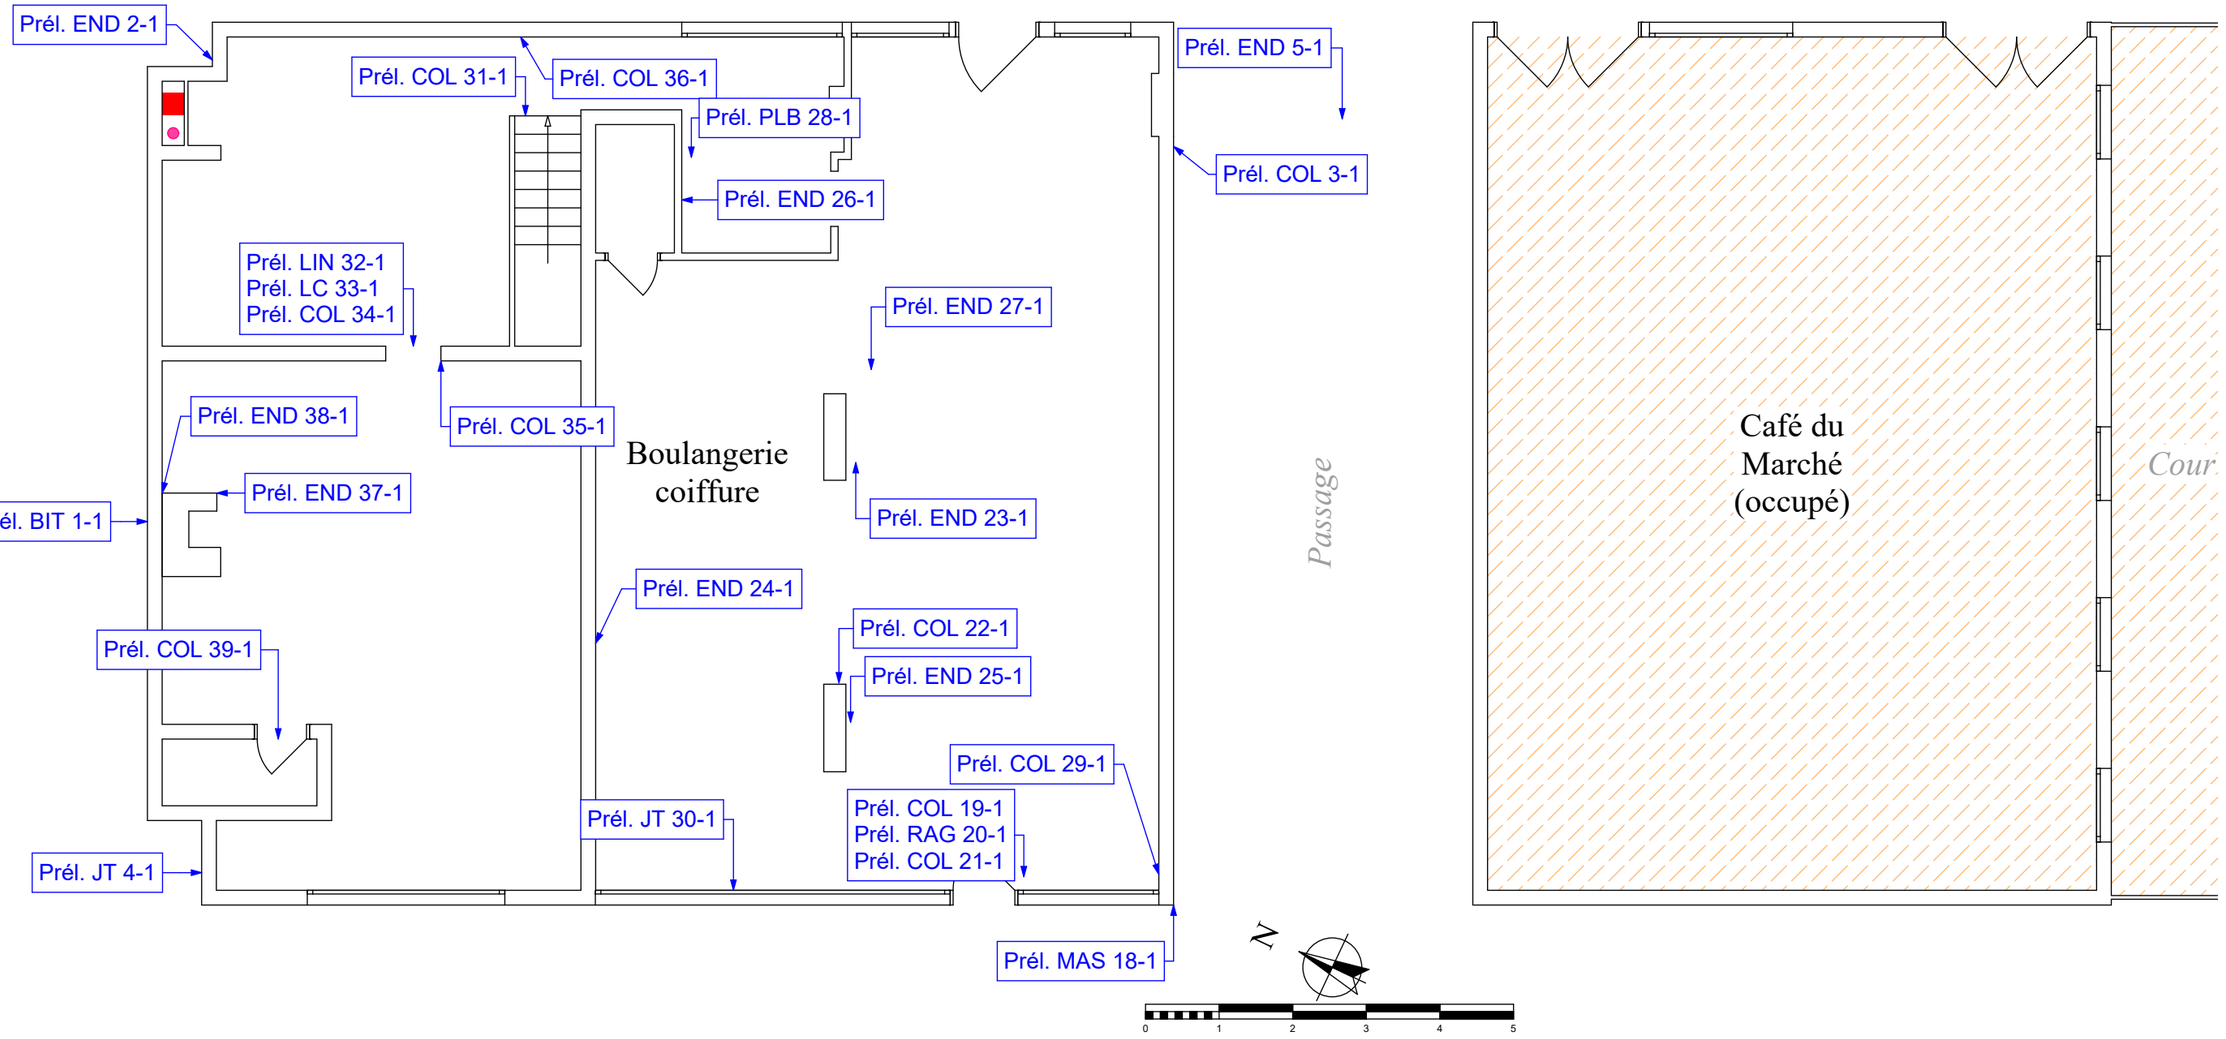

ANNEXE : CARTOGRAPHIE DES PRÉLÈVEMENTS, SONDAGES ET MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

QUALITAT EXPERTISES
92/98, Bd Victor Hugo 92110 CLICHY
01 41 27 93 47 courriel@qualitat.fr

Dossier	64342-2
Date	07/2025
Format : A3	Page : 8/14

ZAC du 8 mai 1945
91270 VIGNEUX SUR SEINE

MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE


N°	Type	Descriptif	Légende	Quantité *(estimée)*
42	Conduit fibres-ciment	gris, 30x30		1 u.
48	Conduit fibres-ciment	rond, diamètre 15cm		1 u.

CENTRE COMMERCIAL / BAT 2 / R-1

INVESTIGATIONS ULTÉRIEURES	
Non visité	

LÉGENDE	
Point de prélèvement	Prél. XXX x-x



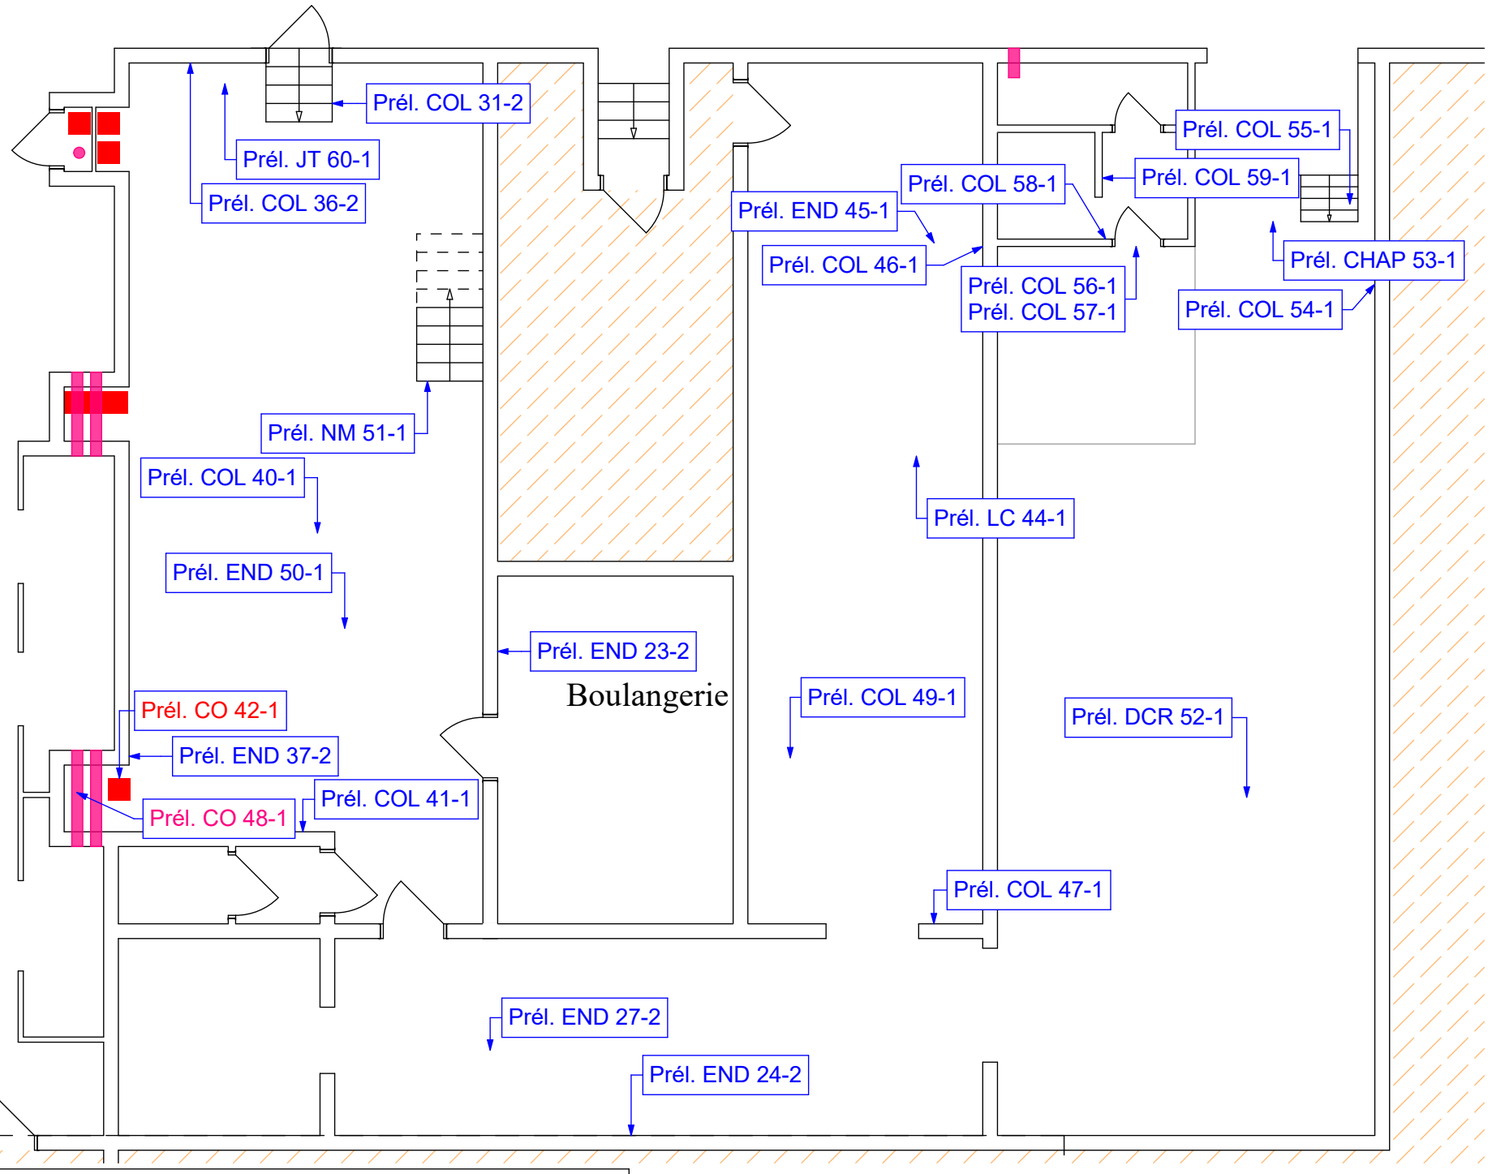

ANNEXE : CARTOGRAPHIE DES PRÉLÈVEMENTS, SONDAGES ET MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

QUALITAT EXPERTISES
92/98, Bd Victor Hugo 92110 CLICHY
01 41 27 93 47 courriel@qualitat.fr

Dossier	64342-2	ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE
Date	07/2025	
Format : A3	Page : 9/14	

MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N°	Type	Descriptif	Légende	Quantité *(estimée)*
42	Conduit fibres-ciment	gris, 30x30		5 u.
48	Conduit fibres-ciment	rond, diamètre 15cm		6 u.

CENTRE COMMERCIAL / BAT 3 / TOITURE

INVESTIGATIONS ULTÉRIEURES	
Non visité	





ANNEXE : CARTOGRAPHIE DES PRÉLÈVEMENTS, SONDAGES ET MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

QUALITAT EXPERTISES
92/98, Bd Victor Hugo 92110 CLICHY
01 41 27 93 47 courriel@qualitat.fr

Dossier	64342-2
Date	07/2025
Format : A3	Page : 10/14


ZAC du 8 mai 1945
91270 VIGNEUX SUR SEINE

CENTRE COMMERCIAL / BAT 3 / RDC + FAÇADES

INVESTIGATIONS ULTÉRIEURES	
Non visité	

LÉGENDE	
Point de prélèvement	Prél. XXX x-x



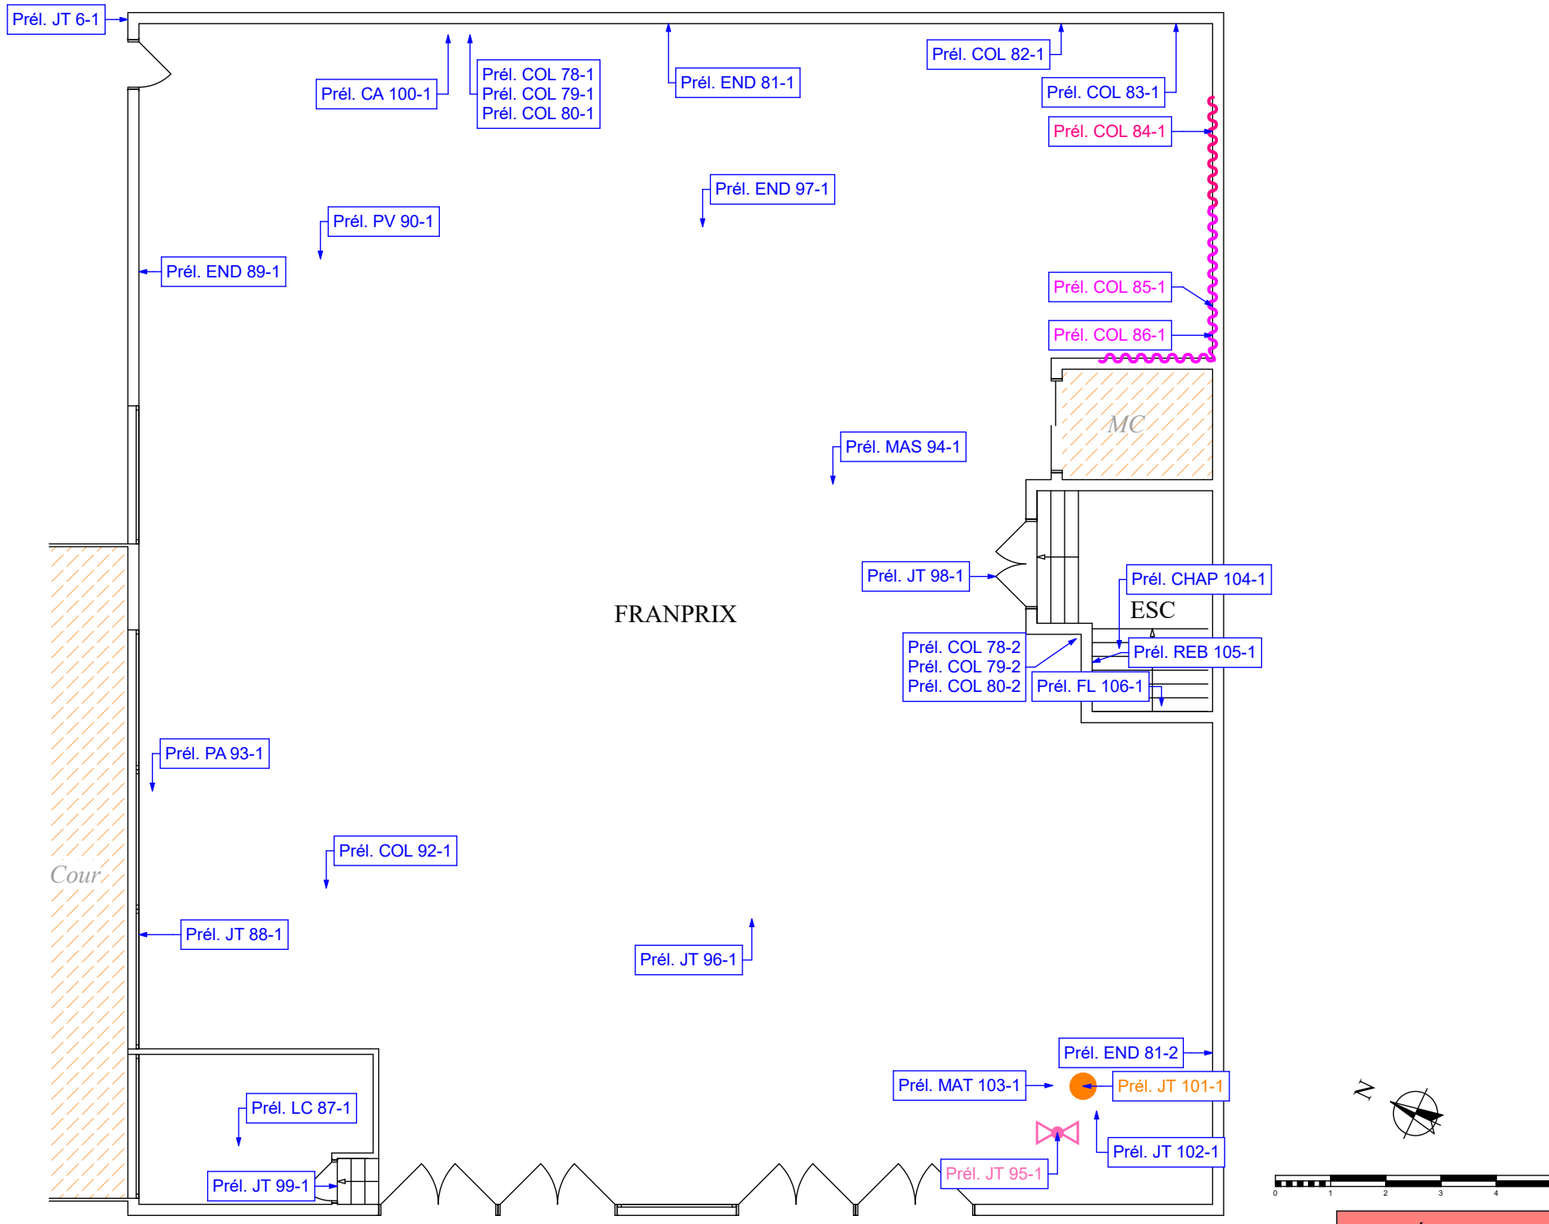

MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N°	Type	Descriptif	Légende	Quantité *(estimée)*
84	Colle + joint	Colle beige + joint beige fin derrière faïence 10x10 blanche		2 ml
85	Colle + joint	Colle beige + joint beige fin derrière faïence 15x15 blanche		5 ml
86	Colle + joint	Colle beige + joint beige fin derrière faïence petit format orangée		5 ml
95	Joint de bride	blanc en jonction réseaux eau et CTA		1 u.
101	Joint	noir rigide en jonction de la CTA et de la gaine de ventilation en acier		1 u.

ANNEXE : CARTOGRAPHIE DES PRÉLÈVEMENTS, SONDAGES ET MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

QUALITAT EXPERTISES
92/98, Bd Victor Hugo 92110 CLICHY
01 41 27 93 47 courriel@qualitat.fr

Dossier	64342-2
Date	07/2025
Format : A3	Page : 11/14

ZAC du 8 mai 1945
91270 VIGNEUX SUR SEINE

CENTRE COMMERCIAL / BAT 4 / TOITURE

INVESTIGATIONS ULTÉRIEURES	
Non visité	





ANNEXE : CARTOGRAPHIE DES PRÉLÈVEMENTS, SONDAGES ET MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

QUALITAT EXPERTISES
92/98, Bd Victor Hugo 92110 CLICHY
01 41 27 93 47 courriel@qualitat.fr


Dossier	64342-2
Date	07/2025
Format : A3	Page : 12/14


ZAC du 8 mai 1945
91270 VIGNEUX SUR SEINE

CENTRE COMMERCIAL / BAT 4 / RDC + FAÇADES

INVESTIGATIONS ULTÉRIEURES	
Non visité	



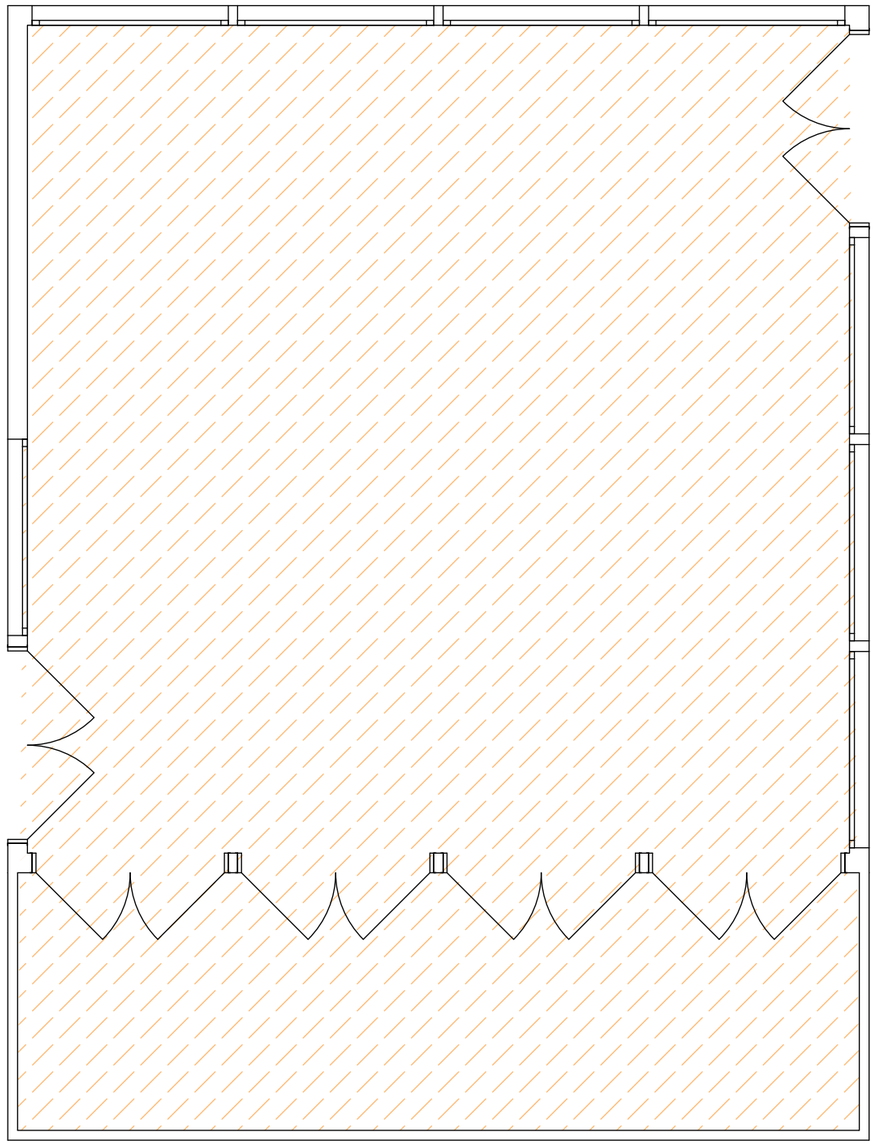





ANNEXE : CARTOGRAPHIE DES PRÉLÈVEMENTS, SONDAGES ET MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE


QUALITAT
EXPERTISES
92/98, Bd Victor Hugo 92110 CLICHY
01 41 27 93 47 courriel@qualitat.fr

Dossier	64342-2	ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE
Date	07/2025	
Format : A3	Page : 13/14	

CENTRE COMMERCIAL / R-1 (Global)

INVESTIGATIONS ULTÉRIEURES	
Non visité	

LÉGENDE	
Point de prélèvement	Prél. XXX x-x

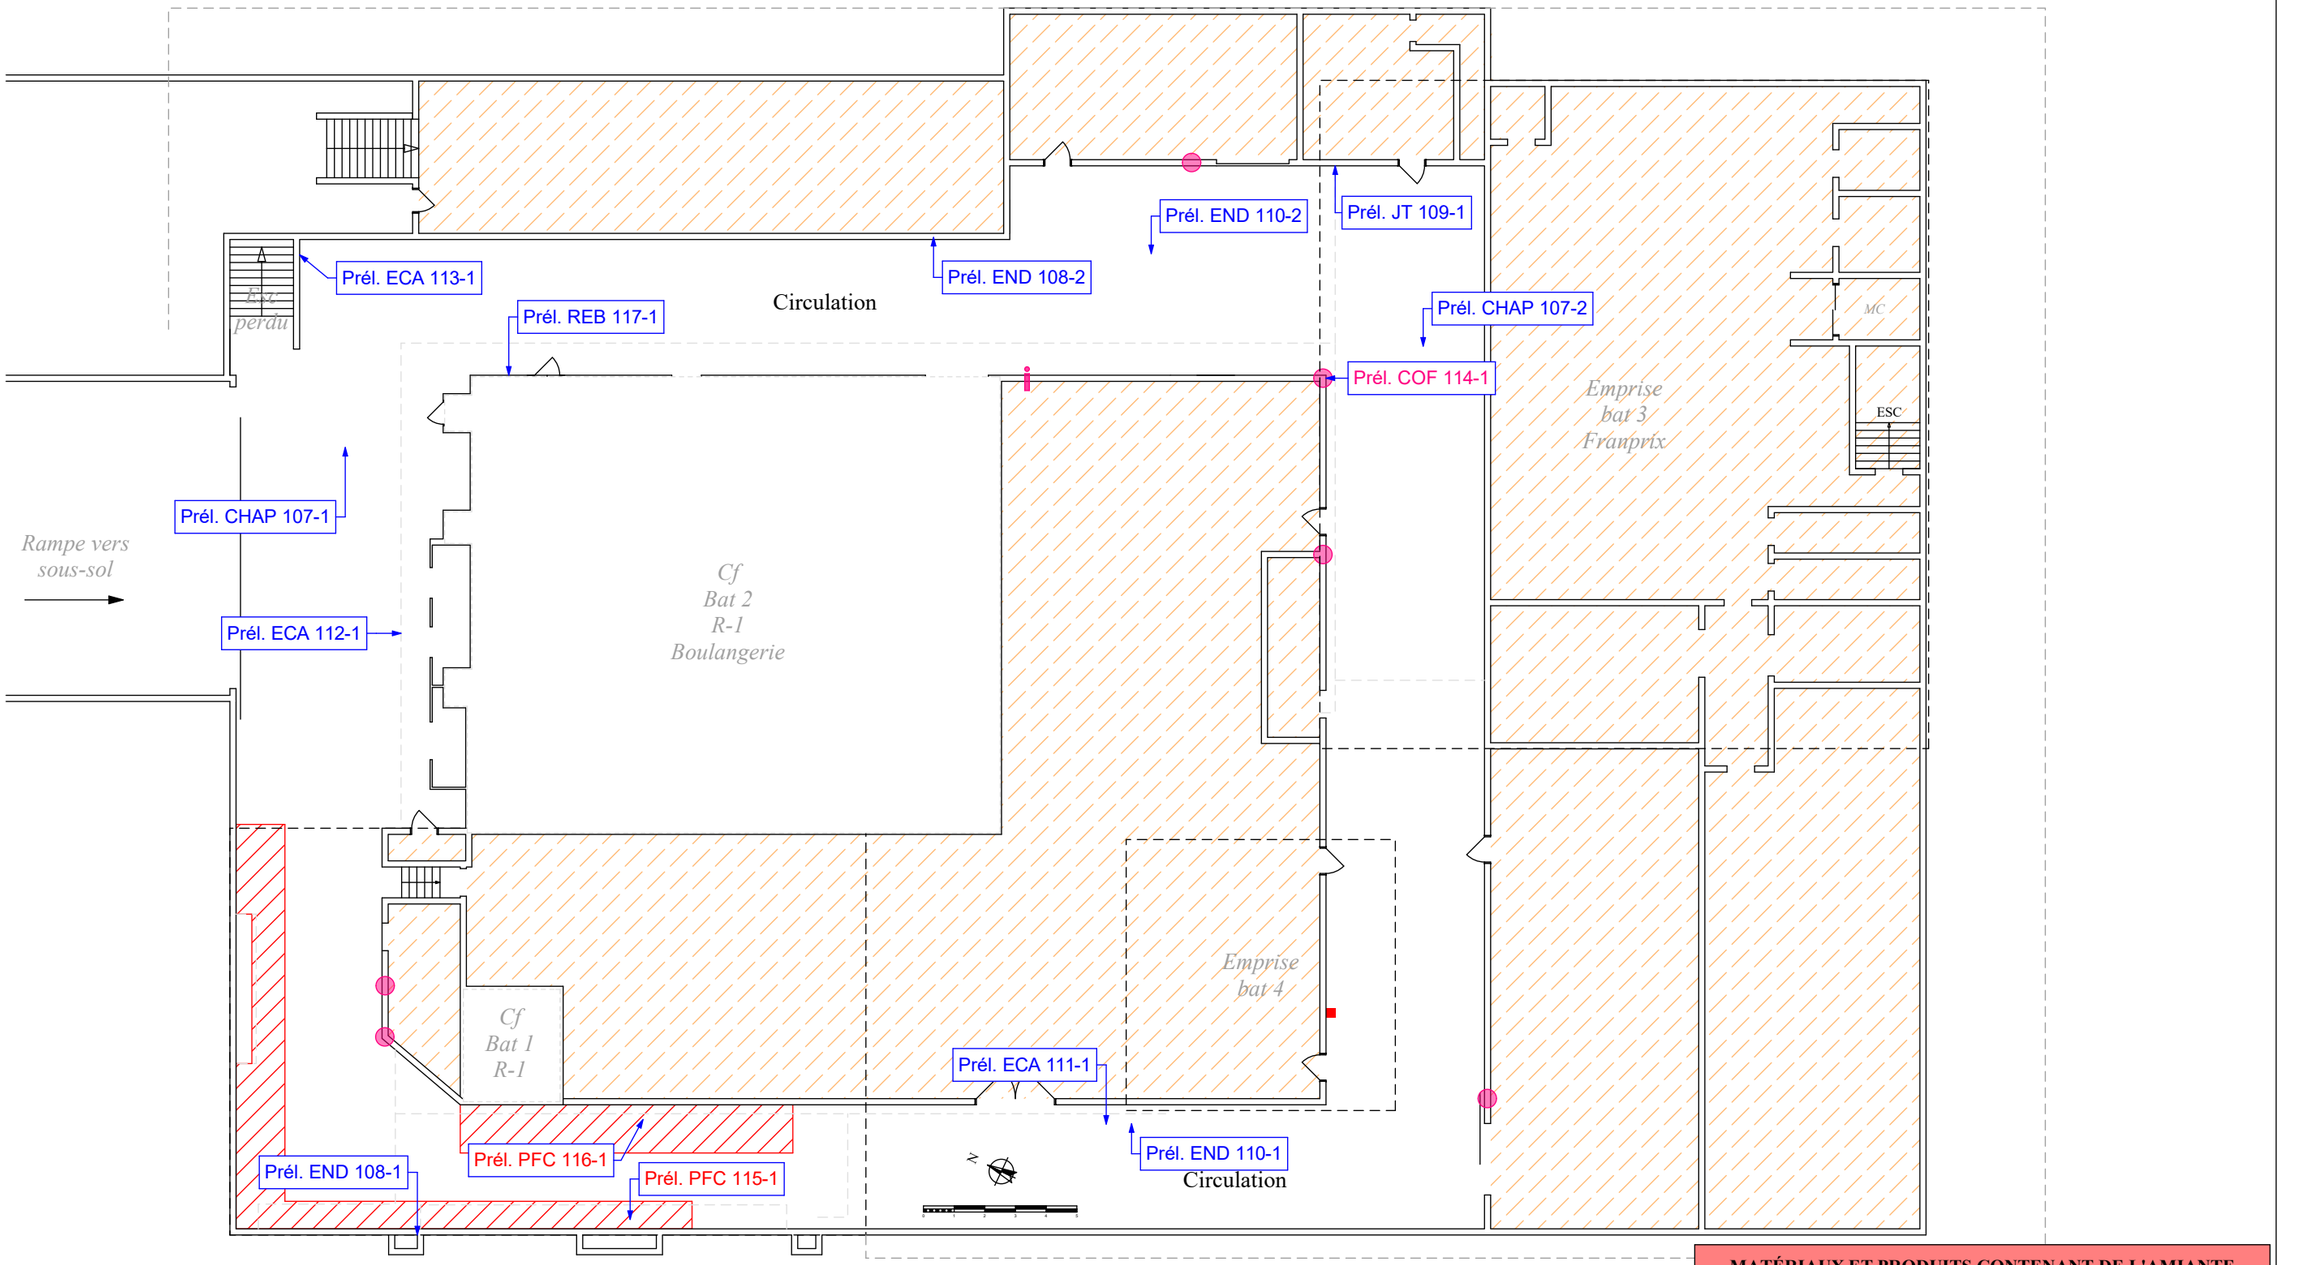

MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N°	Type	Descriptif	Légende	Quantité *(estimée)*
42	Conduit fibres-ciment	gris, 30x30		1 u.
48	Conduit fibres-ciment	rond, diamètre 15cm		2 u.
114	Coffrage perdu	rond diamètre 30cm		6 u.
115	Plaques fibres-ciment	type tôles ondulées en dépot		non quantifiable
116	Plaques fibres-ciment	type panneaux planes en dépot		non quantifiable

ANNEXE : CARTOGRAPHIE DES PRÉLÈVEMENTS, SONDAGES ET MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

QUALITAT EXPERTISES
92/98, Bd Victor Hugo 92110 CLICHY
01 41 27 93 47 courriel@qualitat.fr

Dossier	64342-2
Date	07/2025
Format : A3	Page : 14/14

ZAC du 8 mai 1945
91270 VIGNEUX SUR SEINE

ANNEXE

PROCES-VERBAUX DES ANALYSES DES ECHANTILLONS EN LABORATOIRE

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-26328 EN DATE DU 05/07/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : QUALITAT EXPERTISES - CLICHY 92 - 98 Bd Victor Hugo 92115 CLICHY	Réf. Commande ITGA : IT0725-26328 Réf. Commande Client : 64342-2

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 01/07/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE Réf échantillon client : BIT1-1 - Etanchéite bitumineuse avec couche aluminisé en pied de façades - BAT 2 / FACADES		Réf échantillon ITGA : IT072507-1784 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche d'aluminium et poussières	
Matériau bitumineux noir avec couche d'aluminium et poussières	META (B) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE Réf échantillon client : END2-1 - Enduit mortier gris épais sur murs maçonnés - BAT 2 / FACADES		Réf échantillon ITGA : IT072507-1785 Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène avec poussières	
Enduit compact gris hétérogène avec poussières	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1786	
Réf échantillon client : END2-2 - Enduit mortier gris épais sur murs maçonnés - BAT 1 / FACADES		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LYA (4)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1787	
Réf échantillon client : COL3-1 - Colle grise cilenteuse + joint épais gris sur parement en briquettes collées - BAT 2 / FACADES		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Joint cassant gris	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LYA
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1788	
Réf échantillon client : JT4-1 - Joint noir souple de finition sur menuiseries alu simple vitrage - BAT 2 / FACADES		Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières	
▸ Matériau souple noir avec poussières	META (B) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1789	
Réf échantillon client : END5-1 - Enduit beige plâtreux fin en sous face de plancher béton - BAT 2 / FACADES		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1790	
Réf échantillon client : JT6-1 - Joint mortier gris ciment épais sur maçonnerie en briques pleines - BAT 4 / FACADES		Description ITGA : Matériau compact gris et rouge hétérogène	
▸ Matériau compact gris et rouge hétérogène	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1791	
Réf échantillon client : JT6-2 - Joint mortier gris ciment épais sur maçonnerie en briques pleines - BAT 1 / FACADES		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact rouge hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène non séparable + Matériau compact rouge hétérogène non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1792	
Réf échantillon client : JT6-3 - Joint mortier gris ciment épais sur maçonnerie en briques pleines - BAT 1 / R-1 / TAXI PHONE		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact rouge hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène + Matériau compact rouge hétérogène	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1793	
Réf échantillon client : COL7-1 - Colle grise dure + joint gris sous faïence 10x10 beige - BAT 1 / FACADES		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle grise / Matériau gris hétérogène / Joint cassant gris	
Peintures multiples non séparable + Colle grise non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable + Joint cassant gris	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1794	
Réf échantillon client : END8-1 - Enduit mortier gris épais sur murs en béton - BAT 1 / FACADES		Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène	
Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1795	
Réf échantillon client : JT9-1 - Joint vitrier blanc dure en pourtour de vitrages simples sur allèges et fenêtres - BAT 1 / FACADES		Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac / Matériau métallique en faible quantité	
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LYA (3)
Matériau métallique en faible quantité	---	Non analysé	
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1796	
Réf échantillon client : MAS10-1 - Mastic blanc souple sur panneaux de bardages métalliques rapportés - BAT 1 / FACADES		Description ITGA : Matériau souple blanc avec poussières	
Matériau souple blanc avec poussières	META (B) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1797	
Réf échantillon client : END16-1 - Enduit beige fin de finition sur murs maçonnés - BAT 1 / FACADES		Description ITGA : Enduit beige en vrac hétérogène avec poussières	
Enduit beige en vrac hétérogène avec poussières	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1798	
Réf échantillon client : MAS18-1 - Mastic blanc souple en finition entre parement briques et éléments métalliques - BAT 2 / FACADES		Description ITGA : Matériau ocre avec poussières / Matériau souple blanc	
Matériau ocre avec poussières non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM (4)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1799	
Réf échantillon client : COL19-1 - Colle blanche + joint gris sous carrelage marron imitation parquet - BAT 2 / RDC / BOULANGERIE - COIFFURE		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture en faible quantité / Matériau compact gris / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Peinture en faible quantité non séparable + Matériau compact gris non séparable + Joint cassant gris	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1800	
Réf échantillon client : RAG20-1 - Ragréage rosé épais en finition sous tapis d'entrée - BAT 2 / RDC / BOULANGERIE - COIFFURE		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
Peinture en faible quantité non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1801	
Réf échantillon client : COL21-1 - Colle beige + joint gris sous carrelage marron, sous COL19 - BAT 2 / RDC / BOULANGERIE - COIFFURE		Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac / Joint cassant gris en faible quantité en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige en vrac + Joint cassant gris en faible quantité en vrac	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1802	
Réf échantillon client : COL22-1 - Colle beige + joint gris derrière plinthe marron imitation parquet - BAT 2 / RDC / BOULANGERIE - COIFFURE		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant gris	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1803	
Réf échantillon client : END23-1 - Enduit blanc plâtreux + bande beige en jonction de plaques de plâtre en doublage - BAT 2 / RDC / BOULANGERIE - COIFFURE		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1804	
Réf échantillon client : END23-2 - Enduit blanc plâtreux + bande beige en jonction de plaques de plâtre en doublage - BAT 2 / R-1 / BOULANGERIE		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1805	
Réf échantillon client : END24-1 - Enduit blanc plâtreux fin sur murs en béton - BAT 2 / RDC / BOULANGERIE - COIFFURE		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Carton / Matériau gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Carton non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1806	
Réf échantillon client : END24-2 - Enduit blanc plâtreux fin sur murs en béton - BAT 2 / R-1 / BOULANGERIE		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1807	
Réf échantillon client : END25-1 - Enduit blanc plâtreux fin sur poteaux en béton - BAT 2 / RDC / BOULANGERIE - COIFFURE		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1808	
Réf échantillon client : END26-1 - Enduit blanc plâtreux + bande beige en jonction de plaques de plâtre de plafond - BAT 2 / RDC / BOULANGERIE - COIFFURE		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LYA (4)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1809	
Réf échantillon client : END27-1 - Enduit blanc plâtreux fin sur plafond en béton - BAT 2 / RDC / BOULANGERIE - COIFFURE		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LYA (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1810	
Réf échantillon client : END27-2 - Enduit blanc plâtreux fin sur plafond en béton - BAT 2 / R-1 / BOULANGERIE		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LYA (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1811	
Réf échantillon client : PLB28-1 - Plaque bitumineuse noir sous évier - BAT 2 / RDC / BOULANGERIE - COIFFURE		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche souple	
Matériau bitumineux noir avec couche souple	META (B) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1812	
Réf échantillon client : COL29-1 - Colle grise dure + joint gris sous plinthes marron en carrelage - BAT 2 / RDC / BOULANGERIE - COIFFURE		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle grise / Matériau gris / Matériau rouge en faible quantité / Joint cassant gris	
▸ Peintures multiples + Colle grise non séparable + Matériau gris non séparable + Matériau rouge en faible quantité non séparable (2) + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1813	
Réf échantillon client : JT30-1 - Joint vitrier beige dure + mastic blanc souple sur vitrines simple vitrage en acier - BAT 2 / RDC / BOULANGERIE - COIFFURE		Description ITGA : Peinture / Matériau souple gris / Matériau compact gris	
▸ Peinture non séparable + Matériau souple gris non séparable + Matériau compact gris	META (B) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM (4)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1814	
Réf échantillon client : COL31-1 - Colle épaisse type mortier + joint gris sous carrelage mosaïque beige - BAT 2 / RDC / BOULANGERIE - COIFFURE		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Ragréage gris hétérogène / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise non séparable + Ragréage gris hétérogène non séparable + Joint cassant gris	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LYA (4)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1815	
Réf échantillon client : COL31-2 - Colle épaisse type mortier + joint gris sous carrelage mosaïque beige - BAT 2 / R-1 / BOULANGERIE		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène + Joint cassant gris	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LYA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1816	
Réf échantillon client : LIN32-1 - Linoleum souple imitation parquet foncé, pose libre - BAT 2 / RDC / BOULANGERIE - COIFFURE		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage marron en vrac	
Revêtement souple gris	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage marron en vrac non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1817	
Réf échantillon client : LC33-1 - Linoleum beige gris mouchetté + colle marron - BAT 2 / RDC / BOULANGERIE - COIFFURE		Description ITGA : Colle polymère jaune avec poussières / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune	
Colle polymère jaune avec poussières non séparable + Colle polymère jaune	META (B) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM (4)
Revêtement souple beige	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1818	
Réf échantillon client : COL34-1 - Colle grise + joint gris sous carrelage 50x50 beige marbré - BAT 2 / RDC / BOULANGERIE - COIFFURE		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Joint cassant gris	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1819	
Réf échantillon client : COL35-1 - Colle grise + joint gris derrière plinthes en carrelage 7x50 beige marbré - BAT 2 / RDC / BOULANGERIE - COIFFURE		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Papier en faible quantité / Joint cassant beige	
Peinture + Colle grise non séparable + Papier en faible quantité non séparable + Joint cassant beige non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1820	
Réf échantillon client : COL36-1 - Colle blanche plâtreuse en plot derrière doublage en plaques de plâtre et polystyrène - BAT 2 / RDC / BOULANGERIE - COIFFURE		Description ITGA : Colle blanche en vrac	
Colle blanche en vrac	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1821	
Réf échantillon client : COL36-2 - Colle blanche plâtreuse en plot derrière doublage en plaques de plâtre et polystyrène - BAT 2 / R-1 / BOULANGERIE		Description ITGA : Polystyrène expansé (billes) blanc avec poussières / Colle blanche	
Polystyrène expansé (billes) blanc avec poussières	---	Non analysé	
Colle blanche	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1822	
Réf échantillon client : END37-1 - Enduit blanc crépis sur murs - BAT 2 / RDC / BOULANGERIE - COIFFURE		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1823	
Réf échantillon client : END37-2 - Enduit blanc crépis sur murs - BAT 2 / R-1 / BOULANGERIE		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1824	
Réf échantillon client : END38-1 - Enduit ciment mortier entre menuiserie aluminium et bâtis - BAT 2 / RDC / BOULANGERIE - COIFFURE		Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène	
Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1825	
Réf échantillon client : COL39-1 - Colle grise + joint gris sous carrelage 30x30 noir, sur ragréage gris - BAT 2 / RDC / BOULANGERIE - COIFFURE		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Peinture non séparable + Joint cassant gris	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1826	
Réf échantillon client : COL40-1 - Colle blanche + joint gris sous carrelage 30x30 beige - BAT 2 / R-1 / BOULANGERIE		Description ITGA : Carrelage / Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières / Joint cassant gris en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + Joint cassant gris en vrac	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1827	
Réf échantillon client : COL41-1 - Colle beige + joint gris derrière faïence 15x15 blanche - BAT 2 / R-1 / BOULANGERIE		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau plâtreux blanc en vrac / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Joint cassant gris	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1828	
Réf échantillon client : COL42-1 - Conduit fibres-ciment gris, 30x30 - BAT 2 / R-1 / BOULANGERIE		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 04/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YCD
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1829	
Réf échantillon client : LC44-1 - Linoleum beige souple + colle translucide - BAT 2 / R-1 / BOULANGERIE		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune en faible quantité	
▸ Revêtement souple gris + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1830	
Réf échantillon client : END45-1 - Enduit-peinture rouge au sol, sur chape mortier - BAT 2 / R-1 / BOULANGERIE		Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-26328 EN DATE DU **05/07/2025**

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1831	
Réf échantillon client : COL46-1 - Colle beige + joint gris derrière faïence 15x15 blanche - BAT 2 / R-1 / BOULANGERIE		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Joint cassant gris	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1832	
Réf échantillon client : COL47-1 - Colle beige + joint gris derrière faïence 50x25 grise - BAT 2 / R-1 / BOULANGERIE		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Joint cassant gris	
Peinture + Colle beige non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1833	
Réf échantillon client : CO48-1 - Conduit fibres-ciment rond, diamètre 15 cm - BAT 2 / R-1 / BOULANGERIE		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 04/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : YCD

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) La quantité de la couche à disposition ne permet pas de garantir la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-26329 EN DATE DU 05/07/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : QUALITAT EXPERTISES - CLICHY 92 - 98 Bd Victor Hugo 92115 CLICHY	Réf. Commande ITGA : IT0725-26329 Réf. Commande Client : 64342-2

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 01/07/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE Réf échantillon client : COL49-1 - Colle blanche dure en plot derrière dalle de polystyrène collée au plafond - BAT 2 / R-1 / BOULANGERIE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1865 Description ITGA : Colle blanche / Polystyrène expansé (billes)	
Colle blanche non séparable + Polystyrène expansé (billes) non séparable	META (B) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE Réf échantillon client : END50-1 - Enduit blanc platreux fin + ciment sur poutres béton - BAT 2 / R-1 / BOULANGERIE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1866 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 04/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1867	
Réf échantillon client : NM51-1 - Nez de marche noirt caoutchouc sur escalier - BAT 2 / R-1 / BOULANGERIE		Description ITGA : Matériau souple noir / Colle polymère jaune en faible quantité / Peinture en faible quantité	
▸ Matériau souple noir	META (B) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
▸ Colle polymère jaune en faible quantité + Peinture en faible quantité non séparable	META (B) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1868	
Réf échantillon client : DCR52-1 - Dalle de sol fine rigide beige 30x30 + colle translucide + ragréage blanc fin - BAT 2 / R-1 / BOULANGERIE		Description ITGA : Revêtement cassant marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement cassant marron	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LYA
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LYA (4)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1869	
Réf échantillon client : CHAP53-1 - Chape mortier épaisse au sol - BAT 2 / R-1 / BOULANGERIE		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LYA
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1870	
Réf échantillon client : COL54-1 - Colle beige + joint beige fin derrière faience 15x15 blanche - BAT 2 / R-1 / BOULANGERIE		Description ITGA : Carrelage en vrac / Peinture / Colle beige / Joint cassant noir en vrac	
Carrelage en vrac	---	Non analysé	
▸ Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Joint cassant noir en vrac	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1871	
Réf échantillon client : COL55-1 - Colle blanche + joint gris sous carrelage beige dans escalier - BAT 2 / R-1 / BOULANGERIE		Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac	
▸ Colle beige en vrac	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM (3)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1872	
Réf échantillon client : COL56-1 - Colle grise + joint gris sous carrelage 20x20 beige - BAT 2 / R-1 / BOULANGERIE		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant gris en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant gris en vrac non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1873	
Réf échantillon client : COL57-1 - Colle grise + joint gris sous carrelage 20x20 blanc - BAT 2 / R-1 / BOULANGERIE		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1874	
Réf échantillon client : COL58-1 - Colle beige + joint beige sous plinthe en carrelage bleu/gris - BAT 2 / R-1 / BOULANGERIE		Description ITGA : Carrelage / Peinture / Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Peinture non séparable + Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1875	
Réf échantillon client : COL59-1 - Colle beige + joint gris derrière faience 10x20 blanche cassée - BAT 2 / R-1 / BOULANGERIE		Description ITGA : Carrelage / Peinture / Colle grise / Bois en faible quantité / Joint cassant gris en faible quantité en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Peinture non séparable + Colle grise non séparable + Bois en faible quantité non séparable + Joint cassant gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LYA (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1876	
Réf échantillon client : JT60-1 - Joint noir dure sur vannes - BAT 2 / R-1 / BOULANGERIE		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Matériau souple noir en faible quantité en vrac avec poussières	
Peinture en faible quantité non séparable + Matériau souple noir en faible quantité en vrac avec poussières non séparable	META (B) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1877	
Réf échantillon client : DC61-1 - Dalle de sol imitation parquet + colle translucide - BAT 1 / RDC / TAXI PHONE		Description ITGA : Revêtement cassant noir / Colle polymère incolore avec couche fibreuse et poussières	
Revêtement cassant noir + Colle polymère incolore avec couche fibreuse et poussières non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1878	
Réf échantillon client : LC62-1 - Linoléum souple imitation parquet + colle translucide - BAT 1 / RDC / TAXI PHONE		Description ITGA : Revêtement souple beige avec couche fibreuse et poussières / Colle polymère blanche	
Revêtement souple beige avec couche fibreuse et poussières + Colle polymère blanche non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1879	
Réf échantillon client : COL63-1 - Colle épaisse type mortier + joint gris sous carrelage mosaique beige - BAT 1 / RDC / TAXI PHONE		Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle grise en vrac hétérogène / Joint cassant gris en vrac	
Carrelage en vrac	---	Non analysé	
Colle grise en vrac hétérogène non séparable + Joint cassant gris en vrac non séparable	META (A) le 04/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1880	
Réf échantillon client : END64-1 - Enduit blanc platreux + bande beige en jonction de plaques de platre de doublage - BAT 1 / RDC / TAXI PHONE		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1881	
Réf échantillon client : END65-1 - Enduit blanc crépis sur murs - BAT 1 / RDC / TAXI PHONE		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton en faible quantité en vrac / Matériau compact gris en faible quantité en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Carton en faible quantité en vrac non séparable + Matériau compact gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1882	
Réf échantillon client : END66-1 - Enduit platreux fin + enduit mortier sur murs - BAT 1 / RDC / TAXI PHONE		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1883	
Réf échantillon client : COL67-1 - Colle blanche dure en plot derrière dalle de polystyrène collé au plafond - BAT 1 / RDC / TAXI PHONE		Description ITGA : Peintures multiples / Colle beige en vrac	
▸ Peintures multiples non séparable + Colle beige en vrac non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1884	
Réf échantillon client : END68-1 - Enduit blanc platreux fin sur plafond en béton - BAT 1 / RDC / TAXI PHONE		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris en faible quantité en vrac	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau compact gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 04/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSA (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1885	
Réf échantillon client : COL69-1 - Colle blanche + joint derrière faience 20x20 blanche - BAT 1 / RDC / TAXI PHONE		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant beige en faible quantité	
Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant beige en faible quantité non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1886	
Réf échantillon client : JT70-1 - Joint vitrier marron dure souple sur vitrines simple vitrage en acier - BAT 1 / RDC / TAXI PHONE		Description ITGA : Peinture / Matériau mou gris	
Peinture non séparable + Matériau mou gris non séparable	META (B) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1887	
Réf échantillon client : END71-1 - Enduit-Peinture gris sur chape mortier épaisse - BAT 1 / R-1 / TAXI PHONE		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris en faible quantité en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau compact gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1888	
Réf échantillon client : COL72-1 - Colle beige fine + joint beige derière faience 15x15 blanche - BAT 1 / R-1 / TAXI PHONE		Description ITGA : Carrelage / Peinture / Colle grise / Joint cassant beige en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
Peinture non séparable + Colle grise non séparable + Joint cassant beige en vrac non séparable	META (A) le 04/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1889	
Réf échantillon client : END73-1 - Enduit platrexu fin sur cloisons en carreaux de platre - BAT 1 / R-1 / TAXI PHONE		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac / Matériau compact gris en faible quantité en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Matériau compact gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1890	
Réf échantillon client : END74-1 - Enduit mortier gris épais sur murs maçonnés - BAT 1 / R-1 / TAXI PHONE		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Enduit compact gris en vrac hétérogène	
Peinture en faible quantité non séparable + Enduit compact gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1891	
Réf échantillon client : COL76-1 - Colle épaisse type mortier + joint gris sous carrelage beige 10x10 - BAT 1 /RDC / PASSAGE		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris / Carrelage / Colle grise hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau compact gris non séparable + Colle grise hétérogène non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1892	
Réf échantillon client : COL77-1 - Colle marron clair sous moquette - BAT 1 /RDC / PASSAGE		Description ITGA : Moquette marron / Colle polymère jaune	
Moquette marron + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1893	
Réf échantillon client : COL78-1 - Colle grise + joint gris sous carrelage 15x15 beige - BAT 3 / RDC / FRANPRIX		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse grise	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Couche plâtreuse grise	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1894	
Réf échantillon client : COL78-2 - Colle grise + joint gris sous carrelage 15x15 beige - BAT 3 / RDC / FRANPRIX		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Joint cassant	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Joint cassant	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1895	
Réf échantillon client : COL79-1 - Colle épaisse type mortier + joint gris sous carrelage mosaique bleue - BAT 3 / RDC / FRANPRIX		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LYA (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1896	
Réf échantillon client : COL79-2 - Colle épaisse type mortier + joint gris sous carrelage mosaique bleue - BAT 3 / RDC / FRANPRIX		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LYA
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1897	
Réf échantillon client : COL80-1 - Colle grise cimenteuse + joint gris derrière plinthe en carrelage bleu mouchetée 10x10 - BAT 3 / RDC / FRANPRIX		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène / Peinture en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène non séparable + Peinture en faible quantité non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LYA (4)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1898	
Réf échantillon client : COL80-2 - Colle grise cimenteuse + joint gris derrière plinthe en carrelage bleu mouchetée 10x10 - BAT 3 / RDC / FRANPRIX		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène / Peinture en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène non séparable + Peinture en faible quantité non séparable (2)	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LYA (4)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1899	
Réf échantillon client : END81-1 - Enduit mortier gris épais sur murs maçonnés - BAT 3 / RDC / FRANPRIX		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris en vrac hétérogène	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit compact gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LYA (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1900	
Réf échantillon client : END81-2 - Enduit mortier gris épais sur murs maçonnés - BAT 3 / RDC / FRANPRIX		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 04/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSA (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1901	
Réf échantillon client : COL82-1 - Colle bitumineuse noir en plot sur murs - BAT 3 / RDC / FRANPRIX		Description ITGA : Colle bitumineuse noire avec poussières	
Colle bitumineuse noire avec poussières	MOLP + META (B) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1902	
Réf échantillon client : COL83-1 - Colle blanche platreuse en plot derrière doublage en plaques de platre - BAT 3 / RDC / FRANPRIX		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris en faible quantité en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau compact gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 04/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSA (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1903	
Réf échantillon client : COL84-1 - Colle beige + joint beige fin derrière faience 10x10 blanche - BAT 3 / RDC / FRANPRIX		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle blanche / Matériau compact gris en faible quantité hétérogène / Joint cassant beige	
Peinture non séparable + Colle blanche non séparable + Matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable + Joint cassant beige non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA (4)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1904	
Réf échantillon client : COL85-1 - Colle beige + joint beige fin derrière faience 15x15 blanche - BAT 3 / RDC / FRANPRIX		Description ITGA : Peinture / Colle beige en vrac / Matériau compact gris en faible quantité en vrac hétérogène / Joint cassant beige en faible quantité en vrac	
▸ Peinture non séparable + Colle beige en vrac non séparable + Matériau compact gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + Joint cassant beige en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste(s) : LYA / ATH (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1905	
Réf échantillon client : COL86-1 - Colle beige + joint beige fin derrière faience petit format orangée - BAT 3 / RDC / FRANPRIX		Description ITGA : Carrelage / Colle beige hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige hétérogène	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LYA
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1906	
Réf échantillon client : LC87-1 - Linoléum souple imitation parquet + colle marron - BAT 3 / RDC / FRANPRIX		Description ITGA : Revêtement souple orange et noir / Colle polymère jaune en faible quantité / Bois aggloméré en faible quantité	
▸ Revêtement souple orange et noir	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
▸ Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Bois aggloméré en faible quantité non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1907	
Réf échantillon client : JT88-1 - Joint vitrier beige dure sur anciennes vitrines en acier - BAT 3 / RDC / FRANPRIX		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact beige	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LYA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1908	
Réf échantillon client : END89-1 - Enduit blanc platreux fin de lissage sur murs - BAT 3 / RDC / FRANPRIX		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau plâtreux rose en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau plâtreux rose en vrac non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1909	
Réf échantillon client : PV90-1 - Pare-vapeur bitumineux noir en sous face de ès de laine minérale en plénum - BAT 3 / RDC / FRANPRIX		Description ITGA : Papier bitumé avec poussières	
▸ Papier bitumé avec poussières	MOLP + META (B) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1910	
Réf échantillon client : COL92-1 - Colle en plkot blanc ancien fixation de plafond staff - BAT 3 / RDC / FRANPRIX		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Colle blanche en vrac avec couche en toile	
▸ Peinture en faible quantité non séparable (2) + Colle blanche en vrac avec couche en toile non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LYA (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1911	
Réf échantillon client : PA93-1 - Panneau staff en résidus ou encore en place - BAT 3 / RDC / FRANPRIX		Description ITGA : Peinture / Matériau compact blanc avec poussières / Fragments végétaux	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact blanc avec poussières non séparable + Fragments végétaux non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LYA (4)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1912	
Réf échantillon client : MAS94-1 - Mastic blanc en jonction gaines de ventilation en alu souple et gaines en acier rigide - BAT 3 / RDC / FRANPRIX		Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc	
▸ Peinture non séparable + Matériau souple blanc non séparable	META (B) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1913	
Réf échantillon client : JT95-1 - Joint de bride blanc en jonction réseaux eau et CTA - BAT 3 / RDC / FRANPRIX		Description ITGA : Matériau rose en vrac avec fibres visibles	
▸ Matériau rose en vrac avec fibres visibles	MOLP le 04/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YCD (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-26329 EN DATE DU **05/07/2025**

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1914	
Réf échantillon client : JT96-1 - Joint gris mortier sur plafond en briques - BAT 3 / RDC / FRANPRIX		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LYA

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) La quantité de la couche à disposition ne permet pas de garantir la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-26330 EN DATE DU 05/07/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : QUALITAT EXPERTISES - CLICHY 92 - 98 Bd Victor Hugo 92115 CLICHY	Réf. Commande ITGA : IT0725-26330 Réf. Commande Client : 64342-2

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 01/07/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE Réf échantillon client : END97-1 - Enduit blanc plâtreux + bande beige en jonction de plaques de plâtre des puits de lumière - BAT 3 / RDC / FRANPRIX		Réf échantillon ITGA : IT072507-1838 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec poussières	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec poussières non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE Réf échantillon client : JT98-1 - Joint noir fibreux sur porte coupe feu en bois - BAT 3 / RDC / FRANPRIX		Réf échantillon ITGA : IT072507-1839 Description ITGA : Matériau noir avec fibres / Bois en faible quantité	
Matériau noir avec fibres	MOLP + META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
Bois en faible quantité	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1840	
Réf échantillon client : JT99-1 - Joint vitrier beige en pourtout de simple vitrage sur porte intérieure en bois - BAT 3 / RDC / FRANPRIX		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact beige	
Peintures multiples non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1841	
Réf échantillon client : CA100-1 - Calorifuge noir mousse - BAT 3 / RDC / FRANPRIX		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Matériau noir en mousse / Poussières en faible quantité	
Peinture en faible quantité non séparable (2) + Matériau noir en mousse non séparable	META (B) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM (4)
Poussières en faible quantité	---	Non analysé	
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1842	
Réf échantillon client : JT101-1 - Joint noir rigide en jonction de la CTA et de la gaine de ventilation en acier - BAT 3 / RDC / FRANPRIX		Description ITGA : Matériau souple noir en vrac avec fibres visibles	
Matériau souple noir en vrac avec fibres visibles	MOLP le 05/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : PES (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1843	
Réf échantillon client : JT102-1 - Joint noir de finition sur trappes de visites de la CTA - BAT 3 / RDC / FRANPRIX		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Matériau compact noir en faible quantité en vrac	
Peinture en faible quantité non séparable (2) + Matériau compact noir en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1844	
Réf échantillon client : MAT103-1 - Courroie noir souple sur CTA - BAT 3 / RDC / FRANPRIX		Description ITGA : Matériau noir avec fibres	
Matériau noir avec fibres	MOLP + META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1845	
Réf échantillon client : CHAP104-1 - Chape mortier ciment sur marche et contremarché - BAT 3 / R-1 A RDC / ESCALIER		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1846	
Réf échantillon client : REB105-1 - Rebouchage blanc plâtreux en poutour des fixations main courant - BAT 3 / R-1 A RDC / ESCALIER		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris en faible quantité en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau compact gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1847	
Réf échantillon client : FL106-1 - Flocage gris cotonneux sur plafond et poutres béton - BAT 3 / R-1 A RDC / ESCALIER		Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières	
▸ Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LYA
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1848	
Réf échantillon client : CHAP107-1 - Chape dure grise cimenteuse au sol - R-1 / CIRCULATION		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1849	
Réf échantillon client : CHAP107-2 - Chape dure grise cimenteuse au sol - R-1 / CIRCULATION		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1850	
Réf échantillon client : END108-1 - Enduit ciment mortier de finition ponctuel sur murs béton - R-1 / CIRCULATION		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Enduit compact gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture en faible quantité non séparable (2) + Enduit compact gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1851	
Réf échantillon client : END108-2 - Enduit ciment mortier de finition ponctuel sur murs béton - R-1 / CIRCULATION		Description ITGA : Enduit compact gris en vrac hétérogène	
Enduit compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1852	
Réf échantillon client : JT109-1 - Joint gris ciment sur murs parpaing - R-1 / CIRCULATION		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1853	
Réf échantillon client : END110-1 - Enduit ciment gris de finition ponctuel (rebouchages) sur plafond béton - R-1 / CIRCULATION		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1854	
Réf échantillon client : END110-2 - Enduit ciment gris de finition ponctuel (rebouchages) sur plafond béton - R-1 / CIRCULATION		Description ITGA : Enduit compact gris en vrac hétérogène	
Enduit compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1855	
Réf échantillon client : ECA111-1 - Enveloppe de calorifuge plâtreuse avec trame textile + laine minérale - R-1 / CIRCULATION		Description ITGA : Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc / Matériau fibreux jaune	
Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau fibreux jaune non séparable	MOLP + META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LYA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-26330 EN DATE DU **05/07/2025**

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1856	
Réf échantillon client : ECA112-1 - Enveloppe de calorifuge bitumineuse avec trame textile + laine minérale - R-1 / CIRCULATION		Description ITGA : Matériau beige avec poussières / Toile fibreuse beige avec poussières / Couche bitumineuse noire / Matériau beige avec poussières	
▸ Matériau beige avec poussières non séparable + Toile fibreuse beige avec poussières non séparable + Couche bitumineuse noire + Matériau beige avec poussières non séparable	MOLP + META (B) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YCM (4)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1857	
Réf échantillon client : ECA113-1 - Enveloppe de calorifuge cartonnée beige + laine minérale en fourreau - R-1 / CIRCULATION		Description ITGA : Carton bitumé / Matériau fibreux beige avec poussières	
▸ Carton bitumé non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (B) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1858	
Réf échantillon client : COF114-1 - Coffrage perdu rond diamètre 30cm - R-1 / CIRCULATION		Description ITGA : Matériau gris en vrac avec fibres visibles	
▸ Matériau gris en vrac avec fibres visibles	MOLP le 04/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : YCD (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1859	
Réf échantillon client : PFC115-1 - Plaques fibres ciment type tôles ondulées en dépot - R-1 / CIRCULATION		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières	
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières	MOLP le 04/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YCD
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1860	
Réf échantillon client : PFC116-1 - Plaques fibres ciment type panneaux planes en dépot - R-1 / CIRCULATION		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières	
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières	MOLP le 04/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : YCD

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-26330 EN DATE DU **05/07/2025**

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1861	
Réf échantillon client : REB117-1 - Rebouchage blanc plâtreux ponctuel sur murs - R-1 / CIRCULATION		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris en faible quantité en vrac	
‣ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau compact gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1862	
Réf échantillon client : END118-1 - Enduit ciment mortier de finition ponctuel sur murs béton (rampe) - PARVIS		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
‣ Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1863	
Réf échantillon client : END119-1 - Enduit ciment beige de finition ponctuel sur murs béton - PARVIS		Description ITGA : Enduit compact gris en vrac hétérogène	
‣ Enduit compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 05/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : ZAC du 8 mai 1945 91270 VIGNEUX SUR SEINE		Réf échantillon ITGA : IT072507-1864	
Réf échantillon client : COF123-1 - Coffrage perdu carré, 15x15 - PARVIS		Description ITGA : Matériau compact gris avec fibres visibles avec poussières	
‣ Matériau compact gris avec fibres visibles avec poussières	MOLP le 04/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YCD

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) La quantité de la couche à disposition ne permet pas de garantir la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT252507-442_1 EN DATE DU 09/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBÉRÉMENT AJOUTÉ ET NATURELLEMENT PRÉSENT DANS LES MATÉRIAUX ET PRODUITS MANUFACTURÉS

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
QUALITAT EXPERTISES - CLICHY
92 - 98 Bd Victor Hugo
92115 CLICHY

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0725-26326
Échantillon ITGA : IT252507-442
Reçu au laboratoire le : 02/07/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	64342-2
Dossier client	ZAC du 8 Mai 1945 - 91270 VIGNEUX SUR SEINE
Échantillon	BIT11-1 - Enrobé bitumineux - Parvis

Description ITGA	Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic – Traitement chimique au chloroforme (méthode interne : IT 286)
- Phase granulaire – Traitement thermique et mécanique (méthode interne : IT 413)

- Pour l'analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement, réduction de la matrice et montage adapté sur lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour l'analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ET/OU

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de l'International Mineralogical Association - IMA) : Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT D'ESSAI N° IT252507-442_1 EN DATE DU 09/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DÉLIBÉRÉMENT AJOUTÉ ET NATURELLEMENT PRÉSENT DANS LES MATÉRIAUX ET PRODUITS MANUFACTURÉS

Résultat :

	Fraction Analysée	Données préparations		Données Analytiques		Résultat (2)	Variété d'amiante (2)	Éléments analytiques
		Nombre de préparations	Traitement	Techniques analytiques / Date d'analyse	Nombre de supports analytiques			
▶1	▶ Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux	Nombre de préparations : 1	Chimique	META le 08/07/2025	Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3)	---	Analyste : ABK
	▶ Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène(4)	Nombre de préparations : 3	Thermique et mécanique	META le 09/07/2025	Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (3)	---	Analyste : CJT

(1) Les fibres optiquement observables sont celles ayant un diamètre supérieur à 0.2 micromètre.
(2) Ce résultat porte sur l'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante inférieure à la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).
(4) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.

Validé par : Audrey LUTHRINGER - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT252507-443_1 EN DATE DU 09/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBÉRÉMENT AJOUTÉ ET NATURELLEMENT PRÉSENT DANS LES MATÉRIAUX ET PRODUITS MANUFACTURÉS

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
QUALITAT EXPERTISES - CLICHY
92 - 98 Bd Victor Hugo
92115 CLICHY

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0725-26326
Échantillon ITGA : IT252507-443
Reçu au laboratoire le : 02/07/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	64342-2
Dossier client	ZAC du 8 Mai 1945 - 91270 VIGNEUX SUR SEINE
Échantillon	BIT12-1 - Enrobé bitumineux - Parvis

Description ITGA	Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic – Traitement chimique au chloroforme (méthode interne : IT 286)
- Phase granulaire – Traitement thermique et mécanique (méthode interne : IT 413)

- Pour l'analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement, réduction de la matrice et montage adapté sur lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour l'analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ET/OU

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de l'International Mineralogical Association - IMA) : Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT D'ESSAI N° IT252507-443_1 EN DATE DU 09/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DÉLIBÉRÉMENT AJOUTÉ ET NATURELLEMENT PRÉSENT DANS LES MATÉRIAUX ET PRODUITS MANUFACTURÉS

Résultat :

	Fraction Analysée	Données préparations		Données Analytiques		Résultat (2)	Variété d'amiante (2)	Éléments analytiques
		Nombre de préparations	Traitement	Techniques analytiques / Date d'analyse	Nombre de supports analytiques			
▶1	▶ Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux	Nombre de préparations : 1	Chimique	META le 08/07/2025	Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3)	---	Analyste : ABK
	▶ Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène(4)	Nombre de préparations : 3	Thermique et mécanique	META le 09/07/2025	Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (3)	---	Analyste : CJT

(1) Les fibres optiquement observables sont celles ayant un diamètre supérieur à 0.2 micromètre.
(2) Ce résultat porte sur l'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante inférieure à la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).
(4) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.

Validé par : Audrey LUTHRINGER - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT252507-444_1 EN DATE DU 09/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBÉRÉMENT AJOUTÉ ET NATURELLEMENT PRÉSENT DANS LES MATÉRIAUX ET PRODUITS MANUFACTURÉS

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
QUALITAT EXPERTISES - CLICHY
92 - 98 Bd Victor Hugo
92115 CLICHY

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0725-26326
Échantillon ITGA : IT252507-444
Reçu au laboratoire le : 02/07/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	64342-2
Dossier client	ZAC du 8 Mai 1945 - 91270 VIGNEUX SUR SEINE
Échantillon	BIT13-1 - Enrobé bitumineux - Parvis

Description ITGA	Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic – Traitement chimique au chloroforme (méthode interne : IT 286)
- Phase granulaire – Traitement thermique et mécanique (méthode interne : IT 413)

- Pour l'analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement, réduction de la matrice et montage adapté sur lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour l'analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ET/OU

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de l'International Mineralogical Association - IMA) : Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT D'ESSAI N° IT252507-444_1 EN DATE DU 09/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DÉLIBÉRÉMENT AJOUTÉ ET NATURELLEMENT PRÉSENT DANS LES MATÉRIAUX ET PRODUITS MANUFACTURÉS

Résultat :

	Fraction Analysée	Données préparations		Données Analytiques		Résultat (2)	Variété d'amiante (2)	Éléments analytiques
		Nombre de préparations	Traitement	Techniques analytiques / Date d'analyse	Nombre de supports analytiques			
▶1	▶ Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux	Nombre de préparations : 1	Chimique	META le 08/07/2025	Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3)	---	Analyste : ABK
	▶ Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène(4)	Nombre de préparations : 3	Thermique et mécanique	META le 09/07/2025	Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (3)	---	Analyste : CJT

(1) Les fibres optiquement observables sont celles ayant un diamètre supérieur à 0.2 micromètre.
(2) Ce résultat porte sur l'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante inférieure à la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).
(4) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.

Validé par : Audrey LUTHRINGER - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT252507-445_1 EN DATE DU 09/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBÉRÉMENT AJOUTÉ ET NATURELLEMENT PRÉSENT DANS LES MATÉRIAUX ET PRODUITS MANUFACTURÉS

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
QUALITAT EXPERTISES - CLICHY
92 - 98 Bd Victor Hugo
92115 CLICHY

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0725-26326
Échantillon ITGA : IT252507-445
Reçu au laboratoire le : 02/07/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	64342-2
Dossier client	ZAC du 8 Mai 1945 - 91270 VIGNEUX SUR SEINE
Échantillon	BIT14-1 - Enrobé bitumineux - Parvis

Description ITGA	Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic – Traitement chimique au chloroforme (méthode interne : IT 286)
- Phase granulaire – Traitement thermique et mécanique (méthode interne : IT 413)

- Pour l'analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement, réduction de la matrice et montage adapté sur lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour l'analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ET/OU

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de l'International Mineralogical Association - IMA) : Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT D'ESSAI N° IT252507-445_1 EN DATE DU 09/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DÉLIBÉRÉMENT AJOUTÉ ET NATURELLEMENT PRÉSENT DANS LES MATÉRIAUX ET PRODUITS MANUFACTURÉS

Résultat :

	Fraction Analysée	Données préparations		Données Analytiques		Résultat (2)	Variété d'amiante (2)	Éléments analytiques
		Nombre de préparations	Traitement	Techniques analytiques / Date d'analyse	Nombre de supports analytiques			
▶1	▶ Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux	Nombre de préparations : 1	Chimique	META le 08/07/2025	Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3)	---	Analyste : ABK
	▶ Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène(4)	Nombre de préparations : 3	Thermique et mécanique	META le 09/07/2025	Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (3)	---	Analyste : CJT

(1) Les fibres optiquement observables sont celles ayant un diamètre supérieur à 0.2 micromètre.
(2) Ce résultat porte sur l'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante inférieure à la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).
(4) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.

Validé par : Audrey LUTHRINGER - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT252507-446_1 EN DATE DU 09/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBÉRÉMENT AJOUTÉ ET NATURELLEMENT PRÉSENT DANS LES MATÉRIAUX ET PRODUITS MANUFACTURÉS

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
QUALITAT EXPERTISES - CLICHY
92 - 98 Bd Victor Hugo
92115 CLICHY

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0725-26326
Échantillon ITGA : IT252507-446
Reçu au laboratoire le : 02/07/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	64342-2
Dossier client	ZAC du 8 Mai 1945 - 91270 VIGNEUX SUR SEINE
Échantillon	BIT15-1 - Enrobé bitumineux - Parvis

Description ITGA	Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic – Traitement chimique au chloroforme (méthode interne : IT 286)
- Phase granulaire – Traitement thermique et mécanique (méthode interne : IT 413)

- Pour l'analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement, réduction de la matrice et montage adapté sur lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour l'analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ET/OU

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de l'International Mineralogical Association - IMA) : Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT D'ESSAI N° IT252507-446_1 EN DATE DU 09/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DÉLIBÉRÉMENT AJOUTÉ ET NATURELLEMENT PRÉSENT DANS LES MATÉRIAUX ET PRODUITS MANUFACTURÉS

Résultat :

	Fraction Analysée	Données préparations		Données Analytiques		Résultat (2)	Variété d'amiante (2)	Éléments analytiques
		Nombre de préparations	Traitement	Techniques analytiques / Date d'analyse	Nombre de supports analytiques			
▶1	▶ Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux	Nombre de préparations : 1	Chimique	META le 08/07/2025	Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3)	---	Analyste : ABK
	▶ Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène(4)	Nombre de préparations : 3	Thermique et mécanique	META le 09/07/2025	Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (3)	---	Analyste : CJT

(1) Les fibres optiquement observables sont celles ayant un diamètre supérieur à 0.2 micromètre.
(2) Ce résultat porte sur l'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante inférieure à la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).
(4) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.

Validé par : Audrey LUTHRINGER - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT252507-447_1 EN DATE DU 09/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBÉRÉMENT AJOUTÉ ET NATURELLEMENT PRÉSENT DANS LES MATÉRIAUX ET PRODUITS MANUFACTURÉS

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
QUALITAT EXPERTISES - CLICHY
92 - 98 Bd Victor Hugo
92115 CLICHY

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0725-26326
Échantillon ITGA : IT252507-447
Reçu au laboratoire le : 02/07/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	64342-2
Dossier client	ZAC du 8 Mai 1945 - 91270 VIGNEUX SUR SEINE
Échantillon	BIT75-1 - Enrobé bitumineux - BAT 1 / RDC / PASSAGE

Description ITGA	Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic – Traitement chimique au chloroforme (méthode interne : IT 286)
- Phase granulaire – Traitement thermique et mécanique (méthode interne : IT 413)

- Pour l'analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement, réduction de la matrice et montage adapté sur lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour l'analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ET/OU

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de l'International Mineralogical Association - IMA) : Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT D'ESSAI N° IT252507-447_1 EN DATE DU 09/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DÉLIBÉRÉMENT AJOUTÉ ET NATURELLEMENT PRÉSENT DANS LES MATÉRIAUX ET PRODUITS MANUFACTURÉS

Résultat :

	Fraction Analysée	Données préparations		Données Analytiques		Résultat (2)	Variété d'amiante (2)	Éléments analytiques
		Nombre de préparations	Traitement	Techniques analytiques / Date d'analyse	Nombre de supports analytiques			
▶1	▶ Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux	Nombre de préparations : 1	Chimique	META le 08/07/2025	Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3)	---	Analyste : ABK
	▶ Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène(4)	Nombre de préparations : 3	Thermique et mécanique	META le 09/07/2025	Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (3)	---	Analyste : CJT

(1) Les fibres optiquement observables sont celles ayant un diamètre supérieur à 0.2 micromètre.
(2) Ce résultat porte sur l'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante inférieure à la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).
(4) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.

Validé par : Audrey LUTHRINGER - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT252507-448_1 EN DATE DU 09/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBÉRÉMENT AJOUTÉ ET NATURELLEMENT PRÉSENT DANS LES MATÉRIAUX ET PRODUITS MANUFACTURÉS

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
QUALITAT EXPERTISES - CLICHY
92 - 98 Bd Victor Hugo
92115 CLICHY

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0725-26326
Échantillon ITGA : IT252507-448
Reçu au laboratoire le : 02/07/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	64342-2
Dossier client	ZAC du 8 Mai 1945 - 91270 VIGNEUX SUR SEINE
Échantillon	BIT120-1 - Enrobé bitumineux - Parvis

Description ITGA	Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic – Traitement chimique au chloroforme (méthode interne : IT 286)
- Phase granulaire – Traitement thermique et mécanique (méthode interne : IT 413)

- Pour l'analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement, réduction de la matrice et montage adapté sur lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour l'analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ET/OU

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de l'International Mineralogical Association - IMA) : Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT D'ESSAI N° IT252507-448_1 EN DATE DU 09/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DÉLIBÉRÉMENT AJOUTÉ ET NATURELLEMENT PRÉSENT DANS LES MATÉRIAUX ET PRODUITS MANUFACTURÉS

Résultat :

	Fraction Analysée	Données préparations		Données Analytiques		Résultat (2)	Variété d'amiante (2)	Éléments analytiques
		Nombre de préparations	Traitement	Techniques analytiques / Date d'analyse	Nombre de supports analytiques			
▶1	▶ Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux	Nombre de préparations : 1	Chimique	META le 08/07/2025	Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3)	---	Analyste : ABK
	▶ Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène(4)	Nombre de préparations : 3	Thermique et mécanique	META le 09/07/2025	Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (3)	---	Analyste : CJT

(1) Les fibres optiquement observables sont celles ayant un diamètre supérieur à 0.2 micromètre.
(2) Ce résultat porte sur l'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante inférieure à la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).
(4) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.

Validé par : Audrey LUTHRINGER - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT252507-449_1 EN DATE DU 09/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBÉRÉMENT AJOUTÉ ET NATURELLEMENT PRÉSENT DANS LES MATÉRIAUX ET PRODUITS MANUFACTURÉS

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
QUALITAT EXPERTISES - CLICHY
92 - 98 Bd Victor Hugo
92115 CLICHY

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0725-26326
Échantillon ITGA : IT252507-449
Reçu au laboratoire le : 02/07/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	64342-2
Dossier client	ZAC du 8 Mai 1945 - 91270 VIGNEUX SUR SEINE
Échantillon	BIT121-1 - Enrobé bitumineux - Parvis

Description ITGA	Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic – Traitement chimique au chloroforme (méthode interne : IT 286)
- Phase granulaire – Traitement thermique et mécanique (méthode interne : IT 413)

- Pour l'analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement, réduction de la matrice et montage adapté sur lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour l'analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ET/OU

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de l'International Mineralogical Association - IMA) : Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT D'ESSAI N° IT252507-449_1 EN DATE DU 09/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DÉLIBÉRÉMENT AJOUTÉ ET NATURELLEMENT PRÉSENT DANS LES MATÉRIAUX ET PRODUITS MANUFACTURÉS

Résultat :

	Fraction Analysée	Données préparations		Données Analytiques		Résultat (2)	Variété d'amiante (2)	Éléments analytiques
		Nombre de préparations	Traitement	Techniques analytiques / Date d'analyse	Nombre de supports analytiques			
▶1	▶ Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux	Nombre de préparations : 1	Chimique	META le 08/07/2025	Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3)	---	Analyste : ABK
	▶ Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène(4)	Nombre de préparations : 3	Thermique et mécanique	META le 09/07/2025	Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (3)	---	Analyste : CJT

(1) Les fibres optiquement observables sont celles ayant un diamètre supérieur à 0.2 micromètre.
(2) Ce résultat porte sur l'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante inférieure à la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).
(4) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.

Validé par : Audrey LUTHRINGER - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT252507-450_1 EN DATE DU 09/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBÉRÉMENT AJOUTÉ ET NATURELLEMENT PRÉSENT DANS LES MATÉRIAUX ET PRODUITS MANUFACTURÉS

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
QUALITAT EXPERTISES - CLICHY
92 - 98 Bd Victor Hugo
92115 CLICHY

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0725-26326
Échantillon ITGA : IT252507-450
Reçu au laboratoire le : 02/07/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	64342-2
Dossier client	ZAC du 8 Mai 1945 - 91270 VIGNEUX SUR SEINE
Échantillon	BIT122-1 - Enrobé bitumineux - Parvis

Description ITGA	Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic – Traitement chimique au chloroforme (méthode interne : IT 286)
- Phase granulaire – Traitement thermique et mécanique (méthode interne : IT 413)

- Pour l'analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement, réduction de la matrice et montage adapté sur lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour l'analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ET/OU

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de l'International Mineralogical Association - IMA) : Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT D'ESSAI N° IT252507-450_1 EN DATE DU 09/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DÉLIBÉRÉMENT AJOUTÉ ET NATURELLEMENT PRÉSENT DANS LES MATÉRIAUX ET PRODUITS MANUFACTURÉS

Résultat :

	Fraction Analysée	Données préparations		Données Analytiques		Résultat (2)	Variété d'amiante (2)	Éléments analytiques
		Nombre de préparations	Traitement	Techniques analytiques / Date d'analyse	Nombre de supports analytiques			
▶1	▶ Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux	Nombre de préparations : 1	Chimique	META le 08/07/2025	Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3)	---	Analyste : ABK
	▶ Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène(4)	Nombre de préparations : 3	Thermique et mécanique	META le 09/07/2025	Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (3)	---	Analyste : CJT

(1) Les fibres optiquement observables sont celles ayant un diamètre supérieur à 0.2 micromètre.
(2) Ce résultat porte sur l'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante inférieure à la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).
(4) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.

Validé par : Audrey LUTHRINGER - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

ANNEXE

PROCES-VERBAUX DES ANALYSES HAP DES ECHANTILLONS EN LABORATOIRE

Cadre de référence : Directive 2008/98/CE relative aux déchets

La connaissance de la teneur en HAP d'un enrobés est rendue nécessaire pour déterminer la possibilité de le recycler à chaud ou à froid.

A titre informatif :
Le Guide d'acceptabilité des matériaux alternatifs SETRA 2011 évoque les seuils suivants en matière de traitement et réemploi des enrobés contenant des HAP :

- En dessous de 50 mg/kg, le matériau est considéré comme déchet inerte et réutilisable.
- Entre 50 mg/kg et 1000 mg/kg, le matériau ne peut pas être réutilisé à chaud ou à froid.
- Au-delà de 1000 mg/kg, le matériau est considéré comme déchet dangereux.

N°	Type matériau / produit	Localisation / ZPSO	Nb Prel	Conclusions amiante	Conclusions HAP
11	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en partie courante.	ABORDS EXTÉRIEURS	1	ABSENCE	Somme HAP inférieure à 50mg/kg
12	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en rustines.	ABORDS EXTÉRIEURS	1	ABSENCE	Somme HAP inférieure à 50mg/kg
13	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en partie courante,	ABORDS EXTÉRIEURS	1	ABSENCE	Somme HAP inférieure à 50mg/kg
14	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en rustines.	ABORDS EXTÉRIEURS	1	ABSENCE	Somme HAP inférieure à 50mg/kg
15	Enrobé bitumineux rouge, granulat moyen, épaisseur 3cm environ, en bandes.	ABORDS EXTÉRIEURS	1	ABSENCE	Somme HAP inférieure à 50mg/kg
75	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en partie courante.	BAT 1 / RDC / PASSAGE	1	ABSENCE	Somme HAP inférieure à 50mg/kg
120	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en partie courante.	ABORDS EXTÉRIEURS	1	ABSENCE	Somme HAP inférieure à 50mg/kg
121	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en partie courante.	ABORDS EXTÉRIEURS	1	ABSENCE	Somme HAP inférieure à 50mg/kg
122	Enrobé bitumineux noir, granulat moyen, épaisseur 5cm environ, en rebouchage.	ABORDS EXTÉRIEURS	1	ABSENCE	Somme HAP inférieure à 50mg/kg

ITGA
Agence de saint-etienne enrobes
44 rue Jean Huss
42000 Saint-Etienne
Tel. : 04.77.79.52.99
www.itga.fr - E-Mail : se@itga.fr

Accréditation n°1-1761
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole (C).

Rapport d'essai : KSP2507-0249-001_1 **Date :** 10 juillet 2025

Client :	**QUALITAT EXPERTISES - CLICHY**
Réf. commande :	64342-2 / IT0725-26326
Interlocuteur :	RESULTATS Qualitat
Adresse :	31 Rue de la garde 83140 SIX FOURS LES PLAGES

ITGA :

Date de réception des échantillons : 1 juillet 2025

Site de prélèvement : ZAC du 8 Mai 1945 - 91270 VIGNEUX SUR SEINE

Description : Enrobé bitumineux (x9)

Analyses demandées : Teneur en HAP

Observations : Prélèvements effectués par vos soins

La somme des 16 HAP est donnée à titre indicatif. Le résultat affiché est précédé du signe ≤ si la teneur d'au moins un des composés sur les 16 HAP prioritaires est en dessous de sa limite de quantification. Dans ce cas, la valeur de la limite de quantification est utilisée pour le calcul de la somme. Le résultat de la somme devient alors une indication par excès.

Saint-Etienne, le jeudi 10 juillet 2025

Le Cheffe d'équipe laboratoire
Sophie MAGNOLON

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à essais. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Teneur en HAP

MÉTHODE UTILISÉE

Norme(s) : Méthode interne IT 441
Matériau : Enrobé
Méthode de préparation : Broyage (<4mm) / Extraction par sonication / Concentration
Technique analytique : Chromatographie en phase gazeuse - Détection par spectrométrie de masse

PRÉLÈVEMENT

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

	BIT11-1	BIT120-1	BIT12-1
Emplacement	Enrobé bitumineux / Parvis Date de prélèvement : 23/06/2025	Enrobé bitumineux / Parvis Date de prélèvement : 23/06/2025	Enrobé bitumineux / Parvis Date de prélèvement : 23/06/2025

RÉSULTAT

TENEUR	LQ	I		BIT11-1	BIT120-1	BIT12-1
Naphtalène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Acénaphtylène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Acénaphtène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Fluorène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Phénanthrène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Anthracène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Fluoranthène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Pyrène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Benzo[a]anthracène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Chrysène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Benzo[b]fluoranthène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Benzo[k]fluoranthène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Benzo[a]pyrène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Indéno[1,2,3-c,d]pyrène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Dibenzo[a,h]anthracène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Benzo[g,h,i]pérylène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Somme 16 HAP			mg/kg	≤ 8,0	≤ 8,0	≤ 8,0

REMARQUES

- Date de préparation des échantillons : 09/07/2025
- LQ : limite de quantification. I : incertitude.

Teneur en HAP

MÉTHODE UTILISÉE

Norme(s) : Méthode interne IT 441
Matériau : Enrobé
Méthode de préparation : Broyage (<4mm) / Extraction par sonication / Concentration
Technique analytique : Chromatographie en phase gazeuse - Détection par spectrométrie de masse

PRÉLÈVEMENT

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

	BIT121-1	BIT122-1	BIT13-1
Emplacement	Enrobé bitumineux / Parvis Date de prélèvement : 23/06/2025	Enrobé bitumineux / Parvis Date de prélèvement : 23/06/2025	Enrobé bitumineux / Parvis Date de prélèvement : 23/06/2025

RÉSULTAT

TENEUR	LQ	I		BIT121-1	BIT122-1	BIT13-1
Naphtalène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Acénaphtylène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Acénaphtène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Fluorène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Phénanthrène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Anthracène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Fluoranthène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Pyrène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Benzo[a]anthracène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Chrysène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Benzo[b]fluoranthène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Benzo[k]fluoranthène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Benzo[a]pyrène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Indéno[1,2,3-c,d]pyrène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Dibenzo[a,h]anthracène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Benzo[g,h,i]pérylène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Somme 16 HAP			mg/kg	≤ 8,0	≤ 8,0	≤ 8,0

REMARQUES

- Date de préparation des échantillons : 09/07/2025
- LQ : limite de quantification. I : incertitude.

Teneur en HAP

MÉTHODE UTILISÉE

Norme(s) : Méthode interne IT 441
Matériau : Enrobé
Méthode de préparation : Broyage (<4mm) / Extraction par sonication / Concentration
Technique analytique : Chromatographie en phase gazeuse - Détection par spectrométrie de masse

PRÉLÈVEMENT

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

	BIT14-1	BIT15-1	BIT75-1
Emplacement	Enrobé bitumineux / Parvis Date de prélèvement : 23/06/2025	Enrobé bitumineux / Parvis Date de prélèvement : 23/06/2025	Enrobé bitumineux / BAT 1 / RDC / PASSAGE Date de prélèvement : 23/06/2025

RÉSULTAT

TENEUR	LQ	I		BIT14-1	BIT15-1	BIT75-1
Naphtalène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Acénaphtylène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Acénaphtène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Fluorène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Phénanthrène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Anthracène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Fluoranthène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Pyrène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Benzo[a]anthracène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Chrysène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Benzo[b]fluoranthène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Benzo[k]fluoranthène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Benzo[a]pyrène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Indéno[1,2,3-c,d]pyrène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Dibenzo[a,h]anthracène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Benzo[g,h,i]pérylène(C)	0,50	30%	mg/kg	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)	< 0,50 (LQ)
Somme 16 HAP			mg/kg	≤ 8,0	≤ 8,0	≤ 8,0

REMARQUES

- Date de préparation des échantillons : 09/07/2025
- LQ : limite de quantification. I : incertitude.
