ACT DIAG IMMO HSI MIDI PYRENEES
Immeuble Aurélien
29 avenue J.F. Champollion BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1

Dossier de diagnostics techniques

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition



Référence AMIDEMOL-E5851063-2401 14 avril 2026

Bien	Maison individuelle
Adresse	8 CHEMIN D'EMBROUYSSET 81270 ST SULPICE LA POINTE
Référence Cadastrale	B 924
Propriétaire	ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE Batiment 19 Parc Club du Millenaire 1025 Avenue Henri Becquerel 34000 MONTPELLIER
Demandeur	ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE Batiment 19 Parc Club du Millenaire 1025 Avenue Henri Becquerel 34000 MONTPELLIER

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Visité le 15/11/2024, 31/03/2026 par MARC BOUILLOT

Ce rapport original ne peut être reproduit sans notre autorisation et ne peut être utilisé de façon partielle.

Sommaire

Sommaire	2
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition	3
A. Informations générales	3
B. Cachet du diagnostiqueur	3
C. Programme de travaux	3
D. Programme de repérage	4
E. Conclusion(s)	4
F. Conditions de réalisation du repérage	5
G. Rapports précédents	6
H. Résultats détaillés du repérage	7
I. Déroulement du repérage	11
J. Éléments d'information	11
Annexe 1. Fiches d’identification et de cotation	13
Annexe 2. Croquis	27
Annexe 3. PV d'analyses	32
Annexe 4. Recommandations générales de sécurité	85
Annexe 5. Certificat de qualification	87
Annexe 6. Attestations d'assurance et sur l'honneur	88

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition

R. 1334-14, R. 1334-19, R. 1334-22, R. 1334-29-6 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ; Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage

Norme NF X 46-020 d'août 2017

A Informations générales

A.1 Désignation du bâtiment

Type de bien	Maison individuelle
Nom	EMBROUYSSET
Adresse	8 CHEMIN D'EMBROUYSSET 81270 ST SULPICE LA POINTE
Propriété de	ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE Batiment 19 Parc Club du Millenaire 1025 Avenue Henri Becquerel 34000 MONTPELLIER

A.2 Désignation du donneur d'ordre

Nom	ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
Adresse	Batiment 19 Parc Club du Millenaire 1025 Avenue Henri Becquerel 34000 MONTPELLIER
Qualité	

A.3 Exécution de la mission

Rapport n°	AMIDEMOL-E5851063-2401
Repérage réalisé le	15/11/2024, 31/03/2026
Par	MARC BOUILLOT
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par	DEKRA CERTIFICATION Centre d'Affaires La Boursidière Rue de la Boursidière – Porte I - 92350 LE PLESSIS ROBINSON
Numéro de certification de validation	DTI1944
Date d'obtention	5 septembre 2022
Date d'émission du rapport	14 avril 2026
Laboratoire d'analyses	DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES SUD OUEST
Numéro d'accréditation du laboratoire	1-6766
Adresse du laboratoire	34 chemin de l'Echut Bâtiment 5 - ZI En Jacca 31770 COLOMIERS
Organisme d'assurance professionnelle	SMA BTP – 8 rue Louis Armand CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15
Numéro de contrat d'assurance et date de validité	H98143W 7352000/2 148140 du 01/01/2026 au 31/12/2026

B Cachet du diagnostiqueur

Signature et Cachet de l'entreprise



Date d'établissement du rapport :

Fait à TOULOUSE le 14/04/2026
Nom du diagnostiqueur : MARC BOUILLOT

C Programme de travaux

La mission porte sur le repérage des éléments figurant dans la liste non exhaustive de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, figurant intégralement dans les tableaux A1 de la norme NF X 46-020 - août 2017 et dans la liste C de l'annexe 13-9 du CSP.

Démolition : Partielle du bien : ☐ Totale du bien : ☐



D Programme de repérage

Locaux et parties d'immeubles concernés ou impactés directement ou indirectement

Liste des ouvrages et parties d'ouvrages à inspecter

E Conclusion(s)

⚠ **Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Localisation	Élement	Matériaux ou produits	Critère de décision	ZPSO	Photo	Estimation quantité
RDC > Chambre	Fenêtre C	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	ZPSO 001		1 unité(s)
RDC > Cuisine 2	Fenêtre C	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	ZPSO 001		1 unité(s)
RDC > SDB	Fenêtre C	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	ZPSO 001		1 unité(s)
R+1 > Chambre 3	Sol	Sous-couches (carton, feutre...) des revêtements souples	Résultat d'analyse	ZPSO 002		10 m²
R+1 > Dégagement	Sol	Sous-couches (carton, feutre...) des revêtements souples	Résultat d'analyse	ZPSO 002		30 m²
R+1 > SBD	Plinthe	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse	ZPSO 003		4 ml
R+1 > WC	Plinthe	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse	ZPSO 003		4 ml

RDC > Garage 1	Chaudiére bois	Tresses	Résultat d'analyse			
R+1 > SBD	Mur B	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse			4 ml
R+1 > SBD	Mur C	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse			2 ml
R+1 > SBD	Plinthe	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse			4 ml
RDC > SDB	Faience	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse			10 ml
RDC > SDB	Faience	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse			10 ml
RDC > SDB	sol douche	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse			2 m²
RDC > Salle à manger	Plinthe	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse			15 ml

Liste des locaux non visités et justification

Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

F Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Le donneur d'ordre est tenu :

- de fournir les moyens d'accès nécessaires à mettre en oeuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes...) et d'en définir les conditions d'utilisation.
- de procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandées par l'opérateur

de repérage.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Il est à noter que les prélèvements indiqués (P...) figurant dans la colonne Réf. Prél./Sond. dans le tableau mentionnant les ZPSO, sont considérés comme des sondages selon la méthodologie normative.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Procédures de quantification de matériaux contenant de l'amiante :

Le mesurage permettant la quantification des matériaux et produits contenant de l'amiante, issu de l'obligation réglementaire de l'arrêté du 16 juillet 2019, n'est réalisé que sur les parties visibles et accessibles lors du repérage. Il est estimatif et ne préjuge pas des parties masquées dans les éléments structurels du bâtiment. La quantification sera indiquée en surface, en mètre linéaire ou en unité.

Date du repérage : 18/11/2024

Liste des écarts, adjonctions ou suppressions d'information de la norme :

Dans un souci de ne pas alourdir le rapport et d'en faciliter sa compréhension et sa lecture, l'accréditation COFRAC du laboratoire ayant réalisé l'analyse de nos prélèvements et son annexe technique ne sont pas annexés au présent rapport. Ces documents sont consultables et transmis sur demande auprès de votre interlocuteur en agence.

Informations sur les prélèvements :

A - Motifs qui ont pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe 1 de la norme NFX 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés :

Néant


B - Informations sur toutes les conditions existantes susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des sondages (environnement du matériau, contamination éventuelle,...) :

Néant

C - Informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle...) :

Néant

Sens du repérage pour évaluer un local :



G Rapports précédents

Aucun

H Résultats détaillés du repérage

Liste des locaux visités/non visités et justification

Nom	Etage	Visité	Justification
Extérieur		Oui	
Salle à manger	RDC	Oui	
Entrée	RDC	Oui	
Séjour	RDC	Oui	
Cuisine 1	RDC	Oui	
Couloir	RDC	Oui	
Cuisine 2	RDC	Oui	
Débarras 1	RDC	Oui	
Chambre	RDC	Oui	
SDB	RDC	Oui	
WC	RDC	Oui	
Garage 1	RDC	Oui	
Débarras 2	RDC	Oui	
Poulailler	RDC	Oui	
Chambre 1	R+1	Oui	
Dégagement	R+1	Oui	
Chambre 2	R+1	Oui	
Chambre 3	R+1	Oui	
SBD	R+1	Oui	
WC	R+1	Oui	
Chambre 4	R+1	Oui	
Chambre 5	R+1	Oui	
Terrasse	R+1	Oui	
Grenier	R+2	Oui	
Garage 2	RDC	Oui	

Description des revêtements en place au jour de la visite

Localisation	Élement	Matériaux ou produits
R+1 > Chambre 1	Fenêtre C	Bois
R+1 > Chambre 1	Fenêtre C	Peinture
R+1 > Chambre 1	Mur A	Brique
R+1 > Chambre 1	Mur A	Plâtre
R+1 > Chambre 1	Mur A	Tapisserie
R+1 > Chambre 1	Porte A	Bois
R+1 > Chambre 1	Porte A	Peinture

R+1 > Chambre 1	Fenêtre B	Bois
R+1 > Chambre 1	Fenêtre B	Peinture
R+1 > Chambre 2	Porte A	Bois
R+1 > Chambre 2	Porte A	Brut
R+1 > Chambre 3	Porte A	Bois
R+1 > Chambre 3	Porte A	Brut
R+1 > Chambre 3	Fenêtre C	Bois
R+1 > Chambre 3	Fenêtre C	Peinture
R+1 > Chambre 4	Porte A	Bois
R+1 > Chambre 4	Porte A	Brut
R+1 > Chambre 4	Double porte C	Bois
R+1 > Chambre 4	Double porte C	Brut
R+1 > Chambre 5	Porte A	Bois
R+1 > Chambre 5	Porte A	Brut
R+1 > Chambre 5	Double porte C	Bois
R+1 > Chambre 5	Double porte C	Brut
RDC > Couloir	Porte	Bois
RDC > Couloir	Porte	Brut
RDC > Cuisine 2	Porte A	Bois
RDC > Cuisine 2	Porte A	Brut
RDC > Débarras 2	Plafond	Bois
RDC > Débarras 2	Plafond	Brut
RDC > Débarras 2	Mur B	Brique
RDC > Débarras 2	Mur B	Brut
RDC > Débarras 2	Mur C	Brique
RDC > Débarras 2	Mur C	Brut
RDC > Débarras 2	Mur D	Brique
RDC > Débarras 2	Mur D	Brut
RDC > Débarras 2	Mur A	Brique
RDC > Débarras 2	Mur A	Brut
RDC > Débarras 2	Porte A	Métal
RDC > Débarras 2	Porte A	Peinture
RDC > Garage 1	Plafond	Brique
RDC > Garage 1	Plafond	Brut
RDC > Garage 1	Mur B	Brique
RDC > Garage 1	Mur B	Brut
RDC > Garage 1	Mur C	Brique
RDC > Garage 1	Mur C	Brut

RDC > Garage 1	Mur D	Brique
RDC > Garage 1	Mur D	Brut
RDC > Garage 1	Mur A	Brique
RDC > Garage 1	Mur A	Brut
RDC > Garage 1	Porte D	Métal
RDC > Garage 1	Porte D	Peinture
RDC > Garage 2	Sol	Béton
R+2 > Grenier	Plafond	Bois
R+2 > Grenier	Plafond	Brut
R+2 > Grenier	Mur D	Brique
R+2 > Grenier	Mur D	Brut
R+2 > Grenier	Mur A	Brique
R+2 > Grenier	Mur A	Brut
R+2 > Grenier	Mur B	Brique
R+2 > Grenier	Mur B	Brut
R+2 > Grenier	Mur C	Brique
R+2 > Grenier	Mur C	Brut
RDC > Poulailler	Plafond	Brut
RDC > Poulailler	Plafond	Béton
RDC > Poulailler	Mur A	Brut
RDC > Poulailler	Mur A	Béton
RDC > Poulailler	Porte A	Bois
RDC > Poulailler	Porte A	Brut
RDC > Poulailler	Mur B	Brut
RDC > Poulailler	Mur B	Béton
RDC > Poulailler	Mur C	Brut
RDC > Poulailler	Mur C	Béton
RDC > Poulailler	Mur D	Brut
RDC > Poulailler	Mur D	Béton
RDC > Salle à manger	Fenêtre C	PVC
RDC > Salle à manger	Fenêtre B	PVC
RDC > Séjour	Fenêtre D	PVC

La liste des ZPSO des matériaux ou produits contenant de l'amiante, sur décision de l'opérateur

Aucun

La liste des ZPSO des matériaux ou produits contenant de l'amiante, après analyse ou sondage

ZPSO	Localisation	Élement	Matériaux ou produits	Réf. Prél./Sond.	Estimation quantité

ZPSO 001	RDC > Chambre	Fenêtre C	Joints de mastic de vitrage		1 unité(s)
	RDC > Cuisine 2	Fenêtre C	Joints de mastic de vitrage	P035	1 unité(s)
	RDC > SDB	Fenêtre C	Joints de mastic de vitrage		1 unité(s)
ZPSO 002	R+1 > Chambre 3	Sol	Sous-couches (carton, feutre...) des revêtements souples		10 m²
	R+1 > Dégagement	Sol	Sous-couches (carton, feutre...) des revêtements souples	P043, P046	30 m²
ZPSO 003	R+1 > SBD	Plinthe	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P039	4 ml
	R+1 > WC	Plinthe	Colles et joints de carrelage ou de faïence		4 ml
-	RDC > Garage 1	Chaudiére bois	Tresses	P036	
	R+1 > SBD	Mur B	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P042	4 ml
		Mur C	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P041	2 ml
		Plinthe	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P040	4 ml
	RDC > SDB	Faience	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P028	10 ml
		Faience	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P029	10 ml
		sol douche	Colles et joints de carrelage	P030	2 m²
	RDC > Salle à manger	Plinthe	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P014, P015	15 ml

La liste des ZPSO des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas

ZPSO	Localisation	Élement	Matériaux ou produits	Critère de décision	Réf. Prél./Sond.
-	RDC > Chambre	Sol	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse	P019, P020
		Plinthe	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse	P021
	R+1 > Chambre 2	Fenêtre C	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	P048
		Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P047
		Plinthe	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse	P044, P045
	R+1 > Chambre 4	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P050
		Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P049
	RDC > Cuisine 1	Sol	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse	P001, P002
		Plinthe	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse	P003, P004
		Faience	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse	P005, P006
		Paillasse	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse	P007
	RDC > Cuisine 2	Sol	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse	P016, P017
		Plinthe	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse	P018
	RDC > Entrée	Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P011
		Plinthe	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse	P010
	Extérieur	Façade	Crépis extérieurs	Résultat d'analyse	P033, P034

	RDC > Garage 1	Fenêtre C	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	P031
		Chaudiére fioul	Joints bruleur	Résultat d'analyse	P032
	RDC > Garage 2	Sol	Béton	Résultat d'analyse	P052
		Fenêtre	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	P053
	R+1 > SBD	Sol	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse	P037, P038
	RDC > SDB	Sol	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse	P026, P027
	RDC > Salle à manger	Sol	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse	P012, P013
	RDC > Séjour	Mur C	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P009
		Mur D	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P008
	R+1 > Terrasse	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P051
	RDC > WC	Sol	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse	P022, P023
		Faience	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse	P024
		Faience	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse	P025

Liste des matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante

Aucun

I Déroulement du repérage

Eléments complémentaires au repérage

Présence de mobilier ou d'activité pendant le repérage ?	☐
Les plans du bâtiment ont-ils été fournis ?	☐
Le programme précis des travaux a t-il été transmis ?	☑
D'autres documents ont-ils été remis ?	☐
Commentaire Néant	

J Éléments d'information

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement

accessible sur le site Internet www.sinoe.org

ANNEXE 1 Fiches d'identification et de cotation

Prélèvement	P001
Pièce	RDC - Cuisine 1
Localisation	Sol
Matériaux	Colles et joints de carrelage
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P002
Pièce	RDC - Cuisine 1
Localisation	Sol
Matériaux	Colles et joints de carrelage
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

Prélèvement	P003
Pièce	RDC - Cuisine 1
Localisation	Plinthe
Matériaux	Colles et joints de carrelage ou de faïence
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P004
Pièce	RDC - Cuisine 1
Localisation	Plinthe
Matériaux	Colles et joints de carrelage ou de faïence
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

Prélèvement	P005
Pièce	RDC - Cuisine 1
Localisation	Faience
Matériaux	Colles et joints de carrelage ou de faïence
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P006
Pièce	RDC - Cuisine 1
Localisation	Faience
Matériaux	Colles et joints de carrelage ou de faïence
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

Prélèvement	P007
Pièce	RDC - Cuisine 1
Localisation	Paillasse
Matériaux	Colles et joints de carrelage
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P008
Pièce	RDC - Séjour
Localisation	Mur D
Matériaux	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P009
Pièce	RDC - Séjour
Localisation	Mur C
Matériaux	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P010
Pièce	RDC - Entrée
Localisation	Plinthe
Matériaux	Colles et joints de carrelage ou de faïence
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P011
Pièce	RDC - Entrée
Localisation	Mur D
Matériaux	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P012
Pièce	RDC - Salle à manger
Localisation	Sol
Matériaux	Colles et joints de carrelage
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P013
Pièce	RDC - Salle à manger
Localisation	Sol
Matériaux	Colles et joints de carrelage
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

Prélèvement	P014
Pièce	RDC - Salle à manger
Localisation	Plinthe
Matériaux	Colles et joints de carrelage ou de faïence
Date	15 novembre 2024
Résultat	Présence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P015
Pièce	RDC - Salle à manger
Localisation	Plinthe
Matériaux	Colles et joints de carrelage ou de faïence
Date	15 novembre 2024
Résultat	Présence d'amiante
Commentaire	

Prélèvement	P016
Pièce	RDC - Cuisine 2
Localisation	Sol
Matériaux	Colles et joints de carrelage
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P017
Pièce	RDC - Cuisine 2
Localisation	Sol
Matériaux	Colles et joints de carrelage
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

Prélèvement	P018
Pièce	RDC - Cuisine 2
Localisation	Plinthe
Matériaux	Colles et joints de carrelage ou de faïence
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P019
Pièce	RDC - Chambre
Localisation	Sol
Matériaux	Colles et joints de carrelage
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P020
Pièce	RDC - Chambre
Localisation	Sol
Matériaux	Colles et joints de carrelage
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

Prélèvement	P021
Pièce	RDC - Chambre
Localisation	Plinthe
Matériaux	Colles et joints de carrelage ou de faïence
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

Prélèvement	P022
Pièce	RDC - WC
Localisation	Sol
Matériaux	Colles et joints de carrelage
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P023
Pièce	RDC - WC
Localisation	Sol
Matériaux	Colles et joints de carrelage
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

Prélèvement	P024
Pièce	RDC - WC
Localisation	Faience
Matériaux	Colles et joints de carrelage ou de faïence
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P025
Pièce	RDC - WC
Localisation	Faience
Matériaux	Colles et joints de carrelage ou de faïence
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

Prélèvement	P026
Pièce	RDC - SDB
Localisation	Sol
Matériaux	Colles et joints de carrelage
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P027
Pièce	RDC - SDB
Localisation	Sol
Matériaux	Colles et joints de carrelage
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

Prélèvement	P028
Pièce	RDC - SDB
Localisation	Faience
Matériaux	Colles et joints de carrelage ou de faïence
Date	15 novembre 2024
Résultat	Présence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P029
Pièce	RDC - SDB
Localisation	Faience
Matériaux	Colles et joints de carrelage ou de faïence
Date	15 novembre 2024
Résultat	Présence d'amiante
Commentaire	

Prélèvement	P030
Pièce	RDC - SDB
Localisation	sol douche
Matériaux	Colles et joints de carrelage
Date	15 novembre 2024
Résultat	Présence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P031
Pièce	RDC - Garage 1
Localisation	Fenêtre C
Matériaux	Joints de mastic de vitrage
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P032
Pièce	RDC - Garage 1
Localisation	Chaudiére fioul
Matériaux	Joints bruleur
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P033
Pièce	Extérieur
Localisation	Façade
Matériaux	Crépis extérieurs
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P034
Pièce	Extérieur
Localisation	Façade
Matériaux	Crépis extérieurs
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

Prélèvement	ZPSO 001 - P035
Pièce	RDC - Cuisine 2
Localisation	Fenêtre C
Matériaux	Joints de mastic de vitrage
Date	15 novembre 2024
Résultat	Présence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P036
Pièce	RDC - Garage 1
Localisation	Chaudiére bois
Matériaux	Tresses
Date	15 novembre 2024
Résultat	Présence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P052
Pièce	RDC - Garage 2
Localisation	Sol
Matériaux	Béton
Date	31 mars 2026
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P053
Pièce	RDC - Garage 2
Localisation	Fenêtre
Matériaux	Joints de mastic de vitrage
Date	31 mars 2026
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P037
Pièce	R+1 - SBD
Localisation	Sol
Matériaux	Colles et joints de carrelage
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P038
Pièce	R+1 - SBD
Localisation	Sol
Matériaux	Colles et joints de carrelage
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

Prélèvement	ZPSO 003 - P039
Pièce	R+1 - SBD
Localisation	Plinthe
Matériaux	Colles et joints de carrelage ou de faïence
Date	15 novembre 2024
Résultat	Présence d'amiante
Commentaire	




Prélèvement	P040
Pièce	R+1 - SBD
Localisation	Plinthe
Matériaux	Colles et joints de carrelage ou de faïence
Date	15 novembre 2024
Résultat	Présence d'amiante
Commentaire	

Prélèvement	P041
Pièce	R+1 - SBD
Localisation	Mur C
Matériaux	Colles et joints de carrelage ou de faïence
Date	15 novembre 2024
Résultat	Présence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P042
Pièce	R+1 - SBD
Localisation	Mur B
Matériaux	Colles et joints de carrelage ou de faïence
Date	15 novembre 2024
Résultat	Présence d'amiante
Commentaire	

Prélèvement	ZPSO 002 - P043
Pièce	R+1 - Dégagement
Localisation	Sol
Matériaux	Sous-couches (carton, feutre...) des revêtements souples
Date	15 novembre 2024
Résultat	Présence d'amiante
Commentaire	

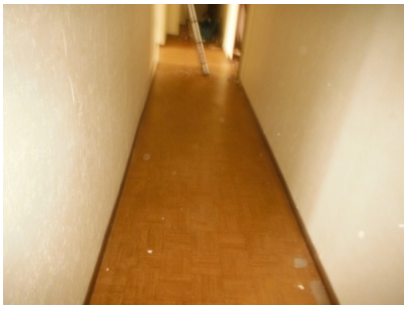

Prélèvement	P044
Pièce	R+1 - Chambre 2
Localisation	Plinthe
Matériaux	Colles non bitumineuses
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

Prélèvement	P045
Pièce	R+1 - Chambre 2
Localisation	Plinthe
Matériaux	Colles non bitumineuses
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

Prélèvement	P046
Pièce	R+1 - Dégagement
Localisation	Sol
Matériaux	Sous-couches (carton, feutre...) des revêtements souples
Date	15 novembre 2024
Résultat	Présence d'amiante
Commentaire	


Prélèvement	P047
Pièce	R+1 - Chambre 2
Localisation	Sol
Matériaux	Ragréages
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

Prélèvement	P048
Pièce	R+1 - Chambre 2
Localisation	Fenêtre C
Matériaux	Joints de mastic de vitrage
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

Prélèvement	P049
Pièce	R+1 - Chambre 4
Localisation	Sol
Matériaux	Ragréages
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	


Prélèvement	P050
Pièce	R+1 - Chambre 4
Localisation	Mur C
Matériaux	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

Prélèvement	P051
Pièce	R+1 - Terrasse
Localisation	Sol
Matériaux	Ragréages
Date	15 novembre 2024
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

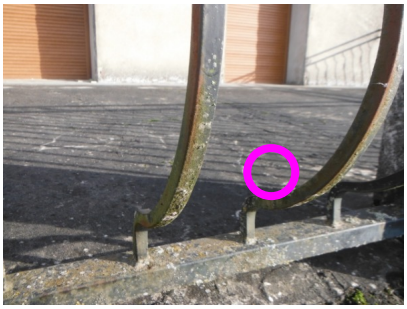

ANNEXE 2 Croquis

Planche de repérage usuel RDC		1/3
Référence	AMIDEMOL-E5851063-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / MARC BOUILLOT	
Adresse	8 CHEMIN D'EMBROUYSSET 81270 ST SULPICE LA POINTE	

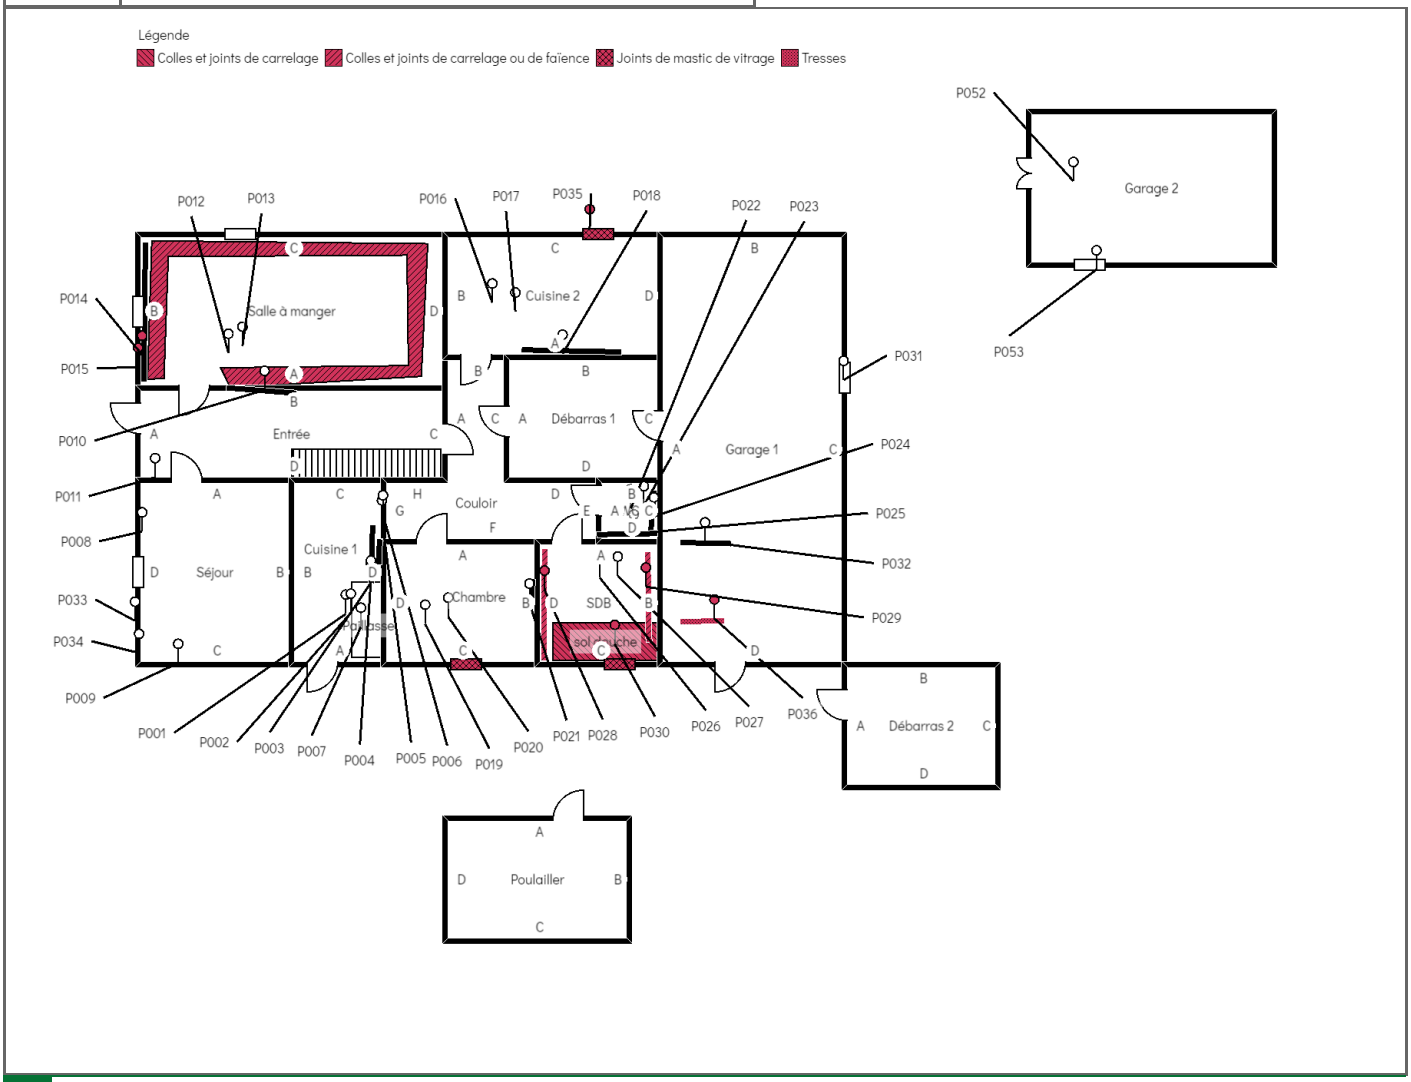

1/3 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - RDC

Prélèvements

P001 Cuisine 1 Sol
Colles et joints de carrelage

P002 Cuisine 1 Sol
Colles et joints de carrelage

P003 Cuisine 1 Plinthe
Colles et joints de carrelage ou de faïence

P004 Cuisine 1 Plinthe
Colles et joints de carrelage ou de faïence

P005 Cuisine 1 Faience
Colles et joints de carrelage ou de faïence

P006 Cuisine 1 Faience
Colles et joints de carrelage ou de faïence

P007 Cuisine 1 Paillasse
Colles et joints de carrelage

P008 Séjour Mur D
Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

P009 Séjour Mur C
Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés


P010 Entrée Plinthe
Colles et joints de carrelage ou de faïence

P011 Entrée Mur D
Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

P012 Salle à manger Sol
Colles et joints de carrelage

P013 Salle à manger Sol Colles et joints de carrelage	**P014 Salle à manger Plinthe** Colles et joints de carrelage ou de faïence	**P015 Salle à manger Plinthe** Colles et joints de carrelage ou de faïence
P016 Cuisine 2 Sol Colles et joints de carrelage	**P017 Cuisine 2 Sol** Colles et joints de carrelage	**P018 Cuisine 2 Plinthe** Colles et joints de carrelage ou de faïence
P019 Chambre Sol Colles et joints de carrelage	**P020 Chambre Sol** Colles et joints de carrelage	**P021 Chambre Plinthe** Colles et joints de carrelage ou de faïence
P022 WC Sol Colles et joints de carrelage	**P023 WC Sol** Colles et joints de carrelage	**P024 WC Faience** Colles et joints de carrelage ou de faïence
P025 WC Faience Colles et joints de carrelage ou de faïence	**P026 SDB Sol** Colles et joints de carrelage	**P027 SDB Sol** Colles et joints de carrelage
P028 SDB Faience Colles et joints de carrelage ou de faïence	**P029 SDB Faience** Colles et joints de carrelage ou de faïence	**P030 SDB sol douche** Colles et joints de carrelage
P031 Garage 1 Fenêtre C Joints de mastic de vitrage	**P032 Garage 1 Chaudiére fioul** Joints bruleur	**P033 Extérieur Façade** Crépis extérieurs
P034 Extérieur Façade Crépis extérieurs	**P035 Cuisine 2 Fenêtre C** Joints de mastic de vitrage **ZPSO 001**	**P036 Garage 1 Chaudiére bois** Tresses
P052 Garage 2 Sol Béton	**P053 Garage 2 Fenêtre** Joints de mastic de vitrage	

Planche de repérage usuel R+1		2/3
Référence	AMIDEMOL-E5851063-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / MARC BOUILLOT	
Adresse	8 CHEMIN D'EMBROUYSSET 81270 ST SULPICE LA POINTE	

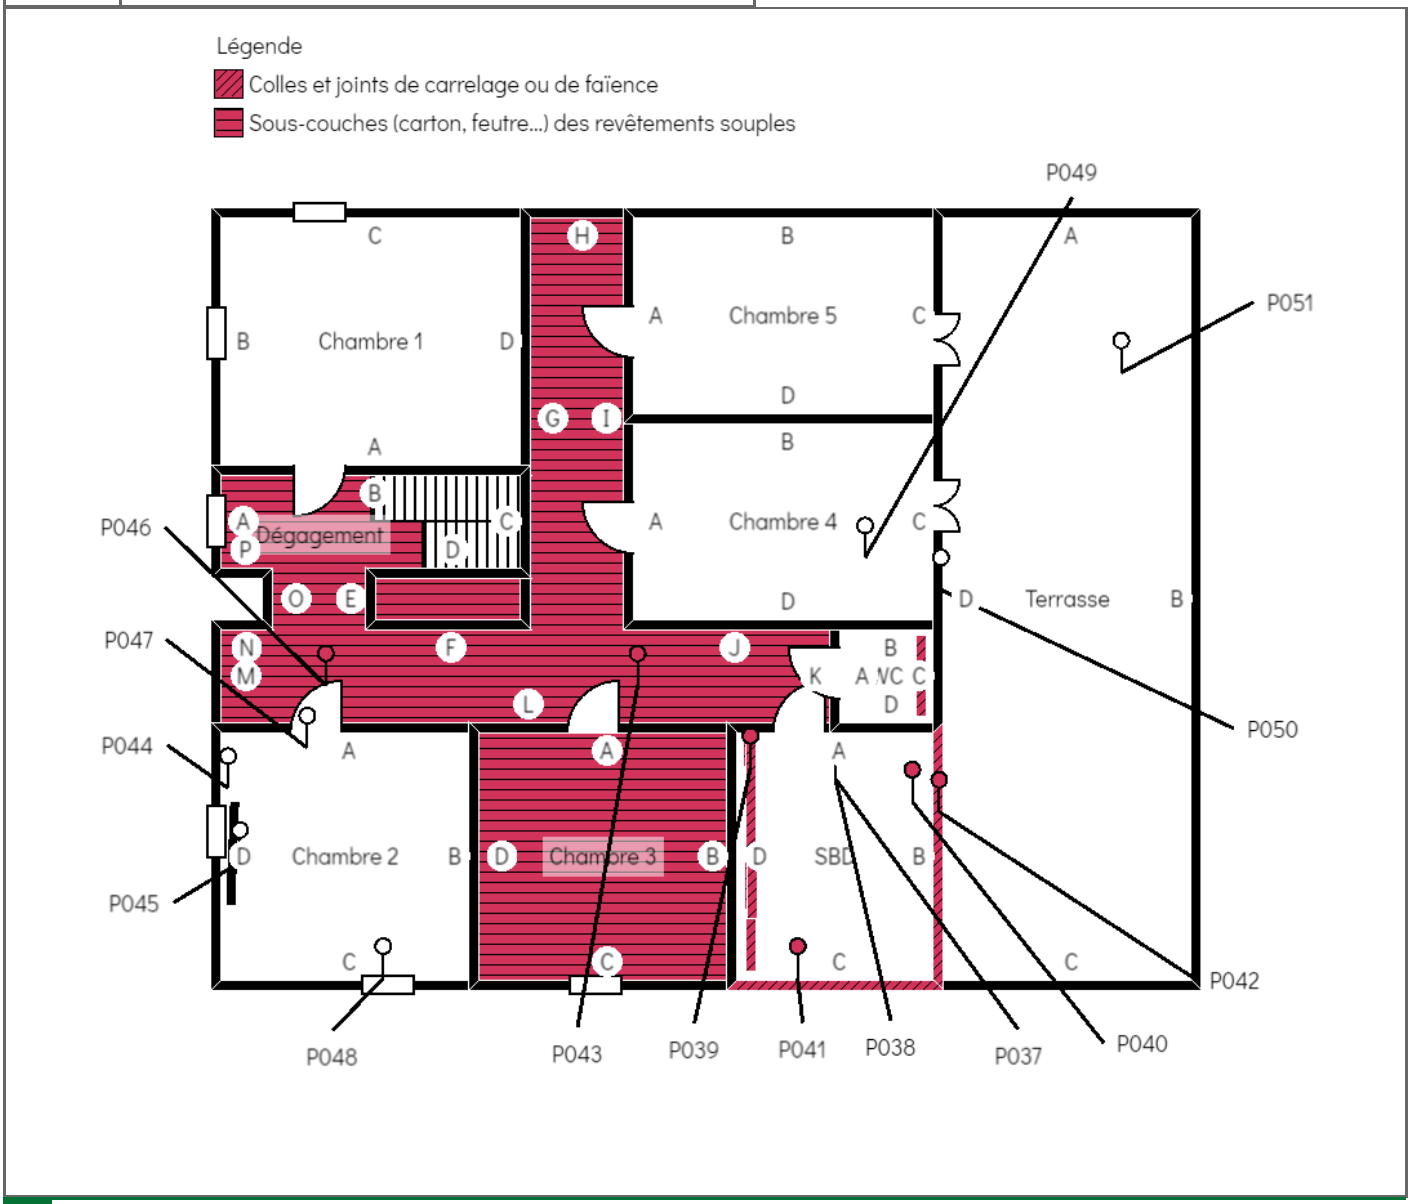

2/3 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - R+1

Prélèvements

P037 SBD Sol
Colles et joints de carrelage

P038 SBD Sol
Colles et joints de carrelage

P039 SBD Plinthe
Colles et joints de carrelage ou de faïence
ZPSO 003

P040 SBD Plinthe
Colles et joints de carrelage ou de faïence

P041 SBD Mur C
Colles et joints de carrelage ou de faïence

P042 SBD Mur B
Colles et joints de carrelage ou de faïence


P043 Dégagement Sol
Sous-couches (carton, feutre...) des revêtements souples
ZPSO 002

P044 Chambre 2 Plinthe
Colles non bitumineuses

P045 Chambre 2 Plinthe
Colles non bitumineuses

P046 **Dégagement Sol** Sous-couches (carton, feutre...) des revêtements souples	**P047 Chambre 2 Sol** Ragréages	**P048 Chambre 2 Fenêtre C** Joints de mastic de vitrage
P049 Chambre 4 Sol Ragréages	**P050 Chambre 4 Mur C** Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	**P051 Terrasse Sol** Ragréages

Planche de repérage usuel R+2		3/3
Référence	AMIDEMOL-E5851063-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / MARC BOUILLOT	
Adresse	8 CHEMIN D'EMBROUYSSET 81270 ST SULPICE LA POINTE	

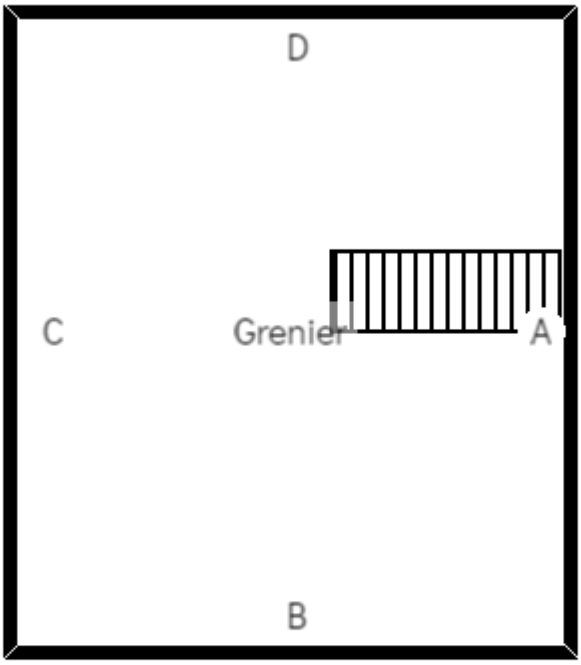

ANNEXE 3 PV d'analyses

P01 à P51.pdf 1/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956209 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806699

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	001	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage		
Localisation :	rdc, cuisine 1, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	joint	dur	gris	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 2/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956209 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806705

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	002	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage		
Localisation :	rdc, cuisine 1, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	joint	dur	gris	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 3/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956209 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806706

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	003	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage ou de faïence		
Localisation :	rdc, cuisine 1, plinthe		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	joint	dur	beige	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 4/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956209 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806707

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	004	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage ou de faïence		
Localisation :	rdc, cuisine 1, plinthe		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	joint	dur	beige	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 5/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956209 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806709

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	005	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage ou de faïence		
Localisation :	rdc, cuisine 1, faïence		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	joint	dur	beige	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 6/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956209 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806710

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	006	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage ou de faïence		
Localisation :	rdc, cuisine 1, faïence		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	joint	dur	beige	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 7/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956209 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806711

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	007	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage		
Localisation :	rdc, cuisine 1, paillasse		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	joint	dur	beige/noir	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 8/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956209 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806713

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	008	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	rdc, séjour, mur D		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	enduit	dur	beige/gris	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 9/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956209 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806714

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	009	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	rdc, séjour, mur C		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	peinture enduit	cassante dur	beige beige	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation
Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 10/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956209 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806715

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	010	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage ou de faïence		
Localisation :	rdc, entrée, plinthe		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	dure	beige/grise	MET	1	2	Non détecté
Couche(s) non analysée(s) :		carrelage					

Motif de couche(s) non analysée(s) : Matériau(x) non susceptible(s) de contenir de l'amiante.
Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 11/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956209 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806716

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	011	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	rdc, entrée, mur D		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	peinture enduit	cassante dur	jaune beige	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation
Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 12/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956209 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806717

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	012	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage		
Localisation :	rdc, salle à manger, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	joint	dur	gris	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 13/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696
liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956209 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806722

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	013	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage		
Localisation :	rdc, salle à manger, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	joint	dur	gris	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 14/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956209 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806723

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	014	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage ou de faïence		
Localisation :	rdc, salle à manger, plinthe		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	dure	grise/beige	MET	1	2	Chrysotile
Couche(s) non analysée(s) :		carrelage					

Motif de couche(s) non analysée(s) : Matériau(x) non susceptible(s) de contenir de l'amiante.
Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 15/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956209 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806725

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	015	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage ou de faïence		
Localisation :	rdc, salle à manger, plinthe		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	joint	dur	gris	MET	1	2	Chrysotile

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 16/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956209 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806726

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	016	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage		
Localisation :	rdc, cuisine 2, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Abdoulaye CAMARA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	joint	dur	gris	MET	1	6	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 17/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956209 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806729

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	017	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage		
Localisation :	rdc, cuisine 2, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	joint	dur	gris	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 18/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956209 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806731

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	018	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage ou de faïence		
Localisation :	rdc, cuisine 2, plinthe		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	dure	grise/beige	MET	1	2	Non détecté
Couche(s) non analysée(s) :		carrelage					

Motif de couche(s) non analysée(s) : Matériau(x) non susceptible(s) de contenir de l'amiante.
Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 19/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956209 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806732

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	019	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage		
Localisation :	rdc, chambre, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	joint	dur	gris	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 20/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696
liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956209 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806734

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	020	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage		
Localisation :	rdc, chambre, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	joint	dur	gris	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 21/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956267 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806748

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	021	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage ou de faïence		
Localisation :	rdc, chambre, plinthe		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	dur	blanc	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 22/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696
liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956267 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806756

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	022	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage		
Localisation :	rdc, wc, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	beton	dur	gris	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 23/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696
liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956267 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806757

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	023	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage		
Localisation :	rdc, wc, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	béton	dur	gris	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 24/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956267 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806759

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	024	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage ou de faïence		
Localisation :	rdc, wc, faïence		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	matériau	dur	blanc	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 25/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956267 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806760

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	025	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage ou de faïence		
Localisation :	rdc, wc, faïence		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	matériau	dur	blanc	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 26/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696
liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956267 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806762

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	026	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage		
Localisation :	rdc, sdb, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	béton	dur	gris	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 27/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696
liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956267 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806764

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	027	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage		
Localisation :	rdc, sdb, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	béton	dur	gris	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 28/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956267 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806766

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	028	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage ou de faïence		
Localisation :	rdc, sdb, faïence		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	dur	blanc	MET	1	2	Chrysotile

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 29/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956267 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806770

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	029	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage ou de faïence		
Localisation :	rdc, sdb, faïence		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	dur	blanc	MET	1	2	Chrysotile

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 30/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956267 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806777

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	030	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage		
Localisation :	rdc, sdb, douche		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	dur	gris	MET	1	2	Chrysotile

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 31/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956267 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806779

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	031	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	joints de mastic de vitrage		
Localisation :	rdc, garage, fenêtre C		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	joint	dur	beige	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 32/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696
liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956267 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806780

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	032	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	joint brûleur		
Localisation :	rdc, garage, chaudiére fioul		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	joint	mou	beige	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 33/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956267 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806783

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	033	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	crépis extérieurs		
Localisation :	extérieur, façade		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	enduit	dur	gris	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 34/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956267 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806785

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	034	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	crépis extérieurs		
Localisation :	extérieur, façade		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	enduit	dur	gris	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 35/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696
liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956267 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806786

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	035	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	joints de mastic de vitrage		
Localisation :	rdc, cuisine 2, fenêtre C		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	joint	dur	beige	MET	1	2	Chrysotile

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 36/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956267 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806788

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	036	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	tresses		
Localisation :	rdc, garage, chaudière bois		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1er octobre 2019– Norme HSG 248 Appendix 2
Après une recherche détaillée et complète sous stéréomicroscope, les fibres représentatives sont montées entre lame et lamelle dans un liquide à indice de réfraction approprié en vue d'une identification par microscope optique à lumière polarisée (MOLP). Préparation par traitement mécanique selon notre procédure interne LAB/TEC/PR/002.

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 22/11/24 Par : DPA/Robin PANVERT

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE						
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	tresse	fibreuse	gris	MOLP	2	Chrysotile

La couche peut renfermer une teneur inférieure à la la limite de détection garantie de fibres d'amiante optiquement observable. Pour être observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2µm.
Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 37/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956267 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806791

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	037	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage		
Localisation :	étage 1, SBD, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	dur	gris	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 38/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696
liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956267 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806793

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	038	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage		
Localisation :	étage 1, SBD, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	dur	gris	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 39/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956267 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806795

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	039	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage ou de faïence		
Localisation :	étage 1, SBD, plinthe		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	dur	blanc	MET	1	2	Chrysotile

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 40/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956267 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 20

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806796

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	040	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage ou de faïence		
Localisation :	étage 1, SBD, plinthe		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	dur	blanc	MET	2	4	Chrysotile

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 41/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956329 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 11

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806812

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	041	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage ou de faïence		
Localisation :	étage 1, SBD, mur C		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	dur	blanc	MET	1	2	Chrysotile

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 42/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956329 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 11

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806813

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	042	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage ou de faïence		
Localisation :	étage 1, SBD, mur B		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Abderrahim OUAYA

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	dur	blanc	MET	2	6	Chrysotile

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 43/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956329 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 11

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806819

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	043	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	sous-coues (cartone, feutre...) des revêtements souples		
Localisation :	étage 1, dégagement, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1er octobre 2019– Norme HSG 248 Appendix 2

Après une recherche détaillée et complète sous stéréomicroscope, les fibres représentatives sont montées entre lame et lamelle dans un liquide à indice de réfraction approprié en vue d'une identification par microscope optique à lumière polarisée (MOLP). Préparation par traitement mécanique selon notre procédure interne LAB/TEC/PR/002.

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/11/24 Par : DPA/Robin PANVERT

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE						
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	revêtement	souple et fibreux	beige	MOLP	2	Chrysotile

La couche peut renfermer une teneur inférieure à la la limite de détection garantie de fibres d'amiante optiquement observable. Pour être observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2µm.
Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 44/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956329 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 11

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806822

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	044	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles non bitumineuses		
Localisation :	étage 1, chambre 2, plinthe		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Marielle BRUCHET

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	matériau colle	dur souple	rose jaune	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.
Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 45/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696
liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956329 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 11

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806824

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	045	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	colles non bitumineuses		
Localisation :	étage 1, chambre 2, plinthe		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	matériau colle	dur souple	rose jaune	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Risque de contamination croisée entre les couches.
Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 46/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956329 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 11

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806826

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	046	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	sous-couches (cartone, feutre...) des revêtements souples		
Localisation :	étage 1, dégagement, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1er octobre 2019– Norme HSG 248 Appendix 2

Après une recherche détaillée et complète sous stéréomicroscope, les fibres représentatives sont montées entre lame et lamelle dans un liquide à indice de réfraction approprié en vue d'une identification par microscope optique à lumière polarisée (MOLP). Préparation par traitement mécanique selon notre procédure interne LAB/TEC/PR/002.

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 22/11/24 Par : DPA/Robin PANVERT

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE						
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	revêtement	souple et fibreux	beige	MOLP	2	Chrysotile

La couche peut renfermer une teneur inférieure à la la limite de détection garantie de fibres d'amiante optiquement observable. Pour être observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2µm.
Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 47/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956329 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 11

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806828

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	047	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	ragréages		
Localisation :	étage 1, chambre 2, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	ragréage	dur	gris	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 48/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956329 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 11

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806829

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	048	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	peinture, bois, joints de mastic de vitrage		
Localisation :	étage 1, chambre 2, fenêtre C		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	joint	dur	beige	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 49/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696
liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956329 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 11

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806831

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	049	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	ragréages		
Localisation :	étage 1, chambre 4, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	ragréage	dur	gris	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 50/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956329 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 11

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806833

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	050	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	étage 1, chambre 4, mur C		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	enduit	dur	blanc	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

P01 à P51.pdf 51/51

DEKRA prélèvements & analyses

DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-6696 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D'EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

Rapport d'essai N° 1956329 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 11

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1806838

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	MARC BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	20/11/24
Référence de l'échantillon :	051	Date de prélèvement :	15/11/24
Description de l'échantillon :	ragréages		
Localisation :	étage 1, terrasse, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris - Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette
Date d'analyse : 25/11/24 Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	ragréage	dur	gris	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 26/11/24
Par DPA/Robin PANVERT
Responsable production

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

PV_E5851063-2401_P052_N.pdf

DPA
Analyses pour le Bâtiment Toulouse
DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse SAS
Siège social : Site de la Géraudière
rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 Nantes
SAS au capital social de 20 000,00 Euros
Siret : 991 257 866 00012– code APE 7120B
RCS : 991 257 866
N° Intracommunautaire : FR87991257866
Analyse-Toulouse@dpa-construction.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION 1-10029
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

Rapport d'essai N° 2202100 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 2

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 5010353

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	Marc BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné le :	01/04/26		
Référence de l'échantillon :	P052	Date de prélèvement :	31/03/26
Description de l'échantillon :	Béton		
Localisation :	RDC, garage 2, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Rapport établis dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du premier octobre 2019. (modifié par l'arrêté du 3 juin 2025) – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Dans le cadre des essais en microscopie électronique à transmission (MET) deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de l'Echut – Bât 5 - Z.I En Jacca - 31770 COLOMIERS
Date d'analyse : 02/04/26 Par : DPA/Maxime CLAU

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	béton	dur(e)	gris(e)	MET	1	1	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 02/04/26
Par DPA/Maxime CLAU
Technicien de laboratoire

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DPA Analyses pour le bâtiment. Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole * .

PV_E5851063-2401_P053_N.pdf

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse SAS
Siège social : Site de la Géraudière
rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 Nantes
SAS au capital social de 20 000,00 Euros
Siret : 991 257 866 00012– code APE 7120B
RCS : 991 257 866
N° Intracommunautaire : FR87991257866
Analyse-Toulouse@dpa-construction.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION 1-10029

DEKRA INDUSTRIAL
MIDI PYRENEES - CDP 6004
IMMEUBLE AURELIEN
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
A l'attention de Jerome RABIER

E5851063-2401
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
8 CHEMIN D EMBROUYSSET
81270 ST SULPICE LA POINTE

Rapport d'essai N° 2202100 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 2

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 5010354

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	Marc BOUILLOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné le :	01/04/26		
Référence de l'échantillon :	P053	Date de prélèvement :	31/03/26
Description de l'échantillon :	Joints de mastic de vitrage		
Localisation :	RDC, garage 2, fenêtre		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Rapport établis dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du premier octobre 2019. (modifié par l'arrêté du 3 juin 2025) – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Dans le cadre des essais en microscopie électronique à transmission (MET) deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de l'Echut – Bât 5 - Z.I En Jacca - 31770 COLOMIERS

Date d'analyse : 02/04/26 Par : DPA/Maxime CLAU

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	joint	dur(e)	gris(e)	MET	1	1	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 02/04/26
Par DPA/Maxime CLAU
Technicien de laboratoire

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DPA Analyses pour le bâtiment. Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole * .

ANNEXE 4 Recommandations générales de sécurité

Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29- 5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
– perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
– remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
– travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,

dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les ravaux sont réalisés, c'est-à- dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :
– de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de- France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
– du conseil général (ou conseil régional en Ile-de- France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
– de la mairie ;
– ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

ANNEXE 5 Certificat de qualification



CERTIFICAT

DE COMPETENCES

Diagnostiqueur immobilier certifié

DEKRA Certification certifie que Monsieur

Marc BOUILLOT

est titulaire du certificat de compétences N°**DTI1944** pour :

Constat de risque d'exposition au plomb du 25/09/2022 au 24/09/2029
Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Diagnostic amiante sans mention du 05/09/2022 au 04/09/2029
Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Diagnostic amiante avec mention du 05/09/2022 au 04/09/2029
Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Etat relatif à la présence de termites (France hexagonale) du 31/10/2022 au 30/10/2029
Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Diagnostic de performance énergétique du 26/09/2022 au 25/09/2029
Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 16 juin 2025

Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments du 26/09/2022 au 25/09/2029
Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 16 juin 2025

Etat de l'installation intérieure de gaz du 22/11/2022 au 21/11/2029
Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Etat de l'installation intérieure d'électricité du 17/12/2023 au 16/12/2030
Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

01KFAP9NFSH4AM56CQ0QN0CZXM

Yvan MAINGUY
Directeur Général
Le Plessis-Robinson, le 28/03/2026

Diagnostiqueur immobilier certifié * DEKRA

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES
Accréditation n° 4-0081
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Avertissement : le périmètre de certification décrit dans le présent document est valable au jour de son émission. En cours de cycle de certification, ce périmètre pouvant évoluer, seules font foi les informations disponibles en ligne sur l'annuaire national des diagnostiqueurs techniques immobiliers mis à jour quotidiennement *(https://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/index.action).*

Le non-respect des clauses contractuelles peut rendre ce certificat invalide

DEKRA Certification SAS – www.dekra-certification.fr
Immeuble La Boursidière - Porte I - Rue de la Boursidière - 92350 Le Plessis-Robinson – France

ANNEXE 6 Attestations d'assurance et sur l'honneur

SMA BTP

Notre référence à rappeler dans toute correspondance :

N° de sociétaire : H98143W
N° de contrat : 7352000/2 148140
N° de SIREN : 433 250 834

DEKRA INDUSTRIAL SAS
PA LIMOGES Sud orange
19 rue Stuart Mill
CS 70308
87008 – LIMOGES CEDEX

Pour tout renseignement, contacter :

SMABTP Grands Comptes Entreprises
8, rue Louis Armand - CS 71201
75738 Paris Cedex 15
Tél : 01.40.59.70.00

ATTESTATION D'ASSURANCE

Contrat d'assurance GLOBAL INGENIERIE

Période de validité : du 01/01/2026 au 31/12/2026

SMA SA ci-après désigné l'assureur atteste que l'assuré désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat d'assurance professionnelle GLOBAL INGENIERIE, numéro **H98143W 7352000/2 148140.**

1 – PERIMETRE DES MISSIONS PROFESSIONNELLES GARANTIES

Missions bénéficiant des garanties d'assurance de responsabilité civile

Les missions suivantes sont garanties par le présent contrat :

- Diagnostic de présence d'amiante dans les bâtiments.
- Assistance technique amiante.
- Mesures d'empoussièrement amiante.
- Coordination SPS lors de chantiers de désamiantage.
- Conseil et accompagnement amiante.
- Prélèvements et analyses de tout type de matériaux, air, sol, boues, rapports d'analyse, surveillance de l'air sur le lieu de travail, logiciels de suivi des analyses et des données de chantier.
- Mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les matériels roulants ferroviaires ;
- - Mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les aéronefs retirés du service avant leur démantèlement ;

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand ● CS 71201 ● 75738 PARIS Cedex 15 ● Tél . : + 33 (0)1 40 59 70 00 ● **smabtp.fr**

- - Mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en oeuvre d'une activité ;
- - Mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers.

2- GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

La garantie objet du présent paragraphe s'applique :

- aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à l'occasion de l'exploitation de sa société pour l'exercice de son activité ;
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.
- aux dommages survenant dans le Monde entier hors USA et CANADA.

Nature de la garantie	Montants de garantie
Tous Dommages confondus : 15 000 000 € par sinistre dont	
Dommages corporels	15 000 000 € par sinistre
Dommages matériels et immatériels	15 000 000 € par sinistre
- dont dommages immatériels non consécutifs	6 000 000 € par sinistre

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand ● CS 71201 ● 75738 PARIS Cedex 15 ● Tél . : + 33 (0)1 40 59 70 00 ● **smabtp.fr**

SMA BTP

3 - GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Cette garantie a vocation à couvrir les dommages causés aux tiers relevant de la responsabilité civile professionnelle de l'assuré en dehors des dispositions relevant des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la garantie décennale.

La garantie objet du présent paragraphe s'applique :

- aux missions professionnelles listées aux paragraphes 1 ci-avant ;
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.
- aux dommages survenant dans le Monde entier hors USA et CANADA.

Nature de la garantie	Montant de garantie
Tous Dommages confondus : 15 000 000 € par sinistre et par an dont	
Dommages corporels	15 000 000 € par sinistre et par an
Dommages matériels et immatériels	15 000 000 € par sinistre et par an
- dont dommages immatériels non consécutifs	6 000 000 € par sinistre et par an
- dont dommages aux biens confiés	5 000 000 € par sinistre et par an
Garantie amiante (*Garantie des seuls dommages immatériels non consécutifs à un sinistre directement ou indirectement dû ou lié à l'amiante ou à un autre matériau contenant de l'amiante*)	4 000 000 € par sinistre et par an
Limite pour tous dommages confondus d'atteinte à l'environnement y compris ceux dus ou liés à l'amiante	1 000 000 € par sinistre et par an
Responsabilité environnementale (*pour les dommages survenus pendant la période de validité de la présente attestation et constatés pendant cette même période)*	150 000 € par sinistre et par an

---

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère.

Fait à Paris,
Le 17/12/2025.

Le Président du Directoire



SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand ● CS 71201 ● 75738 PARIS Cedex 15 ● Tél . : + 33 (0)1 40 59 70 00 ● **smabtp.fr**

Notre référence à rappeler dans toute correspondance :

N° de sociétaire : H98143W
N° de contrat : 7352000/2 148140
N° de SIREN : 433 250 834

DEKRA INDUSTRIAL SAS
PA LIMOGES Sud orange
19 rue Stuart Mill
CS 70308
87008 – LIMOGES CEDEX

Pour tout renseignement, contacter :

SMABTP Grands Comptes Entreprises
8, rue Louis Armand - CS 71201
75738 Paris Cedex 15
Tél : 01.40.59.70.00

ATTESTATION D'ASSURANCE

Contrat d'assurance GLOBAL INGENIERIE

Période de validité : du 01/01/2026 au 31/12/2026

SMA SA ci-après désigné l'assureur atteste que l'assuré désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat d'assurance professionnelle GLOBAL INGENIERIE, numéro **H98143W 7352000/2 148140.**

1 – PERIMETRE DES MISSIONS PROFESSIONNELLES GARANTIES

Missions bénéficiant des garanties d'assurance de responsabilité civile

Les missions suivantes sont garanties par le présent contrat :

- Contrôleur technique.

  Agréé par décision du 26 juillet 1982 au tire des dispositions du décret 78.1146 pour l'intégralité du domaine objet de l'obligation d'assurance instituée par la Loi n° 78.12 du 4 janvier 1978 et à tous les textes suivants qui sont venus le préciser ou le modifier. Conformément à la norme NF P03-100 du 20 septembre 1995 et aux dispositions législatives et règlementaires qui figurent aux articles L 111-23 à L 11-26 et R 111-29 à R 111-42 du Code de la Construction et de l'Habitation.

- Activités de maîtrise d'œuvre et bureau d'étude technique pour la réalisation d'ouvrages et d'installations d'assainissements destinés à desservir des bâtiments dans le domaine de l'industrie et des collectivités.

- Activités de maîtrise d'œuvre en installations thermiques et climatiques.

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand ● CS 71201 ● 75738 PARIS Cedex 15 ● Tél . : + 33 (0)1 40 59 70 00 ● **smabtp.fr**

- Activités de coordinateur et maîtrise d'œuvre SSI.

- Contrôle dans tous les domaines de la construction, de la prévention, de la sécurité, de la fiabilité, de la coordination, de l'assistance, de la maintenance, comportant toutes opérations, missions et prestations de conseils, audits, études, expertises, analyses, diagnostics, enquêtes, constats, contrôles, vérifications, formation, information, y compris les diagnostics et contrôles de présence de plomb, radon et insectes, et ce sur tous biens meubles et immeubles, y compris les ouvrages de génie civil, les équipements, les installations, les remontées mécaniques, les systèmes de sécurité incendie, les navires notamment pour la délivrance de certificats sanitaires, et y compris leurs implications sur l'environnement.

- Conseils et accompagnement amiante et plomb, Stratégie de Prélèvements, Prélèvements et Analyses de tout type de matériaux, air, sols, boues, Rapports d'analyses Surveillance de l'air sur le lieu du travail, logiciels de suivi des analyses et des données de chantier.

- Formation, information, animation, assistance à destination du personnel des entreprises dans les domaines suivants : système sécurité incendie, hygiène et sécurité dans le travail, plans de prévention, audit de conformité du patrimoine bâti, coordination sécurité-santé, mines et carrières.

- Coordinateur « sécurité protection de la santé », coordination SSI, examinateur « qualitel », chargé de sécurité pyrotechnique, mesures de perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments et des réseaux aérauliques.

- Assistance, conseils, audits, études, dans les domaines suivants : sûreté de fonctionnement d'équipements et installations, ingénierie qualité, optimisation de la performance en production et maintenance.

- Études, formations, informations et assistances techniques, administratives et financières aux maîtres d'ouvrages dans les domaines liés à l'environnement (eau, air, sol, déchets), en ce comprises les missions HSE (Hygiène Sécurité Environnement) dans le cadre de la gestion des sites et sols pollués relevant d'une certification du Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE).

- Missions d'assistance à maitrise d'ouvrage, de maitrise d'ouvrage déléguée, et missions Amose selon les articles 5 et 6 de l'Ordonnance 2018-937 du 30 octobre 2018.

- Développement et vente, avec installation, formation et maintenance, de logiciels et progiciels pour la gestion technique et administrative des parcs immobiliers et mobiliers des secteurs publics et privés.

- Soutien au développement de l'activité de contrôle des appareils de radiographie des cabinets dentaires.

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand ● CS 71201 ● 75738 PARIS Cedex 15 ● Tél . : + 33 (0)1 40 59 70 00 ● **smabtp.fr**

SMA BTP

2- GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

La garantie objet du présent paragraphe s'applique :

- aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à l'occasion de l'exploitation de sa société pour l'exercice de son activité ;
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.
- aux dommages survenant dans le Monde entier hors USA et CANADA.

Nature de la garantie	Montants de garantie
Tous Dommages confondus : 15 000 000 € par sinistre dont	
Dommages corporels	15 000 000€ par sinistre
Dommages matériels et immatériels	15 000 000€ par sinistre
- dont dommages immatériels non consécutifs	6 000 000€ par sinistre

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél . : + 33 (0)1 40 59 70 00 • **smabtp.fr**

SMA BTP

3 - GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Cette garantie a vocation à couvrir les dommages causés aux tiers relevant de la responsabilité civile professionnelle de l'assuré en dehors des dispositions relevant des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la garantie décennale.

La garantie objet du présent paragraphe s'applique :

- aux missions professionnelles listées aux paragraphes 1 ci-avant ;
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.
- aux dommages survenant dans le Monde entier hors USA et CANADA.

Nature de la garantie	Montant de garantie
Tous Dommages confondus : 15 000 000 € par sinistre et par an dont	
Dommages corporels	15 000 000 € par sinistre et par an
Dommages matériels et immatériels	15 000 000 € par sinistre et par an
- dont dommages immatériels non consécutifs	6 000 000 € par sinistre et par an
- dont dommages aux biens confiés	5 000 000 € par sinistre et par an
Limite pour tous dommages confondus d'atteinte à l'environnement y compris ceux dus ou liés à l'amiante	1 000 000 € par sinistre et par an
Responsabilité environnementale (*pour les dommages survenus pendant la période de validité de la présente attestation et constatés pendant cette même période*)	150 000 € par sinistre et par an

---

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère.

Fait à Paris,
Le 17/12/2025.

Le Président du Directoire



SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand ● CS 71201 ● 75738 PARIS Cedex 15 ● Tél . : + 33 (0)1 40 59 70 00 ● **smabtp.fr**

DEKRA

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné M. **Georges BALZER agissant en qualité de Président de la Société DEKRA Industrial**, Société par actions simplifiée au capital social de 25 060 000 € ayant son siège social à LIMOGES (87000) - Parc d'activité de Limoges Sud Orange, 19 Rue Stuart Mill immatriculée sous le numéro SIREN 433 250 834 RCS Limoges, déclare sur l'honneur que :

la société **DEKRA Industrial** susvisée pour l'établissement des rapports et constats définis aux 1° à 4°, 6° et 7° de l'article L 271-4 ainsi qu'à l'article L 126-26 du code de la construction et de l'habitation, est en situation régulière au regard de l'article L 271-6 du même code et qu'elle:

- dispose des moyens en matériel et en personne appropriés,
- emploie des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, conformément à l'article R 271-1 du code de la construction et de l'habitation,
- est souscripteur d'une assurance permettant de couvrir des conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions, selon les modalités de l'article R 271-2 du code de la construction et de l'habitation,
- n'a aucun lien de nature à compromettre l'indépendance et l'impartialité de l'auteur (ou des auteurs) des rapports qui seront rédigés que ce soit avec le propriétaire, son mandataire, ou toute autre entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements.

Etabli au PLESSIS ROBINSON, le 05 janvier 2026

Pour servir et valoir ce que de droit

Pour DEKRA Industrial
Georges BALZER
Président

Georges BALZER

Planche de repérage usuel **RDC**		**1/3**
Référence	AMIDEMOL-E5851063-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / MARC BOUILLOT	
Adresse	8 CHEMIN D'EMBROUYSSET 81270 ST SULPICE LA POINTE	

Prélèvements

P001 **Cuisine 1 Sol**
Colles et joints de carrelage

P002 **Cuisine 1 Sol**
Colles et joints de carrelage

P003 **Cuisine 1 Plinthe**
Colles et joints de carrelage ou de faïence

P004 **Cuisine 1 Plinthe**
Colles et joints de carrelage ou de faïence

P005 **Cuisine 1 Faience**
Colles et joints de carrelage ou de faïence

P006 **Cuisine 1 Faience**
Colles et joints de carrelage ou de faïence

P007 **Cuisine 1 Paillasse**
Colles et joints de carrelage

P008 **Séjour Mur D**
Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

P009 **Séjour Mur C**
Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

P010 **Entrée Plinthe**
Colles et joints de carrelage ou de faïence

P011 **Entrée Mur D**
Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

P012 **Salle à manger Sol**
Colles et joints de carrelage

P013 **Salle à manger Sol**
Colles et joints de carrelage

P014 **Salle à manger Plinthe**
Colles et joints de carrelage ou de faïence

P015 **Salle à manger Plinthe**
Colles et joints de carrelage ou de faïence

P016 **Cuisine 2 Sol**
Colles et joints de carrelage

P017 **Cuisine 2 Sol**
Colles et joints de carrelage

P018 **Cuisine 2 Plinthe**
Colles et joints de carrelage ou de faïence

P019 **Chambre Sol**
Colles et joints de carrelage

P020 **Chambre Sol**
Colles et joints de carrelage

P021 **Chambre Plinthe**
Colles et joints de carrelage ou de faïence

P022 **WC Sol**
Colles et joints de carrelage

P023 **WC Sol**
Colles et joints de carrelage

P024 **WC Faience**
Colles et joints de carrelage ou de faïence

P025 **WC Faience**
Colles et joints de carrelage ou de faïence

P026 **SDB Sol**
Colles et joints de carrelage

P027 **SDB Sol**
Colles et joints de carrelage

P028 **SDB Faience**
Colles et joints de carrelage ou de faïence

P029 **SDB Faience**
Colles et joints de carrelage ou de faïence

P030 **SDB sol douche**
Colles et joints de carrelage

P031 **Garage 1 Fenêtre C**
Joints de mastic de vitrage

P032 **Garage 1 Chaudière fioul**
Joints bruleur

P033 **Extérieur Façade**
Crépis extérieurs

P034 **Extérieur Façade**
Crépis extérieurs

P035 **Cuisine 2 Fenêtre C**
Joints de mastic de vitrage
ZPSO 001

P036 **Garage 1 Chaudière bois**
Tresses

P052 **Garage 2 Sol**
Béton

P053 **Garage 2 Fenêtre**
Joints de mastic de vitrage

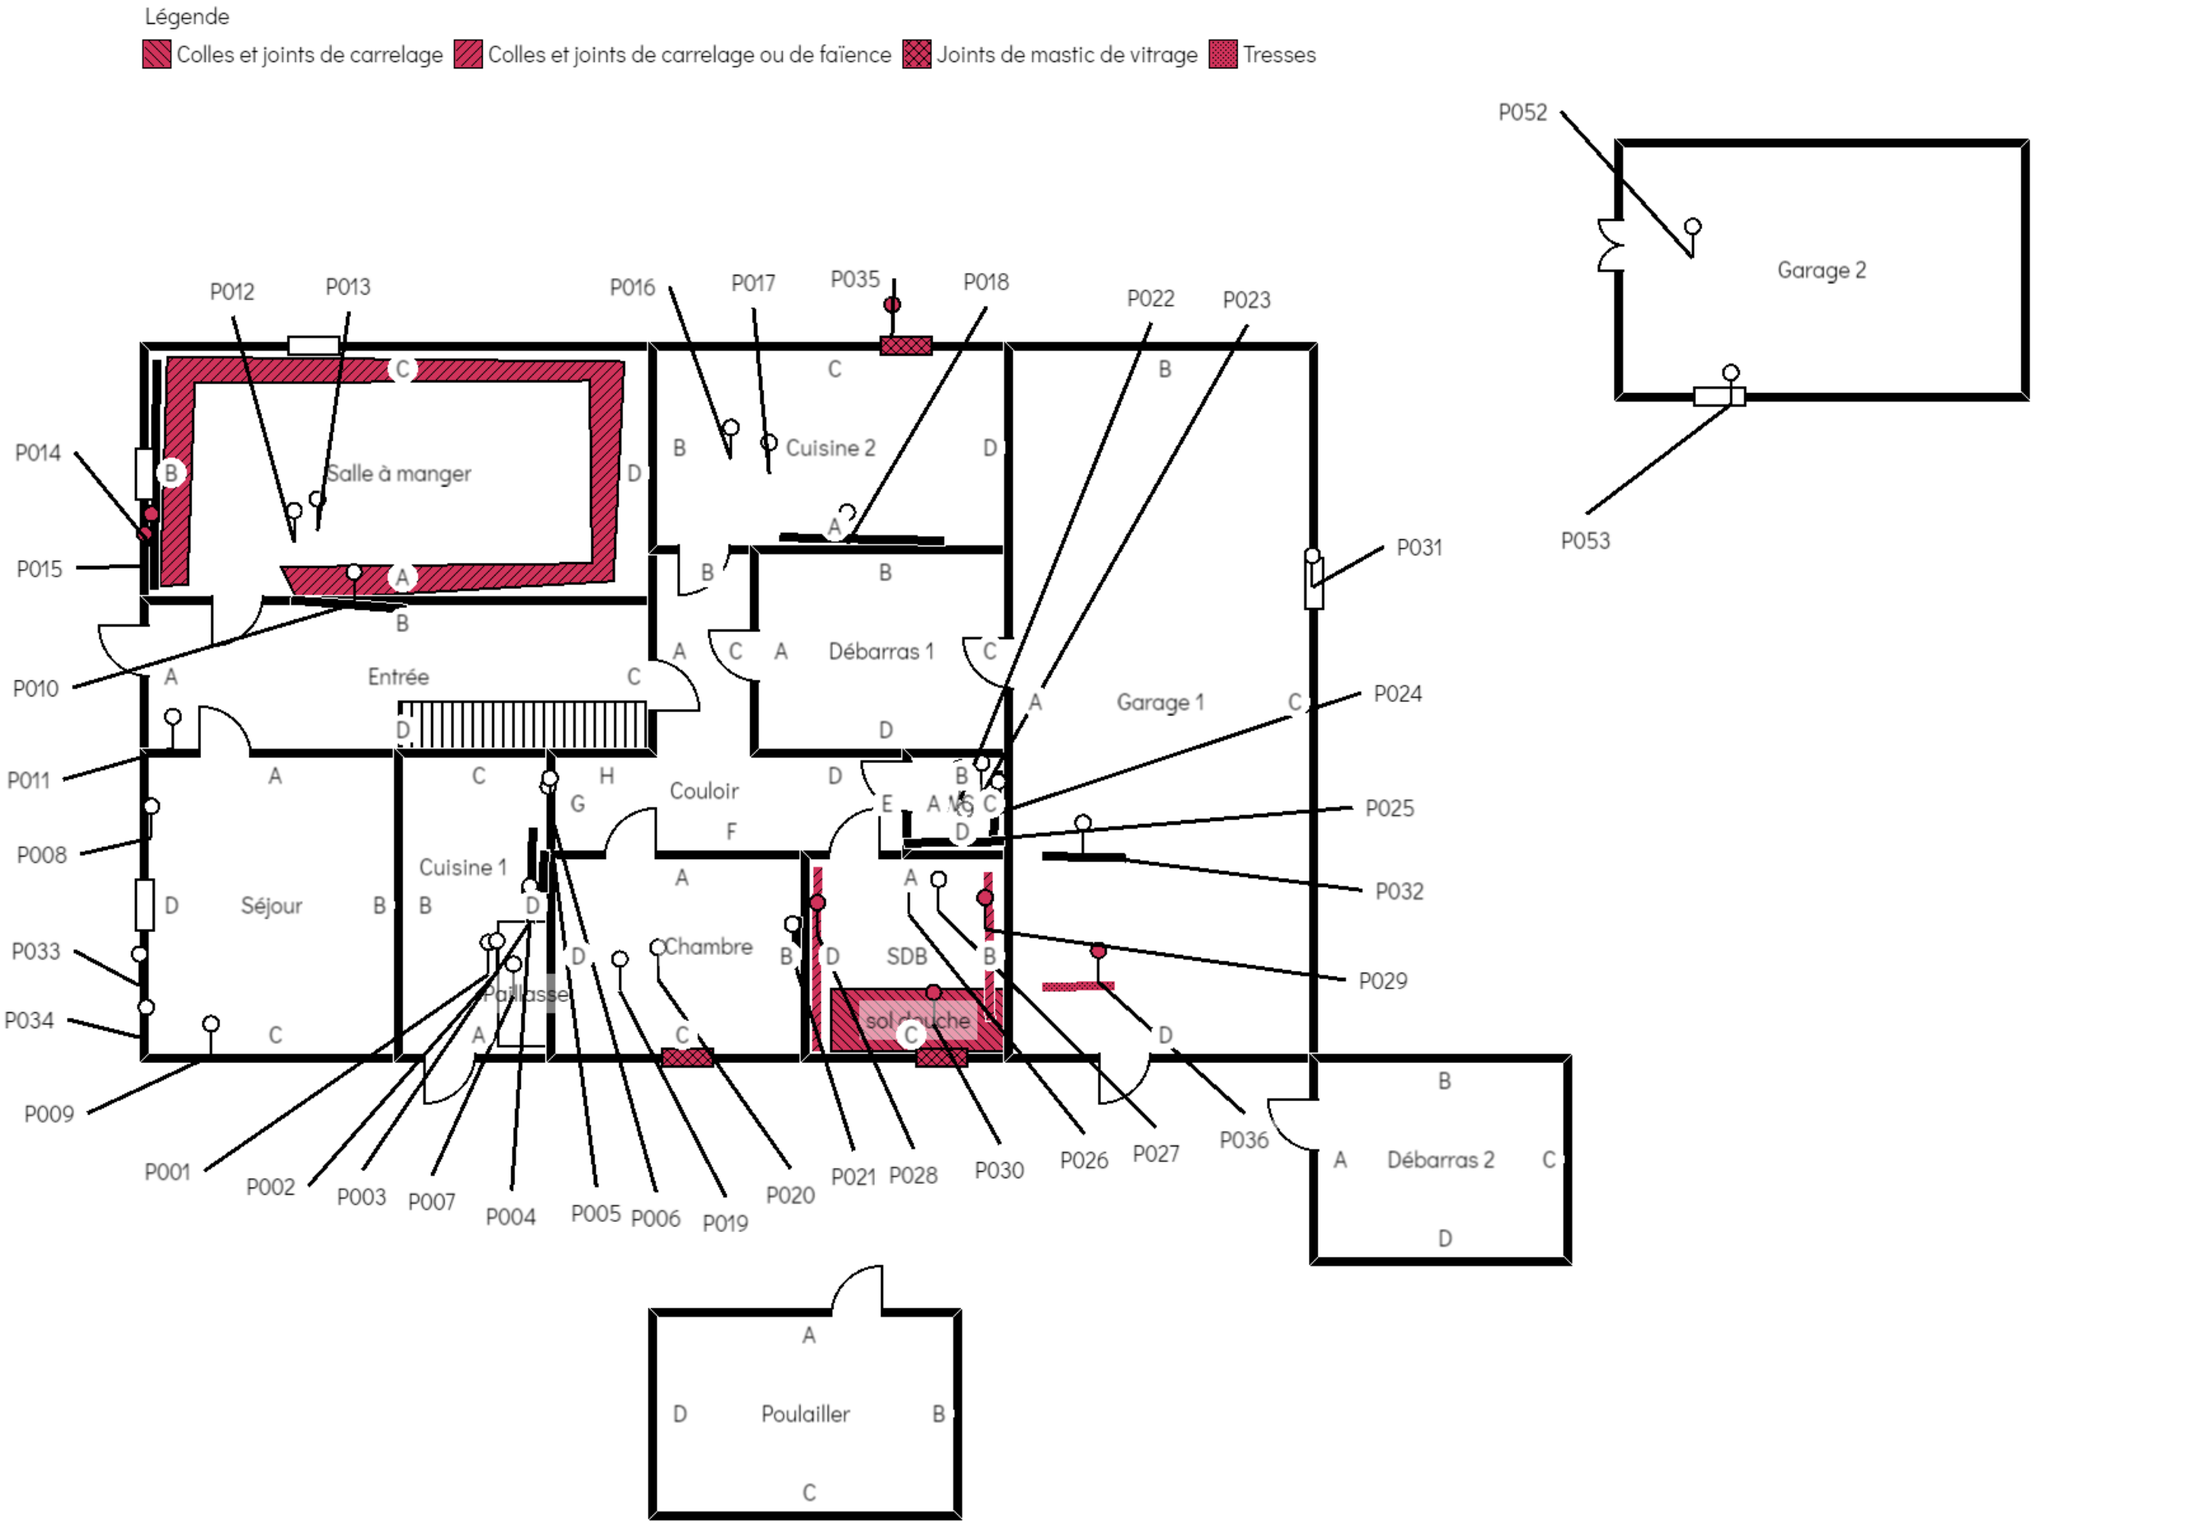


Planche de repérage usuel R+1		2/3
Référence	AMIDEMOL-E5851063-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / MARC BOUILLOT	
Adresse	8 CHEMIN D'EMBROUYSSET 81270 ST SULPICE LA POINTE	

Prélèvements

P037 SBD Sol
Colles et joints de carrelage

P038 SBD Sol
Colles et joints de carrelage

P039 SBD Plinthe
Colles et joints de carrelage ou de faïence
ZPSO 003

P040 SBD Plinthe
Colles et joints de carrelage ou de faïence

P041 SBD Mur C
Colles et joints de carrelage ou de faïence

P042 SBD Mur B
Colles et joints de carrelage ou de faïence

P043 Dégagement Sol
Sous-couches (carton, feutre...) des revêtements souples
ZPSO 002

P044 Chambre 2 Plinthe
Colles non bitumineuses

P045 Chambre 2 Plinthe
Colles non bitumineuses

P046 Dégagement Sol
Sous-couches (carton, feutre...) des revêtements souples

P047 Chambre 2 Sol
Ragréages

P048 Chambre 2 Fenêtre C
Joints de mastic de vitrage

P049 Chambre 4 Sol
Ragréages

P050 Chambre 4 Mur C
Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

P051 Terrasse Sol
Ragréages

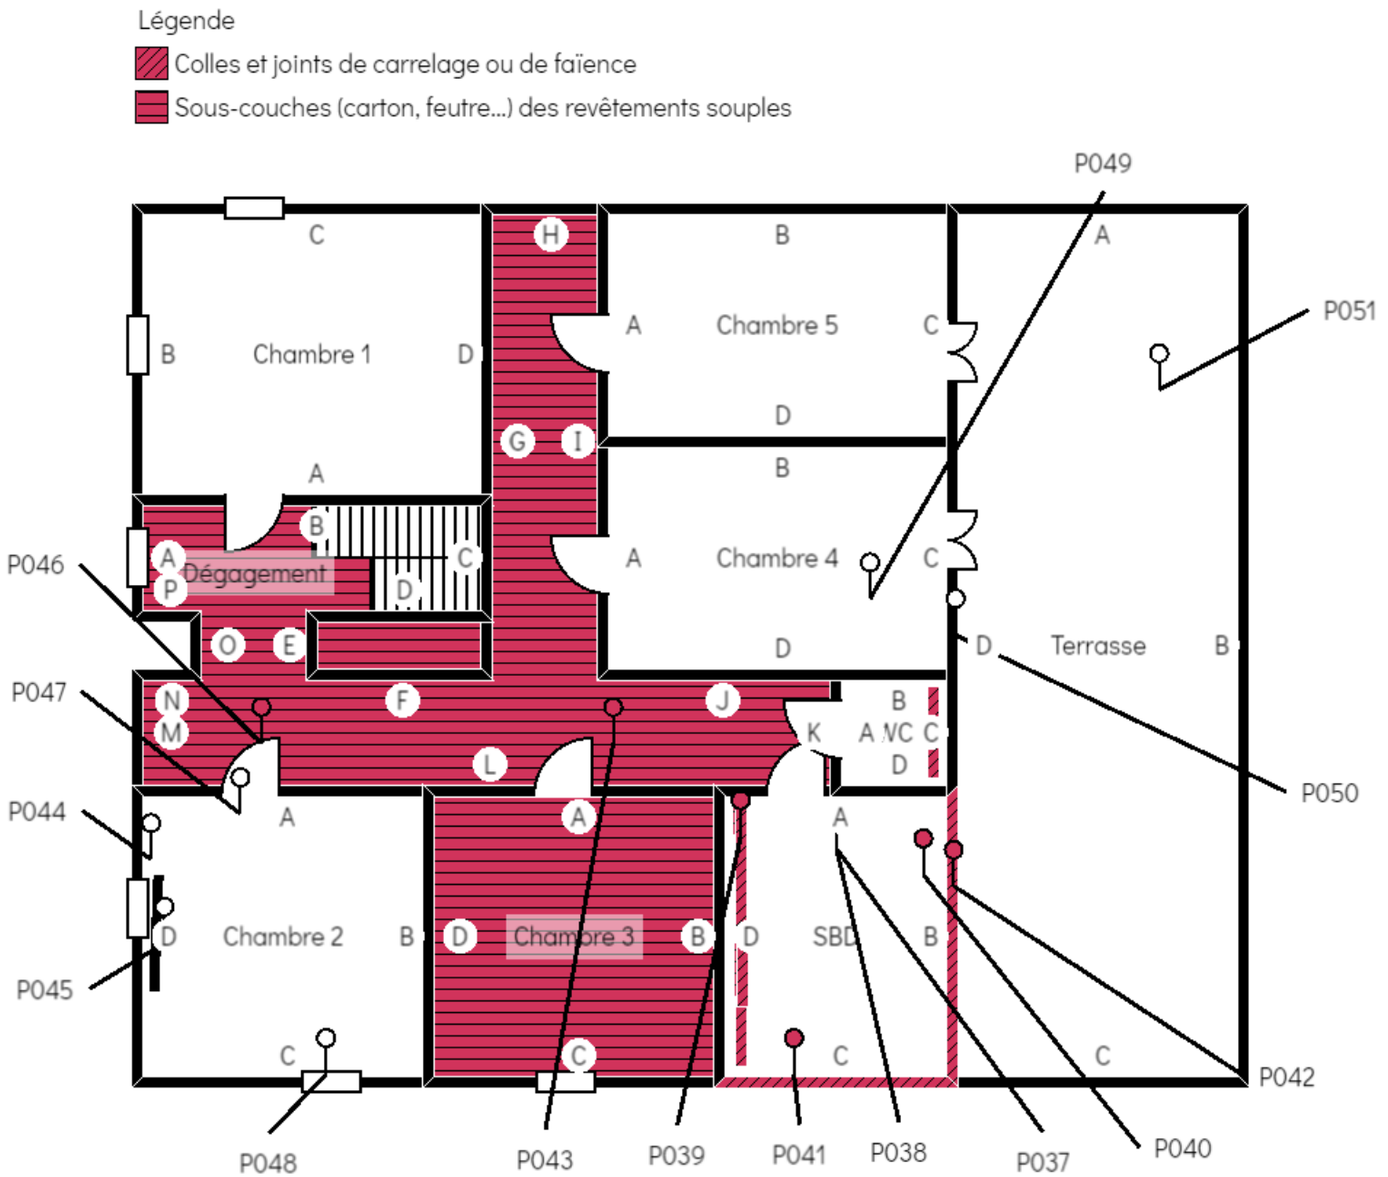


Planche de repérage usuel R+2		3/3
Référence	AMIDEMOL-E5851063-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / MARC BOUILLOT	
Adresse	8 CHEMIN D'EMBROUYSSET 81270 ST SULPICE LA POINTE	

