BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
GEP Lorraine Bourgogne (Nancy)
29 rue Antoine de St Exupery
ZAC de Frocourt
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 33993039/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 20/10/2026

Référence au programme de travaux :
2614_TPROX_SCHILTIGHEIM_AVP 2614- Réfection de la toiture du tribunal de proximité à Schiltigheim - PHASE DIAG – Juin 2026 réalisé le 26/08/2026 par TOPIC Architectes

DONNEUR D'ORDRE

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS

10 RUE DU TRIBUNAL
67300 SCHILTIGHEIM

SITE D'INTERVENTION

TRIBUNAL DE PROXIMITE - SCHILTIGHEIM

10 RUE DU TRIBUNAL
67300 SCHILTIGHEIM

toiture

Latitude : 48.603200 / Longitude : 7.754600

Date(s) d'intervention(s) :
Le 15/10/2026



SYNTHESE DE CONCLUSION

SANS AMIANTE repéré

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Baptiste JULIEN	Diagnostiqueur	Certification N° 24-2743	Baptiste JULIEN
Baptiste JULIEN	Diagnostiqueur	Certification N° 24-2743	

Le présent rapport comporte 35 pages, dont 23 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

Copyright BUREAU VERITAS

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION **3**
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 6

2. CONCLUSIONS **7**
2.1. Obligations réglementaires 8

3. INFORMATIONS GENERALES **9**
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 9
3.2. Parties prenantes 9


4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE **9**
4.1. Références réglementaires 9

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE **10**
5.1. Date(s) de visite(s) 10
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 10
5.3. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 10

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **11**
6.1. Matériaux et produits repérés 11

7. ANNEXES **13**
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 13
7.2. Photos prélèvements 14
7.3. Photos sondages 17
7.4. Attestation d'assurance 18
7.5. Certificat de compétence 20
7.6. Croquis de repérage 21
7.7. Rapport d'analyse du laboratoire 30

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets

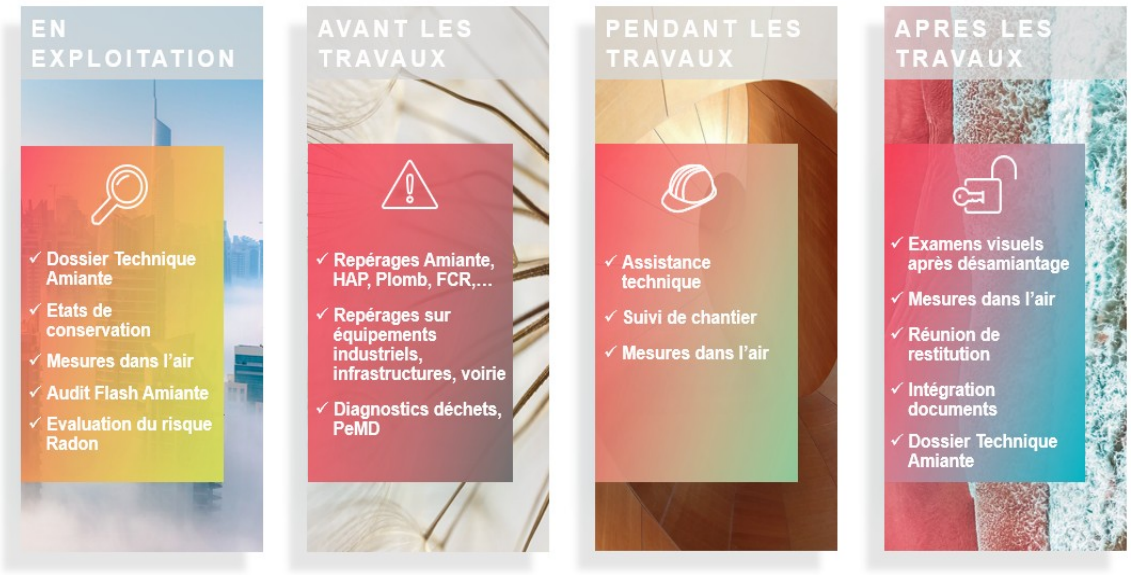

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Remplacement complet de la couverture en ardoise et du revêtement cuivre, des fenêtres de toit. Réfection façades et pose de nouveaux faux plafond dans 2 bureaux

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Ardoises	Ardoises composites hors fibrociment, Ardoises fibrociment
Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")
Conduits en toiture	Conduits de fumée, Conduits EP, Conduits EU
Eléments associés à la toiture	Chéneaux, Closoirs, Colles solins fibrociment, Conduits, Costières, Couvre-joints, Eléments de toiture, Faitages, Garnissages joints de dilatation, Joints de dilatation, Jonctions bitumineuses, Mitres, Rives, Solins, Tresses d'étanchéité à l'air
Eléments sous toiture	Enduits projetés sous toiture, Flocages sous toiture, Isolants fibreux en sous toiture, Pare-pluie, Pare-vapeur
Etanchéité de toiture terrasse	Complexes asphaltés , Ecrans de semi indépendance , Pare-vapeur, Produits d'accrochage, Revêtements bitumineux parties planes, Revêtements bitumineux relevés
Fenêtres de toit	Garnitures de friction fenêtres, Joints menuiserie/ossature, Mastics
Lanterneaux	Garnitures de friction fenêtres, Joints menuiserie/ossature, Mastics
Plaques ondulées et planes	Plaques fibrociment, Plaques matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Toitures	Accessoires couverture fibrociment, Accessoires couverture hors fibrociment, Ardoises composites hors fibrociment, Ardoises fibrociment, Bardeaux bitumineux, Plaques fibrociment, Plaques matériaux bitumineux
Verrières	Garnitures de friction fenêtres, Joints menuiserie/ossature, Mastics
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits de fumée, Conduits eaux pluviales, Conduits eaux usées
Eléments associés à la façade	Conduits, Elements ponctuels (façade)

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibrociment, Ardoises fibrociment, Bacs fibrociment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis fenêtres fibrociment, Coffrages perdus, Colle, Colles carrelage, Colles faïence, Colles pâte de verre, Couvre-joints, Enduits pelliculaires façades, Enduits projetés/crépis façades, Garnissage joints dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints carrelage, Joints dilatation, Joints faïence, Joints pâte de verre, Maçonnerie silico-calcaire, Peintures façades, Primaires d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés sous bardage, Flocages sous bardage
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction fenêtres, Joints d'étanchéité, Mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques fibrociment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales, Bourre en vrac cloisons, Enduits finition plaques de plâtre verticales, Enduits projetés cloisons, Enduits projetés/talochés cloisons, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux, Panneaux cloisons, Peinture cloisons, Plots de colle cloisons, Sous couches tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot gaines, Enduits finition gaines plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage gaines, Enduits projetés gaines, Enduits projetés/talochés gaines, Flocages gaines, Jonctions panneaux, Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction fenêtres, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques fibrociment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits lissage/ragréage murs, Enduits projetés murs, Enduits projetés/talochés murs, Flocages murs, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture murs, Revêtements durs
Plinthes	Peintures plinthes
Portes	Peintures
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs portes, Joints bandes portes, Joints portes, Joints tresses portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs portes, Joints portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs portes, Joints portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs portes, Joints portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits lissage/ragréage poteaux, Enduits projetés poteaux, Enduits projetés/talochés poteaux, Entourages de poteaux, Flocages poteaux, Joints d'assemblage poteaux/poutres, Joints de dilatation poteaux, Peintures poteaux, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles carrelage, Colles faïence, Colles plinthe, Dalles plastique, Joints carrelage, Joints faïence, Joints plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs fibrociment, Sous couches tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits projetés charpente, Enduits projetés/talochés charpente, Flocages charpente, Joints charpentes, Jonctions façade/calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures charpente, Peintures intumescentes charpente, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions faux plafond/structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot gaines, Enduits finition gaines plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage gaines, Enduits projetés gaines, Enduits projetés/talochés gaines, Flocages gaines, Jonctions entre panneaux, Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot plafonds, Coffrages perdus, Colles carrelage, Enduits finition plafonds plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage plafonds, Enduits projetés plafonds, Enduits projetés/talochés plafonds, Flocages plafonds, Fourreaux, Joints carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés plafonds, Panneaux vissés plafonds, Peintures intumescentes, Peintures plafonds, Plots de colle plafonds, Primaires d'accrochage plafonds, Rebouchages trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches tissus plafonds
Poutres	Enduits lissage/ragréage poutres, Enduits projetés poutres, Enduits projetés/talochés poutres, Entourages de poutres, Flocages poutres, Joints poutres, Jonctions façade/calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures poutres, Revêtements bitumineux poutres
Suspentes et contrevents	Flocages suspentes, Peintures suspentes, Projections en plâtre suspentes
06 - Conduits et accessoires intérieurs	

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Clapets coupe-feu	Calfeutrements clapets CF, Clapets CF, Joints clapets CF, Lames clapets CF, Rebouchages clapets CF, Tunnels clapets CF
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Volets coupe-feu	Calfeutrements volets CF, Ossature volets CF, Rebouchages volets CF, Volets CF
08 - Equipements divers et accessoires	
Câbles électriques	Gaine/Enveloppe, Tresses/Isolant
Tuyauteries	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Joints d'étanchéité, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

1.3. Périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Toiture, façades et deux bureaux

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : TRIBUNAL DE PROXIMITE - SCHILTIGHEIM
10 RUE DU TRIBUNAL
67300 SCHILTIGHEIM

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
TRIBUNAL DE PROXIMITE - SCHILTIGHEIM	Administrations, bureaux	Autres	31/12/1897	Non-communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
	Donneur d'ordre	UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS	10 RUE DU TRIBUNAL 67300 SCHILTIGHEIM	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 15/10/2026

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)

5.3. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / 2614_TPROX_SCHILTIGHEIM_AVP	TOPIC Architectes	26/08/2026	2614- Réfection de la toiture du tribunal de proximité à Schiltigheim - PHASE DIAG – Juin 2026	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> BUREAU 1	Faux plafonds	Plaques	Carton, Fibreux	Blanc	5	/	S1	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 2	Faux plafonds	Plaques	Carton, Fibreux	Blanc	5	P4* N	/	AN	/	Non
EXTERIEUR -> TOITURE	Eléments associés à la toiture	Jonctions bitumineuses	Mastic	Noir	9	P9* N	/	AN	/	Non
	Fenêtres de toit	Mastics	Dur, Fibreux	Blanc	10	P10* N	/	AN	/	Non
	Fenêtres de toit	Mastics	Dur, Fibreux	Blanc	10	P11 N	/	AN	/	Non
	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	11	P12* N	/	AN	/	Non
	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Ciment	Noir	12	P13* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
EXTERIEUR -> FAÇADES NORD	Conduits en façade	Conduits eaux pluviales	Métallique	/	13	/	S2	PN	/	Non
	Ardoises	Ardoises composites hors fibrociment	/	/	14	/	S3	PN	Ardoise naturelle	Non
EXTERIEUR -> FAÇADES SUD	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits projetés/crépis façades	Granuleux	Beige	8	P7* N	/	AN	/	Non
	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Compact	Gris	6	P5* N	/	AN	/	Non
	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Compact	Gris	7	P6* N	/	AN	/	Non
EXTERIEUR -> FAÇADES EST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits projetés/crépis façades	Granuleux	Beige	8	P8 N	/	AN	/	Non
Combles	Equipements	Peintures	Décoratif	Gris	2	P1* N	/	AN	Peinture poutre métallique	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Vert	3	P2* N	/	AN	Peinture charpente bois	Non
	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + carton	Blanc	4	P3* N	/	AN	/	Non
	Conduits	Calorifugeages	Tissu	Gris	4	P3* N	/	AN	/	Non

7. ANNEXES

7.1. Parties d’immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d’immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+1	/
R+1 -> BUREAU 1	/
R+1 -> BUREAU 2	/
EXTERIEUR	/
EXTERIEUR -> TOITURE	/
EXTERIEUR -> FAÇADES NORD	/
EXTERIEUR -> FAÇADES SUD	/
EXTERIEUR -> FAÇADES EST	/
EXTERIEUR -> FAÇADES OUEST	/
Combles	/

7.2. Photos prélèvements

P1	ZPSO 2
Combles	
	
Equipements -> Peintures	

P2	ZPSO 3
Combles	
	
Equipements -> Peintures	

P3	ZPSO 4
Combles	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) | Calorifugeages	

P3	ZPSO 4
Combles	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) | Calorifugeages	


P4	ZPSO 5
R+1 -> BUREAU 2	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P5	ZPSO 6
EXTERIEUR -> FAÇADES SUD	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Joints d'assemblage	

P6	ZPSO 7
EXTERIEUR -> FAÇADES SUD	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Joints d'assemblage	

P7	ZPSO 8
EXTERIEUR -> FAÇADES SUD	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits projetés/crépis façades	

P8	ZPSO 8
EXTERIEUR -> FAÇADES EST	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits projetés/crépis façades	

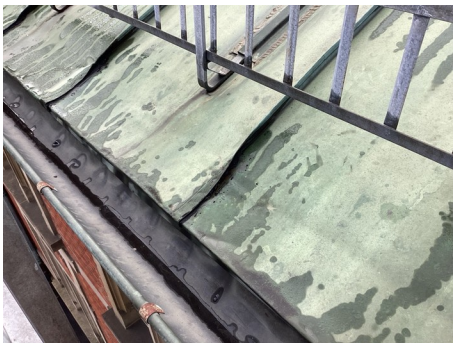P9	ZPSO 9
EXTERIEUR -> TOITURE	
	
Eléments associés à la toiture -> Jonctions bitumineuses	

P10	ZPSO 10
EXTERIEUR -> TOITURE	
	
Fenêtres de toit -> Mastics	


P11	ZPSO 10
EXTERIEUR -> TOITURE	
	
Fenêtres de toit -> Mastics	

Copyright BUREAU VERITAS

P12	ZPSO 11
EXTERIEUR -> TOITURE	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Joints d'assemblage	

P13	ZPSO 12
EXTERIEUR -> TOITURE	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Joints d'assemblage	

7.3. Photos sondages

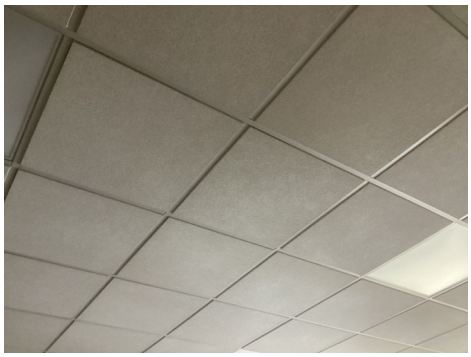S1	ZPSO 5
R+1 -> BUREAU 1	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S2	ZPSO 13
EXTERIEUR -> FAÇADES NORD	
	
Conduits en façade -> Conduits eaux pluviales (Liste B)	

S3	ZPSO 14
EXTERIEUR -> FAÇADES NORD	
	
Ardoises -> Ardoises composites hors fibrociment	

7.4. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Allianz

Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) ..... **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Signed by: LORENZO BATTISTI
EMail: lorenzo.battisti1@allianz.com
Signing time: 23-12-2025 10:46:58
IP address: 165.225.202.119

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.5. Certificat de compétence

Saint Rémy les chevreuse, le 01/09/2024

La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

JULIEN Baptiste

sous le numéro 24-2743

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

☑ **Amiante Sans Mention**	Prise d'effet :	**31/07/2024**	Validité :	**30/07/2031**
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
☑ **Amiante Avec Mention**	Prise d'effet :	**31/07/2024**	Validité :	**30/07/2031**
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
☑ **Termites Metropole**	Prise d'effet :	**24/06/2024**	Validité :	**23/06/2031**
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
☑ **Plomb Crep**	Prise d'effet :	**24/06/2024**	Validité :	**23/06/2031**
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
☑ **DPE sans mention**	Prise d'effet :	**24/06/2024**	Validité :	**23/06/2031**
[arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique]				

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

Accréditation N° 4-0540 portée disponible sur www.cofrac.fr

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 85 25 71 – www.abcidia-certification.fr
ENR20 V10 du 02 décembre 2021

7.6. Croquis de repérage


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE - SCHILTIGHEIM 10 RUE DU TRIBUNAL 67300 SCHILTIGHEIM	
Localisation R+1	Date visite	Le 15/10/2026
	Auteur	Baptiste JULIEN
	N° dossier	33993039/S1/1
	Planche	1 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

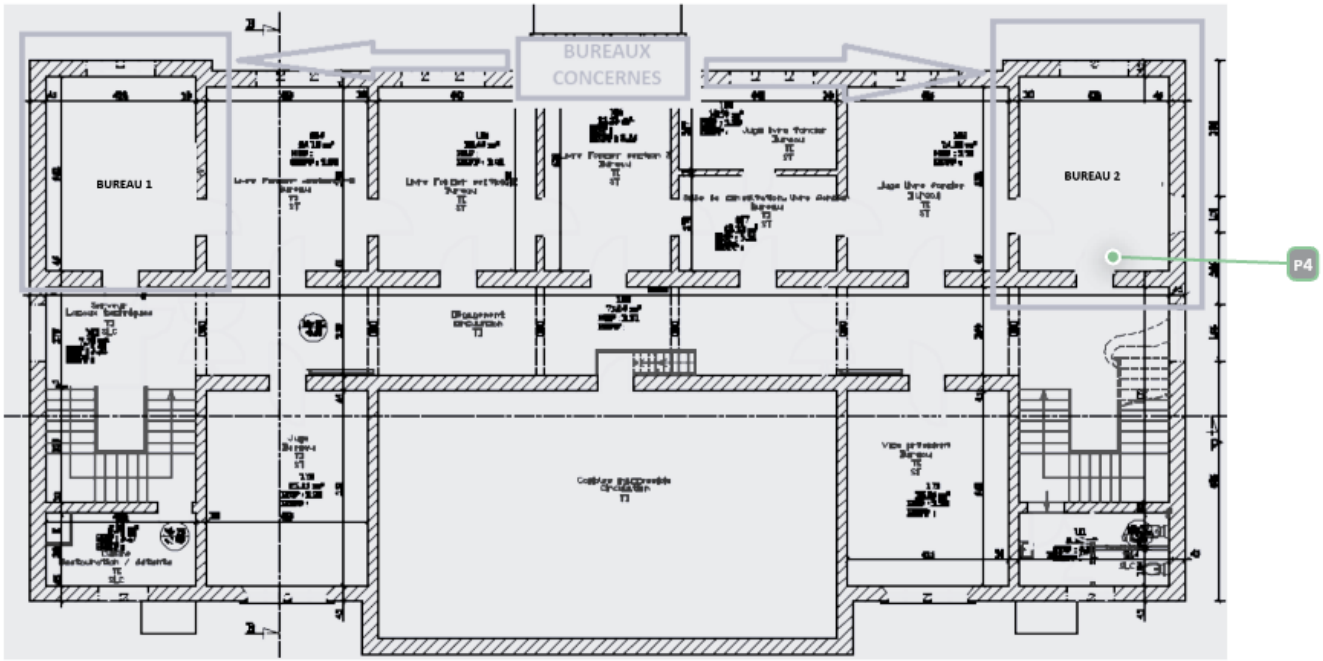

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE - SCHILTIGHEIM 10 RUE DU TRIBUNAL 67300 SCHILTIGHEIM	
Localisation R+1	Date visite	Le 15/10/2026
	Auteur	Baptiste JULIEN
	N° dossier	33993039/S1/1
	Planche	2 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Sondage
Observation

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

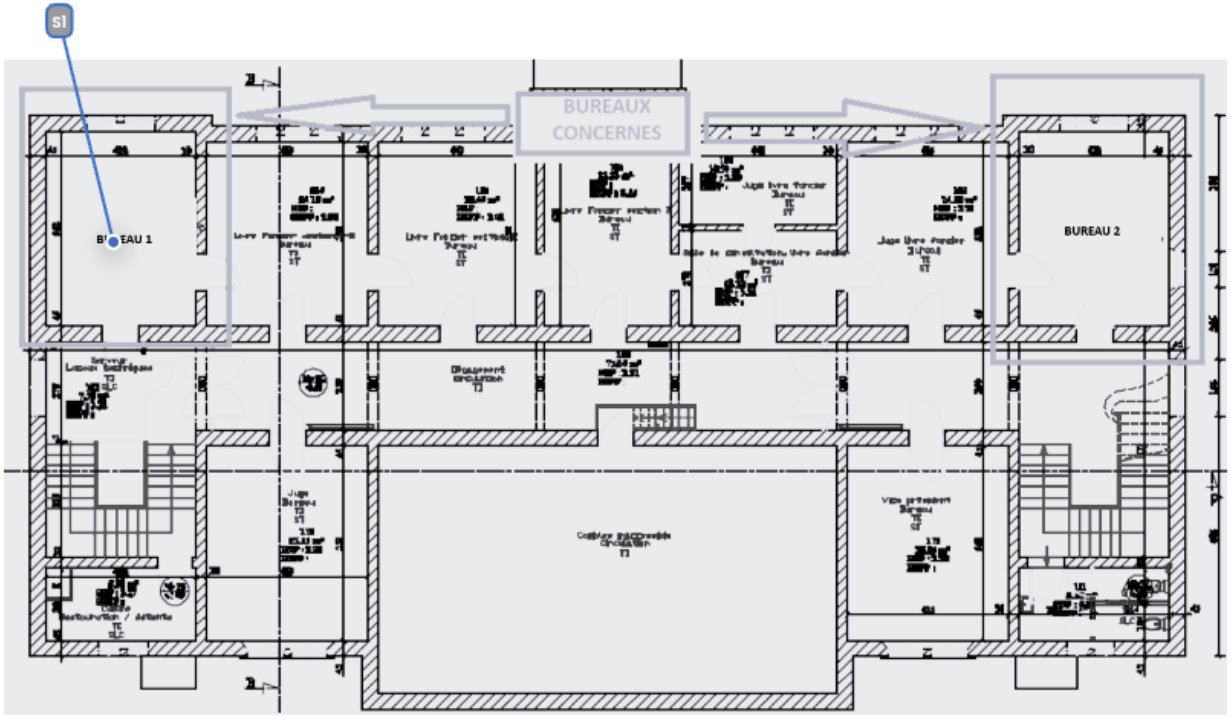

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE - SCHILTIGHEIM 10 RUE DU TRIBUNAL 67300 SCHILTIGHEIM	
Localisation EXTERIEUR > TOITURE	Date visite	Le 15/10/2026
	Auteur	Baptiste JULIEN
	N° dossier	33993039/S1/1
	Planche	3 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

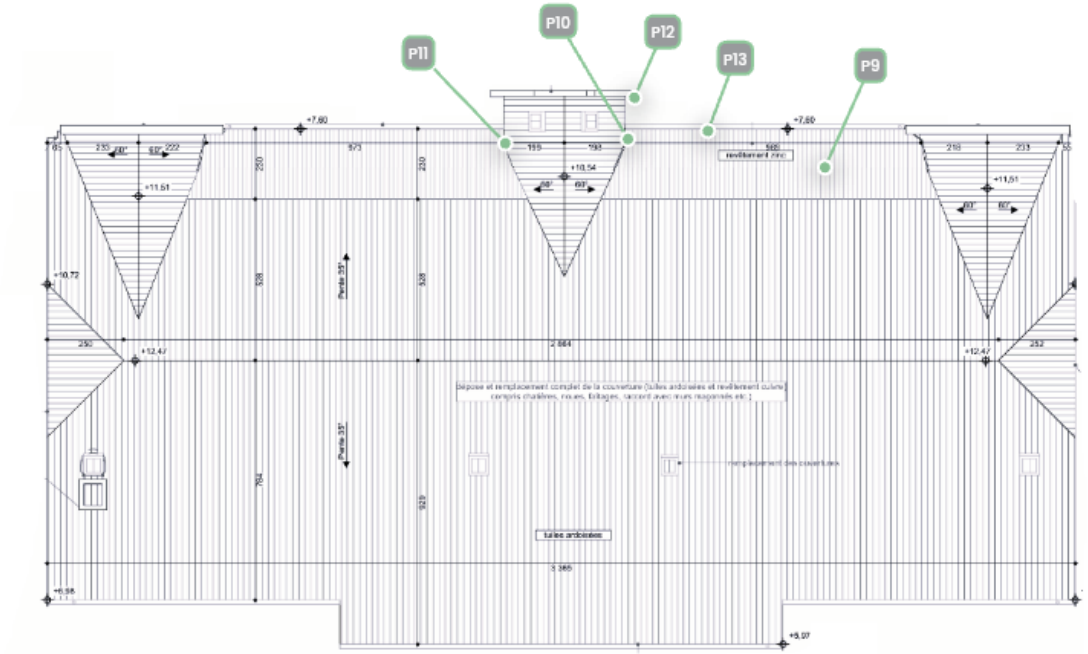

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE - SCHILTIGHEIM 10 RUE DU TRIBUNAL 67300 SCHILTIGHEIM	
Localisation EXTERIEUR > FAÇADES NORD	Date visite	Le 15/10/2026
	Auteur	Baptiste JULIEN
	N° dossier	33993039/S1/1
	Planche	4 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

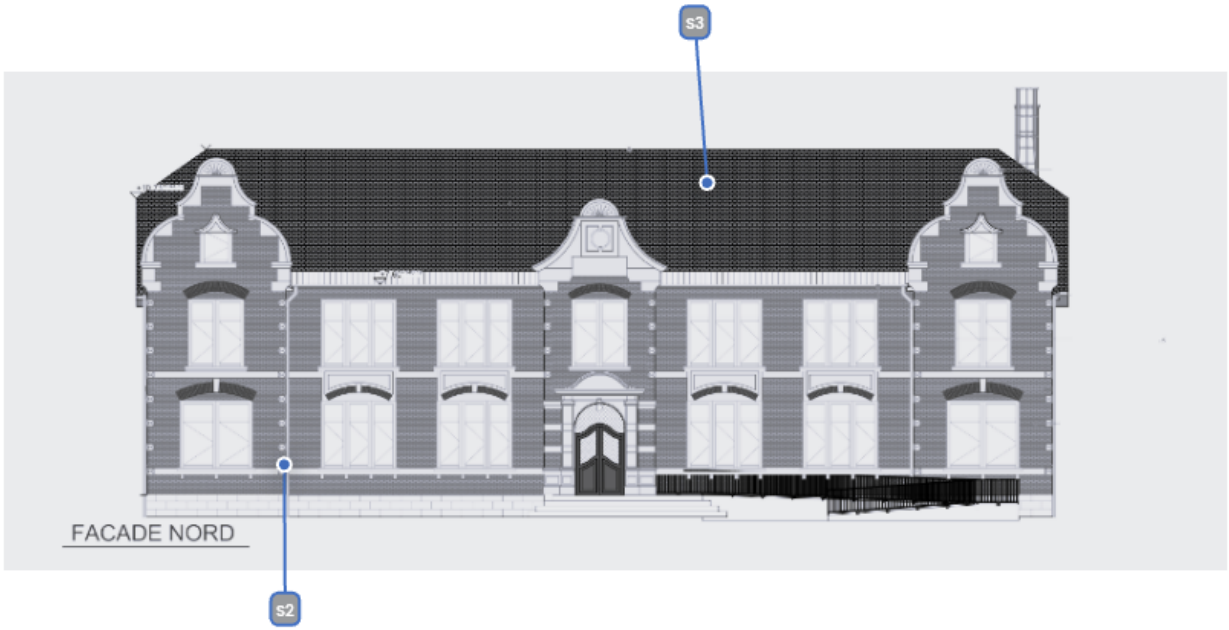

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE - SCHILTIGHEIM 10 RUE DU TRIBUNAL 67300 SCHILTIGHEIM	
Localisation EXTERIEUR > FAÇADES SUD	Date visite	Le 15/10/2026
	Auteur	Baptiste JULIEN
	N° dossier	33993039/S1/1
	Planche	5 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

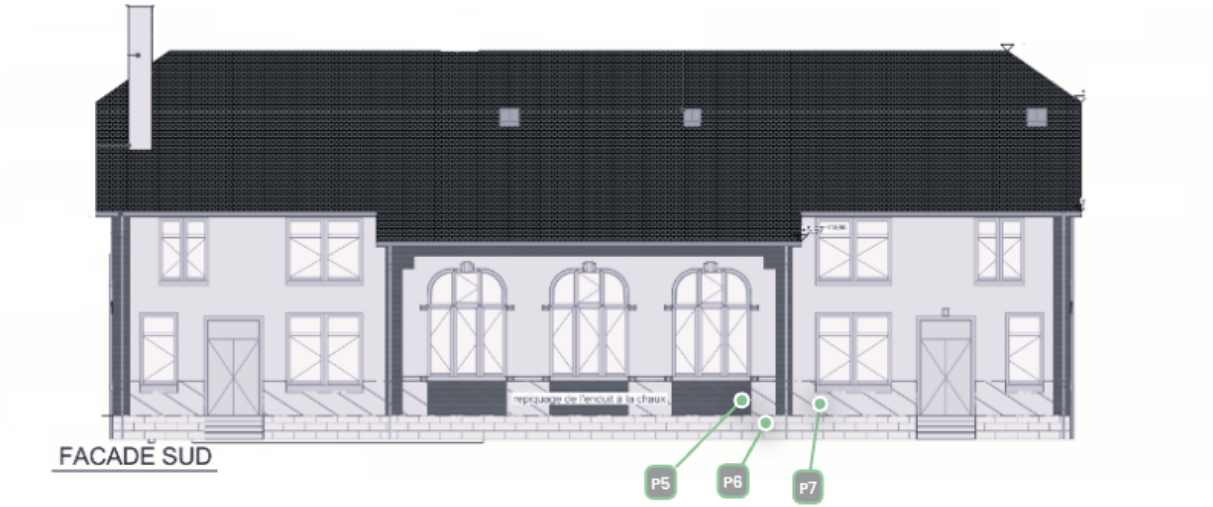

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE - SCHILTIGHEIM 10 RUE DU TRIBUNAL 67300 SCHILTIGHEIM	
Localisation EXTERIEUR > FAÇADES EST	Date visite	Le 15/10/2026
	Auteur	Baptiste JULIEN
	N° dossier	33993039/S1/1
	Planche	6 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

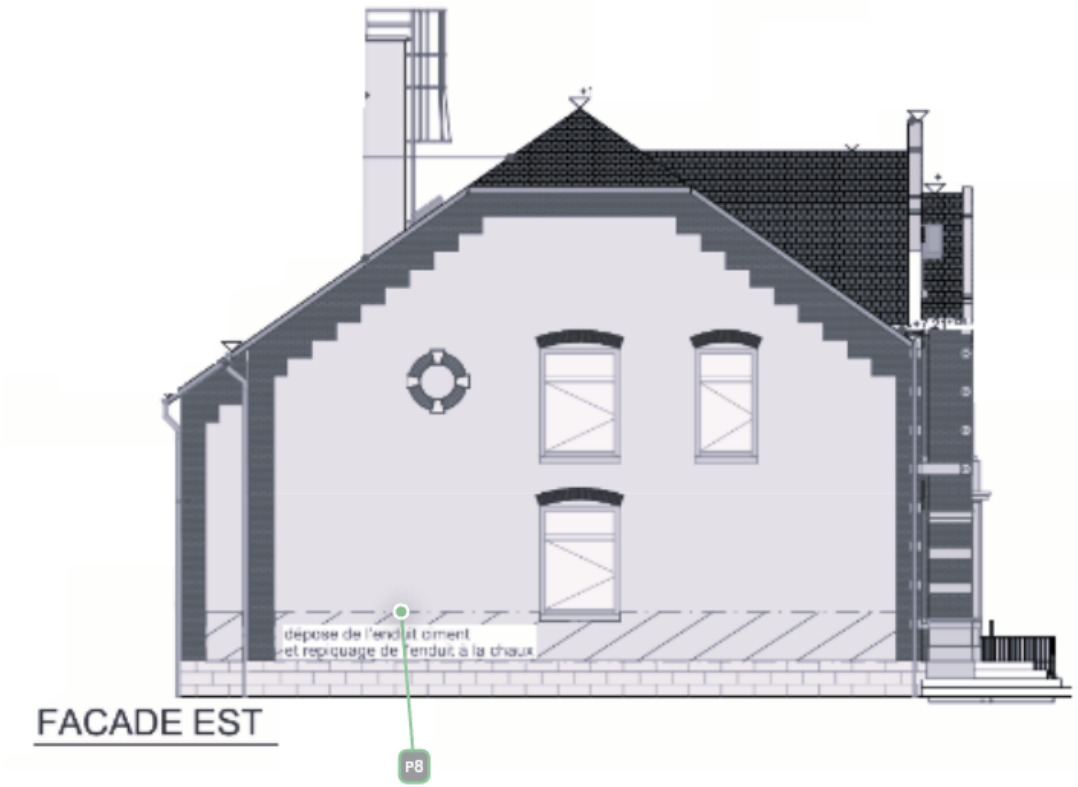

FACADE EST

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE - SCHILTIGHEIM 10 RUE DU TRIBUNAL 67300 SCHILTIGHEIM	
Localisation EXTERIEUR > FAÇADES OUEST	Date visite	Le 15/10/2026
	Auteur	Baptiste JULIEN
	N° dossier	33993039/S1/1
	Planche	7 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

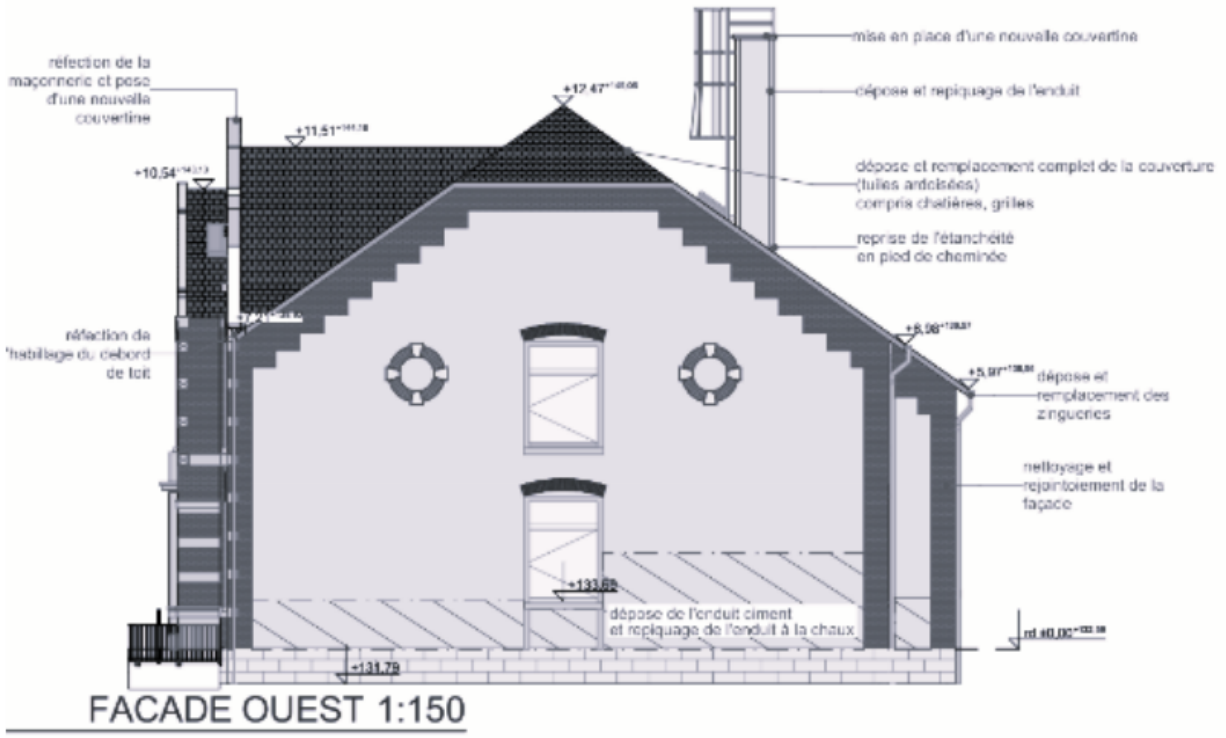

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE - SCHILTIGHEIM 10 RUE DU TRIBUNAL 67300 SCHILTIGHEIM	
Localisation Combles	Date visite	Le 15/10/2026
	Auteur	Baptiste JULIEN
	N° dossier	33993039/S1/1
	Planche	8 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

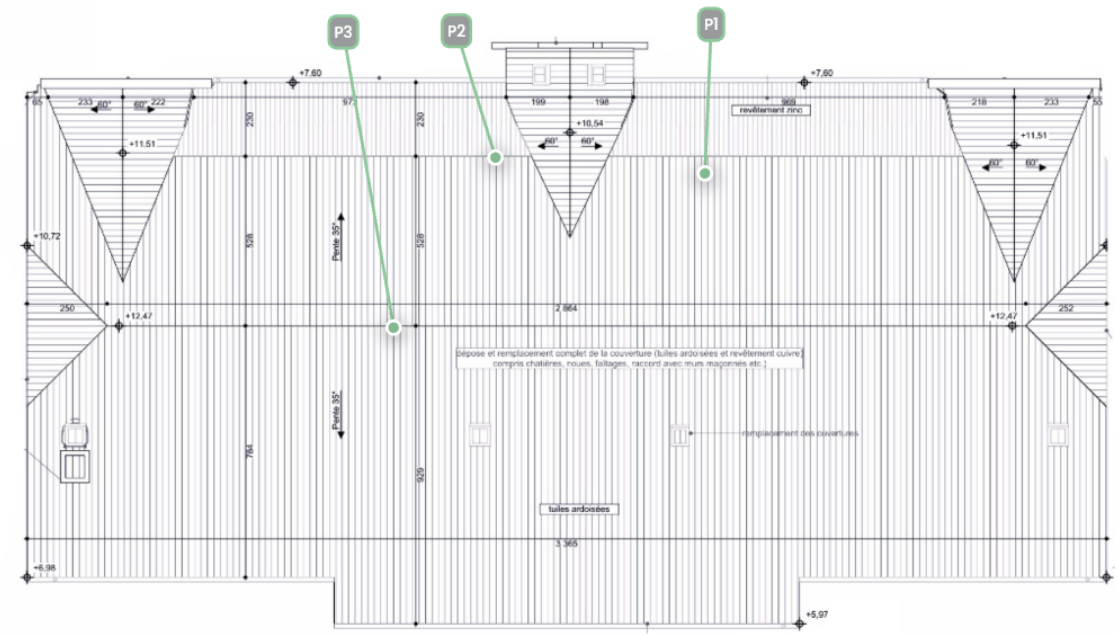

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

7.7. Rapport d'analyse du laboratoire

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Baptiste JULIEN
29 rue Antoine de St Exupéry - ZAC de Frocourt
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-LE-183047-01 | Date d'émission de rapport : 20/10/2026 12:46 |
Dossier N° : 26A036828 | Date de réception : 16/10/2026 | Date d'analyse : 19/10/2026
Référence dossier Client:1510797887/33993039/S1/1/1_33993039/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	EUROFINS240000063831 Réf. Prel : P1 Combles/Equipements : Peintures - (Décoratif/Gris)	Matériau de type peinture sur lingette (marron)	**MET** / SLP2	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	EUROFINS240000063829 Réf. Prel : P2 Combles/Equipements : Peintures - (Décoratif/Vert)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** * / SLP2	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003 (1) (2)	EUROFINS240000063830 Réf. Prel : P3 Combles/Conduits : Enveloppes de calorifuges (Liste B) / Calorifugeages (Liste A) - (Liant plâtre + carton/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	**MET** * / SLP2	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / T1Q8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type bourre de calorifuge (de différentes couleurs)	**MOLP** * / T1Q8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 6 74 89 13 21 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1751
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-LE-183047-01 | Date d'émission de rapport : 20/10/2026 12:46 | Page2/5
Dossier N° : 26A036828 | Date de réception : 16/10/2026 | Date d'analyse : 19/10/2026
Référence dossier Client:1510797887/33993039/S1/1/1_33993039/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004 (1)	EUROFINS240000063828 Réf. Prel : P4 R+1 - BUREAU 2/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Fibreux, Carton/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** * / SLP2	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005 (1)	EUROFINS240000063827 Réf. Prel : P5 EXTERIEUR - FAÇADES SUD/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs : Joints d'assemblage - (Compact/Gris)	Matériau dur (granulaire) (noir)	**MET** * / SLP2	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006 (1)	EUROFINS240000063826 Réf. Prel : P6 EXTERIEUR - FAÇADES SUD/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs : Joints d'assemblage - (Compact/Gris)	Matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** * / SLP2	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007 (1)	EUROFINS240000063825 Réf. Prel : P7 EXTERIEUR - FAÇADES SUD/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits projetés/crépis façades - (Granuleux/Beige)	Matériau semi-dur (granulaire) (rose) (beige)	**MET** * / SLP2	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 6 74 89 13 21 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-LE-183047-01 | Date d'émission de rapport : 20/10/2026 12:46 | Page3/5
Dossier N° : 26A036828 | Date de réception : 16/10/2026 | Date d'analyse : 19/10/2026
Référence dossier Client:1510797887/33993039/S1/1/1_33993039/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	EUROFINS240000063824 Réf. Prel : P8 EXTERIEUR - FAÇADES EST/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits projetés/crépis façades - (Granuleux/Beige)	Matériau semi-dur (granulaire) (rose) (beige)	**MET** * / SLP2	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009 (1)	EUROFINS250000028397 Réf. Prel : P9 EXTERIEUR - TOITURE/Eléments associés à la toiture : Jonctions bitumineuses - (Mastic/Noir)	Matériau semi-dur (noir)	**MET** * / SLP2	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010 (1)	EUROFINS250000028412 Réf. Prel : P10 EXTERIEUR - TOITURE/Fenêtres de toit : Mastics - (Dur, Fibreux/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET** * / SLP2	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
011 (1)	EUROFINS250000028395 Réf. Prel : P11 EXTERIEUR - TOITURE/Fenêtres de toit : Mastics - (Dur, Fibreux/Blanc)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET** * / SLP2	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 6 74 89 13 21 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-LE-183047-01 | Date d'émission de rapport : 20/10/2026 12:46 | Page4/5
Dossier N° : 26A036828 | Date de réception : 16/10/2026 | Date d'analyse : 19/10/2026
Référence dossier Client:1510797887/33993039/S1/1/1_33993039/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012 (1)	EUROFINS250000028398 Réf. Prel : P12 EXTERIEUR - TOITURE/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs : Joints d'assemblage - (Ciment/Gris)	Matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** * / SLP2	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013 (1)	EUROFINS250000028396 Réf. Prel : P13 EXTERIEUR - TOITURE/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs : Joints d'assemblage - (Ciment/Noir)	Matériau semi-dur (granulaire) (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	**MET** * / SLP2	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) Une lingette ayant été utilisée lors du prélèvement pour la protection de l'opérateur de repérage est présente dans l'échantillon. Celle-ci n'a pas été analysée.

(2) Un matériau de type poussière est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 6 74 89 13 21 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-LE-183047-01 | Date d'émission de rapport : 20/10/2026 12:46 | Page5/5
Dossier N° : 26A036828 | Date de réception : 16/10/2026 | Date d'analyse : 19/10/2026
Référence dossier Client:1510797887/33993039/S1/1/1_33993039/1/1

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection." ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, arrêté du 1er octobre 2019 modifié.
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Aurélie BARBARAS
Technicien(ne) Analyste

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 6 74 89 13 21 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS
