Chubb France
SIEGE SOCIAL : 10 AVENUE DE L'ENTREPRISE
PARC SAINT CHRISTOPHE - BAT MAGELLAN 1
95 862 CERGY PONTOISE CEDEX
702 000 522 RCS PONTOISE
SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE AU CAPITAL DE 32 302 720 EUROS

PROCES VERBAL D'ESSAIS AVEC FOYERS TYPES DE SITE

Agence Strasbourg Installations
Rue du Pont du Péage
Parc de la Porte Sud
Bâtiment E
67118 GEISPOLSHEIM
Téléphone : +33 (0)3.88.55.36.55

NOM DE L'INTERVENANT CHUBB FRANCE

Prénom, Nom	Brahim Belkadi
Fonction	Technicien
Téléphone	0683845640
Email	brahim.belkadi@chubb.fr

N° de Projet	428J186362		
Désignation Projet	UNISTRA - ATRIUM - STRASBOURG		
Nom du client	UDS ATRIUM		
Lieu d'Intervention			
Adresse	16 RUE RENE DES CARTES ESPLANADE		
Code Postal	67000	**Ville**	STRASBOURG

FOYER TYPE n°1

Local

Appellation	ATRIUM	**Hauteur**	13m	**Facteur de risque (K)**	1

Détection

Type de détecteur	Optique linéaire de fumée	**N° de la ZDA**	2

Justification de l'essai

Hauteur supérieure à 7 mètres, détecteur par aspiration		**Référentiel**	NF S61-970

Foyer type de référence

FTR n°	5B - Carton, grand tromblon	**Quantité de produit retenue**	2 rouleaux de 310 mm

Conditions d'essais

Climatisation		**Ventilation**		**Portes**	Fermées			**Température**	20°c


Résultat de l'essai

Déclenchement de l'alarme à l'intérieur de la surface surveillée et avant la fin de combustion complète du FTS ou dans le temps requis

Temps avant déclenchement	400 Sec.	**N° du premier détecteur ayant signalé l'alarme dans la zone**	01120
Asservissements pilotés	Évacuation, Désenfumage	**N° des IA pilotés**	

Chubb France
SIEGE SOCIAL : 10 AVENUE DE L'ENTREPRISE
PARC SAINT CHRISTOPHE - BAT MAGELLAN 1
95 862 CERGY PONTOISE CEDEX
702 000 522 RCS PONTOISE
SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE AU CAPITAL DE 32 302 720 EUROS

EMPLACEMENT DU FOYER

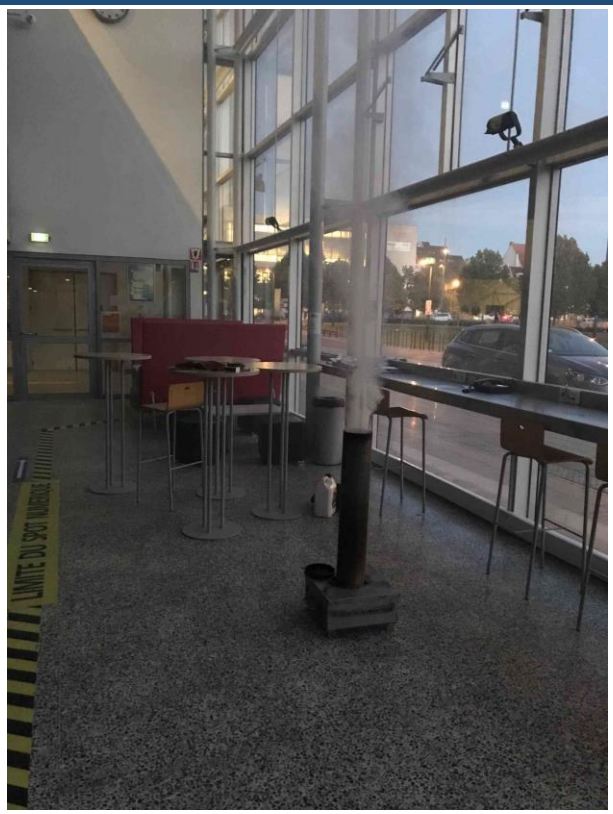

SIGNATURES

A	STRASBOURG	**Le**	13/10/2021

Nom et signature du Représentant Chubb France		**Nom et signature du Représentant de l'Exploitant**	
Prénom, Nom	Brahim Belkadi	**Nom, Prénom**	Arnaud SCHMITT

Thème observation	Observation

FTS n°1, Autres détecteurs déclenchés	01119 / 0371/0/N/ATR/DOL/119 
FTS n° 1	Test ZF ATTIUM et contrôle bon fonctionnement DI Linéaire
