Chubb France

SIEGE SOCIAL : 10 AVENUE DE L'ENTREPRISE
PARC SAINT CHRISTOPHE - BAT MAGELLAN 1
95 862 CERGY PONTOISE CEDEX
702 000 522 RCS PONTOISE
SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE AU CAPITAL DE 32 302 720 EUROS

RAPPORT DE MISE EN SERVICE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

2021/10/06 15:03 - Rapport de Mise en Service SSI - 428J186362 - UNISTRA - ATRIUM - STRASBOURG

Agence Strasbourg Installations
Rue du Pont du Péage
Parc de la Porte Sud
Bâtiment E
67118 GEISPOLSHEIM
Téléphone : +33 (0)3.88.55.36.55

INTERVENANT CHUBB FRANCE

Prénom, Nom	Brahim Belkadi
Fonction	Technicien
Téléphone	0683845640
Email	brahim.belkadi@chubb.fr

N° Projet	428J186362		
Désignation Projet	UNISTRA - ATRIUM - STRASBOURG		
Nom du client	UDS ATRIUM		
Lieu d'Intervention			
Adresse	16 RUE RENE DES CARTES ESPLANADE		
Code Postal	67000	**Ville**	STRASBOURG

CONTACT SUR SITE

Société	UNISTRA
Nom, Prénom	Arnaud SCHMITT
Fonction	Service technique
Téléphone	0677453673
Email	Ar.schmitt@unistra.fr

DATE D'INTERVENTION

06/10/2021

DOCUMENTS D'EXPLOITATION

Plans , Cahier des charges fonctionnel

TYPE D'INTERVENTION

Installation neuve

MISE EN SERVICE

définitive

EXPLOITATION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Chubb France

SIEGE SOCIAL : 10 AVENUE DE L'ENTREPRISE
PARC SAINT CHRISTOPHE - BAT MAGELLAN 1
95 862 CERGY PONTOISE CEDEX
702 000 522 RCS PONTOISE
SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE AU CAPITAL DE 32 302 720 EUROS

RAPPORT DE MISE EN SERVICE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

SYSTÈME DE DETECTION INCENDIE

Date de Mise en Service	15/07/2021
Etat Visuel à notre arrivée	Rien à signaler
Cavalier « Défaut Terre »	On
Etat Visuel à notre départ	Rien à signaler

Vérification fonctionnelle du Système de Sécurité Incendie

	Référence	Qté Installée	Qté Testée	Observation
RÉCEPTEUR OSI-90	64040003	2	2	X
EMETTEUR OSE-SPW STD 640400005		2	2	
ICF I SCAN+	640000028	2	2	
Interrupteur Réarmement OSID		2	2	X

SYSTÈME DE MISE EN SECURITE INCENDIE

Date de Mise en Service	15/07/2021
Etat Visuel à notre arrivée	Rien à signaler
Cavalier « Défaut Terre »	On
Etat Visuel à notre départ	

Vérification fonctionnelle des asservissements

	Qté Installée	Qté Testée	Observation
Porte Coupe-Feu Asservie	4	4	X

Evacuation

UGA n°	Temporisation Alarme Restreinte	Essai Processus Alarme Evacuation
1	Immédiate	Non effectué

Chubb France

SIEGE SOCIAL : 10 AVENUE DE L'ENTREPRISE
PARC SAINT CHRISTOPHE - BAT MAGELLAN 1
95 862 CERGY PONTOISE CEDEX
702 000 522 RCS PONTOISE
SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE AU CAPITAL DE 32 302 720 EUROS

RAPPORT DE MISE EN SERVICE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Photos des centrales à notre arrivée



Photos des centrales à notre départ



Photos de l'intérieur des coffrets



Chubb France

SIEGE SOCIAL : 10 AVENUE DE L'ENTREPRISE
PARC SAINT CHRISTOPHE - BAT MAGELLAN 1
95 862 CERGY PONTOISE CEDEX
702 000 522 RCS PONTOISE
SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE AU CAPITAL DE 32 302 720 EUROS

RAPPORT DE MISE EN SERVICE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Observations Générales

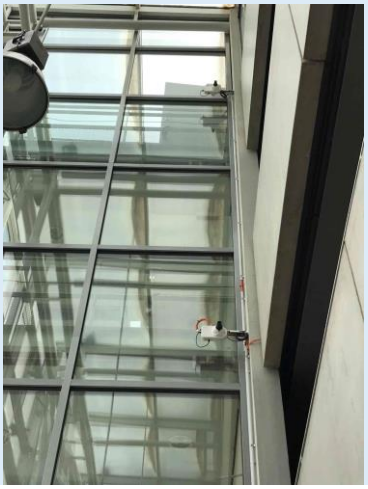
Rapport de mise en service complémentaire du 15/07/2021

Mise en service OSID ATRIUM OK

Mise en service PCF Cage escalier R+1/R+2/R+3 + Circulation

Signatures

Nom et signature du Technicien Chubb France	Nom et signature du Responsable d'Établissement ou de son Représentant	Nom et signature du titulaire du Marché (Donneur d'Ordre pour Chubb France)
Prénom, Nom :	**Prénom, Nom:**	**Prénom, Nom:**
Brahim Belkadi	**Arnaud SCHMITT/COVID**	
		

Thème Obs.	Observation	Photos
RÉCEPTEUR OSI-90	Mise en service détecteur linéaire R+1/R+3 Adresse 01119/01120 Test DI OK	

Chubb France

SIEGE SOCIAL : 10 AVENUE DE L'ENTREPRISE
PARC SAINT CHRISTOPHE - BAT MAGELLAN 1
95 862 CERGY PONTOISE CEDEX
702 000 522 RCS PONTOISE
SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE AU CAPITAL DE 32 302 720 EUROS

RAPPORT DE MISE EN SERVICE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Thème Obs.	Observation	Photos
Interrupteur Réarmement OSID	Réarmement + prise USB pour maitenance	
PCF	Blocage mécanique frottement au sol PCF R+2 Cage escalier	
