KAWANA CONSEILS et EXPERTISES

268 rue Jacques IEKAWE
BP 8546
988407 NOUMEA CEDEX
Tél. : 28 88 08 / 78 79 35
e mail : t.rappalini@kawana-conseil.nc
kce.thr@gmail.com

Référence : AFF-26-031-diag-p-DID-base-186-13
Date d'édition : 01/09/2026

RAPPORT DE SYNTHESE DES MESURES PLOMB SUR LES PEINTURES

DESIGNATION DU BATIMENT	DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE
Désignation du bâtiment : Hangar 13 **Fonction principale du bâtiment :** Abri hélicoptère **Date du permis de Construire :** < 1997 **Adresse :** Base 186 de Tontouta **Propriété de :** La défense	**DID** **Adresse :** 2, rue Olry - BP 38 - 98843 NOUMÉA cedex

La peinture sur les éléments de l'ossature métallique du bâtiment contient du plomb.
La peinture sur les éléments de la construction ne contient pas de plomb.

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	
KAWANA CONSEILS & EXPERTISES Tel : 28 88 08 / 78 79 35 Mail : kce.thr@gmail.com BP 8546-98807 NOUMEA CEDEX Ridet : 1 483 791.001	**Date d'établissement du rapport :** Fait à Nouméa le 01/09/2026 **Société :** KAWANA CONSEILS et EXPERTISES **Nom du diagnostiqueur :** M. Thierry RAPPALINI **Assurance :** Assurance SMA BTP contrat n°1265.000

SOMMAIRE

DESIGNATION DU BATIMENT 1
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE 1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 1
A. INFORMATIONS GENERALES 2
B. CONCLUSION 2
C. DESCRIPTION DE LA MISSION 3
D. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 3
E. SIGNATURE 5
F. ANNEXES 5
F.1 ANNEXE – CROQUIS DE REPERAGE 5
F.2 ANNEXE – RAPPORTS D'ESSAIS 7
F.3 ANNEXE – AUTRES DOCUMENTS 9

Ce rapport ne doit être reproduit qu'intégralement

A. INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N : AFF-26-031-diag-p-DID-base-186-13
Date de la commande : 03/07/2026
Date du repérage : 23/07/2026
Date de l'émission du rapport : 01/09/2026

REFERENCES REGLEMENTAIRES

Périmètre du repérage	Le projet prévoie la rénovation du bâtiment 13

B. CONCLUSION

Liste des mesures effectuées avec un **X-MET 8000** supérieures à la valeur critique de 1 mg/cm²

N°	Unités mesurées
00	Calibration
09, 10, 13, 19, 37, 39, 43, 60, 61, 69, 70, 75, 76, 77, 79, 80, 81	Ossature métallique en parois verticales Grilles

Liste des mesures effectuées avec un **X-MET 8000** inférieures à la valeur critique de 1 mg/cm²

N°	Matériau
01 à 08, 11, 12, 14 à 18, 20 à 36, 38, 40, 41, 42, 44 à 59, 62 à 68, 71 à 74, 78, 82, 83	Enduit peint (plafond, mur), porte et fenêtre

Liste des analyses effectuées par un laboratoire agréé supérieures à la valeur limite de 1 mg/cm²

Sans objet pas d'échantillon pour analyse

C. DESCRIPTION DE LA MISSION

C.1 BILAN DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE

Rapport concernant la recherche de plomb déjà réalisé	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Oui plans
Moyen mis à disposition	Moyens d'accès

C.2 PIECES OU LOCAUX NON VISITEES

Localisation	Parties du local	Raison
Les pièces 07 et 12 hors projet		

D. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

D.1 PAR ANALYSES EN LABORATOIRE

N°	Localisation	Matériaux et produit(s)	Commentaire(s)
Sans objet			

D.2 PAR MESUREUR

N°	Localisation	Matériaux et produit(s)	Commentaire(s)
00	Calibration	Echantillon calibré	Supérieure à la valeur critique
01	Atelier bureau 1 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
02	Atelier bureau 1 porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
03	Atelier bureau 1 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
04	Atelier bureau 1 porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
05	Stockage 20 bâti porte	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
06	Stockage 20 porte	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
07	Stockage 20 bâti porte	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
08	Stockage 20 porte	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
09	Atelier 1 ossature métallique ext.	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
10	Servitude 2 ossature métallique ext.	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
11	Servitude 2 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
12	Servitude 2 porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
13	Atelier 3 ossature métallique ext.	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
14	Atelier 3 porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
15	Atelier 3 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
16	Atelier 6 porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
17	Atelier 6 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
18	Atelier 6 ossature métallique ext.	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
19	Atelier 6 ossature métallique ext.	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
20	Servitude 2 bâti porte	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
21	Servitude 2 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
22	Servitude 2 EPM ext.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
23	Atelier 3 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
24	Atelier 3 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
25	Atelier 3 bâti fenêtre	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
26	Atelier 3 grille extérieure	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
27	Bureau 18 bâti porte	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
28	Bureau 18 porte	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
29	Local 18 ossature métallique ext.	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
30	Local 18 ossature métallique ext.	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
31	Local TGBT 4 bâti porte	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique

32	Local TGBT 4 porte	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
33	Atelier 6 grille ext.	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
34	Atelier 6 fenêtre ext.	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
35	Atelier 6 bati fenêtre ext.	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
36	Atelier 6 EPM ext.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
37	Atelier 6 poteau ext.	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
38	Atelier 6 EPM ext.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
39	Local 6 poteau ext.	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
40	Entrée 8 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
41	Entrée 8 porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
42	Entrée 8 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
43	Entrée 8 poteau int.	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
44	Magasin 6 EPM ext.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
45	Local 7 grille int.	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
46	Magasin 6 bâti porte	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
47	Magasin 6 porte	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
48	Magasin 6 peinture sol	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
49	Magasin 6 bâti porte	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
50	Magasinl 6 porte	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
51	Bureau 9 bâti porte	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
52	Bureau 9 porte	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
53	Local 9 bâti porte	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
54	Sanitaires 10 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
55	Vestiaire 11 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
56	Vestiaire 11 porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
57	Vestiaire 11 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
58	Magasin 14 bâti porte	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
59	Magasin14 porte	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
60	Magasin 14 ossature métallique ext.	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
61	Magasin 14 ossature métallique ext.	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
62	Magasin 14 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
63	Atelier 15 bâti porte	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
64	Atelier 15 peinture au sol	Peinture sur chape	Inférieure à la valeur critique
65	Vestiaire 11 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
66	Magasin 16 bâti porte	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
67	Magasin 16 porte	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
68	Magasin 16 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
69	Bureau 17 ossature métallique ext.	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
70	Bureau 17 ossature métallique ext.	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
71	Local 17 bâti porte ext.	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
72	Local 17 bâti porte ext.	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
73	Local 17 bâti porte ext.	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
74	Local 17 bâti porte ext.	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
75	Magasin 16 ossature métallique ext.	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
76	Local 17 ossature métallique ext.	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
77	Magasin 14 grille ext.	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
78	Magasin 14 grille ext.	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
79	Magasin 14 grille ext.	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
80	Magasin 14 grille ext.	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
81	Bureau 13 grille ext.	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
82	Bureau 12 grille ext.	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
83	Local 17 EPM ext.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique

D.3	LABORATOIRE D'ANALYSE

Raison sociale et nom de l'entreprise : LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT
Adresse : Route de Neubourg, zone d'activités de la Baudrière 27520 Grand-Bourgtheroulde
Numéro d'accréditation : n°1-5094

E. SIGNATURE

La majorité des mesures plomb fait apparaître que les couches de peintures primaires (dessous) sont contaminées au plomb.
Par principe de précaution il y a lieu de considérer que l'ensemble des ossatures métalliques (mur et plafond) ont de la peinture contenant du plomb avec une teneur supérieure à la valeur critique de 1mg/cm².
Pour respecter la réglementation, les travaux de décapage, de préparation et de remise en peinture devront se faire avec du personnel formé et une entreprise assurée pour ce genre de travaux en présence de plomb.
Pendant les travaux si des matériaux non listés dans le présent rapport sont mis en évidence, des mesures complémentaires pourront être effectuées.

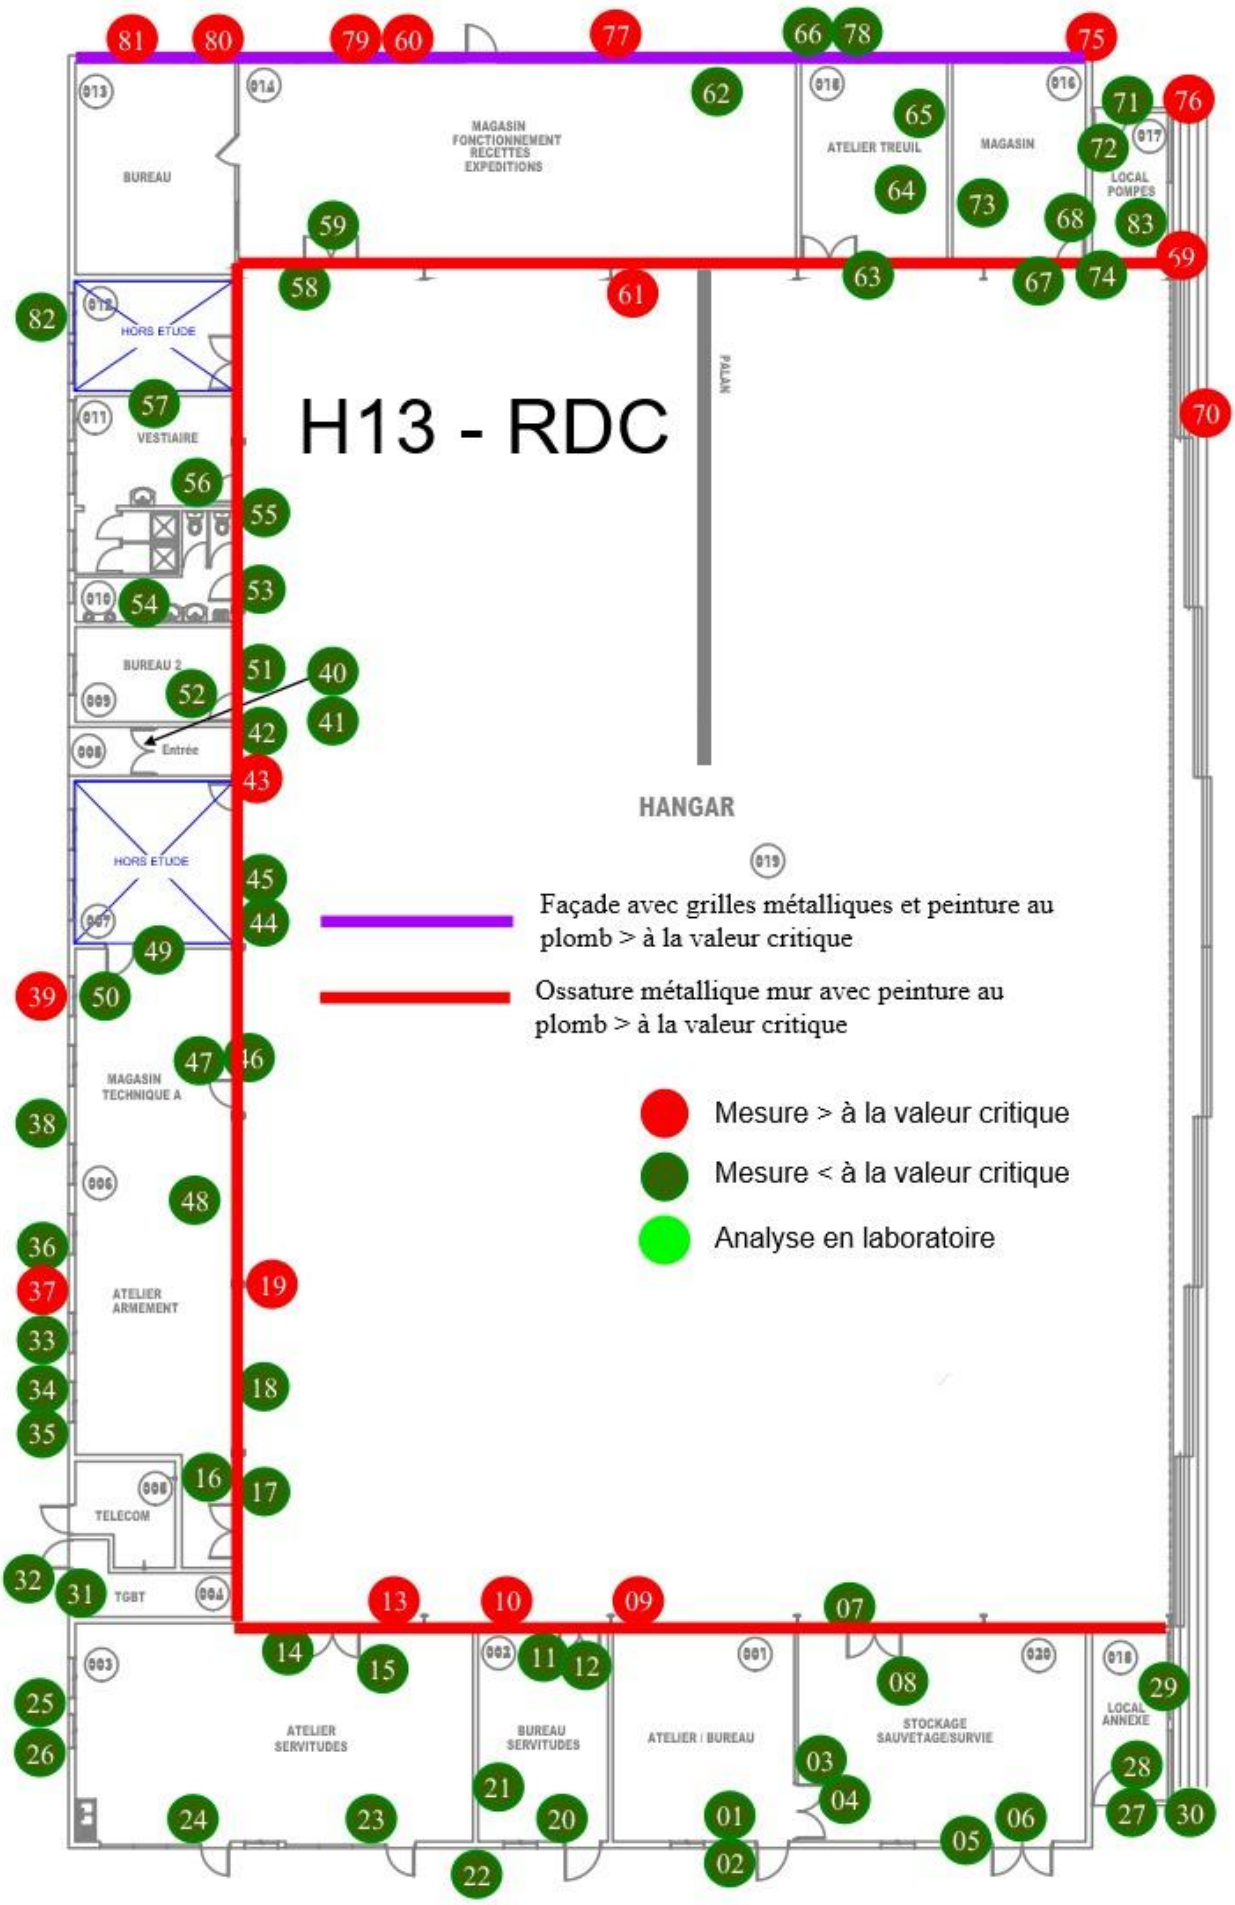
Fait à Nouméa, le 01/09/2026

Rédigé par Theerry RAPPALINI

KAWANA CONSEILS & EXPERTISES
Tel : 28 88 08 / 78 79 35
Mail : kce.thr@gmail.com
BP 8546-98807 NOUMEA CEDEX
Ridet : 1 483 791.001

F. ANNEXES

F.1	CROQUIS DE REPERAGE


H13 - RDC
BUREAU
MAGASIN FONCTIONNEMENT RECETTES EXPEDITIONS
ATELIER TREUIL
MAGASIN
LOCAL POMPES
HORS ETUDE
VESTIAIRE
BUREAU 2
Entrée
HORS ETUDE
MAGASIN TECHNIQUE A
ATELIER ARMEMENT
TELECOM
TGBT
PALAN
HANGAR
ATELIER SERVITUDES
BUREAU SERVITUDES
ATELIER / BUREAU
STOCKAGE SAUVETAGE/SURVIE
LOCAL ANNEXE
Façade avec grilles métalliques et peinture au plomb > à la valeur critique
Ossature métallique mur avec peinture au plomb > à la valeur critique
Mesure > à la valeur critique
Mesure < à la valeur critique
Analyse en laboratoire

F.2 RAPPORT DES MESURES

Mesures effectuées avec un X-MET 8000				
Numéro	**Localisation**	**Type structure**	**Date**	**Pb**
CCS DID HANGAR 13 # 0	Calibration	Echantillon calibré	23/07/2026	1,039
CCS DID HANGAR 13 # 1	Atelier bureau 1 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,158
CCS DID HANGAR 13 # 2	Atelier bureau 1 porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,138
CCS DID HANGAR 13 # 3	Atelier bureau 1 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,081
CCS DID HANGAR 13 # 4	Atelier bureau 1 porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,082
CCS DID HANGAR 13 # 5	Stockage 20 bâti porte	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,112
CCS DID HANGAR 13 # 6	Stockage 20 porte	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,104
CCS DID HANGAR 13 # 7	Stockage 20 bâti porte	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,140
CCS DID HANGAR 13 # 8	Stockage 20 porte	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,122
CCS DID HANGAR 13 # 9	Atelier 1 ossat. métallique ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	2,995
CCS DID HANGAR 13 # 10	Servit. 2 ossat. métallique ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	2,354
CCS DID HANGAR 13 # 11	Servitude 2 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,101
CCS DID HANGAR 13 # 12	Servitude 2 porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,095
CCS DID HANGAR 13 # 13	Atelier 3 ossat. métallique ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	1,861
CCS DID HANGAR 13 # 14	Atelier 3 porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,130
CCS DID HANGAR 13 # 15	Atelier 3 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,105
CCS DID HANGAR 13 # 16	Atelier 6 porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,134
CCS DID HANGAR 13 # 17	Atelier 6 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,146
CCS DID HANGAR 13 # 18	Atelier 6 ossat. métallique ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,082
CCS DID HANGAR 13 # 19	Atelier 6 ossat. métallique ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	2,198
CCS DID HANGAR 13 # 20	Servitude 2 bâti porte	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,095
CCS DID HANGAR 13 # 21	Servitude 2 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,105
CCS DID HANGAR 13 # 22	Servitude 2 EPM ext.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,091
CCS DID HANGAR 13 # 23	Atelier 3 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,111
CCS DID HANGAR 13 # 24	Atelier 3 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,107
CCS DID HANGAR 13 # 25	Atelier 3 bâti fenêtre	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,082
CCS DID HANGAR 13 # 26	Atelier 3 grille extérieure	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,105
CCS DID HANGAR 13 # 27	Bureau 18 bâti porte	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,177
CCS DID HANGAR 13 # 28	Bureau 18 porte	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,135
CCS DID HANGAR 13 # 29	Local 18 ossat. métallique ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,165
CCS DID HANGAR 13 # 30	Local 18 ossat. métallique ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,105
CCS DID HANGAR 13 # 31	Local TGBT 4 bâti porte	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,088
CCS DID HANGAR 13 # 32	Local TGBT 4 porte	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,104
CCS DID HANGAR 13 # 33	Atelier 6 grille ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,087
CCS DID HANGAR 13 # 34	Atelier 6 fenêtre ext.	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,094
CCS DID HANGAR 13 # 35	Atelier 6 bati fenêtre ext.	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,083
CCS DID HANGAR 13 # 36	Atelier 6 EPM ext.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,082
CCS DID HANGAR 13 # 37	Atelier 6 poteau ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	1,795
CCS DID HANGAR 13 # 38	Atelier 6 EPM ext.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,175
CCS DID HANGAR 13 # 39	Local 6 poteau ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	1,841
CCS DID HANGAR 13 # 40	Entrée 8 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,102
CCS DID HANGAR 13 # 41	Entrée 8 porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,098
CCS DID HANGAR 13 # 42	Entrée 8 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,092
CCS DID HANGAR 13 # 43	Entrée 8 poteau int.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	1,177
CCS DID HANGAR 13 # 44	Magasin 6 EPM ext.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,082
CCS DID HANGAR 13 # 45	Local 7 grille int.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,183



CCS DID HANGAR 13 # 46	Magasin 6 bâti porte	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,106
CCS DID HANGAR 13 # 47	Magasin 6 porte	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,106
CCS DID HANGAR 13 # 48	Magasin 6 peinture sol	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,118
CCS DID HANGAR 13 # 49	Magasin 6 bâti porte	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,115
CCS DID HANGAR 13 # 50	Magasinl 6 porte	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,106
CCS DID HANGAR 13 # 51	Bureau 9 bâti porte	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,103
CCS DID HANGAR 13 # 52	Bureau 9 porte	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,135
CCS DID HANGAR 13 # 53	Local 9 bâti porte	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,123
CCS DID HANGAR 13 # 54	Sanitaires 10 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,083
CCS DID HANGAR 13 # 55	Vestiaire 11 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,133
CCS DID HANGAR 13 # 56	Vestiaire 11 porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,082
CCS DID HANGAR 13 # 57	Vestiaire 11 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,088
CCS DID HANGAR 13 # 58	Magasin 14 bâti porte	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,081
CCS DID HANGAR 13 # 59	Magasin14 porte	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,081
CCS DID HANGAR 13 # 60	Mag. 14 ossat. métallique ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	4,588
CCS DID HANGAR 13 # 61	Mag. 14 ossat. métallique ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	1,266
CCS DID HANGAR 13 # 62	Magasin 14 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,082
CCS DID HANGAR 13 # 63	Atelier 15 bâti porte	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,082
CCS DID HANGAR 13 # 64	Atelier 15 peinture au sol	Peinture sur chape	23/07/2026	0,158
CCS DID HANGAR 13 # 65	Vestiaire 11 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,115
CCS DID HANGAR 13 # 66	Magasin 16 bâti porte	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,133
CCS DID HANGAR 13 # 67	Magasin 16 porte	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,081
CCS DID HANGAR 13 # 68	Magasin 16 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,082
CCS DID HANGAR 13 # 69	Bur. 17 ossat. métallique ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	2,181
CCS DID HANGAR 13 # 70	Bur. 17 ossat. métallique ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	1,252
CCS DID HANGAR 13 # 71	Local 17 bâti porte ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,996
CCS DID HANGAR 13 # 72	Local 17 bâti porte ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,785
CCS DID HANGAR 13 # 73	Local 17 bâti porte ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,111
CCS DID HANGAR 13 # 74	Local 17 bâti porte ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,105
CCS DID HANGAR 13 # 75	Mag. 16 ossat. métallique ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	3,583
CCS DID HANGAR 13 # 76	Local 17 ossat. métallique ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	3,053
CCS DID HANGAR 13 # 77	Magasin 14 grille ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	9,100
CCS DID HANGAR 13 # 78	Magasin 14 grille ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,640
CCS DID HANGAR 13 # 79	Magasin 14 grille ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	3,433
CCS DID HANGAR 13 # 80	Magasin 14 grille ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	1,497
CCS DID HANGAR 13 # 81	Bureau 13 grille ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	5,141
CCS DID HANGAR 13 # 82	Bureau 12 grille ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,108
CCS DID HANGAR 13 # 83	Local 17 EPM ext.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,113

F.3	AUTRES DOCUMENTS

Notre référence à rappeler dans toute correspondance :
N° assuré : H 68935 T
N° contrat : 1265.000
N°RIDET : 1 483 791

SMA BTP

Pour tout renseignement contacter :
SMABTP NOUVELLE CALEDONIE
Immeuble Odéon
23 route de l'Anse-Vata
BP 234
98845 NOUMEA CEDEX
Tél. : 225 90 25
Courriel : smabtp@smabtp.nc

SARL KAWANA CONSEILS ET EXPERTISES
268 RUE JACQUES IEKAWE
98800 NOUMEA

Attestation d'assurance
MULTIGARANTIE CONCEPTEUR NOUVELLE-CALEDONIE

Période de validité : du 01/07/2026 au 31/12/2026

SMABTP, dont le siège social est situé 8, rue Louis Armand CS 71201 75738 PARIS CEDEX 15 ci-après désigné l'assureur, atteste que l'assuré désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat d'assurance professionnelle MULTIGARANTIE CONCEPTEUR n° **H 68935 T 1265.000** ayant pris effet le **02/02/2023**.

1 - PERIMETRE DES MISSIONS PROFESSIONNELLES GARANTIES

1-1 Missions bénéficiant des garanties d'assurance des garanties de responsabilité civile hors toutes garanties décennales

Seules les missions suivantes sont garanties par le présent contrat :

Mission : METRE
Définition : Mission limitée à l'établissement et/ou à la vérification de devis quantitatifs et/ou estimatifs, à l'exclusion des devis descriptifs.

Mission : DIAGNOSTIC IMMOBILIER
Définition :
1/ Missions relatives au diagnostic réalisé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre.
Diagnostics immobiliers visés :
- constat de risque d'exposition au plomb (CERP)
- Installations intérieures d'électricité

2/ Relevés de mesures Loi Carrez : Mission de relevés de mesures loi carrez dans le cadre de la loi n°96-1107 du 18/12/1996, en cas de vente d'un bien immobilier (loi n°96-1107 du 18/12/1996 ou tout équivalent applicable localement)

Mission : MAITRISE D'ŒUVRE RETRAIT DESAMIANTAGE BATIMENT ET ENVIRONNEMENTALE
Définition :
Maîtrise d'œuvre de désamiantage
