I.B.A
Inspection Bâtiment Atlantique

Pré-Rapport du 12/05/2021 de la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant démolition (Listes C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : IBA/2101/0584-B4
Date du repérage : 11 et 30,31/03/2021

Références réglementaires et normatives	
Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4531-1 du code du travail conjointement aux arrêtés du 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 et du 16 juillet 2019 et conformément aux articles R.1334-19, R.1334-22, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6 et l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, issues du décret 2011-629 du 3 juin 2011.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité	
Adresse	Rue : ..... **BASE AERIENNE 118 (BA118)** **Avenue du Colonnel Rozanoff** **Projet COGA** Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: **B4 Lot numéro Non communiqué,** Code postal, ville : . **40000 MONT-DE-MARSAN**
Périmètre de repérage :	**Zone travaux projet COGA** **Demolitions des Bâtiment, B4=0035= Investigations A .** **Relevé par carottage des dalles béton si possible ensemble des bâtiments.**
Type de logement : ..... **Bureaux et locaux techniques** Fonction principale du bâtiment : ..... **Bureaux** Date de construction : ..... **< 1997**	

Le propriétaire et le commanditaire	
Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom **:** ... **Ministère de la défense** **Bon de commande n°1510441922**
Le commanditaire	Nom et prénom : ... **ESID BX - ASC 1 BROCHARD Romain " Architecte du Pôle maîtrise d'œuvre"** Adresse : ..... **Division Investissement/ Pôle Maîtrise d'œuvre Interne** **Caserne Pelleport** **9 rue de Cursol** **CS 21152** **33068 BORDEAUX CEDEX (France)**

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ---------- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	RABEAU VIRGINIE	Opérateur de repérage	LCC QUALIXPERT 17 rue Borrel 81100 CASTRES	Obtention : 10/07/2017 Échéance : 09/07/2022 N° de certification : C0188

Raison sociale de l'entreprise : **IBA (Inspection Bâtiment Atlantique)** (Numéro SIRET : **791 276 868 00019)**
Adresse : **39 impasse Frédéric Mistral, 33127 SAINT JEAN D ILLAC**
Désignation de la compagnie d'assurance : **ALLIANZ**
Numéro de police et date de validité : **80810566 / 30 09 2021**

Le rapport de repérage
Date d'émission du rapport de repérage : 12/05/2021, remis au propriétaire le 12/05/2021
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 91 pages

Sommaire

1 Les conclusions
2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses
3 La mission de repérage
3.1 L'objet de la mission
3.2 Le cadre de la mission
3.2.1 L'intitulé de la mission
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
3.2.3 L'objectif de la mission
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
4 Conditions de réalisation du repérage
4.1 Bilan de l'analyse documentaire
4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
4.4 Plan et procédures de prélèvements
5 Résultats détaillés du repérage
5.0 Liste des matériaux (Liste C) reconnus visuellement
5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse
5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif
5.4 Liste des zones, présentée par catégorie
5.5 Récapitulatif zone par zone
6 Signatures
7 Annexes

1. – Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire :

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
Parties extérieures	**Identifiant: M003** **Réf. échantillon: P003** **Réf. laboratoire: IT072103-48407** **Description analysé: Fibrociment gris avec fibres visibles** **Composant de la construction: 10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Conduits, Siphons** **Partie à sonder: Couvercles des regards R2 et R3 fibres-ciment** **Sondage: Fractionnement**	**Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2	Identifiant: M004 Réf. échantillon: P004 Réf. laboratoire: IT072104-2295 Description: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 2- Bureau 14m2	Identifiant: M004 Réf. échantillon: P004 Réf. laboratoire: IT072104-2295 Description: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
prefa ancien/Bât 4/RDC - 3- Bureau 17m2	Identifiant: M004 Réf. échantillon: P004 Réf. laboratoire: IT072104-2295 Description: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2	Identifiant: M004 Réf. échantillon: P004 Réf. laboratoire: IT072104-2295 Description: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 5- Bureau 30m2	Identifiant: M004 Réf. échantillon: P004 Réf. laboratoire: IT072104-2295 Description: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 6- Bureau 11m2	Identifiant: M004 Réf. échantillon: P004 Réf. laboratoire: IT072104-2295 Description: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 7- Archives 6m2	**Identifiant: M004** **Réf. échantillon: P004** **Réf. laboratoire: IT072104-2295** **Description analysé: Peinture non séparable+matériau compact beige avec fibres visibles** **Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)** **Partie à sonder: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 20- Sanitaire 13m2	Identifiant: M004 Réf. échantillon: P004 Réf. laboratoire: IT072104-2295 Description: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 21-Bureau 11m2	Identifiant: M004 Réf. échantillon: P004 Réf. laboratoire: IT072104-2295 Description: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
prefa ancien/Bât 4/RDC - 22-Salle detente 34m2	Identifiant: M004 Réf. échantillon: P004 Réf. laboratoire: IT072104-2295 Description: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2	Identifiant: M004 Réf. échantillon: P004 Réf. laboratoire: IT072104-2295 Description: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 24-Bureau 11m2	Identifiant: M004 Réf. échantillon: P004 Réf. laboratoire: IT072104-2295 Description: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 25-Bureau 22m2	Identifiant: M004 Réf. échantillon: P004 Réf. laboratoire: IT072104-2295 Description: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 7- Archives 6m2	**Identifiant: M005** **Réf. échantillon: P005** **Réf. laboratoire: IT072104-2296** **Description: Panneaux et plaquestype glasal en fibre ciment** **Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds** **Partie à sonder: Panneaux et plaques** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Fractionnement**	**Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 8- Chaufferie 6m2	Identifiant: M005 Réf. échantillon: P005 Réf. laboratoire: IT072104-2296 Description: Panneaux et plaquestype glasal en fibre ciment Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 20- Sanitaire 13m2	**Identifiant: M011-3** **Echantillon: P011-3** **réf. laboratoire. IT072104-2302** **Description du matériau analysé: Colle beige +bois massif** **Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures donnant sur l'exterieur- Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres** Partie à sonder: Carrelage/Colle beige/Joint cassant/Bois massif **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
prefa ancien/Bât 4/RDC - 5- Bureau 30m2	**Identifiant: M013-6** **Echantillon:P013-6,** **réf. laboratoire. IT072104-2304** **Description analysé: Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable dalle dure cassante beige** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** Partie à sonder: Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 6- Bureau 11m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 21-Bureau 11m2	Identifiant: M013-6 Echantillon:P013-6, réf. laboratoire. IT072104-2304 Description: Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable dalle dure cassante beige Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	ZPSO Présence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 8- Chaufferie 6m2	**Identifiant: M018** **Réf. échantillon: P018** **Réf. laboratoire: IT072104-4183** **Description analysé: Bois sous forme de fibres+penture en faible quantité en vrac+matériau beige en vrac avec fibres visibles** **Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich** Partie à sonder: Panneaux en fibre ciment type glasal **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Raclage**	**Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
	Identifiant: M020 **Réf. échantillon: P020** **Réf. laboratoire: IT072104-4185** **Description analysé: Peinture non séparable+matériau fibreux marron** **Composant de la construction: 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes** Partie à sonder: Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage : fractionnement**	**Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2	Identifiant: M023 Réf. échantillon: P023 Réf. laboratoire: IT072104-4188 Description: Panneaux collés vissés ou cloués Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Panneaux collés vissés ou cloués Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2	**Identifiant: M023** **Réf. échantillon: P023** **Réf. laboratoire: IT072104-4188** **Description analysé: Panneaux collés vissés ou cloués** **Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds** **Partie à sonder: Panneaux collés vissés ou cloués** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Fractionnement**	**Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
prefa ancien/Bât 4/RDC - 5- Bureau 30m2	Identifiant: M023 Réf. échantillon: P023 Réf. laboratoire: IT072104-4188 Description: Panneaux collés vissés ou cloués Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Panneaux collés vissés ou cloués Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 6- Bureau 11m2	Identifiant: M023 Réf. échantillon: P023 Réf. laboratoire: IT072104-4188 Description: Panneaux collés vissés ou cloués Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Panneaux collés vissés ou cloués Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 21-Bureau 11m2	Identifiant: M023 Réf. échantillon: P023 Réf. laboratoire: IT072104-4188 Description: Panneaux collés vissés ou cloués Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Panneaux collés vissés ou cloués Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 22-Salle detente 34m2	Identifiant: M023 Réf. échantillon: P023 Réf. laboratoire: IT072104-4188 Description: Panneaux collés vissés ou cloués Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Panneaux collés vissés ou cloués Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2	Identifiant: M023 Réf. échantillon: P023 Réf. laboratoire: IT072104-4188 Description: Panneaux collés vissés ou cloués Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Panneaux collés vissés ou cloués Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 24-Bureau 11m2	Identifiant: M023 Réf. échantillon: P023 Réf. laboratoire: IT072104-4188 Description: Panneaux collés vissés ou cloués Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Panneaux collés vissés ou cloués Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 25-Bureau 22m2	Identifiant: M023 Réf. échantillon: P023 Réf. laboratoire: IT072104-4188 Description: Panneaux collés vissés ou cloués Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Panneaux collés vissés ou cloués Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante
Prefa ancien/bât 4/combles - Sous toiture	Identifiant: M023 Réf. échantillon: P023 Réf. laboratoire: IT072104-4188 Description: Panneaux collés vissés ou cloués Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Panneaux collés vissés ou cloués Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2	**Identifiant: M025** **Echantillon:P025** **réf. laboratoire: IT072104-4190** **Description analysé: Dalle dure cassante beige** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage et fractionnement**	**Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 2- Bureau 14m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 3- Bureau 17m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 25-Bureau 22m2	Identifiant: M025 Echantillon:P025 réf. laboratoire: IT072104-4190 Description analysé: Dalle dure cassante beige Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage et fractionnement	ZPSO Présence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2	**Identifiant: M025-2** **Echantillon:P025-2** **réf. laboratoire: IT072104-4190** **Description analysé: Dalle dure cassante rouge** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage et fractionnement**	**Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 2- Bureau 14m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 3- Bureau 17m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 25-Bureau 22m2	Identifiant: M025-2 Echantillon:P025-2 réf. laboratoire: IT072104-4190 Description: Dalle dure cassante rouge Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage et fractionnement	ZPSO Présence d'amiante

- des matériaux et produits ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
Parties extérieures*prefa ancien- bât B4	**Identifiant: M001** **Réf. échantillon: P001** **Réf. laboratoire: IT072103-48405** **Description analysé: Matériau fibreux jaune avec poussières** **Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage** **Partie à sonder: Isolation laine de verre en contact avec du glasal FC** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
	Identifiant: IBA/2101/0584-B4/M001-2 **Description analysé: Carton bitumé** **Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage** **Partie à sonder: carton bitumé** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
Parties extérieures/prefa ancien-bât B4	**Identifiant: M002** **Réf. échantillon: P002** **Réf. laboratoire: IT072103-48406** **Description analysé: Peintures multiples en vrac** **Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich** **Partie à sonder: Peinture des bardages métalliques** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 7- Archives 6m2	**Identifiant: M006** **Réf. échantillon: P006** **Réf. laboratoire: IT072104-2297** **Description analysé: Papier peint non séparable+peinture non séparable+matériau plâtreux blanc** **Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, plâtre** **Partie à sonder: Peinture décorative +papier peint** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Dépose**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
Prefa ancien/bât 4/combles - Sous toiture	**Identifiant: M007** **Réf. échantillon: P007** **Réf. laboratoire: IT072104-2298** **Description analysé: Matériaufibreux multicolore avec poussières** **Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)** **Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2 (zone des pièces 5 ;6 ;7 ;8 ;20 ;21)	**Identifiant: M008** **Echantillon:** **P008** **réf. laboratoire: IT072104-2299** **Description analysé: Carrelage** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Dalle de sol+ colle +carrelages+colle blanche+joint ciment +chape sur dalle bs+chape sur beton** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2 (zone des pièces 5 ;6 ;7 ;8 ;20 ;21)	**Identifiant: M008-2** **Echantillon:** **P008-2** **réf. laboratoire: IT072104-2299** **Description analysé: Colle beige joint cassant gris non séparable colle beige** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Dalle de sol+ colle +carrelages+colle blanche+joint ciment +chape sur dalle bs+chape sur beton** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2 (zone des pièces 5 ;6 ;7 ;8 ;20 ;21)	**Identifiant: M008-3** **Echantillon: P008-3** **réf. laboratoire.: IT072104-2299** **Description: Carrelage blanc** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Dalle de sol+ colle +carrelages+colle blanche+joint ciment +chape sur dalle bs+chape sur beton** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2 (zone des pièces 5 ;6 ;7 ;8 ;20 ;21)	**Identifiant: M008-4** **Echantillon:P008-4** **réf. laboratoire: IT072104-2299** **Description analysé: Matériau compact gris hétérogène** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Dalle de sol+ colle +carrelages+colle blanche+joint ciment +chape sur dalle bs+chape sur beton** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2 (zone des pièces 5 ;6 ;7 ;8 ;20 ;21)	**Identifiant: M008-5** **Echantillon:P008-5** **réf. laboratoire: IT072104-2299** **Description analysé: Ragréage rose non séparable colle bitumineuse noire** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Dalle de sol+ colle +carrelages+colle blanche+joint ciment +chape sur dalle bs+chape sur beton** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 20- Sanitaire 13m2	**Identifiant: M009** **Réf. échantillon: P009** **Réf. laboratoire: IT072104-2300** **Description analysé: Colle grise** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle de carrelage 30x30 sur ancien carrelage des douches et wc** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
	Identifiant: M010 **Echantillon:P010** **réf. laboratoire: IT072104-2301** **Description analysé: Colle beige** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle de carrelage 5x5+joint sur chape** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
	Identifiant: M010-2 **Echantillon:P010-2** **réf. laboratoire: IT072104-2301** **Description analysé: Joint cassant gris** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle de carrelage 5x5+joint sur chape** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
	Identifiant: M010-3 **Echantillon:P010-3** **réf. laboratoire: IT072104-2301** **Description analysé: Carrelage** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle de carrelage 5x5+joint sur chape** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**

prefa ancien/Bât 4/RDC - 20- Sanitaire 13m2	**Identifiant: M011** **Echantillon: P011** **réf. laboratoire: IT072104-2302** **Description analysé: Carrelage** **Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures donnant sur l'exterieur- Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres** **Partie à sonder: Colle de carrelage +joint sur panneau bois poser sur panneau fibre ciment type glasal** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
	Identifiant: M011-2 **Echantillon:P011-2** **réf. laboratoire: IT072104-2302** **Description analysé: Joint cassant blanc** **Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures donnant sur l'exterieur- Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres** **Partie à sonder: Colle de carrelage +joint sur panneau bois poser sur panneau fibre ciment type glasal** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 20- Sanitaire 13m2	**Identifiant: M012** **Echantillon:P012** **réf laboratoire: IT072104-2303** **Description analysé: Carrelage** **Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, cloisons de séparations** **Partie à sonder: Colle de faïence sur mur ciment** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire**)
prefa ancien/Bât 4/RDC - 22-Salle detente 34m2		ZPSO Absence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 20- Sanitaire 13m2	**Identifiant: M012-2** **Echantillon:P012-2** **réf laboratoire: IT072104-2303** **Description analysé: Colle grise** **Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, cloisons de séparations** **Partie à sonder: Colle de faïence sur mur ciment** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 22-Salle detente 34m2		ZPSO Absence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 20- Sanitaire 13m2	**Identifiant: M012-3** **Echantillon:P012-3** **réf. laboratoire: IT072104-2303** **Description analysé: Matériau compact gris hétérogène** **Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, cloisons de séparations** **Partie à sonder: Colle de faïence sur mur ciment** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 22-Salle detente 34m2		ZPSO Absence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 5- Bureau 30m2	**Identifiant: M013** **Echantillon:P013** **réf. laboratoire: IT072104-2304** **Description anlysé: Matériau compact gris hétérogène** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**

prefa ancien/Bât 4/RDC - 6- Bureau 11m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 21-Bureau 11m2	Identifiant: M013 Echantillon:P013 réf. laboratoire: IT072104-2304 Description : Matériau compact gris hétérogène Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage Sondage: Carottage	ZPSO Absence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 5- Bureau 30m2	**Identifiant: M013-2** **Echantillon:P013-2** **réf. laboratoire. IT072104-2304** **Description analysé: Carrelage** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 6- Bureau 11m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 21-Bureau 11m2	Identifiant: M013-2 Echantillon:P013-2 réf. laboratoire. IT072104-2304 Description : Carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	ZPSO Absence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 5- Bureau 30m2	**Identifiant: M013-3** **Echantillon:P013-3** **réf. laboratoire: IT072104-2304** **Description analysé: Colle beige** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 6- Bureau 11m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 21-Bureau 11m2	Identifiant: M013-3 Echantillon:P013-3 réf. laboratoire: IT072104-2304 Description: Colle beige Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	ZPSO Absence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 5- Bureau 30m2	**Identifiant: M013-4** **Echantillon:P013-4** **réf. laboratoire: IT072104-2304** **Description analysé: Ragréage rose** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**

prefa ancien/Bât 4/RDC - 6- Bureau 11m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 21-Bureau 11m2	Identifiant: M013-4 Echantillon:P013-4 réf. laboratoire: IT072104-2304 Description: Ragréage rose Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	ZPSO Absence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 5- Bureau 30m2	**Identifiant: M013-5** **Echantillon:P013-5** **réf. laboratoire: IT072104-2304** **Description analysé: Colle bitumineuse noire ragréage gris non séparable** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 6- Bureau 11m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 21-Bureau 11m2	Identifiant: M013-5 Echantillon:P013-5 réf. laboratoire: IT072104-2304 Description: Colle bitumineuse noire ragréage gris non séparable Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	ZPSO Absence d'amiante
RDC - 1- Entrée 51m2 zone partie recente S9 et S19	**Identifiant: M014** **Echantillon:P014** **réf. laboratoire: IT072104-2305** **Description: Joint cassant gris non séparable colle grise non séparable matériau beige non séparable peinture non séparable** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle de carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa récent /Bât 4/RDC - 9- Sanitaire 9,5m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 19- Sanitaire 9,5m2	Identifiant: M014 Echantillon:P014 réf. laboratoire: IT072104-2305 Description: Joint cassant gris non séparable colle grise non séparable matériau beige non séparable peinture non séparable Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	ZPSO Absence d'amiante
RDC - 1- Entrée 51m2 zone partie recente S9 et S19	**Identifiant: M014-2** **Echantillon:P014-2** **réf. laboratoire: IT072104-2305** **Description analysé: Carrelage** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle de carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**

prefa récent /Bât 4/RDC - 9- Sanitaire 9,5m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 19- Sanitaire 9,5m2	Identifiant: M014-2 Echantillon:P014-2 réf. laboratoire: IT072104-2305 Description: Carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	ZPSO Absence d'amiante
RDC - 1- Entrée 51m2 zone partie recente S9 et S19	**Identifiant: M014-3** **Echantillon:P014-3** **réf. laboratoire: IT072104-2305** **Description analysé: Matériau compact gris hétérogène polystyrène expansé (billes) blanc non séparable** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle de carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa récent /Bât 4/RDC - 9- Sanitaire 9,5m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 19- Sanitaire 9,5m2	Identifiant: M014-3 Echantillon:P014-3 réf. laboratoire: IT072104-2305 DescriptionMatériau compact gris hétérogène polystyrène expansé (billes) blanc non séparable Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	ZPSO Absence d'amiante
prefa récent /Bât 4/RDC - 10-Couloir 19m2	**Identifiant: M015** **Echantillon:P015** **réf. laboratoire: IT072104-4180** **Description analysé: Revêtement souple beige** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques bois - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle non bitumineuse+linoléum souple** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa récent /Bât 4/RDC - 11-Bureau17m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 12-Bureau14m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 13-Bureau14m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 14-Bureau14m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 15-Bureau14m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 16-Bureau14m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 17-Bureau14m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 18-Salle de cours53m2	Identifiant: M015 Echantillon:P015 réf. laboratoire: IT072104-4180 Description: Revêtement souple beige Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques bois - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse+linoléum souple Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	ZPSO Absence d'amiante
prefa récent /Bât 4/RDC - 10-Couloir 19m2	**Identifiant: M015-2** **Echantillon:P015-2** **réf. laboratoire: IT072104-4180** **Description analysé: Colle polymère jaune non séparable bois aggloméré** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques bois - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle non bitumineuse+linoléum souple** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**

prefa récent /Bât 4/RDC - 11-Bureau17m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 12-Bureau14m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 13-Bureau14m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 14-Bureau14m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 15-Bureau14m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 16-Bureau14m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 17-Bureau14m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 18-Salle de cours53m2	Identifiant: M015-2 Echantillon:P015-2 réf. laboratoire: IT072104-4180 Description: Colle polymère jaune non séparable bois aggloméré Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques bois - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse+linoléum souple Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	ZPSO Absence d'amiante
prefa récent /Bât 4/RDC - 18-Salle de cours53m2	**Identifiant: M016** **Echantillon:P016** **réf. laboratoire: IT072104-4181** **Description analysé: Revêtement souple beige** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques bois - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle non bitumineuse+ linoléum souple** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa récent /Bât 4/RDC - 10-Couloir 19m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 16-Bureau14m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 15-Bureau14m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 11-Bureau17m2	Identifiant: M016 Echantillon:P016 réf. laboratoire: IT072104-4181 Description : Revêtement souple beige Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques bois - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse+ linoléum souple Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	ZPSO Absence d'amiante
prefa récent /Bât 4/RDC - 18-Salle de cours53m2	**Identifiant: M016-2** **Echantillon:P016-2** **réf. laboratoire: IT072104-4181** **Description analysé: Colle polymère jaune** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques bois - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle non bitumineuse+ linoléum souple** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa récent /Bât 4/RDC - 10-Couloir 19m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 16-Bureau14m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 15-Bureau14m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 15-Bureau14m2	Identifiant: M016-2 Echantillon:P016-2 réf. laboratoire: IT072104-4181 Description: Colle polymère jaune Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques bois - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse+ linoléum souple Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	ZPSO Absence d'amiante
prefa récent /Bât 4/RDC - 18-Salle de cours53m2	Identifiant: M016-3 Echantillon:P016-3 réf. laboratoire: IT072104-4181 Description analysé: Bois massif bois sous forme de fibres non séparable Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques bois - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse+ linoléum souple Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

prefa récent /Bât 4/RDC - 10-Couloir 19m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 16-Bureau14m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 15-Bureau14m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 15-Bureau14m2	Identifiant: M016-3 Echantillon:P016-3 réf. laboratoire: IT072104-4181 Description analysé: Bois massif bois sous forme de fibres non séparable Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques bois - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse+ linoléum souple Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	ZPSO Absence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 22-Salle detente 34m2	**Identifiant: M017 Echantillon:P017 réf. laboratoire: IT072104-4182 Description analysé: Carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Carrelage+joints ciment+DDS+Colle bitumineuse+cgape sur dalle béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
	Identifiant: M017-2 Echantillon:P017-2 réf. laboratoire: IT072104-4182 Description analysé: Colle grise Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Carrelage+joints ciment+DDS+Colle bitumineuse+cgape sur dalle béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
	Identifiant: M017-3 Echantillon:P017-3 réf. laboratoire: IT072104-4182 Description analysé: Colle bitumineuse noire Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Carrelage+joints ciment+DDS+Colle bitumineuse+cgape sur dalle béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
	Identifiant: M017-4 Echantillon:P017-4 réf. laboratoire.: IT072104-4182 Description analysé: Joint cassant gris Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Carrelage+joints ciment+DDS+Colle bitumineuse+cgape sur dalle béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
	Identifiant: M017-5 Echantillon:P017-5 réf. laboratoire: IT072104-4182 Description analysé: Matériau compact gris hétérogène Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Carrelage+joints ciment+DDS+Colle bitumineuse+cgape sur dalle béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 8- Chaufferie 6m2	**Identifiant: M019 Echantillon:P019 réf. laboratoire: IT072104-4184 Description analysé: Peintures multiples en vrac Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Peinture de sol Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Fractionnement**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**

prefa ancien/Bât 4/RDC - 8- Chaufferie 6m2	**Identifiant:** M019-2 **Echantillon:**P019-2 **réf. laboratoire: IT072104-4184** **Description:** Matériau compact gris hétérogène **Composant de la construction:** 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols **Partie à sonder:** Peinture de sol **Liste selon annexe.13-9 du CSP:** C **Sondage:** Fractionnement	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2	**Identifiant:** M021 **Echantillon:**P021 **réf. laboratoire: IT072104-4186** **Description analysé:** Carrelage **Composant de la construction:** 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres **Partie à sonder:** Colle de plinthes en carrelage sur béton cellulaire et toile de verre peint **Liste selon annexe.13-9 du CSP:** C **Sondage:** Carottage	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
	Identifiant: M021-2 **Echantillon:**P021-2 **réf. laboratoire: IT072104-4186** **Description analysé:** Colle beige peinture avec couche en toile non séparable **Composant de la construction:** 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres **Partie à sonder:** Colle de plinthes en carrelage sur béton cellulaire et toile de verre peint **Liste selon annexe.13-9 du CSP:** C **Sondage:** Carottage	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
	Identifiant: M021 **Echantillon:**P021-3 **réf. laboratoire: IT072104-4186** **Description analysé:** Couche plâtreuse blanche **Composant de la construction:** 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres **Partie à sonder:** Colle de plinthes en carrelage sur béton cellulaire et toile de verre peint **Liste selon annexe.13-9 du CSP:** C **Sondage:** Carottage	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2	**Identifiant:** M022 **Echantillon:**P022 **réf. laboratoire: IT072104-4187** **Description analysé:** Carrelage **Composant de la construction:** 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols **Partie à sonder:** Colle bitumineuse+colle blanche de carrelage **Liste selon annexe.13-9 du CSP:** C **Sondage:** Carottage	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
	Identifiant: M022-2 **Echantillon:**P022-2 **réf. Laboratoire: IT072104-4187** **Description analysé:** Colle beige **Composant de la construction:** 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols **Partie à sonder:** Colle bitumineuse+colle blanche de carrelage **Liste selon annexe.13-9 du CSP:** C **Sondage:** Carottage	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**

prefa ancien/Bât 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2	**Identifiant: M022** **Echantillon:P022-3** **réf. laboratoire: IT072104-4187** **Description analysé: Colle bitumineuse noire** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle bitumineuse+colle blanche de carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 24-Bureau 11m2	**Identifiant: M024** **Echantillon:P024** **réf. laboratoire: IT072104-4189** **Description analysé: Carrelage** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle +DDS rouge+colle de carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage x2**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
	Identifiant: M024-2 **Echantillon:P024-2** **réf. laboratoire: IT072104-4189** **Description analysé: Colle grise** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle +DDS rouge+colle de carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage x2**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
	Identifiant: M024-3 **Echantillon:P024-3** **réf. laboratoire: IT072104-4189** **Description analysé: Matériau compact gris** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle +DDS rouge+colle de carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage x2**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
	Identifiant: M024-4 **Echantillon: P024-4** **réf. laboratoire: IT072104-4189** **Description analysé: Couche grise non séparable colle polymère jaune non séparable matériau rose** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle +DDS rouge+colle de carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage x2**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2	**Identifiant: M025-5** **Echantillon:P025-5** **réf. laboratoire: IT072104-4190** **Description analysé: Colle bitumineuse noire non séparable colle bitumineuse noire** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage et fractionnement**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 2- Bureau 14m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 3- Bureau 17m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 25-Bureau 22m2	Identifiant: M025-5 Echantillon:P025-5 réf. laboratoire: IT072104-4190 Description: Colle bitumineuse noire non séparable colle bitumineuse noire Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage et fractionnement	ZPSO Absence d'amiante

prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2	**Identifiant: M025-6** **Echantillon: P025-6** **réf. laboratoire: IT072104-4190** **Description analysé: Carrelage** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage et fractionnement**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 2- Bureau 14m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 3- Bureau 17m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 25-Bureau 22m2	Identifiant: M025-6 Echantillon: P025-6 réf. laboratoire: IT072104-4190 Description: Carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage et fractionnement	ZPSO Absence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2	**Identifiant: M025-4** **Echantillon:P025-4** **réf. laboratoire: IT072104-4190** **Description analysé: Colle grise** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage et fractionnement**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 2- Bureau 14m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 3- Bureau 17m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 25-Bureau 22m2	Identifiant: M025-4 Echantillon:P025-4 réf. laboratoire: IT072104-4190 Description: Colle grise Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage et fractionnement	ZPSO Absence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2	**Identifiant: M025-3** **Echantillon:P025-3** **réf. laboratoire: IT072104-4190** **Description analysé: Matériau compact gris hétérogène** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage et fractionnement**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 2- Bureau 14m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 3- Bureau 17m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 25-Bureau 22m2	Identifiant: M025-3 Echantillon:P025-3 réf. laboratoire: IT072104-4190 Description: Matériau compact gris hétérogène Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage et fractionnement	ZPSO Absence d'amiante

Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif		
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 21-Bureau 11m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 22-Salle detente 34m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2	Identifiant: IBA/2101/0584-B4/M026 Description: Faux plafonds 120x60 en laine de verre Composant de la construction: 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Visuel	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 2- Bureau 14m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 3- Bureau 17m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 5- Bureau 30m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 6- Bureau 11m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 24-Bureau 11m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 25-Bureau 22m2	Identifiant: IBA/2101/0584-B4/M027 Description: Faux plafonds friable 60x60 Composant de la construction: 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Analyse antérieur : DEFI1981814 du 16/07/1998	Absence d'amiante (Suivant documentation consultée DTA 60278-03-365 Indice 1)

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Vide sanitaire 9 et 19	Sol conduits ou canalisation souterraines	Partie inondée

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Institut technique des gaz et de l'air (ITGA)
Adresse : ..... Parc EDONIA rue de la Terre Bât R 66892 35768 Saint Grégoire Cedex
Numéro de l'accréditation Cofrac : 1-5967

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la démolition de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Pré-Rapport du 12/05/2021 de la mission de repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante avant démolition».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article R. 1334-19 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante ».
Conjointement, l'article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de l'évaluation des risques que le maître d'ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérogène portant sur les matériaux susceptibles d'en contenir

et qui doivent faire l'objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante (articles R 4412-97 à 113 et R 4412-139 et suivants du code du travail)
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante dans l'immeuble à démolir.»
Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 13-9 du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par la liste C de l'Annexe 13.9 du Code de la santé publique et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017

Extrait de l'annexe 13.9 (liste C) du Code de la santé publique modifié (liste non exhaustive)

Composant de la construction	*Partie du composant à vérifier ou à sonder*
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment
Ardoises	Ardoises composites
	Ardoises fibres-ciment
Eléments ponctuels	Conduits de cheminée
	Conduits de ventilation
	Conduits d'évacuation d'eau
Revêtements bitumineux d'étanchéité	Bardeaux d'asphalte
	Bardeaux bitume ("shingle")
	Pare-vapeur
	Revêtements
	Colles
Accessoires de toitures	Rivets
	Faîtages
	Closoirs
2. Façades	
Panneaux sandwichs	Plaques
	Joints d'assemblage
	Tresses
Bardages	Plaques fibres-ciment
	Bacs fibres-ciment
	Ardoises fibres-ciment
	Isolants sous bardages
Appuis de fenêtres	Eléments fibres-ciment
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons	Flocages
	Enduits projetés
	Revêtements durs (plaques planes fibres-ciment)
	Joints de dilatation
Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages
	Enduits projetés
	Joints de dilatation
	Entourage de poteaux (carton)
	Entourage de poteaux (fibres-ciment)
	Entourage de poteaux (matériau sandwich)
	Entourage de poteaux (carton+plâtre)
	Peintures intumescentes
Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (tresses)
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton)
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (fibres-ciment)
Gaines et coffres verticaux	Flocages
	Enduits projetés coupe-feu
	Enduits lissés coupe-feu
	Enduits talochés coupe-feu
	Panneaux
Portes coupe-feu, portes pare-flammes	Vantaux
	Joints
4. Plafonds et faux-plafonds	
Plafonds	Flocages
	Enduits projetés
	Panneaux collés ou vissés
	Coffrages perdus (carton-amiante)
	Coffrages perdus (fibres-ciment)
	Coffrages perdus (composites)
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)	Flocages
	Enduits projetés
	Peintures intumescentes
Interfaces entre structures	Rebouchage de trémies
	Jonctions avec la façade
	Calfeutrements
	Joints de dilatation
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits projetés
	Panneaux
	Jonction entre panneaux
Faux-plafonds	Panneaux
	Plaques
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Dalles plastiques
	Colles bitumineuses
	Revêtement plastique avec sous-couche
	Chape maigre
	Calfeutrement des passages de conduits
	Revêtement bitumineux des fondations
Revêtements de murs	Sous-couche des tissus muraux
	Revêtements durs (plaques de menuiseries)
	Revêtements durs (fibres-ciment)
	Colles des carrelages
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides)	Calorifugeages
	Enveloppes de calorifuges
	Conduits fibres-ciment

Conduits de vapeur, fumée, échappement	Conduits fibres-ciment
	joints entre éléments
	Mastics
	Tresses
	Manchons
Clapets / volets coupe-feu	Clapets coupe-feu
	Volets coupe-feu
	Rebouchage
Vide-ordures	Conduit fibres-ciment
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes et cloisons palières	Portes palières
	Cloisons palières
Trémie	Flocages
	Bourres
	Jonction murs / plancher
	Joints mousse
Machinerie	Flocages
	Bourres
	Jonction murs / plancher
	Joints mousse
8. Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes…..	Bourres
	Tresses
	Joints
	Calorifugeages
	Peintures anti-condensation
	Plaques isolantes internes
	Plaques isolantes externes
	Tissu amiante
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries…	Bourres
	Tresses
	Joints
	Calorifugeages
	Peintures anti-condensation
	Plaques isolantes
	Tissu amiante
	Freins
	Embrayages
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus	Eléments fibres-ciment

Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017 (liste non exhaustive)

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
	Fenêtres de toit, lanternaux, verrières
2 - Parois verticales extérieures et Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
	Éléments associés aux façades
3 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
4 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
	Suspentes et contrevents
5 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols
6 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Portes et cloisons palières
	parois des équipements
	Matériels en machinerie
8 - Équipements divers et accessoires	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	fusibles à broche

	canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
9 - Fondations et soubassements	Étanchéité des murs enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées
	Conduits et fourreaux
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	


3.2.6 *Le périmètre de repérage effectif*

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.


Etendu de la démolition :
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 2- Bureau 14m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 3- Bureau 17m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 5- Bureau 30m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 6- Bureau 11m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 7- Archives 6m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 8- Chaufferie 6m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 9- Sanitaire 9,5m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 19- Sanitaire 9,5m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 20- Sanitaire 13m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 21-Bureau 11m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 22- Salle detente 34m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 24- Bureau 11m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 25-Bureau 22m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 10-Couloir 19m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 11-Bureau17m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 12-Bureau14m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 13-Bureau14m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 14-Bureau14m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 15-Bureau14m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 16-Bureau14m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 17-Bureau14m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 18-Salle de cours53m2; Prefa ancien/bât 4/combles - Sous toiture : Démolition et retrait des Algecos

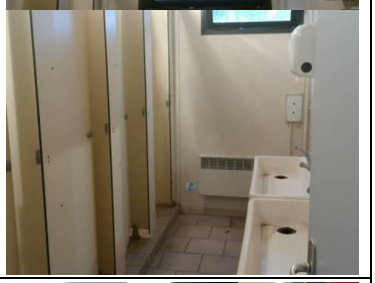


Liste des pièces visitées



Localisation	Description	Photo
Bâtiment B4	Bâtiment recent Algecco Couverture en bac acier descente EP en PVC Bâtiment ancient préfabrique Couverture en bac acier descente EP en PVC	
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Fibre ciment et Toile de verre peinture Faux Plafond : Panneaux laine de verre et Peinture Plinthes : Bois et Peinture Porte A : Aluminium Radiateur D : Métal et Peinture	

Localisation	Description	Photo
prefa ancien/Bât 4/RDC - 2- Bureau 14m2	Sol : Carrelage Sol : bois et Dalles plastiques +colle Mur A, B, C : Fibre ciment et Toile de verre peinture Mur D : Bois et Toile de verre peinture Bas des murs habillages A, B, C, D : Bois et Vernis Plinthes : Bois et Vernis Faux Plafond : Panneaux fibreux 60x60 Fenêtre avec volets C : Bois et Peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 D : Bois et Peinture Radiateur C : Métal et Peinture	 
prefa ancien/Bât 4/RDC - 3- Bureau 17m2	Sol : Carrelage Sol : bois et Dalles plastiques +colle Mur A : Fibre ciment et Toile de verre peinture Mur B : Bois et Toile de verre peinture Mur C, D : Fibre ciment et Toile de verre peinture Bas des murs habillages A, B, C, D : Bois et Vernis Plinthes : Bois et Vernis Faux Plafond : Panneaux fibreux 60x60 Fenêtre avec volets C : Bois et Peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 B : Bois et Peinture Radiateur C : Métal et Peinture	
prefa ancien/Bât 4/RDC - 5- Bureau 30m2	Sol : Carrelage Sol : Béton et Dalles plastiques+colle Mur A : Bois et Toile de verre peinture Mur B : Plâtre et Toile de verre peinture Mur C, D : Fibre ciment et Toile de verre peinture Plinthes : Bois et Peinture Faux Plafond : Panneaux fibreux 60x60 Fenêtre avec volets C : Bois et Peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Radiateurs C : Métal et Peinture	
prefa ancien/Bât 4/RDC - 6- Bureau 11m2	Sol : Carrelage Sol : Béton et Dalles plastiques+colle Mur A, B, C, D : Fibre ciment et Toile de verre peinture Faux Plafond : Panneaux fibreux 60x60 Fenêtre avec volets C : Bois et Peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Radiateurs C : Métal et Peinture Cadre d'ouverture B : Bois	 

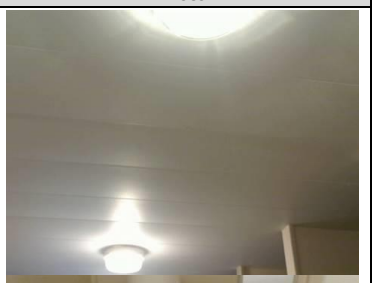
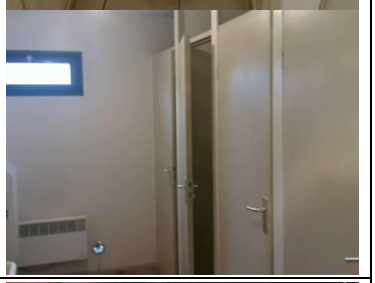
Localisation	Description	Photo
prefa ancien/Bât 4/RDC - 7- Archives 6m2	Sol : Béton Mur A, B, C, D : Fibre ciments et Peinture Mur E, F : Plâtre et Tapisserie Plafond : Panneaux bois et Peinture Plafond : Panneaux fibre ciment et Peinture Porte A : Bois et Peinture Fenêtre avec volets C : Bois et Peinture	  
prefa ancien/Bât 4/RDC - 20- Sanitaire 13m2	Sol : Béton et Carrelage Mur A : Bois et Peinture Mur lavabo A : Faïences Mur B, C, D : Fibre ciments et Peinture Plafond : Panneaux bois et Peinture Plafond à vérifier : Panneaux fibre ciment et Peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Mur douches,wc B : plâtre et Faiences Cloison de séparation sanitaires : plâtre et Toile de verre peint/Faiences Porte 2 (x4) C : Bois et Peinture Fenêtre B : bois et peinture Fenêtres (x4) C : bois et peinture Radiateur B : Métal et Peinture	
prefa ancien/Bât 4/RDC - 21-Bureau 11m2	Sol : Béton et Carrelage Plafond : Panneaux fibreux 120x60 et Peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Radiateur C : Métal et Peinture Fenêtres avec volets C : Bois et Peinture Mur A, B, C, D : Fibre ciments et Toile de verre peinture	
prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2	Sol : Béton et Carrelage Sol : Béton et Dalles plastiques+colle Mur A, B, C, D : Fibre ciment et Toile de verre peinture Plafond : Panneaux fibreux 120x60 et peinture Plinthes : Bois et Peinture Fenêtre avec volets C : bois et peinture Porte 1 A : bois et peinture Fenêtres avec volets C : Bois et Peinture Radiateur C : Métal et Peinture Mur bas habillage lambris A, B, C, D : Bois et Peinture	 

Localisation	Description	Photo
prefa ancien/Bât 4/RDC - 22-Salle detente 34m2	Sol : Béton et Carrelage Mur A, B, C, D : Fibre ciment et Toile de verre peinture Plafond : Panneaux fibreux 120x60 et peinture Plinthes : Bois et Peinture Fenêtre avec volets C : bois et peinture Porte A : bois et peinture	
prefa ancien/Bât 4/RDC - 24-Bureau 11m2	Sol : Béton et Carrelage Mur A, B, C, D : Fibre ciment et Toile de verre peinture Plafond : Panneaux fibreux 60x60 et peinture Plinthes : Bois et Peinture Fenêtre avec volets C : bois et peinture Porte 1 A : bois et peinture Radiateur C : Métal et Peinture	 
prefa ancien/Bât 4/RDC - 25-Bureau 22m2	Sol : Béton et Carrelage Mur A, B, C, D : Fibre ciment et Toile de verre peinture Plafond : Panneaux fibreux 60x60 et peinture Plinthes : Bois et Peinture Fenêtre avec volets C : bois et peinture Porte 1 A : bois et peinture Radiateur C : Métal et Peinture	 


Localisation	Description	Photo
prefa récent /Bât 4/RDC - 19- Sanitaire 9,5m2	Sol : Béton et Carrelage Vide sanitaire : Murs parpaing et Sol terre battue Mur A, B, C, D : Panneaux métal isolé mousse extrudé et Peinture Cloisons de separation : Bois compressé et Revêtement. PVC Plafond : Panneaux métal isolé mousse extrudé et peinture Plinthes : bois et peinture Fenêtre C : Aluminium et peinture Porte A : bois et peinture Portes B : bois compressé. PVC	  
prefa récent /Bât 4/RDC - 12-Bureau14m2	Sol : bois et Synthétique Mur Algecco A : Métal et Rev. Plastique Mur Algecco C : Métal et Peinture Plafond : Métal et peinture Porte A : Métal et peinture Fenêtre avec volets C : Aluminium Remarque : Le revêtement de sol est collé	 
prefa récent /Bât 4/RDC - 10-Couloir 19m2	Mur Algecco A : Métal et Peinture Mur Algecco B : Métal et Rev. Plastique Plafond : Métal et Peinture Porte 1 A : Métal et Peinture Porte 2 A : Aluminium Porte 3 B : Métal et Peinture Porte 4 C : Métal et Peinture Porte 5 C : Métal et Peinture Porte 6 C : Métal et Peinture Porte 7 C : Métal et Peinture Porte 8 C : Métal et Peinture Porte 9 C : Métal et Peinture Porte de sortie D : Métal et Peinture Fenêtre avec volets 1 A : Aluminium Fenêtre avec volets 2 A : Aluminium Remarque : Le revêtement de sol est collé	

Localisation	Description	Photo
prefa récent /Bât 4/RDC - 13-Bureau14m2	Sol : bois et Synthétique et plaque métal Mur Algecco A : Métal et Rev. Plastique Mur Algecco C : Métal et Peinture Plafond : Métal et Peinture Fenêtre avec volets C : Aluminium Porte A : Métal et peinture Remarque : Le revêtement de sol est collé	 
prefa récent /Bât 4/RDC - 17-Bureau14m2	Sol : bois et Synthétique Mur Algecco C : Métal et peinture Mur Algecco A : Métal et Rev. Plastique Plafond : Métal et peinture Fenêtre avec volets C : Aluminium Porte A : Métal et peinture Remarque : Le revêtement de sol est collé	 
prefa récent /Bât 4/RDC - 16-Bureau14m2	Sol : bois et Synthétique Mur Algecco C : Métal et peinture Mur Algecco A : Métal et Rev. Plastique Plafond : Métal et peinture Fenêtre avec volets C : Aluminium Porte A : Métal et peinture Remarque : Le revêtement de sol est collé	  

Localisation	Description	Photo
prefa récent /Bât 4/RDC - 15-Bureau14m2	Sol : bois et Synthétique Mur Algecco C : Métal et peinture Mur Algecco A : Métal et Rev. Plastique Plafond : Métal et peinture Fenêtre avec volets C : Aluminium Porte A : Métal et peinture Remarque : Le revêtement de sol est collé	 
prefa récent /Bât 4/RDC - 14-Bureau14m2	Sol : bois et Synthétique Mur Algecco A : Métal et Rev. Plastique Mur Algecco C : Métal et Peinture Plafond : Métal et Peinture Fenêtre avec volets C : Aluminium Porte A : Métal et peinture Remarque : Le revêtement de sol est collé	 
prefa récent /Bât 4/RDC - 18-Salle de cours53m2	Mur Algecco A : Métal et Rev. Plastique Mur Algecco B : Métal et Peinture Plafond : Métal et peinture Fenêtre avec volets 1 B : Aluminium Fenêtre avec volets 2 B : Aluminium Fenêtre avec volets 3 B : Aluminium Fenêtre avec volets 4 D : Aluminium Fenêtre avec volets 5 D : Aluminium Porte 1 A : Métal et peinture Porte 2 D : Aluminium sol Fourreaux Electric D : PVC Remarque : Le revêtement de sol est collé Remarque : Le revêtement de sol est collé	 

Localisation	Description	Photo
prefa récent /Bât 4/RDC - 9- Sanitaire 9,5m2	Sol : Béton et Carrelage Vide sanitaire : Murs parpaing et Sol terre battue Mur A, B, C, D : Panneaux métal isolé mousse extrudé et Peinture Cloisons de separation : Panneaux métal isolé mousse extrudé et peinture Plafond : Panneaux métal isolé mousse extrudé et peinture Plinthes : bois et peinture Fenêtre C : Aluminium Porte A : bois et peinture Portes D : bois et peinture	  
Prefa ancien/bât 4/combles - Sous toiture	Sol : Poques de glasal Sol : plaques de glasal FC Isolant : Laine de verre sol : Panneaux aggloméré Couverture : Bac acier simple peau structure : Métal et Peinture calorifugeages : Fibre et laine Conduit de fumée : Inox trappe : Double plaque de glasal FC	  

Localisation	Description	Photo
prefa ancien/Bât 4/RDC - 8- Chaufferie 6m2	Sol : Béton et peinture Mur A, B, C : Plaque FC type glasal et Peinture Mur D : Plâtre et Peinture Faux plafond : Fibre type glasal autour du conduit inox Porte : Métal et Peinture Chaudière : Joint de brûleur fibreux Calorifugeage : Mousse armaflex Conduit d'air : Galvanisé Goulotte : PVC	     
prefa ancien/Bât 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2	Sol : Carrelage Mur A, B, C : Fibre ciment et Toile de verre peinture Mur D : Beton cellulaire et Toile de verre peinture Plinthes : Carrelage Faux Plafond : Panneaux fibreux 60x60 Fenêtre avec volets C : Bois et Peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 A : Bois et Peinture Porte 3 A : Bois et Peinture Radiateurs C : Métal et Peinture	

Localisation	Description	Photo
prefa récent /Bât 4/RDC - 11-Bureau17m2	Sol : bois et Synthétique Mur Algecco A : Métal et Rev. Plastique Mur Algecco B : Métal et Peinture Plafond : Métal et peinture Fenêtre avec volets 1 B : Aluminium Fenêtre avec volets 2 D : Aluminium Porte A : Métal et peinture Remarque : Le revêtement de sol est collé	 

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés GRM	Rapport amiante n°60278-03/365 indice 1 daté du 2006 Avec intégration des informations sur l'analyse antérieure DEFI1981814_ daté du 16/07/1998
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Oui
Dossier technique amiante DEFI **non annexé** (flocage, calorifugeage,FPL)	Rapport n° DEFI1981814_ daté du 16/07/1998

Observations :
Le rapport consulté est incomplet, il ne fait apparaître que les parements des murs extérieurs et cloisons intérieures en fibre ciment et il fait réference à une analyse antérieure sur un faux plafond en salle de repos B4-01 datant de 1998 fait par la société DEFI mais rien sur les panneaux rigide au dessus qui sont pourtant en amiante ciment.

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 16/12/2020
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 11 et 30,31/03/2021
Heure d'arrivée : 09 h 00
Durée du repérage : +/-3j
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Aucun accompagnateur

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible inodée		X	X
Combles ou toiture accessibles et visitables partiellement,	X		X

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.
Remarque :
Sur le prefa ancien il est observé plusieurs changement de cloison intérieurs celle-ci sont en bois, en béton cellulaire ou plâtre, cepedant la plus grande prudence est à avoir lors de la desconstruction.
Car il se peut que certaines d'entre elles fasse office d'encoffrement des cloisons initiale en glasal ce que nous avons pu observer dans la chaufferie.
L'ensemble des sols de la partie ancienne du préfa a fait l'objet d'un encapsulage recouvrant des dalles de sol avec colle noire ceux-ci étant hétérogène il est possible que des analyses en cours de démolition soient necessaires et ceux malgres nous divers sondages et prélèvement transmis au laboratoire.
L'ensemble des plafonds de type glasal qui se trouventen plénum au dessus des faux plafonds fibreux de type Amstrong ou de laine minérale voir de panneaux bois contiennent de l'amiante.

5. – Résultats détaillés du repérage

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation et préconisations
Parties extérieures	**Identifiant: M003** **Réf. échantillon: P003** **Réf. laboratoire: IT072103-48407** **Description analysé: Fibrociment gris avec fibres visibles** **Composant de la construction: 10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Conduits, Siphons** **Partie à sonder: Couvercles des regards R2 et R3 fibres-ciment** **Sondage: Fractionnement**	**Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**	**Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2	Identifiant: M004 Réf. échantillon: P004 Réf. laboratoire: IT072104-2295 Description: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante	Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage
prefa ancien/Bât 4/RDC - 2- Bureau 14m2	Identifiant: M004 Réf. échantillon: P004 Réf. laboratoire: IT072104-2295 Description: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante	Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage
prefa ancien/Bât 4/RDC - 3- Bureau 17m2	Identifiant: M004 Réf. échantillon: P004 Réf. laboratoire: IT072104-2295 Description: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante	Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage
prefa ancien/Bât 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2	Identifiant: M004 Réf. échantillon: P004 Réf. laboratoire: IT072104-2295 Description: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante	Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage
prefa ancien/Bât 4/RDC - 5- Bureau 30m2	Identifiant: M004 Réf. échantillon: P004 Réf. laboratoire: IT072104-2295 Description: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante	Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage
prefa ancien/Bât 4/RDC - 6- Bureau 11m2	Identifiant: M004 Réf. échantillon: P004 Réf. laboratoire: IT072104-2295 Description: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante	Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation et préconisations
prefa ancien/Bât 4/RDC - 7-Archives 6m2	**Identifiant: M004** **Réf. échantillon: P004** **Réf. laboratoire: IT072104-2295** **Description analysé: Peinture non séparable+matériau compact beige avec fibres visibles** **Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)** **Partie à sonder: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**	**Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 20-Sanitaire 13m2	Identifiant: M004 Réf. échantillon: P004 Réf. laboratoire: IT072104-2295 Description: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante	Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage
prefa ancien/Bât 4/RDC - 21-Bureau 11m2	Identifiant: M004 Réf. échantillon: P004 Réf. laboratoire: IT072104-2295 Description: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante	Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage
prefa ancien/Bât 4/RDC - 22-Salle detente 34m2	Identifiant: M004 Réf. échantillon: P004 Réf. laboratoire: IT072104-2295 Description: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante	Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage
prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2	Identifiant: M004 Réf. échantillon: P004 Réf. laboratoire: IT072104-2295 Description: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante	Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage
prefa ancien/Bât 4/RDC - 24-Bureau 11m2	Identifiant: M004 Réf. échantillon: P004 Réf. laboratoire: IT072104-2295 Description: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante	Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage
prefa ancien/Bât 4/RDC - 25-Bureau 22m2	Identifiant: M004 Réf. échantillon: P004 Réf. laboratoire: IT072104-2295 Description: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante	Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage
prefa ancien/Bât 4/RDC - 7-Archives 6m2	**Identifiant: M005** **Réf. échantillon: P005** **Réf. laboratoire: IT072104-2296** **Description: Panneaux et plaquestype glasal en fibre ciment** **Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds** **Partie à sonder: Panneaux et plaques** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Fractionnement**	**Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**	**Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 8-Chaufferie 6m2	Identifiant: M005 Réf. échantillon: P005 Réf. laboratoire: IT072104-2296 Description: Panneaux et plaquestype glasal en fibre ciment Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante	Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation et préconisations
prefa ancien/Bât 4/RDC - 20-Sanitaire 13m2	**Identifiant: M011-3** **Echantillon: P011-3** **réf. laboratoire. IT072104-2302** **Description du matériau analysé: Colle beige +bois massif** **Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures donnant sur l'exterieur- Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres** Partie à sonder: Carrelage/Colle beige/Joint cassant/Bois massif **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**	**Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 5-Bureau 30m2	**Identifiant: M013-6** **Echantillon:P013-6,** **réf. laboratoire. IT072104-2304** **Description analysé: Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable dalle dure cassante beige** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** Partie à sonder: Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**	**Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 6- Bureau 11m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 21-Bureau 11m2	Identifiant: M013-6 Echantillon:P013-6, réf. laboratoire. IT072104-2304 Description: Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable dalle dure cassante beige Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	ZPSO Présence d'amiante	**Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 8-Chaufferie 6m2	**Identifiant: M018** **Réf. échantillon: P018** **Réf. laboratoire: IT072104-4183** **Description analysé: Bois sous forme de fibres+penture en faible quantité en vrac+matériau beige en vrac avec fibres visibles** **Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich** Partie à sonder: Panneaux en fibre ciment type glasal **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Raclage**	**Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**	**Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage**
	Identifiant: M020 **Réf. échantillon: P020** **Réf. laboratoire: IT072104-4185** **Description analysé: Peinture non séparable+matériau fibreux marron** **Composant de la construction: 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes** Partie à sonder: Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage : fractionnement**	**Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**	**Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2	Identifiant: M023 Réf. échantillon: P023 Réf. laboratoire: IT072104-4188 Description: Panneaux collés vissés ou cloués Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Panneaux collés vissés ou cloués Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante	Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage
prefa ancien/Bât 4/RDC - 4-Salle de reunion 17m2	**Identifiant: M023** **Réf. échantillon: P023** **Réf. laboratoire: IT072104-4188** **Description analysé: Panneaux collés vissés ou cloués** **Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds** **Partie à sonder: Panneaux collés vissés ou cloués** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Fractionnement**	**Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**	**Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 5- Bureau 30m2	Identifiant: M023 Réf. échantillon: P023 Réf. laboratoire: IT072104-4188 Description: Panneaux collés vissés ou cloués Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Panneaux collés vissés ou cloués Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante	Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage
prefa ancien/Bât 4/RDC - 6- Bureau 11m2	Identifiant: M023 Réf. échantillon: P023 Réf. laboratoire: IT072104-4188 Description: Panneaux collés vissés ou cloués Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Panneaux collés vissés ou cloués Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante	Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation et préconisations
prefa ancien/Bât 4/RDC - 21-Bureau 11m2	Identifiant: M023 Réf. échantillon: P023 Réf. laboratoire: IT072104-4188 Description: Panneaux collés vissés ou cloués Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Panneaux collés vissés ou cloués Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante	Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage
prefa ancien/Bât 4/RDC - 22-Salle detente 34m2	Identifiant: M023 Réf. échantillon: P023 Réf. laboratoire: IT072104-4188 Description: Panneaux collés vissés ou cloués Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Panneaux collés vissés ou cloués Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante	Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage
prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2	Identifiant: M023 Réf. échantillon: P023 Réf. laboratoire: IT072104-4188 Description: Panneaux collés vissés ou cloués Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Panneaux collés vissés ou cloués Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante	Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage
prefa ancien/Bât 4/RDC - 24-Bureau 11m2	Identifiant: M023 Réf. échantillon: P023 Réf. laboratoire: IT072104-4188 Description: Panneaux collés vissés ou cloués Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Panneaux collés vissés ou cloués Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante	Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage
prefa ancien/Bât 4/RDC - 25-Bureau 22m2	Identifiant: M023 Réf. échantillon: P023 Réf. laboratoire: IT072104-4188 Description: Panneaux collés vissés ou cloués Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Panneaux collés vissés ou cloués Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante	Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage
Prefa ancien/bât 4/combles - Sous toiture	Identifiant: M023 Réf. échantillon: P023 Réf. laboratoire: IT072104-4188 Description: Panneaux collés vissés ou cloués Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Panneaux collés vissés ou cloués Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	ZPSO Présence d'amiante	Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage
prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2	**Identifiant: M025** **Echantillon:P025** **réf. laboratoire: IT072104-4190** **Description analysé: Dalle dure cassante beige** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage et fractionnement**	**Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**	**Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 2- Bureau 14m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 3- Bureau 17m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 25-Bureau 22m2	Identifiant: M025 Echantillon:P025 réf. laboratoire: IT072104-4190 Description analysé: Dalle dure cassante beige Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage et fractionnement	ZPSO Présence d'amiante	Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage
prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2	**Identifiant: M025-2** **Echantillon:P025-2** **réf. laboratoire: IT072104-4190** **Description analysé: Dalle dure cassante rouge** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage et fractionnement**	**Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**	**Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 2- Bureau 14m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 3- Bureau 17m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 25-Bureau 22m2	Identifiant: M025-2 Echantillon:P025-2 réf. laboratoire: IT072104-4190 Description: Dalle dure cassante rouge Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage et fractionnement	ZPSO Présence d'amiante	Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
Parties extérieures*prefa ancien- bât B4	Identifiant: M001 Réf. échantillon: P001 Réf. laboratoire: IT072103-48405 Description analysé: Matériau fibreux jaune avec poussières Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage Partie à sonder: Isolation laine de verre en contact avec du glasal FC Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Identifiant: IBA/2101/0584-B4/M001-2 Description analysé: Carton bitumé Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage Partie à sonder: carton bitumé Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Parties extérieures/prefa ancien-bât B4	Identifiant: M002 Réf. échantillon: P002 Réf. laboratoire: IT072103-48406 Description analysé: Peintures multiples en vrac Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich Partie à sonder: Peinture des bardages métalliques Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
prefa ancien/Bât 4/RDC - 7-Archives 6m2	Identifiant: M006 Réf. échantillon: P006 Réf. laboratoire: IT072104-2297 Description analysé: Papier peint non séparable+peinture non séparable+matériau plâtreux blanc Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, plâtre Partie à sonder: Peinture décorative +papier peint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Dépose	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Prefa ancien/bât 4/combles - Sous toiture	Identifiant: M007 Réf. échantillon: P007 Réf. laboratoire: IT072104-2298 Description analysé: Matériaufibreux multicolore avec poussières Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1-Entrée 51m2 (zone des pièces 5 ;6 ;7 ;8 ;20 ;21)	Identifiant: M008 Echantillon: P008 réf. laboratoire: IT072104-2299 Description analysé: Carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol+ colle +carrelages+colle blanche+joint ciment +chape sur dalle bs+chape sur beton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1-Entrée 51m2 (zone des pièces 5 ;6 ;7 ;8 ;20 ;21)	Identifiant: M008-2 Echantillon: P008-2 réf. laboratoire: IT072104-2299 Description analysé: Colle beige joint cassant gris non séparable colle beige Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol+ colle +carrelages+colle blanche+joint ciment +chape sur dalle bs+chape sur beton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1-Entrée 51m2 (zone des pièces 5 ;6 ;7 ;8 ;20 ;21)	Identifiant: M008-3 Echantillon: P008-3 réf. laboratoire.: IT072104-2299 Description: Carrelage blanc Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol+ colle +carrelages+colle blanche+joint ciment +chape sur dalle bs+chape sur beton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1-Entrée 51m2 (zone des pièces 5 ;6 ;7 ;8 ;20 ;21)	Identifiant: M008-4 Echantillon:P008-4 réf. laboratoire: IT072104-2299 Description analysé: Matériau compact gris hétérogène Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol+ colle +carrelages+colle blanche+joint ciment +chape sur dalle bs+chape sur beton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1-Entrée 51m2 (zone des pièces 5 ;6 ;7 ;8 ;20 ;21)	Identifiant: M008-5 Echantillon:P008-5 réf. laboratoire: IT072104-2299 Description analysé: Ragréage rose non séparable colle bitumineuse noire Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol+ colle +carrelages+colle blanche+joint ciment +chape sur dalle bs+chape sur beton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
prefa ancien/Bât 4/RDC - 20-Sanitaire 13m2	**Identifiant:** M009 **Réf. échantillon:** P009 **Réf. laboratoire:** IT072104-2300 **Description analysé:** Colle grise **Composant de la construction:** 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols **Partie à sonder:** Colle de carrelage 30x30 sur ancien carrelage des douches et wc **Liste selon annexe.13-9 du CSP:** C **Sondage:** Carottage	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**
	Identifiant: M010 **Echantillon:**P010 réf. laboratoire: IT072104-2301 **Description analysé:** Colle beige **Composant de la construction:** 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols **Partie à sonder:** Colle de carrelage 5x5+joint sur chape **Liste selon annexe.13-9 du CSP:** C **Sondage:** Carottage	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**
	Identifiant: M010-2 **Echantillon:**P010-2 réf. laboratoire: IT072104-2301 **Description analysé:** Joint cassant gris **Composant de la construction:** 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols **Partie à sonder:** Colle de carrelage 5x5+joint sur chape **Liste selon annexe.13-9 du CSP:** C **Sondage:** Carottage	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**
	Identifiant: M010-3 **Echantillon:**P010-3 réf. laboratoire: IT072104-2301 **Description analysé:** Carrelage **Composant de la construction:** 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols **Partie à sonder:** Colle de carrelage 5x5+joint sur chape **Liste selon annexe.13-9 du CSP:** C **Sondage:** Carottage	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 20-Sanitaire 13m2	**Identifiant:** M011 **Echantillon:** P011 réf. laboratoire: IT072104-2302 **Description analysé:** Carrelage **Composant de la construction:** 3 - Parois verticales intérieures donnant sur l'exterieur- Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres **Partie à sonder:** Colle de carrelage +joint sur panneau bois poser sur panneau fibre ciment type glasal **Liste selon annexe.13-9 du CSP:** C **Sondage:** Carottage	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**
	Identifiant: M011-2 **Echantillon:**P011-2 réf. laboratoire: IT072104-2302 **Description analysé:** Joint cassant blanc **Composant de la construction:** 3 - Parois verticales intérieures donnant sur l'exterieur- Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres **Partie à sonder:** Colle de carrelage +joint sur panneau bois poser sur panneau fibre ciment type glasal **Liste selon annexe.13-9 du CSP:** C **Sondage:** Carottage	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 20-Sanitaire 13m2	**Identifiant:** M012 **Echantillon:**P012 réf laboratoire: IT072104-2303 **Description analysé:** Carrelage **Composant de la construction:** 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, cloisons de séparations **Partie à sonder:** Colle de faïence sur mur ciment **Liste selon annexe.13-9 du CSP:** C **Sondage:** Carottage	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 22-Salle detente 34m2		ZPSO Absence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 20-Sanitaire 13m2	**Identifiant:** M012-2 **Echantillon:**P012-2 réf laboratoire: IT072104-2303 **Description analysé:** Colle grise **Composant de la construction:** 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, cloisons de séparations **Partie à sonder:** Colle de faïence sur mur ciment **Liste selon annexe.13-9 du CSP:** C **Sondage:** Carottage	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 22-Salle detente 34m2		ZPSO Absence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 20-Sanitaire 13m2	**Identifiant:** M012-3 **Echantillon:**P012-3 réf. laboratoire: IT072104-2303 **Description analysé:** Matériau compact gris hétérogène **Composant de la construction:** 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, cloisons de séparations **Partie à sonder:** Colle de faïence sur mur ciment **Liste selon annexe.13-9 du CSP:** C **Sondage:** Carottage	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 22-Salle detente 34m2		ZPSO Absence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 5-Bureau 30m2	**Identifiant:** M013 **Echantillon:**P013 réf. laboratoire: IT072104-2304 **Description anlysé:** Matériau compact gris hétérogène **Composant de la construction:** 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols **Partie à sonder:** Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage **Liste selon annexe.13-9 du CSP:** C **Sondage:** Carottage	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
prefa ancien/Bât 4/RDC - 6- Bureau 11m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 21-Bureau 11m2	Identifiant: M013 Echantillon:P013 réf. laboratoire: IT072104-2304 Description : Matériau compact gris hétérogène Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage Sondage: Carottage	ZPSO Absence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 5-Bureau 30m2	**Identifiant: M013-2** **Echantillon:P013-2** **réf. laboratoire. IT072104-2304** **Description analysé: Carrelage** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 6- Bureau 11m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 21-Bureau 11m2	Identifiant: M013-2 Echantillon:P013-2 réf. laboratoire. IT072104-2304 Description : Carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	ZPSO Absence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 5-Bureau 30m2	**Identifiant: M013-3** **Echantillon:P013-3** **réf. laboratoire: IT072104-2304** **Description analysé: Colle beige** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 6- Bureau 11m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 21-Bureau 11m2	Identifiant: M013-3 Echantillon:P013-3 réf. laboratoire: IT072104-2304 Description: Colle beige Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	ZPSO Absence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 5-Bureau 30m2	**Identifiant: M013-4** **Echantillon:P013-4** **réf. laboratoire: IT072104-2304** **Description analysé: Ragréage rose** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 6- Bureau 11m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 21-Bureau 11m2	Identifiant: M013-4 Echantillon:P013-4 réf. laboratoire: IT072104-2304 Description: Ragréage rose Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	ZPSO Absence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 5-Bureau 30m2	**Identifiant: M013-5** **Echantillon:P013-5** **réf. laboratoire: IT072104-2304** **Description analysé: Colle bitumineuse noire ragréage gris non séparable** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 6- Bureau 11m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 21-Bureau 11m2	Identifiant: M013-5 Echantillon:P013-5 réf. laboratoire: IT072104-2304 Description: Colle bitumineuse noire ragréage gris non séparable Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	ZPSO Absence d'amiante
RDC - 1- Entrée 51m2 zone partie recente S9 et S19	**Identifiant: M014** **Echantillon:P014** **réf. laboratoire: IT072104-2305** **Description: Joint cassant gris non séparable colle grise non séparable matériau beige non séparable peinture non séparable** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle de carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
prefa récent /Bât 4/RDC - 9-Sanitaire 9,5m2	Identifiant: M014 Echantillon:P014 réf. laboratoire: IT072104-2305 Description: Joint cassant gris non séparable colle grise non séparable matériau beige non séparable peinture non séparable Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	ZPSO Absence d'amiante
prefa récent /Bât 4/RDC - 19-Sanitaire 9,5m2		
RDC - 1- Entrée 51m2 zone partie recente S9 et S19	**Identifiant: M014-2** **Echantillon:P014-2** **réf. laboratoire: IT072104-2305** **Description analysé: Carrelage** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle de carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**
prefa récent /Bât 4/RDC - 9-Sanitaire 9,5m2	Identifiant: M014-2 Echantillon:P014-2 réf. laboratoire: IT072104-2305 Description: Carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	ZPSO Absence d'amiante
prefa récent /Bât 4/RDC - 19-Sanitaire 9,5m2		
RDC - 1- Entrée 51m2 zone partie recente S9 et S19	**Identifiant: M014-3** **Echantillon:P014-3** **réf. laboratoire: IT072104-2305** **Description analysé: Matériau compact gris hétérogène polystyrène expansé (billes) blanc non séparable** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle de carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**
prefa récent /Bât 4/RDC - 9-Sanitaire 9,5m2	Identifiant: M014-3 Echantillon:P014-3 réf. laboratoire: IT072104-2305 DescriptionMatériau compact gris hétérogène polystyrène expansé (billes) blanc non séparable Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	ZPSO Absence d'amiante
prefa récent /Bât 4/RDC - 19-Sanitaire 9,5m2		
prefa récent /Bât 4/RDC - 10-Couloir 19m2	**Identifiant: M015** **Echantillon:P015** **réf. laboratoire: IT072104-4180** **Description analysé: Revêtement souple beige** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques bois - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle non bitumineuse+linoléum souple** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**
prefa récent /Bât 4/RDC - 11-Bureau17m2	Identifiant: M015 Echantillon:P015 réf. laboratoire: IT072104-4180 Description: Revêtement souple beige Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques bois - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse+linoléum souple Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	ZPSO Absence d'amiante
prefa récent /Bât 4/RDC - 12-Bureau14m2		
prefa récent /Bât 4/RDC - 13-Bureau14m2		
prefa récent /Bât 4/RDC - 14-Bureau14m2		
prefa récent /Bât 4/RDC - 15-Bureau14m2		
prefa récent /Bât 4/RDC - 16-Bureau14m2		
prefa récent /Bât 4/RDC - 17-Bureau14m2		
prefa récent /Bât 4/RDC - 18-Salle de cours53m2		
prefa récent /Bât 4/RDC - 10-Couloir 19m2	**Identifiant: M015-2** **Echantillon:P015-2** **réf. laboratoire: IT072104-4180** **Description analysé: Colle polymère jaune non séparable bois aggloméré** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques bois - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle non bitumineuse+linoléum souple** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**

prefa récent /Bât 4/RDC - 11-Bureau17m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 12-Bureau14m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 13-Bureau14m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 14-Bureau14m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 15-Bureau14m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 16-Bureau14m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 17-Bureau14m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 18-Salle de cours53m2	Identifiant: M015-2 Echantillon:P015-2 réf. laboratoire: IT072104-4180 Description: Colle polymère jaune non séparable bois aggloméré Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques bois - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse+linoléum souple Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	ZPSO Absence d'amiante
prefa récent /Bât 4/RDC - 18-Salle de cours53m2	**Identifiant: M016** **Echantillon:P016** **réf. laboratoire: IT072104-4181** **Description analysé: Revêtement souple beige** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques bois - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle non bitumineuse+ linoléum souple** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**
prefa récent /Bât 4/RDC - 10-Couloir 19m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 16-Bureau14m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 15-Bureau14m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 11-Bureau17m2	Identifiant: M016 Echantillon:P016 réf. laboratoire: IT072104-4181 Description : Revêtement souple beige Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques bois - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse+ linoléum souple Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	ZPSO Absence d'amiante
prefa récent /Bât 4/RDC - 18-Salle de cours53m2	**Identifiant: M016-2** **Echantillon:P016-2** **réf. laboratoire: IT072104-4181** **Description analysé: Colle polymère jaune** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques bois - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle non bitumineuse+ linoléum souple** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**
prefa récent /Bât 4/RDC - 10-Couloir 19m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 16-Bureau14m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 15-Bureau14m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 15-Bureau14m2	Identifiant: M016-2 Echantillon:P016-2 réf. laboratoire: IT072104-4181 Description: Colle polymère jaune Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques bois - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse+ linoléum souple Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	ZPSO Absence d'amiante
prefa récent /Bât 4/RDC - 18-Salle de cours53m2	Identifiant: M016-3 Echantillon:P016-3 réf. laboratoire: IT072104-4181 Description analysé: Bois massif bois sous forme de fibres non séparable Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques bois - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse+ linoléum souple Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
prefa récent /Bât 4/RDC - 10-Couloir 19m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 16-Bureau14m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 15-Bureau14m2 prefa récent /Bât 4/RDC - 15-Bureau14m2	Identifiant: M016-3 Echantillon:P016-3 réf. laboratoire: IT072104-4181 Description analysé: Bois massif bois sous forme de fibres non séparable Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques bois - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse+ linoléum souple Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	ZPSO Absence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 22-Salle detente 34m2	**Identifiant: M017** **Echantillon:P017** **réf. laboratoire: IT072104-4182** **Description analysé: Carrelage** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Carrelage+joints ciment+DDS+Colle bitumineuse+cgape sur dalle béton** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**
	Identifiant: M017-2 **Echantillon:P017-2** **réf. laboratoire: IT072104-4182** **Description analysé: Colle grise** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Carrelage+joints ciment+DDS+Colle bitumineuse+cgape sur dalle béton** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**

	Identifiant: M017-3 **Echantillon:**P017-3 réf. laboratoire: IT072104-4182 **Description analysé:** Colle bitumineuse noire **Composant de la construction:** 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols **Partie à sonder:** Carrelage+joints ciment+DDS+Colle bitumineuse+cgape sur dalle béton **Liste selon annexe.13-9 du CSP:** C **Sondage:** Carottage	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**
	Identifiant: M017-4 **Echantillon:**P017-4 réf. laboratoire.: IT072104-4182 **Description analysé:** Joint cassant gris **Composant de la construction:** 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols **Partie à sonder:** Carrelage+joints ciment+DDS+Colle bitumineuse+cgape sur dalle béton **Liste selon annexe.13-9 du CSP:** C **Sondage:** Carottage	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**
	Identifiant: M017-5 **Echantillon:**P017-5 réf. laboratoire: IT072104-4182 **Description analysé:** Matériau compact gris hétérogène **Composant de la construction:** 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols **Partie à sonder:** Carrelage+joints ciment+DDS+Colle bitumineuse+cgape sur dalle béton **Liste selon annexe.13-9 du CSP:** C **Sondage:** Carottage	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 8-Chaufferie 6m2	**Identifiant:** M019 **Echantillon:**P019 réf. laboratoire: IT072104-4184 **Description analysé:** Peintures multiples en vrac **Composant de la construction:** 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols **Partie à sonder:** Peinture de sol **Liste selon annexe.13-9 du CSP:** C **Sondage:** Fractionnement	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 8-Chaufferie 6m2	**Identifiant:** M019-2 **Echantillon:**P019-2 réf. laboratoire: IT072104-4184 **Description:** Matériau compact gris hétérogène **Composant de la construction:** 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols **Partie à sonder:** Peinture de sol **Liste selon annexe.13-9 du CSP:** C **Sondage:** Fractionnement	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 4-Salle de reunion 17m2	**Identifiant:** M021 **Echantillon:**P021 réf. laboratoire: IT072104-4186 **Description analysé:** Carrelage **Composant de la construction:** 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres **Partie à sonder:** Colle de plinthes en carrelage sur béton cellulaire et toile de verre peint **Liste selon annexe.13-9 du CSP:** C **Sondage:** Carottage	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**
	Identifiant: M021-2 **Echantillon:**P021-2 réf. laboratoire: IT072104-4186 **Description analysé:** Colle beige peinture avec couche en toile non séparable **Composant de la construction:** 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres **Partie à sonder:** Colle de plinthes en carrelage sur béton cellulaire et toile de verre peint **Liste selon annexe.13-9 du CSP:** C **Sondage:** Carottage	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**
	Identifiant: M021 **Echantillon:**P021-3 réf. laboratoire: IT072104-4186 **Description analysé:** Couche plâtreuse blanche **Composant de la construction:** 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres **Partie à sonder:** Colle de plinthes en carrelage sur béton cellulaire et toile de verre peint **Liste selon annexe.13-9 du CSP:** C **Sondage:** Carottage	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 4-Salle de reunion 17m2	**Identifiant:** M022 **Echantillon:**P022 réf. laboratoire: IT072104-4187 **Description analysé:** Carrelage **Composant de la construction:** 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols **Partie à sonder:** Colle bitumineuse+colle blanche de carrelage **Liste selon annexe.13-9 du CSP:** C **Sondage:** Carottage	**Absence d'amiante** **(Après analyse en laboratoire)**

	Identifiant: M022-2 **Echantillon:P022-2** **réf. Laboratoire: IT072104-4187** **Description analysé: Colle beige** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle bitumineuse+colle blanche de carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2	**Identifiant: M022** **Echantillon:P022-3** **réf. laboratoire: IT072104-4187** **Description analysé: Colle bitumineuse noire** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle bitumineuse+colle blanche de carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 24- Bureau 11m2	**Identifiant: M024** **Echantillon:P024** **réf. laboratoire: IT072104-4189** **Description analysé: Carrelage** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle +DDS rouge+colle de carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage x2**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
	Identifiant: M024-2 **Echantillon:P024-2** **réf. laboratoire: IT072104-4189** **Description analysé: Colle grise** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle +DDS rouge+colle de carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage x2**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
	Identifiant: M024-3 **Echantillon:P024-3** **réf. laboratoire: IT072104-4189** **Description analysé: Matériau compact gris** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle +DDS rouge+colle de carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage x2**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
	Identifiant: M024-4 **Echantillon: P024-4** **réf. laboratoire: IT072104-4189** **Description analysé: Couche grise non séparable colle polymère jaune non séparable matériau rose** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle +DDS rouge+colle de carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage x2**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 23- Bureau 11m2	**Identifiant: M025-5** **Echantillon:P025-5** **réf. laboratoire: IT072104-4190** **Description analysé: Colle bitumineuse noire non séparable colle bitumineuse noire** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage et fractionnement**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 2- Bureau 14m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 3- Bureau 17m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 25-Bureau 22m2	Identifiant: M025-5 Echantillon:P025-5 réf. laboratoire: IT072104-4190 Description: Colle bitumineuse noire non séparable colle bitumineuse noire Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage et fractionnement	ZPSO Absence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 23- Bureau 11m2	**Identifiant: M025-6** **Echantillon: P025-6** **réf. laboratoire: IT072104-4190** **Description analysé: Carrelage** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage et fractionnement**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 2- Bureau 14m2	Identifiant: M025-6 Echantillon: P025-6 réf. laboratoire: IT072104-4190 Description: Carrelage	ZPSO Absence d'amiante

prefa ancien/Bât 4/RDC - 3- Bureau 17m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 25-Bureau 22m2	Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage et fractionnement	
prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2	**Identifiant: M025-4** **Echantillon:P025-4** **réf. laboratoire: IT072104-4190** **Description analysé: Colle grise** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage et fractionnement**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 2- Bureau 14m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 3- Bureau 17m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 25-Bureau 22m2	Identifiant: M025-4 Echantillon:P025-4 réf. laboratoire: IT072104-4190 Description: Colle grise Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage et fractionnement	ZPSO Absence d'amiante
prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2	**Identifiant: M025-3** **Echantillon:P025-3** **réf. laboratoire: IT072104-4190** **Description analysé: Matériau compact gris hétérogène** **Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols** **Partie à sonder: Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage** **Liste selon annexe.13-9 du CSP: C** **Sondage: Carottage et fractionnement**	**Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)**
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 2- Bureau 14m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 3- Bureau 17m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 25-Bureau 22m2	Identifiant: M025-3 Echantillon:P025-3 réf. laboratoire: IT072104-4190 Description: Matériau compact gris hétérogène Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage et fractionnement	ZPSO Absence d'amiante

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif

Localisation	Identifiant + Description	Photo
prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 21- Bureau 11m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 22- Salle detente 34m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 23- Bureau 11m2	Identifiant: IBA/2101/0584-B4/M026 Description: Faux plafonds 120x60 en laine de verre Composant de la construction: 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Visuel Justificatif: Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante	
prefa ancien/Bât 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 2- Bureau 14m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 3- Bureau 17m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 5- Bureau 30m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 6- Bureau 11m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 24-Bureau 11m2 prefa ancien/Bât 4/RDC - 25-Bureau 22m2	Identifiant: IBA/2101/0584-B4/M027 Description: Faux plafonds friable 60x60 Composant de la construction: 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Justificatif: Suivant documentation consultée DTA 60278-03-365 Indice 1	

5.4 Liste des zones, présentée par catégorie

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

M001 : Isolation laine de verre en contact avec du glasal FC

Pièces : Parties extérieures*prefa ancien- bât B4

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parties extérieures*prefa ancien- bât B4	1	Identifiant :M001 Description :Matériau fibreux jaune avec poussières Résultat : Absence d'amiante	Oui Parties extérieures*prefa ancien- bât B4 : Faces exterieures	P001	

M001-2 : carton bitumé

Pièces : Parties extérieures*prefa ancien- bât B4

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parties extérieures*prefa ancien- bât B4	1	Identifiant :M001-2 Description :Carton bitumé Résultat : Absence d'amiante	Oui Parties extérieures*prefa ancien- bât B4 : Faces exterieures	P001-1	Idem à P001

M002 : Peinture des bardages métalliques

Pièces : Parties extérieures/prefa ancien-bât B4

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parties extérieures/prefa ancien-bât B4	1	Identifiant :M002 Description :Peinture des bardages métalliques Résultat : Absence d'amiante	Oui Parties extérieures/prefa ancien-bât B4 : Façades extérieures	P002	

M018 : Panneaux en fibre ciment type glasal

Niveau : prefa ancien/Bât 4/RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
8- Chaufferie 6m2	1	Identifiant :M018 Description :Panneaux en fibre ciment type glasal Résultat : Présence d'amiante	Oui prefa ancien/Bât 4/RDC - 8- Chaufferie 6m2 : A,B,C	P018	

3 - Parois verticales intérieures

M004 : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non

Niveau : prefa ancien/Bât 4/RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo

1- Entrée 51m2	1	Identifiant :M004 Description :Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004	P004	Idem photo : P004
2- Bureau 14m2	2	Identifiant :M004 Description :Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004	P004	Idem photo : P004
3- Bureau 17m2	3	Identifiant :M004 Description :Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004	P004	Idem photo : P004
4- Salle de reunion 17m2	4	Identifiant :M004 Description :Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004	P004	Idem photo : P004
5- Bureau 30m2	5	Identifiant :M004 Description :Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004	P004	Idem photo : P004
6- Bureau 11m2	6	Identifiant :M004 Description :Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004	P004	Idem photo : P004
7- Archives 6m2	7	Identifiant :M004 Description :Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Résultat : Présence d'amiante	Oui prefa ancien/Bât 4/RDC - 7- Archives 6m2 : Mur A B,C	P004	
20- Sanitaire 13m2	8	Identifiant :M004 Description :Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004	P004	Idem photo : P004
21-Bureau 11m2	9	Identifiant :M004 Description :Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004	P004	Idem photo : P004
22-Salle detente 34m2	10	Identifiant :M004 Description :Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004	P004	Idem photo : P004
23-Bureau 11m2	11	Identifiant :M004 Description :Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004	P004	Idem photo : P004
24-Bureau 11m2	12	Identifiant :M004 Description :Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004	P004	Idem photo : P004
25-Bureau 22m2	13	Identifiant :M004 Description :Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004	P004	Idem photo : P004

M006 : Peinture décorative +papier peint

Niveau : prefa ancien/Bât 4/RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
7- Archives 6m2	1	Identifiant :M006 Description :Peinture décorative +papier peint Résultat : Absence d'amiante	Oui prefa ancien/Bât 4/RDC - 7- Archives 6m2 : Mur D,E et F	P006	

M011 : Colle de carrelage +joint sur panneau bois poser sur panneau fibre ciment type glasal

Niveau : prefa ancien/Bât 4/RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
20- Sanitaire 13m2	1	Identifiant :M011 Description :Carrelage faïecnces Résultat : Absence d'amiante	Oui prefa ancien/Bât 4/RDC - 20- Sanitaire 13m2 : Mur C	P011	
	2	Identifiant :M011 Description :Joint cassant blanc Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	P011	Idem photo : P011
	3	Identifiant :M011 Description :Colle beige bois massif Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	P011	Idem photo : P011

M012 : Colle de faïence sur mur ciment

Niveau : prefa ancien/Bât 4/RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
20- Sanitaire 13m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 22-Salle detente 34m2	1	Identifiant :M012 Description :Carrelage faïences Résultat : Absence d'amiante	Oui prefa ancien/Bât 4/RDC - 20- Sanitaire 13m2 : Cloison de séparation inter	P012	
	2	Identifiant :M012 Description :Colle grise Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012	P012	Idem photo : P012
	3	Identifiant :M012 Description :Matériau compact gris hétérogène Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012	P012	Idem photo : P012

M021 : Colle de plinthes en carrelage sur béton cellulaire et toile de verre peint

Niveau : prefa ancien/Bât 4/RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
4- Salle de reunion 17m2	1	Identifiant :M021 Description :Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui prefa ancien/Bât 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2 : Mur D	P021	
	2	Identifiant :M021 Description :Colle beige peinture avec couche en toile non séparable Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P021	P021	Idem photo : P021
	3	Identifiant :M021 Description :Couche plâtreuse blanche Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P021	P021	Idem photo : P021

4 - Plafonds et faux plafonds

M005 : Panneaux et plaques

Niveau : prefa ancien/Bât 4/RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
7- Archives 6m2	1	Identifiant :M005 Description :Panneaux et plaquestype glasal en fibre ciment Résultat : Présence d'amiante	Oui prefa ancien/Bât 4/RDC - 7- Archives 6m2 : Plafond	P005	
8- Chaufferie 6m2	2	Identifiant :M005 Description :Panneaux et plaquestype glasal en fibre ciment Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005	P005	Idem photo : P005

M023 : Panneaux collés vissés ou cloués

Niveau : prefa ancien/Bât 4/RDC, Prefa ancien/bât 4/combles

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
1- Entrée 51m2	1	Identifiant :M023 Description :Panneaux collés vissés ou cloués Quantification : 51 m2 Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P023	P023	Idem photo : P023
4- Salle de reunion 17m2	2	Identifiant :M023 Description :Panneaux collés vissés ou cloués Quantification : 25 m2 Résultat : Présence d'amiante	Oui prefa ancien/Bât 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2 : Plafond	P023	
5- Bureau 30m2	3	Identifiant :M023 Description :Panneaux collés vissés ou cloués Quantification : 30 m2 Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P023	P023	Idem photo : P023
6- Bureau 11m2	4	Identifiant :M023 Description :Panneaux collés vissés ou cloués Quantification : 11 m2 Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P023	P023	Idem photo : P023
21-Bureau 11m2	5	Identifiant :M023 Description :Panneaux collés vissés ou cloués Quantification : 11 m2 Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P023	P023	Idem photo : P023
22-Salle detente 34m2	6	Identifiant :M023 Description :Panneaux collés vissés ou cloués Quantification : 34 m2 Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P023	P023	Idem photo : P023
23-Bureau 11m2	7	Identifiant :M023 Description :Panneaux collés vissés ou cloués Quantification : 11 m2 Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P023	P023	Idem photo : P023
24-Bureau 11m2	8	Identifiant :M023 Description :Panneaux collés vissés ou cloués Quantification : 11 m2 Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P023	P023	Idem photo : P023
25-Bureau 22m2	9	Identifiant :M023 Description :Panneaux collés vissés ou cloués Quantification : 22 m2 Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P023	P023	Idem photo : P023
Sous toiture	10	Identifiant :M023 Description :Panneaux collés vissés ou cloués Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P023	P023	Idem photo : P023

5 - Planchers et planchers techniques

M008 : Dalle de sol+ colle +carrelages+colle blanche+joint ciment +chape sur dalle bs+chape sur beton

Niveau : prefa ancien/Bât 4/RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo

1- Entrée 51m2	1	Identifiant :M008 Description :Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2 : Sol	P008	
	2	Identifiant :M008 Description :Colle beige joint cassant gris non séparable colle beige Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008	P008	Idem photo : P008
	3	Identifiant :M008 Description :Carrelage blanc Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008	P008	Idem photo : P008
	4	Identifiant :M008 Description :Matériau compact gris hétérogène Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008	P008	Idem photo : P008
	5	Identifiant :M008 Description :Ragréage rose non séparable colle bitumineuse noire Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008	P008	Idem photo : P008

M009 : Colle de carrelage 30x30 sur ancien carrelage

Niveau : prefa ancien/Bât 4/RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
20- Sanitaire 13m2	1	Identifiant :M009 Description :Colle de carrelage 30x30 sur ancien carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui prefa ancien/Bât 4/RDC - 20- Sanitaire 13m2 : Douche	P009	

M010 : Colle de carrelage 5x5+joint sur chape

Niveau : prefa ancien/Bât 4/RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
20- Sanitaire 13m2	1	Identifiant :M010 Description :Colle beige Résultat : Absence d'amiante	Oui prefa ancien/Bât 4/RDC - 20- Sanitaire 13m2 : Sol	P010	
	2	Identifiant :M010 Description :Joint cassant gris Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010	P010	Idem photo : P010
	3	Identifiant :M010 Description :Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010	P010	Idem photo : P010

M013 : Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage					
Niveau : prefa ancien/Bât 4/RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
5- Bureau 30m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 6- Bureau 11m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 21-Bureau 11m2	6	Identifiant :M013 Description :Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable dalle dure cassante beige Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013	P013	Idem photo : P013
	1	Identifiant :M013 Description :Matériau compact gris hétérogène Résultat : Absence d'amiante	Oui prefa ancien/Bât 4/RDC - 5- Bureau 30m2 : Sol	P013	
	2	Identifiant :M013 Description :Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013	P013	Idem photo : P013
	3	Identifiant :M013 Description :Colle beige Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013	P013	Idem photo : P013
	4	Identifiant :M013 Description :Ragréage rose Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013	P013	Idem photo : P013
	5	Identifiant :M013 Description :Colle bitumineuse noire ragréage gris non séparable Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013	P013	Idem photo : P013

M014 : Colle de carrelage					
Niveau : prefa récent /Bât 4/RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
9- Sanitaire 9,5m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 19- Sanitaire 9,5m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2 zone partie recente S9 et S19	1	Identifiant :M014 Description :Joint cassant gris non séparable colle grise non séparable matériau beige non séparable peinture non séparable Résultat : Absence d'amiante	Oui prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2 zone partie recente S9 et S19 : Sol	P014	
	2	Identifiant :M014 Description :Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014	P014	Idem photo : P014
	3	Identifiant :M014 Description :Matériau compact gris hétérogène polystyrène expansé (billes) blanc non séparable Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014	P014	Idem photo : P014

M015 : Colle non bitumineuse+linoléum souple

Niveau : prefa récent /Bât 4/RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
10-Couloir 19m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 11-Bureau17m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 12-Bureau14m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 13-Bureau14m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 14-Bureau14m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 15-Bureau14m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 16-Bureau14m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 17-Bureau14m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 18-Salle de cours53m2	1	Identifiant :M015 Description :Revêtement souple beige Résultat : Absence d'amiante	Oui prefa récent /Bât 4/RDC - 10-Couloir 19m2 : Sol	P015	
	2	Identifiant :M015 Description :Colle polymère jaune non séparable bois aggloméré Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P015	P015	Idem photo : P015

M016 : Colle non bitumineuse+ linoléum souple

Niveau : prefa récent /Bât 4/RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
10-Couloir 19m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 11-Bureau17m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 15-Bureau14m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 16-Bureau14m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 18-Salle de cours53m2	1	Identifiant :M016 Description :Revêtement souple beige Résultat : Absence d'amiante	Oui prefa récent /Bât 4/RDC - 18-Salle de cours53m2 : Sol	P016	
	2	Identifiant :M016 Description :Colle polymère jaune Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016	P016	Idem photo : P016
	3	Identifiant :M016 Description :Bois massif bois sous forme de fibres non séparable Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016	P016	Idem photo : P016

M017 : Carrelage+joints ciment+DDS+Colle bitumineuse+cgape sur dalle béton					
Niveau : prefa ancien/Bât 4/RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
22-Salle detente 34m2	1	Identifiant :M017 Description :Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui prefa ancien/Bât 4/RDC - 22-Salle detente 34m2 : Sol	P017	
	2	Identifiant :M017 Description :Colle grise Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017	P017	Idem photo : P017
	3	Identifiant :M017 Description :Colle bitumineuse noire Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017	P017	Idem photo : P017
	4	Identifiant :M017 Description :Joint cassant gris Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017	P017	Idem photo : P017
	5	Identifiant :M017 Description :Matériau compact gris hétérogène Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017	P017	Idem photo : P017

M019 : Peinture de sol					
Niveau : prefa ancien/Bât 4/RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
8- Chaufferie 6m2	1	Identifiant :M019 Description :Peintures multiples en vrac Résultat : Absence d'amiante	Oui prefa ancien/Bât 4/RDC - 8-Chaufferie 6m2 : Sol	P019	
	2	Identifiant :M019 Description :Matériau compact gris hétérogène Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P019	P019	Idem photo : P019

M022 : Colle bitumineuse+colle blanche de carrelage					
Niveau : prefa ancien/Bât 4/RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
4- Salle de reunion 17m2	1	Identifiant :M022 Description :Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui prefa ancien/Bât 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2 : Sol	P022	
	2	Identifiant :M022 Description :Colle beige Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P022	P022	Idem photo : P022
	3	Identifiant :M022 Description :Colle bitumineuse noire Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P022	P022	Idem photo : P022

M024 : Colle +DDS rouge+colle de carrelage					
Niveau : prefa ancien/Bât 4/RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
24-Bureau 11m2	1	Identifiant :M024 Description :Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui prefa ancien/Bât 4/RDC - 24-Bureau 11m2 : Sol	P024	
	2	Identifiant :M024 Description :Colle grise Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024	P024	Idem photo : P024
	3	Identifiant :M024 Description :Matériau compact gris Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024	P024	Idem photo : P024
	4	Identifiant :M024 Description :Couche grise non séparable colle polymère jaune non séparable matériau rose Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024	P024	Idem photo : P024

M025 : Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage					
Niveau : prefa ancien/Bât 4/RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
1- Entrée 51m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 2- Bureau 14m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 3- Bureau 17m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 25-Bureau 22m2	5	Identifiant :M025 Description :Colle bitumineuse noire non séparable colle bitumineuse noire Résultat : Absence d'amiante	Oui prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2 : Sol	P025-5	Idem photo : P025
	6	Identifiant :M025 Description :Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2 : Sol	P025-6	Idem photo : P025
	4	Identifiant :M025 Description :Colle grise Quantification : Résultat : Absence d'amiante	Oui prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2 : Sol	P025-4	Idem photo : P025
	3	Identifiant :M025 Description :Matériau compact gris hétérogène Quantification : Résultat : Absence d'amiante	Oui prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2 : Sol	P025-3	Idem photo : P025
	2	Identifiant :M025 Description :Dalle dure cassante rouge Quantification : Résultat : Présence d'amiante	Oui prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2 : Sol	P025-2	Idem photo : P025
	1	Identifiant :M025 Description :Dalle dure cassante beige Quantification : Résultat : Présence d'amiante	Oui prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2 : Sol	P025	

6 - Conduits et accessoires intérieurs

M007 : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)					
Niveau : Prefa ancien/bât 4/combles					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Sous toiture	1	Identifiant :M007 Description :Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Résultat : Absence d'amiante	Oui Prefa ancien/bât 4/combles - Sous toiture : Dans les combles	P007	

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

M020 : Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride					
Niveau : prefa ancien/Bât 4/RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
8- Chaufferie 6m2	1	Identifiant :M020 Description :Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride Résultat : Présence d'amiante	Oui prefa ancien/Bât 4/RDC - 8- Chaufferie 6m2 : Bruleur de chaudière	P020	

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

M003 : Couvercles des regards R2 et R3 fibres-ciment					
Pièces : Parties extérieures					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Parties extérieures	1	Identifiant :M003 Description :Couvercles des regards R2 et R3 fibres-ciment Quantification : 2 U Résultat : Présence d'amiante	Oui Parties extérieures : Sol/regards EU	P003	


Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017

M026 : Faux plafonds					
Niveau : prefa ancien/Bât 4/RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
1- Entrée 51m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 21-Bureau 11m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 22-Salle detente 34m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2	1	Identifiant :M026 Description :Faux plafonds 120x60 en laine de verre Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

M027 : Faux plafonds					
Niveau : prefa ancien/Bât 4/RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
2- Bureau 14m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 3- Bureau 17m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 5- Bureau 30m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 6- Bureau 11m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 24-Bureau 11m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 25-Bureau 22m2	1	Identifiant :M027 Description :Faux plafonds friable 60x60 Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

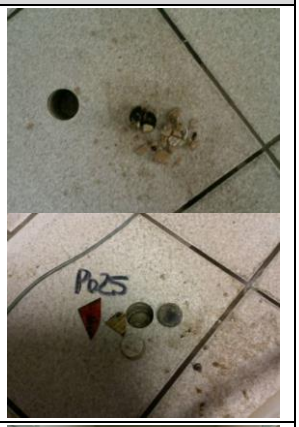
5.5 Récapitulatif zone par zone

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M001	Localisation : Parties extérieures*prefa ancien- bât B4 Echantillons : P001 Description : Matériau fibreux jaune avec poussières	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M001-2	Localisation : Parties extérieures*prefa ancien- bât B4 Echantillons : Description : Carton bitumé	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M002	Localisation : Parties extérieures/prefa ancien-bât B4 Echantillons : P002 Description : Peinture des bardages métalliques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 
M003	Localisation : Parties extérieures Echantillons : P003 Description : Couvercles des regards R2 et R3 fibres-ciment	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M004	Localisation : prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 2- Bureau 14m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 3- Bureau 17m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 5- Bureau 30m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 6- Bureau 11m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 7- Archives 6m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 20- Sanitaire 13m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 21- Bureau 11m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 22-Salle detente 34m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 24-Bureau 11m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 25-Bureau 22m2 Zone : Discontinue Echantillons : P004 Description : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M005	Localisation : prefa ancien/Bât 4/RDC - 7- Archives 6m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 8- Chaufferie 6m2 Zone : Discontinue Echantillons : P005 Description : Panneaux et plaquestype glasal en fibre ciment	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M006	Localisation : prefa ancien/Bât 4/RDC - 7- Archives 6m2 Echantillons : P006 Description : Peinture décorative +papier peint	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M007	Localisation : Prefa ancien/bât 4/combles - Sous toiture Echantillons : P007 Description : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M008 à M008-5	Localisation : prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2 Echantillons : P008 Description : Carrelage; Colle beige joint cassant gris non séparable colle beige; Carrelage blanc; Matériau compact gris hétérogène; Ragréage rose non séparable colle bitumineuse noire	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M009	Localisation : prefa ancien/Bât 4/RDC - 20- Sanitaire 13m2 Echantillons : P009 Description : Colle de carrelage 30x30 sur ancien carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M010 à M10-3	Localisation : prefa ancien/Bât 4/RDC - 20- Sanitaire 13m2 Echantillons : P010 Description : Colle beige; Joint cassant gris; Carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M011 à M011-3	Localisation : prefa ancien/Bât 4/RDC - 20- Sanitaire 13m2 Echantillons : P011 Description : Carrelage; Joint cassant blanc; Colle beige bois massif	Absence d'amiante + Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M012 à M012-3	Localisation : prefa ancien/Bât 4/RDC - 20- Sanitaire 13m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 22-Salle detente 34m2 Echantillons : P012 Description : Carrelage; Colle grise; Matériau compact gris hétérogène	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M013 à M013-6	Localisation : prefa ancien/Bât 4/RDC - 5- Bureau 30m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 6- Bureau 11m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 21-Bureau 11m2 Echantillons : P013 Description : Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable dalle dure cassante beige; Matériau compact gris hétérogène; Carrelage; Colle beige; Ragréage rose; Colle bitumineuse noire ragréage gris non séparable	Présence d'amiante + Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M014 à M014-3	Localisation : prefa récent /Bât 4/RDC - 9- Sanitaire 9,5m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 19- Sanitaire 9,5m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 1-Entrée 51m2 zone partie recente S9 et S19 Echantillons : P014 Description : Joint cassant gris non séparable colle grise non séparable matériau beige non séparable peinture non séparable; Carrelage; Matériau compact gris hétérogène polystyrène expansé (billes) blanc non séparable	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M015 à M015-2	Localisation : prefa récent /Bât 4/RDC - 10-Couloir 19m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 11-Bureau17m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 12-Bureau14m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 13-Bureau14m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 14-Bureau14m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 15-Bureau14m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 16-Bureau14m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 17-Bureau14m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 18-Salle de cours53m2 Echantillons : P015 Description : Revêtement souple beige; Colle polymère jaune non séparable bois aggloméré	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M016 à M016-3	Localisation : prefa récent /Bât 4/RDC - 10-Couloir 19m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 11-Bureau17m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 15-Bureau14m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 16-Bureau14m2; prefa récent /Bât 4/RDC - 18-Salle de cours53m2 Echantillons : P016 Description : Revêtement souple beige; Colle polymère jaune; Bois massif bois sous forme de fibres non séparable	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M017 à M017-5	Localisation : prefa ancien/Bât 4/RDC - 22-Salle detente 34m2 Echantillons : P017 Description : Carrelage; Colle grise; Colle bitumineuse noire; Joint cassant gris; Matériau compact gris hétérogène	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M018	Localisation : prefa ancien/Bât 4/RDC - 8- Chaufferie 6m2 Echantillons : P018 Description : Panneaux en fibre ciment type glasal	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M019 à M019-2	Localisation : prefa ancien/Bât 4/RDC - 8- Chaufferie 6m2 Echantillons : P019 Description : Peintures multiples en vrac; Matériau compact gris hétérogène	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M020	Localisation : prefa ancien/Bât 4/RDC - 8- Chaufferie 6m2 Echantillons : P020 Description : Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M021 à M021-3	Localisation : prefa ancien/Bât 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2 Echantillons : P021 Description : Carrelage; Colle beige peinture avec couche en toile non séparable; Couche plâtreuse blanche	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M022 à M022-3	Localisation : prefa ancien/Bât 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2 Echantillons : P022 Description : Carrelage; Colle beige; Colle bitumineuse noire	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M023	Localisation : prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 5- Bureau 30m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 6- Bureau 11m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 21-Bureau 11m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 22-Salle detente 34m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 24-Bureau 11m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 25-Bureau 22m2; Prefa ancien/bât 4/combles - Sous toiture Zone : Discontinue Echantillons : P023 Description : Panneaux collés vissés ou cloués	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 
M024 à M024-4	Localisation : prefa ancien/Bât 4/RDC - 24-Bureau 11m2 Echantillons : P024 Description : Carrelage; Colle grise; Matériau compact gris; Couche grise non séparable colle polymère jaune non séparable matériau rose	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M025 à M025-6	Localisation : prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 2- Bureau 14m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 3- Bureau 17m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 25-Bureau 22m2 Zone : Discontinue Echantillons : P025-5; P025-6; P025-4; P025-3; P025-2; P025 Description : Colle bitumineuse noire non séparable colle bitumineuse noire; Carrelage; Colle grise; Matériau compact gris hétérogène; Dalle dure cassante rouge; Dalle dure cassante beige	Absence d'amiante + Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M026	Localisation : prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 21-Bureau 11m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 22-Salle detente 34m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2 Echantillons : Description : Faux plafonds 120x60 en laine de verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
M027	Localisation : prefa ancien/Bât 4/RDC - 2- Bureau 14m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 3- Bureau 17m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 5- Bureau 30m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 6- Bureau 11m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 24-Bureau 11m2; prefa ancien/Bât 4/RDC - 25-Bureau 22m2 Echantillons : Description : Faux plafonds friable 60x60	Absence d'amiante (Suivant documentation consultée DTA 60278-03-365 Indice 1)	

6. – Signatures

*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **LCC QUALIXPERT** 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)*

Fait à **MONT-DE-MARSAN**, le **12/05/2021**

Par : RABEAU VIRGINIE

Virginie RABEAU

Signature numérique de Virginie RABEAU
Date : 2021.05.13 00:11:49 +02'00'

Signature du représentant :

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° IBA/2101/0584-B4

Informations

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Recommandations générales de sécurité

7.4 Documents annexés au présent rapport

7.1 - Annexe - Schéma de repérage

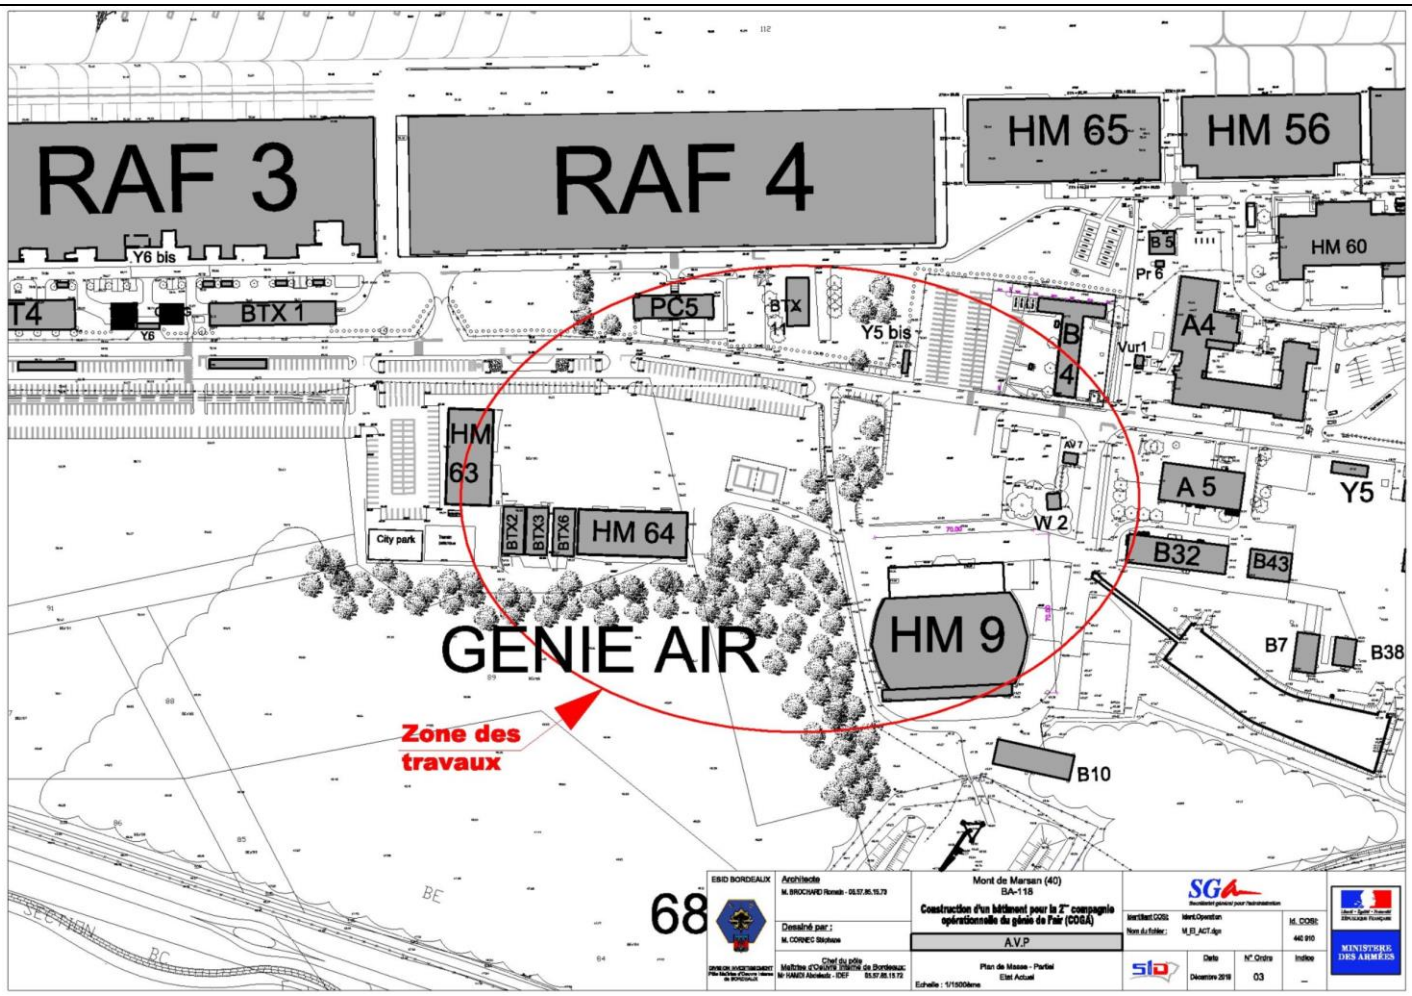


Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : IBA (Inspection Bâtiment Atlantique), auteur : RABEAU VIRGINIE
Dossier n° IBA/2101/0584-B4 du 11 et 30,31/03/2021
Adresse du bien : BASE AERIENNE 118 (BA118)
Avenue du Colonnel Rozanoff
Projet COGA (Non communiqué) 40000 MONT-DE-MARSAN

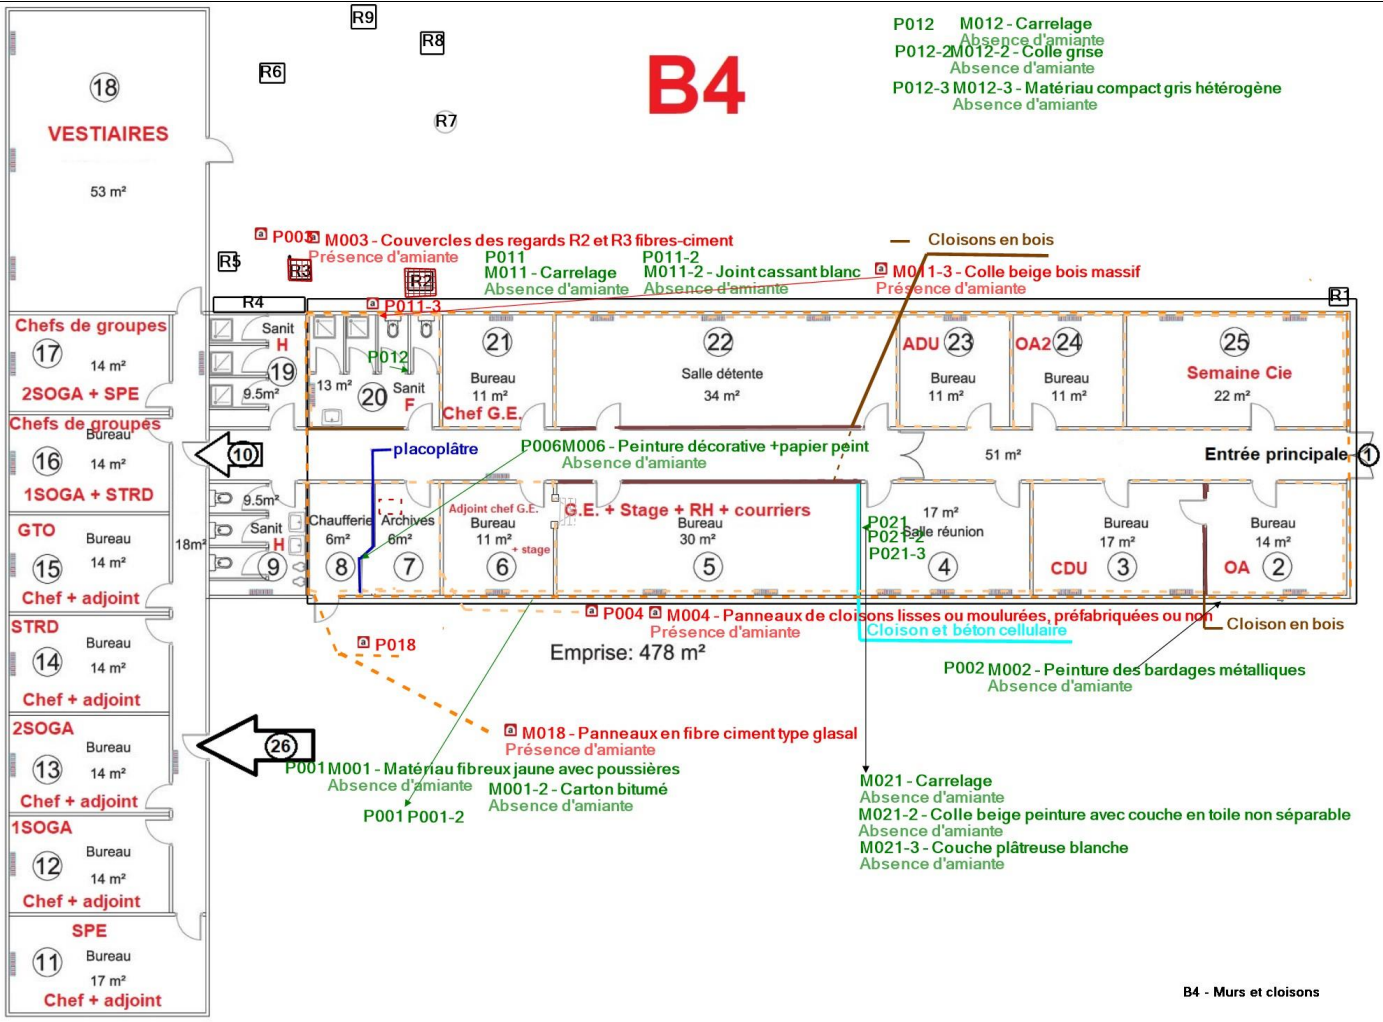


Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : IBA (Inspection Bâtiment Atlantique), auteur : RABEAU VIRGINIE
Dossier n° IBA/2101/0584-B4 du 11 et 30,31/03/2021
Adresse du bien : BASE AERIENNE 118 (BA118)
Avenue du Colonnel Rozanoff
Projet COGA (Non communiqué) 40000 MONT-DE-MARSAN

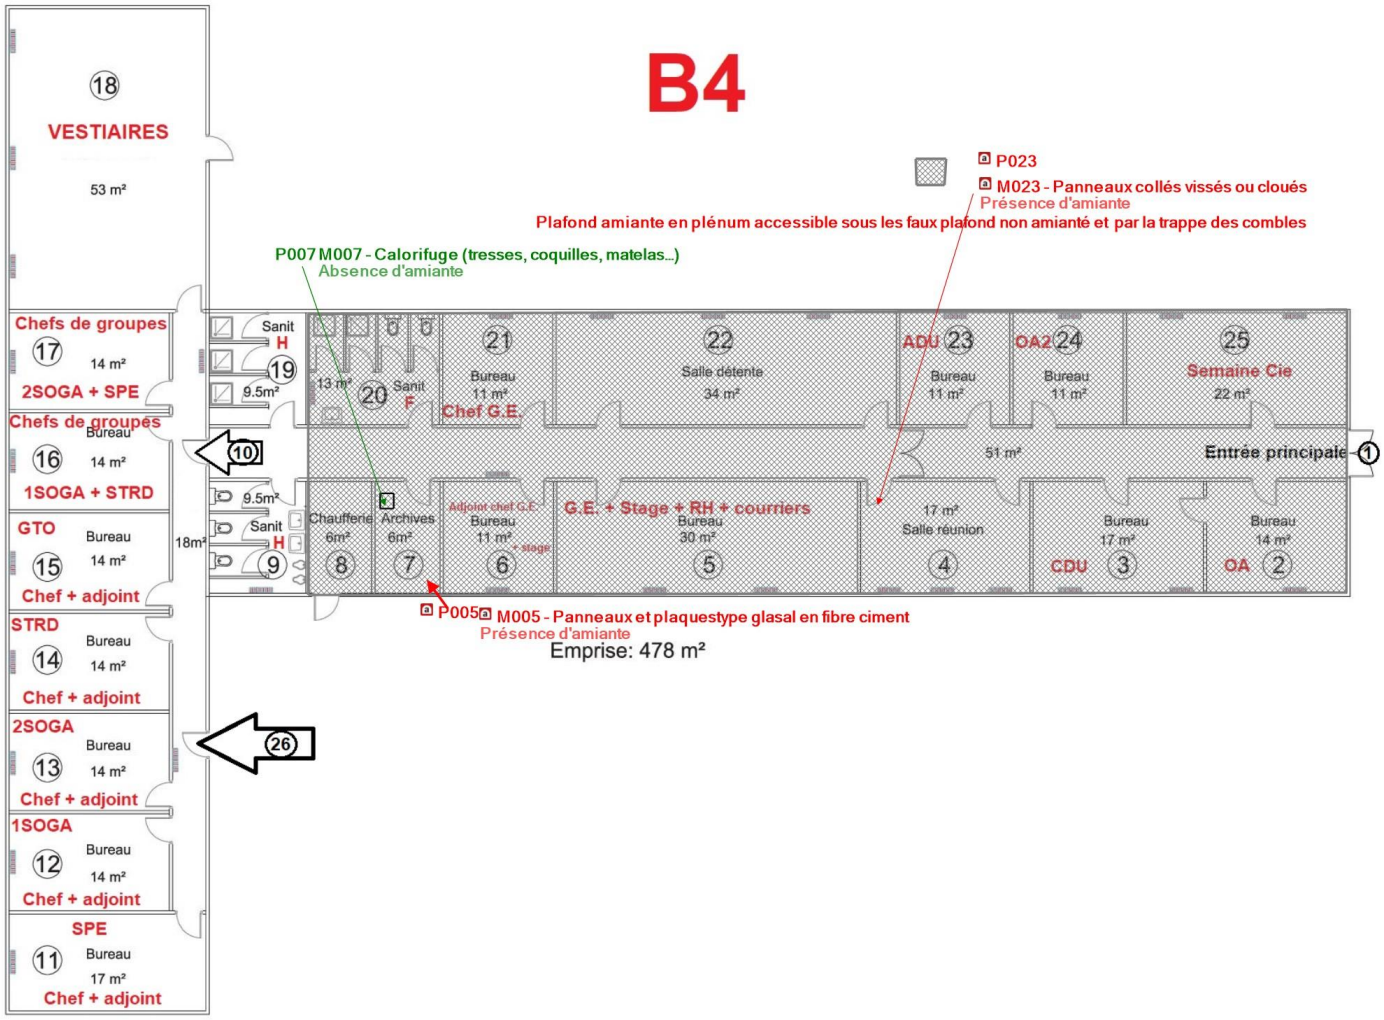


Planche (croquis plafond et autres) de repérage technique effectué par le cabinet : IBA (Inspection Bâtiment Atlantique), auteur : RABEAU VIRGINIE
Dossier n° IBA/2101/0584-B4 du 11 et 30,31/03/2021
Adresse du bien : BASE AERIENNE 118 (BA118)
Avenue du Colonnel Rozanoff
Projet COGA (Non communiqué) 40000 MONT-DE-MARSAN

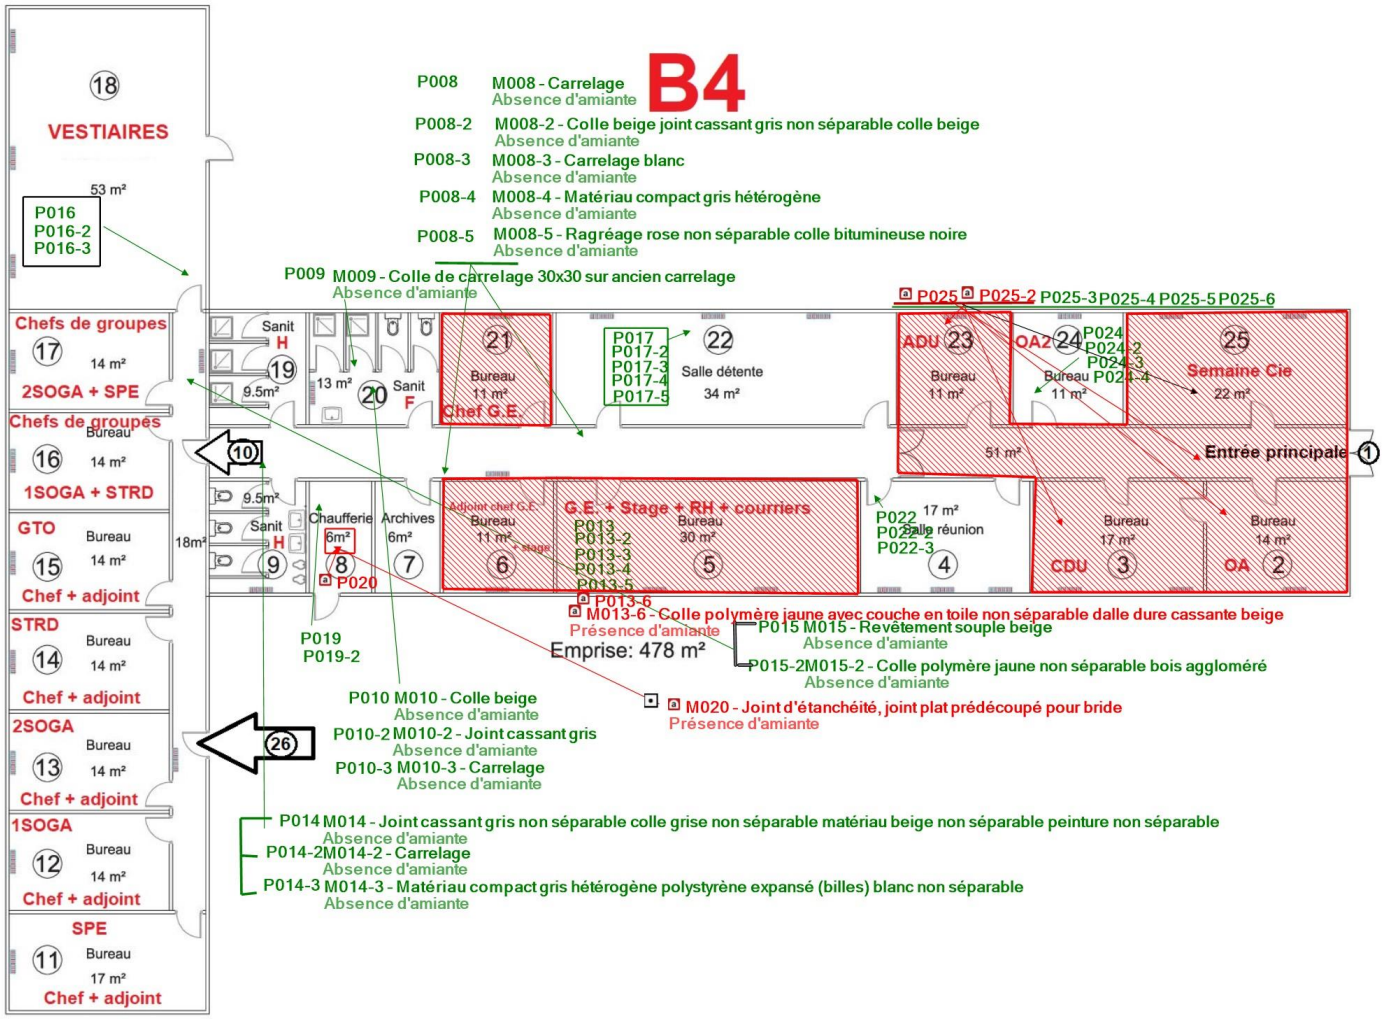


Planche (croquis sols) de repérage technique effectué par le cabinet : IBA (Inspection Bâtiment Atlantique), auteur : RABEAU VIRGINIE
Dossier n° IBA/2101/0584-B4 du 11 et 30,31/03/2021
Adresse du bien : BASE AERIENNE 118 (BA118)
Avenue du Colonnel Rozanoff
Projet COGA (Non communiqué) 40000 MONT-DE-MARSAN

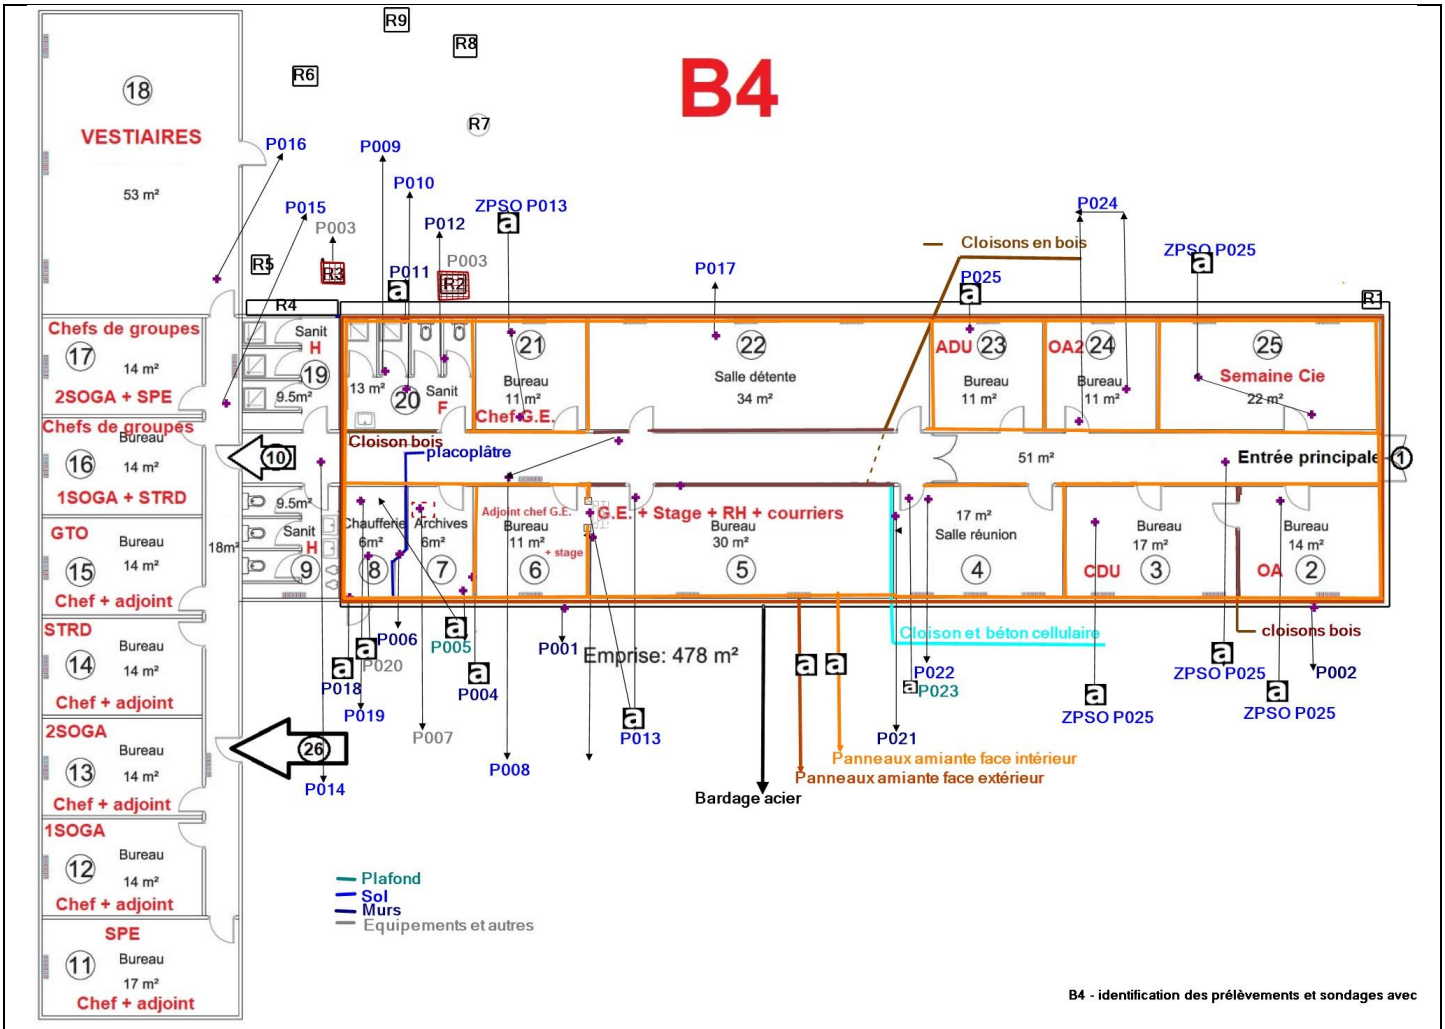


Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : IBA (Inspection Bâtiment Atlantique), auteur : RABEAU VIRGINIE
Dossier n° IBA/2101/0584-B4 du 11 et 30,31/03/2021
Adresse du bien : BASE AERIENNE 118 (BA118)
Avenue du Colonnel Rozanoff
Projet COGA (Non communiqué) 40000 MONT-DE-MARSAN

P017

carrelage
DDS et colle
chape 2,5 cm

béton 15 cm





Rodelle caoutchouc de fixation de bac acier
Matériau qui ne contient pas d'amiante par nature

Planche (croquis pour info) de repérage technique effectué par le cabinet : IBA (Inspection Bâtiment Atlantique), auteur : RABEAU VIRGINIE
Dossier n° IBA/2101/0584-B4 du 11 et 30,31/03/2021
Adresse du bien : BASE AERIENNE 118 (BA118)
Avenue du Colonnel Rozanoff
Projet COGA (Non communiqué) 40000 MONT-DE-MARSAN

Légende


	Conduit en fibro-ciment		Dalles de sol
	Conduit autre que fibro-ciment		Carrelage
	Brides		Colle Amiante Uniquement
	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante		Dalles de faux-plafond
	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste		Toiture en fibro-ciment
	Présence d'amiante		Toiture en matériaux composites
NV ou NC	Non visité	ZS	zone de similitude d'ouvrage et /ou matériau
N ou NA	Matériau non amianté	N° de prélèvement sur plan	

Nom du propriétaire **:**
Ministère de la défense
Adresse du bien :
BASE AERIENNE 118 (BA118)
Avenue du Colonnel Rozanoff
Projet COGA
40000
MONT-DE-MARSAN

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des échantillons prélevés :

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M001-P001	Parties extérieures*prefa ancien- bât B4	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Isolation laine de verre en contact avec du glasal FC	Matériau fibreux jaune avec poussières **Commentaires prélèvement:** Isolation laine de verre en contact avec du glasal FC derrière bardage acier Faces exterieures Envoyé au labo en tant que : Isolation laine de verre en contact avec du glasal FC **Réf. laboratoire:** IT072103-48405 **Commentaires Laboratoire:** Matériau fibreux jaune avec poussières:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M001-2-P001-2	Parties extérieures*prefa ancien- bât B4	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	carton bitumé	Carton bitumé **Commentaires prélèvement:** Isolation laine de verre en contact avec du glasal FC derrière bardage acier Faces exterieures Envoyé au labo en tant que : Isolation laine de verre en contact avec du glasal FC **Réf. laboratoire:** IT072103-48405 **Commentaires Laboratoire:** Carton bitumé:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P001
M002-P002	Parties extérieures/prefa ancien-bât B4	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Peinture des bardages métalliques	Peinture des bardages métalliques **Réf. laboratoire:** IT072103-48406 **Commentaires Laboratoire:** Peintures multiples en vrac:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M003-P003	Parties extérieures	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Conduits, Siphons	Couvercles des regards R2 et R3 fibres-ciment	Couvercles des regards R2 et R3 fibres-ciment **Commentaires prélèvement:** 11/03/2021 Couvercles des regards R2 et R3 fibres-ciment **Réf. laboratoire:** IT072103-48407 **Commentaires Laboratoire:** Fibrociment gris avec fibres visibles:MOLP **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M004-P004	prefa ancien/Bât 4/RDC - 7- Archives 6m2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non **Matériau présent dans les pièces:** prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2, prefa ancien/Bât 4/RDC - 2- Bureau 14m2, prefa ancien/Bât 4/RDC - 3- Bureau 17m2, prefa ancien/Bât 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2, prefa ancien/Bât 4/RDC - 5- Bureau 30m2, prefa ancien/Bât 4/RDC - 6- Bureau 11m2, prefa ancien/Bât 4/RDC - 7- Archives 6m2, prefa ancien/Bât 4/RDC - 20- Sanitaire 13m2, prefa ancien/Bât 4/RDC - 21-Bureau 11m2, prefa ancien/Bât 4/RDC - 22-Salle detente 34m2, prefa ancien/Bât 4/RDC - 23- Bureau 11m2, prefa ancien/Bât 4/RDC - 24-Bureau 11m2, prefa ancien/Bât 4/RDC - 25-Bureau 22m2 **Commentaires prélèvement:** 30/03/2021Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées intérieure et parements donnant sur l'extérieure+peinture **Réf. laboratoire:** IT072104-2295 **Commentaires Laboratoire:** Peinture non séparable + matériau compact beige avec fibres visibles:MOLP **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M005-P005	prefa ancien/Bât 4/RDC - 7- Archives 6m2	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaquestype glasal en fibre ciment **Matériau présent dans les pièces:** prefa ancien/Bât 4/RDC - 7- Archives 6m2, prefa ancien/Bât 4/RDC - 8- Chaufferie 6m2 **Commentaires prélèvement:** 30/03/2021 Panneaux et plaque stype glasal en fibre ciment **Réf. laboratoire:** IT072104-2296 **Commentaires Laboratoire:** Peintures multiples non séparable + matériau compact beige avec fibres visibles:MOLP **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M006-P006	prefa ancien/Bât 4/RDC - 7- Archives 6m2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, plâtre	Peinture décorative +papier peint	**Commentaires prélèvement:** 30/03/2021 Peinture décorative +papier peint **Réf. laboratoire:** IT072104-2297 **Commentaires Laboratoire:** Papier peint non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M007-P007	Prefa ancien/bât 4/combles - Sous toiture	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…)	**Commentaires prélèvement:** 30/03/2021Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…) **Réf. laboratoire:** IT072104-2298 **Commentaires Laboratoire:** Matériau fibreux multicolore avec poussières:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M008-P008	prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol+ colle +carrelages+colle blanche+joint ciment+chape sur beton	Carrelage **Commentaires prélèvement:** 30/03/2021 Dalle de sol+ colle noire +carrelages+colle blanche+joint ciment +chape sur dalle beton **Envoyé au labo en tant que** : Dalle de sol+ colle noire+carrelages+colle blanche+joint ciment +chape sur dalle beton **Réf. laboratoire:** IT072104-2299 **Commentaires Laboratoire:** Carrelage:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M008-P008-2	prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol+ colle +carrelages+colle blanche+joint ciment +chape sur dalle bs+chape sur beton	**Commentaires prélèvement:** 30/03/2021 Dalle de sol+ colle noire +carrelages+colle blanche+joint ciment +chape sur dalle beton **Envoyé au labo en tant que** : Dalle de sol+ colle noire+carrelages+colle blanche+joint ciment +chape sur dalle beton **Réf. laboratoire:** IT072104-2299 **Commentaires Laboratoire:** Colle beige + joint cassant gris non séparable + colle beige:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P008
M008-P008-3	prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol+ colle +carrelages+colle blanche+joint ciment +chape sur dalle bs+chape sur beton	**Commentaires prélèvement:** 30/03/2021 Dalle de sol+ colle noire +carrelages+colle blanche+joint ciment +chape sur dalle beton **Envoyé au labo en tant que** : Dalle de sol+ colle noire+carrelages+colle blanche+joint ciment +chape sur dalle beton **Réf. laboratoire:** IT072104-2299 **Commentaires Laboratoire:** Carrelage blanc:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P008
M008-P008-4	prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol+ colle +carrelages+colle blanche+joint ciment +chape sur dalle bs+chape sur beton	**Commentaires prélèvement:** 30/03/2021 Dalle de sol+ colle noire +carrelages+colle blanche+joint ciment +chape sur dalle beton **Envoyé au labo en tant que** : Dalle de sol+ colle noire+carrelages+colle blanche+joint ciment +chape sur dalle beton **Réf. laboratoire:** IT072104-2299 **Commentaires Laboratoire:** Matériau compact gris hétérogène:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P008
M008-P008-5	prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol+ colle +carrelages+colle blanche+joint ciment +chape sur dalle bs+chape sur beton	**Commentaires prélèvement:** 30/03/2021 Dalle de sol+ colle noire +carrelages+colle blanche+joint ciment +chape sur dalle beton **Envoyé au labo en tant que** : Dalle de sol+ colle noire+carrelages+colle blanche+joint ciment +chape sur dalle beton **Réf. laboratoire:** IT072104-2299 **Commentaires Laboratoire:** Ragréage rose non séparable + colle bitumineuse noire:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P008
M009-P009	prefa ancien/Bât 4/RDC - 20- Sanitaire 13m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage 30x30 sur ancien carrelage	**Commentaires prélèvement:** 30/03/2021Colle de carrelage 30x30 sur ancien carrelage **Réf. laboratoire:** IT072104-2300 **Commentaires Laboratoire:** Colle grise:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M010-P010	prefa ancien/Bât 4/RDC - 20- Sanitaire 13m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage 5x5+joint sur chape	**Commentaires prélèvement:** 30/03/2021 Colle de carrelage 5x5+joint sur chape **Envoyé au labo en tant que** : Colle de carrelage 5x5+joint sur chape **Réf. laboratoire:** IT072104-2301 **Commentaires Laboratoire:** Colle beige:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M010-P010-2	prefa ancien/Bât 4/RDC - 20- Sanitaire 13m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage 5x5+joint sur chape	**Commentaires prélèvement:** 30/03/2021 Colle de carrelage 5x5+joint sur chape **Envoyé au labo en tant que** : Colle de carrelage 5x5+joint sur chape **Réf. laboratoire:** IT072104-2301 **Commentaires Laboratoire:** Joint cassant gris:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P010
M010-P010-3	prefa ancien/Bât 4/RDC - 20- Sanitaire 13m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage 5x5+joint sur chape	**Commentaires prélèvement:** 30/03/2021 Colle de carrelage 5x5+joint sur chape Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage 5x5+joint sur chape **Réf. laboratoire:** IT072104-2301 **Commentaires Laboratoire:** Carrelage:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P010

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M011-P011	prefa ancien/Bât 4/RDC - 20-Sanitaire 13m2	3 - Parois verticales intérieures donnant sur l'exterieur-Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage +joint sur panneau bois poser sur panneau fibre ciment type glasal	Carrelage **Commentaires prélèvement:** 30/03/2021 Colle de faïence +joint sur panneau bois poser sur panneau fibre ciment type glasal **Envoyé au labo en tant que** : Colle de carrelage +joint sur panneau bois poser sur panneau fibre ciment type glasal **Réf. laboratoire:** IT072104-2302 **Commentaires Laboratoire:** Carrelage:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M011-P011-2	prefa ancien/Bât 4/RDC - 20-Sanitaire 13m2	3 - Parois verticales intérieures donnant sur l'exterieur-Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage +joint sur panneau bois poser sur panneau fibre ciment type glasal	**Commentaires prélèvement:** 30/03/2021 Colle de faïence +joint sur panneau bois poser sur panneau fibre ciment type glasal **Envoyé au labo en tant que** : Colle de carrelage +joint sur panneau bois poser sur panneau fibre ciment type glasal **Réf. laboratoire:** IT072104-2302 **Commentaires Laboratoire:** Joint cassant blanc:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P011
M011-P011-3	prefa ancien/Bât 4/RDC - 20-Sanitaire 13m2	3 - Parois verticales intérieures donnant sur l'exterieur-Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage +joint sur panneau bois poser sur panneau fibre ciment type glasal	**Commentaires prélèvement:** 30/03/2021 Colle de faïence +joint sur panneau bois poser sur panneau fibre ciment type glasal **Envoyé au labo en tant que** : Colle de carrelage +joint sur panneau bois poser sur panneau fibre ciment type glasal **Réf. laboratoire:** IT072104-2302 **Commentaires Laboratoire:** Colle beige + bois massif:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P011
M012-P012	prefa ancien/Bât 4/RDC - 20-Sanitaire 13m2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, cloisons de séparations	Colle de faïence sur mur ciment	**Commentaires prélèvement:** 30/03/2021 Colle de faïence sur mur ciment Detail Couches à analyser: Cloison intérieure de séparation **Envoyé au labo en tant que** : Colle de faïence sur mur ciment **Réf. laboratoire:** IT072104-2303 **Commentaires Laboratoire:** Carrelage:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M012-P012-2	prefa ancien/Bât 4/RDC - 20-Sanitaire 13m2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, cloisons de séparations	Colle de faïence sur mur ciment	**Commentaires prélèvement:** 30/03/2021 Colle de faïence sur mur ciment Detail Couches à analyser: Cloison intérieure de séparation **Envoyé au labo en tant que** : Colle de faïence sur mur ciment **Réf. laboratoire:** IT072104-2303 **Commentaires Laboratoire:** Colle grise:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P012
M012-P012-3	prefa ancien/Bât 4/RDC - 20-Sanitaire 13m2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, cloisons de séparations	Colle de faïence sur mur ciment	**Commentaires prélèvement:** 30/03/2021 Colle de faïence sur mur ciment Detail Couches à analyser: Cloison intérieure de séparation **Envoyé au labo en tant que** : Colle de faïence sur mur ciment **Réf. laboratoire:** IT072104-2303 **Commentaires Laboratoire:** Matériau compact gris hétérogène:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P012
M013-P013	prefa ancien/Bât 4/RDC - 5- Bureau 30m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage	**Commentaires prélèvement:** 30/03/2021Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage **Envoyé au labo en tant que** : Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage **Réf. laboratoire**: IT072104-2304 **Commentaires Laboratoire**: Matériau compact gris hétérogène:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M013-P013-2	prefa ancien/Bât 4/RDC - 5- Bureau 30m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage	**Commentaires prélèvement:** 30/03/2021Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage **Envoyé au labo en tant que** : Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage **Réf. laboratoire:** IT072104-2304 **Commentaires Laboratoire:** Carrelage:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P013
M013-P013-3	prefa ancien/Bât 4/RDC - 5- Bureau 30m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage	**Commentaires prélèvement:** 30/03/2021Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage **Envoyé au labo en tant que** : Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage **Réf. laboratoire:** IT072104-2304 **Commentaires Laboratoire**: Colle beige:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P013
M013-P013-4	prefa ancien/Bât 4/RDC - 5- Bureau 30m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage	**Commentaires prélèvement**: 30/03/2021Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage **Envoyé au labo en tant que** : Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage **Réf. laboratoire:** IT072104-2304 **Commentaires Laboratoire:** Ragréage rose:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P013
M013-P013-5	prefa ancien/Bât 4/RDC - 5- Bureau 30m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage	**Commentaires prélèvement**: 30/03/2021Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage **Envoyé au labo en tant que** : Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage **Réf. laboratoire**: IT072104-2304 **Commentaires Laboratoire**: Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P013
M013-P013-6	prefa ancien/Bât 4/RDC - 5- Bureau 30m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage	**Commentaires prélèvement:** 30/03/2021Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage **Envoyé au labo en tant que : Dalle** de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage **Réf. laboratoire:** IT072104-2304 **Commentaires Laboratoire:** Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable + dalle dure cassante beige:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M014-P014	prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2 zone partie recente S9 et S19	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	**Commentaires prélèvement:** 30/03/2021 Colle de carrelage+ joint ciment+dalle beton avec polystyrène **Envoyé au labo en tant que** : Colle de carrelage+ joint ciment+dalle beton avec polystyrène **Réf. laboratoire:** IT072104-2305 **Commentaires Laboratoire:** Joint cassant gris non séparable + colle grise non séparable + matériau beige non séparable + peinture non séparable:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M014-P014-2	prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2 zone partie recente S9 et S19	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	**Commentaires prélèvement:** 30/03/2021 Colle de carrelage+ joint ciment+dalle beton avec polystyrène **Envoyé au labo en tant que :** Colle de carrelage+ joint ciment+dalle beton avec polystyrène **Réf. laboratoire:** IT072104-2305 **Commentaires Laboratoire:** Carrelage:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P014
M014-P014-3	prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2 zone partie recente S9 et S19	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	**Commentaires prélèvement:** 30/03/2021 Colle de carrelage+ joint ciment+dalle beton avec polystyrène **Envoyé au labo en tant que** : Colle de carrelage+ joint ciment+dalle beton avec polystyrène **Réf. laboratoire:** IT072104-2305 **Commentaires Laboratoire:** Matériau compact gris hétérogène + polystyrène expansé (billes) blanc non séparable:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P014
M015-P015	prefa récent /Bât 4/RDC - 10-Couloir 19m2	5 - Planchers et planchers techniques bois - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse+linoléum souple	**Commentaires prélèvement:** 31/03/2021 Colle non bitumineuse+linoléum souple **Envoyé au labo en tant que** : Colle non bitumineuse+linoléum souple **Réf. laboratoire:** IT072104-4180 **Commentaires Laboratoire:** Revêtement souple beige:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M015-P015-2	prefa récent /Bât 4/RDC - 10-Couloir 19m2	5 - Planchers et planchers techniques bois - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse+linoléum souple	**Commentaires prélèvement:** 31/03/2021 Colle non bitumineuse+linoléum souple Envoyé au labo en tant que : Colle non bitumineuse+linoléum souple **Réf. laboratoire:** IT072104-4180 **Commentaires Laboratoire:** Colle polymère jaune non séparable + bois aggloméré:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P015
M016-P016	prefa récent /Bât 4/RDC - 18-Salle de cours53m2	5 - Planchers et planchers techniques bois - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse+ linoléum souple	**Commentaires prélèvement:** 31/03/2021 Colle non bitumineuse+ linoléum souple **Envoyé au labo en tant que :** Colle non bitumineuse+ linoléum souple **Réf. laboratoire:** IT072104-4181 **Commentaires Laboratoire:** Revêtement souple beige:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M016-P016-2	prefa récent /Bât 4/RDC - 18-Salle de cours53m2	5 - Planchers et planchers techniques bois - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse+ linoléum souple	**Commentaires prélèvement:** 31/03/2021 Colle non bitumineuse+ linoléum souple **Envoyé au labo en tant que** : Colle non bitumineuse+ linoléum souple **Réf. laboratoire:** IT072104-4181 **Commentaires Laboratoire:** Colle polymère jaune:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P016
M016-P016-3	prefa récent /Bât 4/RDC - 18-Salle de cours53m2	5 - Planchers et planchers techniques bois - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse+ linoléum souple	**Commentaires prélèvement:** 31/03/2021 Colle non bitumineuse+ linoléum souple **Envoyé au labo en tant que** : Colle non bitumineuse+ linoléum souple **Réf. laboratoire:** IT072104-4181 **Commentaires Laboratoire:** Bois massif + bois sous forme de fibres non séparable:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P016
M017-P017	prefa ancien/Bât 4/RDC - 22-Salle detente 34m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Carrelage+joints ciment+DDS+Colle bitumineuse+cgape sur dalle béton	**Commentaires prélèvement:** 31/03/2021 Carrelage+joints ciment+DDS+Colle bitumineuse+chape sur dalle béton **Envoyé au labo en tant que** : Carrelage+joints ciment+DDS+Colle bitumineuse+chape sur dalle béton **Réf. laboratoire:** IT072104-4182 **Commentaires Laboratoire:** Carrelage:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M017-P017-2	prefa ancien/Bât 4/RDC - 22-Salle detente 34m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Carrelage+joints ciment+DDS+Colle bitumineuse+cgape sur dalle béton	**Commentaires prélèvement:** 31/03/2021 Carrelage+joints ciment+DDS+Colle bitumineuse+cgape sur dalle béto **Envoyé au labo en tant que** : Carrelage+joints ciment+DDS+Colle bitumineuse+cgape sur dalle béto **Réf. laboratoire:** IT072104-4182 **Commentaires Laboratoire:** Colle grise:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P017
M017-P017-3	prefa ancien/Bât 4/RDC - 22-Salle detente 34m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Carrelage+joints ciment+DDS+Colle bitumineuse+cgape sur dalle béton	**Commentaires prélèvement:** 31/03/2021 Carrelage+joints ciment+DDS+Colle bitumineuse+chape sur dalle béton **Envoyé au labo en tant que** : Carrelage+joints ciment+DDS+Colle bitumineuse+chape sur dalle bétn **Réf. laboratoire:** IT072104-4182 **Commentaires Laboratoire:** Colle bitumineuse noire:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P017
M017-P017-4	prefa ancien/Bât 4/RDC - 22-Salle detente 34m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Carrelage+joints ciment+DDS+Colle bitumineuse+cgape sur dalle béton	**Commentaires prélèvement:** 31/03/2021 Carrelage+joints ciment+DDS+Colle bitumineuse+chape sur dalle béton **Envoyé au labo en tant que** : Carrelage+joints ciment+DDS+Colle bitumineuse+chape sur dalle béton **Réf. laboratoire:** IT072104-4182 **Commentaires Laboratoire:** Joint cassant gris:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P017
M017-P017-5	prefa ancien/Bât 4/RDC - 22-Salle detente 34m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Carrelage+joints ciment+DDS+Colle bitumineuse+cgape sur dalle béton	**Commentaires prélèvement:** 31/03/2021 Carrelage+joints ciment+DDS+Colle bitumineuse+cgape sur dalle béto **Envoyé au labo en tant que** : Carrelage+joints ciment+DDS+Colle bitumineuse+cgape sur dalle béto **Réf. laboratoire:** IT072104-4182 **Commentaires Laboratoire:** Matériau compact gris hétérogène:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P017
M018-P018	prefa ancien/Bât 4/RDC - 8-Chaufferie 6m2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Panneaux en fibre ciment type glasal	**Commentaires prélèvement:** 31/03/2021Panneaux en fibre ciment type glasal **Réf. laboratoire:** IT072104-4183 **Commentaires Laboratoire:** Bois sous forme de fibres + peinture en faible quantité en vrac + matériau beige en vrac avec fibres visibles:MOLP **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M019-P019	prefa ancien/Bât 4/RDC - 8-Chaufferie 6m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Peinture de sol	**Commentaires prélèvement:** 31/03/2021 Peinture de sol **Envoyé au labo en tant que** : Peinture de sol **Réf. laboratoire:** IT072104-4184 **Commentaires Laboratoire:** Peintures multiples en vrac:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M019-P019-2	prefa ancien/Bât 4/RDC - 8-Chaufferie 6m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Peinture de sol	**Commentaires prélèvement:** 31/03/2021 Peinture de sol **Envoyé au labo en tant que** : Peinture de sol **Réf. laboratoire:** IT072104-4184 **Commentaires Laboratoire:** Matériau compact gris hétérogène:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P019
M020-P020	prefa ancien/Bât 4/RDC - 8-Chaufferie 6m2	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride	**Commentaires prélèvement:** 31/03/2021 Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride **Réf. laboratoire:** IT072104-4185 **Commentaires Laboratoire:** Peinture non séparable + matériau fibreux marron:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M021-P021	prefa ancien/Bât 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	**Colle de plinthes** en carrelage sur béton cellulaire et toile de verre peint	**Commentaires prélèvement:** 31/03/2021 Colle de plinthes en carrelage sur béton cellulaire et toile de verre peint **Envoyé au labo en tant que** : Colle de plinthes en carrelage sur béton cellulaire et toile de verre peint **Réf. laboratoire:** IT072104-4186 **Commentaires Laboratoire:** Carrelage:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M021-P021-2	prefa ancien/Bât 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes en carrelage sur béton cellulaire et toile de verre peint	**Commentaires prélèvement:** 31/03/2021 Colle de plinthes en carrelage sur béton cellulaire et toile de verre peint **Envoyé au labo en tant que** : Colle de plinthes en carrelage sur béton cellulaire et toile de verre peint **Réf. laboratoire:** IT072104-4186 **Commentaires Laboratoire:** Colle beige + peinture avec couche en toile non séparable:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P021
M021-P021-3	prefa ancien/Bât 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes en carrelage sur béton cellulaire et toile de verre peint	**Commentaires prélèvement:** 31/03/2021 Colle de plinthes en carrelage sur béton cellulaire et toile de verre peint **Envoyé au labo en tant que** : Colle de plinthes en carrelage sur béton cellulaire et toile de verre peint **Réf. laboratoire:** IT072104-4186 **Commentaires Laboratoire:** Couche plâtreuse blanche:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P021
M022-P022	prefa ancien/Bât 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse+colle blanche de carrelage	**Commentaires prélèvement:** 31/03/2021 Colle bitumineuse+colle blanche de carrelage **Envoyé au labo en tant que :** Colle bitumineuse+colle blanche de carrelage **Réf. laboratoire:** IT072104-4187 **Commentaires Laboratoire:** Carrelage:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M022-P022-2	prefa ancien/Bât 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse+colle blanche de carrelage	**Commentaires prélèvement:** 31/03/2021 Colle bitumineuse+colle blanche de carrelage **Envoyé au labo en tant que :** Colle bitumineuse+colle blanche de carrelage **Réf. laboratoire:** IT072104-4187 **Commentaires Laboratoire:** Colle beige:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P022
M022-P022-3	prefa ancien/Bât 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse+colle blanche de carrelage	**Commentaires prélèvement:** 31/03/2021 Colle bitumineuse+colle blanche de carrelage **Envoyé au labo en tant que** : Colle bitumineuse+colle blanche de carrelage **Réf. laboratoire:** IT072104-4187 **Commentaires Laboratoire:** Colle bitumineuse noire:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P022

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M023-P023	prefa ancien/Bât 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Panneaux collés vissés ou cloués	**Matériau présent dans les pièces:** prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2, prefa ancien/Bât 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2, prefa ancien/Bât 4/RDC - 5- Bureau 30m2, prefa ancien/Bât 4/RDC - 6- Bureau 11m2, prefa ancien/Bât 4/RDC - 21- Bureau 11m2, prefa ancien/Bât 4/RDC - 22-Salle detente 34m2, prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2, prefa ancien/Bât 4/RDC - 24- Bureau 11m2, prefa ancien/Bât 4/RDC - 25-Bureau 22m2, Prefa ancien/bât 4/combles - Sous toiture **Commentaires prélèvement:** 31/03/2021Panneaux collés vissés ou cloués **Les panneaux amiante au dessus des plénums sur l'ensemble du vieux prefa** Detail Couches à analyser: Ils sont au dessus des FPL non amianté **Réf. laboratoire:** IT072104-4188 **Commentaires Laboratoire:** Peinture non séparable + matériau compact beige avec fibres visibles:MOLP **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M024-P024	prefa ancien/Bât 4/RDC - 24- Bureau 11m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle +DDS rouge+colle de carrelage	**Commentaires prélèvement:** 31/03/2021 Colle +DDS rouge+colle de carrelage **Envoyé au labo en tant que** : Colle +DDS rouge+colle de carrelage **Réf. laboratoire:** IT072104-4189 **Commentaires Laboratoire:** Carrelage:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M024-P024-2	prefa ancien/Bât 4/RDC - 24- Bureau 11m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle +DDS rouge+colle de carrelage	**Commentaires prélèvement:** 31/03/2021 Colle +DDS rouge+colle de carrelage **Envoyé au labo en tant que** : Colle +DDS rouge+colle de carrelage **Réf. laboratoire:** IT072104-4189 **Commentaires Laboratoire:** Colle grise:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P024
M024-P024-3	prefa ancien/Bât 4/RDC - 24- Bureau 11m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle +DDS rouge+colle de carrelage	**Commentaires prélèvement:** 31/03/2021 Colle +DDS rouge+colle de carrelage **Envoyé au labo en tant que :** Colle +DDS rouge+colle de carrelage **Réf. laboratoire:** IT072104-4189 **Commentaires Laboratoire:** Matériau compact gris:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P024
M024-P024-4	prefa ancien/Bât 4/RDC - 24- Bureau 11m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle +DDS rouge+colle de carrelage	**Commentaires prélèvement:** 31/03/2021 Colle +DDS rouge+colle de carrelage **Envoyé au labo en tant que** : Colle +DDS rouge+colle de carrelage **Réf. laboratoire:** IT072104-4189 **Commentaires Laboratoire:** Couche grise non séparable + colle polymère jaune non séparable + matériau rose:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem à P024
M025-P025	prefa ancien/Bât 4/RDC - 23- Bureau 11m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage	**Dalle dure cassante beige** **Commentaires prélèvement:** 31/03/2021Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage **Réf. laboratoire:** IT072104-4190 **Commentaires Laboratoire:** Dalle dure cassante beige:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M025-P025-2	prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage	**Dalle dure cassante rouge** **Commentaires prélèvement:** 31/03/2021Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage **Réf. laboratoire:** IT072104-4190 **Commentaires Laboratoire:** Dalle dure cassante rouge:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M025-P025-3	prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage	Matériau compact gris hétérogène **Commentaires prélèvement:** 31/03/2021Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage **Réf. laboratoire:** IT072104-4190 **Commentaires Laboratoire:** Matériau compact gris hétérogène:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M025-P025-4	prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage	Colle grise **Commentaires prélèvement:** 31/03/2021Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage **Réf. laboratoire:** IT072104-4190 **Commentaires Laboratoire:** Colle grise:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M025-P025-5	prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage	Colle bitumineuse noire non séparable colle bitumineuse noire **Commentaires prélèvement:** 31/03/2021Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage **Réf. laboratoire:** IT072104-4190 **Commentaires Laboratoire:** Colle bitumineuse noire non séparable + colle bitumineuse noire:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M025-P025-6	prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage	Carrelage **Commentaires prélèvement:** 31/03/2021Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage **Réf. laboratoire:** IT072104-4190 **Commentaires Laboratoire:** Carrelage:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Copie des rapports d'essais :

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-22219 EN DATE DU 26/03/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : IBA - INSPECTION BATIMENT ATLANTIQUE 39 Impasse Frédéric Mistral 33127 Saint-Jean d'Illac	Réf. Commande ITGA : IT0721-22219 Réf. Commande Client : IBA/2101/0584-B4_2021_03_19_1856_2372

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 23/03/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) Analytique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
ou diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : IBA/2101/0584-B4 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA : IT072103-48405		
Réf échantillon client : P001 - Isolation laine de verre en contact avec du glasal FC - Parties exterieures*prefa ancien-bat B4		Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières / Carton bitumé		
Matériau fibreux jaune avec poussières	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Carton bitumé	META (2)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : IBA/2101/0584-B4 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA : IT072103-48406		
Réf échantillon client : P002 - Peinture des bardages metalliques - Parties exterieures/prefa ancien-bat B4		Description ITGA : Peintures multiples en vrac		
Peintures multiples en vrac	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : IBA/2101/0584-B4 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA : IT072103-48407		
Réf échantillon client : P003 - Couvercles des regards R2 et R3 fibres-ciment - Parties exterieures		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles		
Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP	2	25/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-22219 EN DATE DU 26/03/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO II0721-24938/m1 EN DATE DU 06/04/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.
Ce rapport annule et remplace le rapport II0721-24938 émis précédemment qui doit être détruit. Toute utilisation de la version précédente et de ses éventuelles reproductions engage la responsabilité du destinataire du rapport. Les modifications sont identifiées par un trait dans la marge.

Client : IBA - INSPECTION BATIMENT ATLANTIQUE 39 Impasse Frédéric Mistral 33127 Saint-Jean d'Illac	Réf. Commande ITGA : II0721-24938 Réf. Commande Client : IBA/2101/0584-B4_2021_03_30_2038_2665

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 01/04/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Légende : M Résultat modifié depuis la version précédente N Résultat ajouté depuis la version précédente

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : IBA/2101/0584-B4 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA : IT072104-2295		
Réf échantillon client : P004 - Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - prefa ancien/ Bat 4/RDC - 7- Archives 6m2		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige avec fibres visibles		
Peinture non séparable + matériau compact beige avec fibres visibles	MOLP	1	02/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : IBA/2101/0584-B4 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA : IT072104-2296		
Réf échantillon client : P005 - Panneaux et plaquestype glasal en fibre ciment - prefa ancien/ Bat 4/RDC - 7- Archives 6m2		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact beige avec fibres visibles		
Peintures multiples non séparable + matériau compact beige avec fibres visibles	MOLP	1	02/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : IBA/2101/0584-B4 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA : IT072104-2297		
Réf échantillon client : P006 - Peinture decorative +papier peint - prefa ancien/ Bat 4/RDC - 7- Archives 6m2		Description ITGA : Papier peint / Peinture / Matériau plâtreux blanc		
Papier peint non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1)	1	02/04/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-24938/m1 EN DATE DU 06/04/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : IBA/2101/0584-B4 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA :		IT072104-2298
Réf échantillon client : P007 - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Prefa ancien/ bat 4/combles - Sous toiture		Description ITGA :		Matériau fibreux multicolore avec poussières
Matériau fibreux multicolore avec poussières	META (1)	1	02/04/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : IBA/2101/0584-B4 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA :		IT072104-2299
Réf échantillon client : P008 - Dalle de sol+ colle noire+carrelages+colle blanche+joint ciment +chape sur dalle beton - prefa ancien/ Bat 4/RDC - 1- Entree 51m2		Description ITGA :		Carrelage / Colle beige / Joint cassant gris / Carrelage blanc / Colle beige / Ragréage rose / Colle bitumineuse noire / Matériau compact gris hétérogène
Carrelage	META (1)	1	06/04/2021	Amiante non détecté / -
Colle beige + joint cassant gris non séparable + colle beige	META (1)	1	06/04/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage blanc	META (1)	1	06/04/2021	Amiante non détecté / -
Ragréage rose non séparable + colle bitumineuse noire	META (2)	1	06/04/2021	Amiante non détecté / -
Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	06/04/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : IBA/2101/0584-B4 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA :		IT072104-2300
Réf échantillon client : P009 - Colle de carrelage 30x30 sur ancien carrelage - prefa ancien/ Bat 4/ RDC - 20- Sanitaire 13m2		Description ITGA :		Colle grise
Colle grise	META (1)	1	02/04/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : IBA/2101/0584-B4 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA :		IT072104-2301
Réf échantillon client : P010 - Colle de carrelage 5x5+joint sur chape - prefa ancien/ Bat 4/RDC - 20- Sanitaire 13m2		Description ITGA :		Carrelage / Colle beige / Joint cassant gris
Carrelage	META (1)	1	06/04/2021	Amiante non détecté / -
Colle beige	META (1)	1	06/04/2021	Amiante non détecté / -
Joint cassant gris	META (1)	1	06/04/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : IBA/2101/0584-B4 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA :		IT072104-2302
Réf échantillon client : P011 - Colle de carrelage +joint sur panneau bois poser sur panneau fibre ciment type glasal - prefa ancien/ Bat 4/RDC - 20- Sanitaire 13m2		Description ITGA :		Carrelage / Colle beige / Joint cassant blanc / Bois massif
Carrelage	META (1)	1	06/04/2021	Amiante non détecté / -
Joint cassant blanc	META (1)	1	06/04/2021	Amiante non détecté / -
Colle beige + bois massif	META (1)	2	06/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO II0721-24938/m1 EN DATE DU 06/04/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client :	IBA/2101/0584-B4 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA :	IT072104-2303	
Réf échantillon client :	P012 - Colle de faience sur mur ciment - prefa ancien/ Bat 4/RDC - 20- Sanitaire 13m2		Description ITGA :	Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène	
	Carrelage	META (1)	1	06/04/2021	Amiante non détecté / -
	Colle grise	META (1)	1	06/04/2021	Amiante non détecté / -
	Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	06/04/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :	IBA/2101/0584-B4 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA :	IT072104-2304	
Réf échantillon client :	P013 - Dalle de sol + colle noire +chape+colle grise +carrelage - prefa ancien/ Bat 4/RDC - 5- Bureau 30m2		Description ITGA :	Colle polymère jaune avec couche en toile / Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène / Carrelage / Colle beige / Ragréage rose	
	Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable + dalle dure cassante beige	META (2)	1	06/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	META (2)	1	06/04/2021	Amiante non détecté / -
	Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	06/04/2021	Amiante non détecté / -
	Carrelage	META (1)	1	06/04/2021	Amiante non détecté / -
	Colle beige	META (1)	1	06/04/2021	Amiante non détecté / -
	Ragréage rose	META (1)	1	06/04/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :	IBA/2101/0584-B4 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA :	IT072104-2305	
Réf échantillon client :	P014 - Colle de carrelage+ joint ciment+dalle beton avec polystyrene - prefa ancien/ Bat 4/RDC - 1- Entree 51m2 zone partie recente S9 et S19		Description ITGA :	Joint cassant gris / Carrelage / Colle grise / Matériau beige / Peinture / Matériau compact gris hétérogène / Polystyrène expansé (billes) blanc	
N	Joint cassant gris non séparable + colle grise non séparable + matériau beige non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	06/04/2021	Amiante non détecté / -
N	Carrelage	META (1)	1	06/04/2021	Amiante non détecté / -
N	Matériau compact gris hétérogène + polystyrène expansé (billes) blanc non séparable	META (1)	1	06/04/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-25225 EN DATE DU 08/04/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : IBA - INSPECTION BATIMENT ATLANTIQUE 39 Impasse Frédéric Mistral 33127 Saint-Jean d'Illac	Réf. Commande ITGA : IT0721-25225 Réf. Commande Client : IBA/2101/0584-B4_2021_04_01_1044_3557

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 02/04/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) Analytique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
ou diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : IBA/2101/0584-B4 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA : IT072104-4180		
Réf échantillon client : P015 - Colle non bitumineuse+linoleum souple - prefa recent / Bat 4/RDC - 10-Couloir 19m2		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Bois aggloméré		
Revêtement souple beige	META (1)	1	07/04/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + bois aggloméré	META (1)	1	07/04/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : IBA/2101/0584-B4 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA : IT072104-4181		
Réf échantillon client : P016 - Colle non bitumineuse+ linoleum souple - prefa recent / Bat 4/RDC - 18-Salle de cours53m2		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Bois massif / Bois sous forme de fibres		
Revêtement souple beige	META (1)	1	07/04/2021	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune	META (2)	1	07/04/2021	Amiante non détecté / -
Bois massif + bois sous forme de fibres non séparable	META (1)	1	07/04/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-25225 EN DATE DU 08/04/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : IBA/2101/0584-B4 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA :		IT072104-4182
Réf échantillon client : P017 - Carrelage+joints ciment+DDS+Colle bitumineuse+cgape sur dalle beto - prefa ancien/ Bat 4/RDC - 22-Salle detente 34m2		Description ITGA :		Carrelage / Colle grise / Colle bitumineuse noire / Joint cassant gris / Matériau compact gris hétérogène
Carrelage	META (1)	1	07/04/2021	Amiante non détecté / -
Colle grise	META (1)	1	07/04/2021	Amiante non détecté / -
Colle bitumineuse noire	META (2)	1	07/04/2021	Amiante non détecté / -
Joint cassant gris	META (1)	1	07/04/2021	Amiante non détecté / -
Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	07/04/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : IBA/2101/0584-B4 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA :		IT072104-4183
Réf échantillon client : P018 - Panneaux en fibre ciment tyoe glasal - prefa ancien/ Bat 4/RDC - 8- Chaufferie 6m2		Description ITGA :		Bois sous forme de fibres / Peinture en faible quantité en vrac / Matériau beige en vrac avec fibres visibles
Bois sous forme de fibres + peinture en faible quantité en vrac + matériau beige en vrac avec fibres visibles	MOLP	2	06/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : IBA/2101/0584-B4 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA :		IT072104-4184
Réf échantillon client : P019 - Peinture de sol - prefa ancien/ Bat 4/RDC - 8- Chaufferie 6m2		Description ITGA :		Peintures multiples en vrac / Matériau compact gris hétérogène
Peintures multiples en vrac	META (1)	1	07/04/2021	Amiante non détecté / -
Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	07/04/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : IBA/2101/0584-B4 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA :		IT072104-4185
Réf échantillon client : P020 - Joint d'etancheite, joint plat predecoupe pour bride - prefa ancien/ Bat 4/RDC - 8- Chaufferie 6m2		Description ITGA :		Peinture / Matériau fibreux marron
Peinture non séparable + matériau fibreux marron	META (1)	2	07/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : IBA/2101/0584-B4 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA :		IT072104-4186
Réf échantillon client : P021 - Colle de plinthes en carrelage sur beton cellulaire et toile de verre peint - prefa ancien/ Bat 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2		Description ITGA :		Carrelage / Colle beige / Peinture avec couche en toile / Couche plâtreuse blanche
Carrelage	META (1)	1	07/04/2021	Amiante non détecté / -
Colle beige + peinture avec couche en toile non séparable	META (1)	1	07/04/2021	Amiante non détecté / -
Couche plâtreuse blanche	META (1)	1	07/04/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-25225 EN DATE DU 08/04/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : IBA/2101/0584-B4 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA : IT072104-4187		
Réf échantillon client : P022 - Colle bitumineuse+colle blanche de carrelage - prefa ancien/ Bat 4/ RDC - 4- Salle de reunion 17m2		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Colle bitumineuse noire		
Carrelage	META (1)	1	07/04/2021	Amiante non détecté / -
Colle beige	META (1)	1	07/04/2021	Amiante non détecté / -
Colle bitumineuse noire	META (2)	1	07/04/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : IBA/2101/0584-B4 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA : IT072104-4188		
Réf échantillon client : P023 - Panneaux collés visses ou cloués - prefa ancien/ Bat 4/ RDC - 4- Salle de reunion 17m2		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige avec fibres visibles		
Peinture non séparable + matériau compact beige avec fibres visibles	MOLP	2	06/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : IBA/2101/0584-B4 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA : IT072104-4189		
Réf échantillon client : P024 - Colle +DDS rouge+colle de carrelage - prefa ancien/ Bat 4/ RDC - 24-Bureau 11m2		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris / Couche grise / Colle polymère jaune / Matériau rose		
Carrelage	META (1)	1	07/04/2021	Amiante non détecté / -
Colle grise	META (1)	1	07/04/2021	Amiante non détecté / -
Matériau compact gris	META (1)	1	07/04/2021	Amiante non détecté / -
Couche grise non séparable + colle polymère jaune non séparable + matériau rose	META (1)	1	07/04/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : IBA/2101/0584-B4 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA : IT072104-4190		
Réf échantillon client : P025 - Colle bitumineuse+ DDS rouge+DDS beige +colle ciment +carrelage - prefa ancien/ Bat 4/ RDC - 23-Bureau 11m2		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Dalle dure cassante rouge / Colle bitumineuse noire / Matériau compact gris hétérogène / Colle grise / Carrelage		
Dalle dure cassante beige	META (2)	1	07/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Colle bitumineuse noire non séparable + colle bitumineuse noire	META (2)	2	07/04/2021	Amiante non détecté / -
Dalle dure cassante rouge	META (2)	1	07/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	07/04/2021	Amiante non détecté / -
Colle grise	META (1)	1	07/04/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	META (1)	1	08/04/2021	Amiante non détecté / -


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO II0721-25225 EN DATE DU 08/04/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante

Validé par : Nathan BARATON - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

7.3 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et

interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.4 - Annexe - Autres documents

Cabinet CONDORCET
AUDIT ET COURTAGE EN ASSURANCE

Allianz

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 2 Rue Grignan – 13001 Marseille, attestons par la présente que la Société :

INSPECTION BATIMENT ATLANTIQUE
39 IMPASSE FREDERIC MISTRAL
33127 ST JEAN D ILLAC
Siret n°791 276 868 00019

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, un contrat d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier », sous le numéro N°86517808/ 80810566.

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : **DIAGNOSTIC IMMOBILIER :**

Assainissement Autonome - Collectif
Attestation de prise en compte de la réglementation thermique
Audit énergétique sans préconisation de travaux
Certificat de décence (loi SRU 2000-1208 SRU du 13/12/2000)
Certificat de norme d'habitabilité dans le cadre de l'obtention d'un prêt conventionné et/ou d'un prêt à taux zéro
Coordination SPS
Diagnostic Accessibilité (Hors ERP)
Diagnostic acoustique
Diagnostic amiante avant travaux / démolition sans préconisation de travaux
Diagnostic amiante avant vente
Diagnostic Amiante dans les Parties Privatives
Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux (Hors milieu industriel)
Diagnostic de performance énergétique
Diagnostic humidité
Diagnostic Légionellose
Diagnostic monoxyde de carbone
Diagnostic Plomb dans l'eau
Diagnostic radon
Diagnostic sécurité piscine
Diagnostic surface habitable Loi Boutin
Diagnostic Technique SRU
Diagnostic termites
Document Unique
Dossier technique amiante
DRIPP- Diagnostic de risque d'intoxication au plomb
Etat de l'installation intérieure de l'électricité des parties privatives et communes (DTT)
Etat des installations de gaz (Dossier de diagnostic technique)
Etat des lieux locatifs
Etat des risques et pollutions
Etat parasitaire
Etude thermique règlementaire RT 2005
Etude thermique règlementaire RT 2012
Evaluation Périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
Evaluation valeur vénale et locative
Exposition au plomb (CREP)
Loi Carrez
Loi Scellier
Millièmes de copropriété
Recherche de métaux lourds(Hors Détection toxique chez l'Homme)
Recherche de plomb avant travaux/Démolition
Risques naturels et technologiques
Test d'infiltrométrie sur l'enveloppe des bâtiments
Thermographie infrarouge
Vérification des équipements et installations incendie (Hors ERP)
Vérifications générales périodiques électricité
Vérifications générales périodiques gaz

La garantie du contrat porte exclusivement :

- **Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus,**
- **Et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications correspondantes exigées par la réglementation**

Tél. : 09 72 36 90 00
2 rue Grignan 13001 Marseille
contact@cabinetcondorcet.com • www.cabinetcondorcet.com
Service Réclamation : contact@cabinetcondorcet.com - 2 Rue Grignan 13001 Marseille 09 72 36 90 00
SAS au capital de 50 000 € - RCS Marseille 494 253 982 - Immatriculation ORIAS 07 026 627 www.orias.fr - Sous le contrôle de l'ACPR
Autorité de contrôle Prudentiel et Résolution - 61 Rue Taitbout 75009 Paris

Cabinet CONDORCET
AUDIT ET COURTAGE EN ASSURANCE

Allianz

Période de validité : **du 01/10/2020 au 30/09/2021**

L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations.

La Société ALLIANZ garantit l'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales n° COM08813, des conventions spéciales n° DIG20704 et des conditions particulières (feuillet d'adhésion 80810566), établies sur les bases des déclarations de l'adhérent. Les garanties sont subordonnées au paiement des cotisations d'assurances pour la période de la présente attestation.

Tél. : 09 72 36 90 00
2 rue Grignan 13001 Marseille
contact@cabinetcondorcet.com • www.cabinetcondorcet.com
Service Réclamation : contact@cabinetcondorcet.com - 2 Rue Grignan 13001 Marseille 09 72 36 90 00
SAS au capital de 50 000 € - RCS Marseille 494 253 982 - Immatriculation ORIAS 07 026 627 www.orias.fr - Sous le contrôle de l'ACPR
Autorité de contrôle Prudentiel et Résolution - 61 Rue Taitbout 75009 Paris

Cabinet CONDORCET
AUDIT ET COURTAGE EN ASSURANCE

Allianz


TABLEAU DE GARANTIE

Responsabilité civile « Exploitation »	
Nature des dommages	**Montant des garanties**
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	9 000 000 € par sinistre
dont :	
- Dommages matériels et immatériels consécutifs :	1 500 000 € par sinistre
- Dommages immatériels non consécutifs :	150 000 € par année d'assurance
- Atteintes à l'environnement accidentelles (corporels, matériels et immatériels) :	750 000 € par année d'assurance
- Dommages aux bâtiments loués ou empruntés et à leur contenu	300 000 € par sinistre
Responsabilité civile « Professionnelle » ***(garantie par Assuré)***	
Nature des dommages	**Montant des garanties**
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	600 000 € par sinistre avec un maximum de 600 000 € par année d'assurance
dont :	
- Destruction ou détérioration des documents et autres supports d'informations confiés à l'Assuré pour l'exécution des prestations, y compris les frais de reconstitution des informations :	30 000 € par sinistre
Défense – Recours	
Défense devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives. Défense des intérêts civils devant les juridictions répressives :	Frais à la charge de l'Assureur, sauf dépassement du plafond de garantie en cause.
Recours (préjudices supérieurs à 150 €) :	15 000 € par sinistre

La présente attestation ne peut engager l'assureur en dehors des limites prévues par les clauses et conditions du contrat auxquelles elle se réfère.

Fait à Marseille, le 18 septembre 2020

POUR LE CABINET CONDORCET



Tél. : 09 72 36 90 00
2 rue Grignan 13001 Marseille
contact@cabinetcondorcet.com • www.cabinetcondorcet.com
Service Réclamation : contact@cabinetcondorcet.com - 2 Rue Grignan 13001 Marseille 09 72 36 90 00
SAS au capital de 50 000 € - RCS Marseille 494 253 982 - Immatriculation ORIAS 07 026 627 www.orias.fr - Sous le contrôle de l'ACPR
Autorité de contrôle Prudentiel et Résolution - 61 Rue Taitbout 75009 Paris

QUALIXPERT

Certificat N° C0188

Madame Virginie RABEAU

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N° 4-0094 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Amiante avec mention	**Certificat valable Du 10/07/2017 au 09/07/2022**	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Constat de risque d'exposition au plomb	**Certificat valable Du 23/04/2019 au 22/04/2024**	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	**Certificat valable Du 14/11/2018 au 13/11/2023**	Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Date d'établissement le mardi 23 avril 2019

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

F09 Certification de compétence version M 250119

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible
