I.B.A
Inspection Bâtiment Atlantique

Résumé de l'expertise n° IBA/2101/0584-HM9

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :
Adresse :..... **BASE AERIENNE 118 (BA118)**
Avenue du Colonnel Rozanoff
Projet COGA
Commune :..... **40000 MONT-DE-MARSAN**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
HM9 Lot numéro Non communiqué,
Périmètre de repérage : ... **Zone travaux projet COGA**
Demolition du Bâtiment HM9
Relevé par carottage des dalles béton si possible ensemble des bâtiments.

	Prestations	Conclusion
	Amiante	Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. (voir détail dans le rapport) La mission n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.
	Etat Termite/Parasitaire	Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.Il n'a pas été repéré d'indice de présence d'autres agents de dégradation biologique.
	Plomb avant démolition	En mode avant travaux ou démolition le tableau des mesures fait office de conclusion.

Localisation	Parties du local	Raison
HM9/RDC - 7-Vestiaire, HM9/RDC - 11-Sanitaires, HM9/RDC - 12-WC, HM9/RDC - 22-Salle de detente,	Conduits ou canalisations souterraines sous les dallages béton	Non accessible et visible à cette étape du projet en cas de doute des investigations complémentaires devront avoir lieux

I.B.A
Inspection Bâtiment Atlantique

ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° **IBA/2101/0584-HM9** relatif à l'immeuble bâti visité situé au :

BASE AERIENNE 118 (BA118)
HM9
Avenue du Colonnel Rozanoff
Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN.

Je soussignée, **RABEAU VIRGINIE**, technicienne de la construction pour la société **IBA (Inspection Bâtiment Atlantique)** atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :


- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences :

Prestations	Nom du diagnostiqueur	Entreprise de certification	N° Certification	Echéance certif
Termites	RABEAU VIRGINIE	LCC QUALIXPERT	C0188	13/11/2023 (Date d'obtention : 14/11/2018)
Amiante Mention				09/07/2022 (Date d'obtention : 10/07/2017)
Plomb				22/04/2024 (Date d'obtention : 23/04/2019)

- Avoir souscrit à une assurance (ALLIANZ n° 80810566 valable jusqu'au 30 09 2021) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.
-

Fait à SAINT JEAN D ILLAC , le **07/06/2021**

Signature de l'opérateur de diagnostics :



Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation
« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »
Article L271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation
« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »

Cabinet CONDORCET
AUDIT ET COURTAGE EN ASSURANCE

Allianz

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 2 Rue Grignan – 13001 Marseille, attestons par la présente que la Société :

INSPECTION BATIMENT ATLANTIQUE
39 IMPASSE FREDERIC MISTRAL
33127 ST JEAN D ILLAC
Siret n°791 276 868 00019

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, un contrat d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier », sous le numéro N°86517808/ 80810566.

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : **DIAGNOSTIC IMMOBILIER :**

Assainissement Autonome - Collectif
Attestation de prise en compte de la réglementation thermique
Audit énergétique sans préconisation de travaux
Certificat de décence (loi SRU 2000-1208 SRU du 13/12/2000)
Certificat de norme d'habitabilité dans le cadre de l'obtention d'un prêt conventionné et/ou d'un prêt à taux zéro
Coordination SPS
Diagnostic Accessibilité (Hors ERP)
Diagnostic acoustique
Diagnostic amiante avant travaux / démolition sans préconisation de travaux
Diagnostic amiante avant vente
Diagnostic Amiante dans les Parties Privatives
Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux (Hors milieu industriel)
Diagnostic de performance énergétique
Diagnostic humidité
Diagnostic Légionellose
Diagnostic monoxyde de carbone
Diagnostic Plomb dans l'eau
Diagnostic radon
Diagnostic sécurité piscine
Diagnostic surface habitable Loi Boutin
Diagnostic Technique SRU
Diagnostic termites
Document Unique
Dossier technique amiante
DRIPP- Diagnostic de risque d'intoxication au plomb
Etat de l'installation intérieure de l'électricité des parties privatives et communes (DTT)
Etat des installations de gaz (Dossier de diagnostic technique)
Etat des lieux locatifs
Etat des risques et pollutions
Etat parasitaire
Etude thermique règlementaire RT 2005
Etude thermique règlementaire RT 2012
Evaluation Périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
Evaluation valeur vénale et locative
Exposition au plomb (CREP)
Loi Carrez
Loi Scellier
Millièmes de copropriété
Recherche de métaux lourds(Hors Détection toxique chez l'Homme)
Recherche de plomb avant travaux/Démolition
Risques naturels et technologiques
Test d'infiltrométrie sur l'enveloppe des bâtiments
Thermographie infrarouge
Vérification des équipements et installations incendie (Hors ERP)
Vérifications générales périodiques électricité
Vérifications générales périodiques gaz

La garantie du contrat porte exclusivement :

- **Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus,**
- **Et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications correspondantes exigées par la réglementation**

Tél. : 09 72 36 90 00
2 rue Grignan 13001 Marseille
contact@cabinetcondorcet.com • www.cabinetcondorcet.com
Service Réclamation : contact@cabinetcondorcet.com - 2 Rue Grignan 13001 Marseille 09 72 36 90 00
SAS au capital de 50 000 € - RCS Marseille 494 253 982 - Immatriculation ORIAS 07 026 627 www.orias.fr - Sous le contrôle de l'ACPR
Autorité de contrôle Prudentiel et Résolution - 61 Rue Taitbout 75009 Paris

Cabinet CONDORCET
AUDIT ET COURTAGE EN ASSURANCE

Allianz

Période de validité : **du 01/10/2020 au 30/09/2021**

L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations.

La Société ALLIANZ garantit l'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales n° COM08813, des conventions spéciales n° DIG20704 et des conditions particulières (feuillet d'adhésion 80810566), établies sur les bases des déclarations de l'adhérent. Les garanties sont subordonnées au paiement des cotisations d'assurances pour la période de la présente attestation.

Tél. : 09 72 36 90 00
2 rue Grignan 13001 Marseille
contact@cabinetcondorcet.com • www.cabinetcondorcet.com
Service Réclamation : contact@cabinetcondorcet.com - 2 Rue Grignan 13001 Marseille 09 72 36 90 00
SAS au capital de 50 000 € - RCS Marseille 494 253 982 - Immatriculation ORIAS 07 026 627 www.orias.fr - Sous le contrôle de l'ACPR
Autorité de contrôle Prudentiel et Résolution - 61 Rue Taitbout 75009 Paris

Cabinet CONDORCET
AUDIT ET COURTAGE EN ASSURANCE

Allianz


TABLEAU DE GARANTIE

Responsabilité civile « Exploitation »	
Nature des dommages	**Montant des garanties**
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	9 000 000 € par sinistre
dont :	
- Dommages matériels et immatériels consécutifs :	1 500 000 € par sinistre
- Dommages immatériels non consécutifs :	150 000 € par année d'assurance
- Atteintes à l'environnement accidentelles (corporels, matériels et immatériels) :	750 000 € par année d'assurance
- Dommages aux bâtiments loués ou empruntés et à leur contenu	300 000 € par sinistre
Responsabilité civile « Professionnelle » ***(garantie par Assuré)***	
Nature des dommages	**Montant des garanties**
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	600 000 € par sinistre avec un maximum de 600 000 € par année d'assurance
dont :	
- Destruction ou détérioration des documents et autres supports d'informations confiés à l'Assuré pour l'exécution des prestations, y compris les frais de reconstitution des informations :	30 000 € par sinistre
Défense – Recours	
Défense devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives. Défense des intérêts civils devant les juridictions répressives :	Frais à la charge de l'Assureur, sauf dépassement du plafond de garantie en cause.
Recours (préjudices supérieurs à 150 €) :	15 000 € par sinistre

La présente attestation ne peut engager l'assureur en dehors des limites prévues par les clauses et conditions du contrat auxquelles elle se réfère.

Fait à Marseille, le 18 septembre 2020

POUR LE CABINET CONDORCET



Tél. : 09 72 36 90 00
2 rue Grignan 13001 Marseille
contact@cabinetcondorcet.com • www.cabinetcondorcet.com
Service Réclamation : contact@cabinetcondorcet.com - 2 Rue Grignan 13001 Marseille 09 72 36 90 00
SAS au capital de 50 000 € - RCS Marseille 494 253 982 - Immatriculation ORIAS 07 026 627 www.orias.fr - Sous le contrôle de l'ACPR
Autorité de contrôle Prudentiel et Résolution - 61 Rue Taitbout 75009 Paris

I.B.A
Inspection Bâtiment Atlantique

Pré-Rapport du 07/06/2021 de la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition (listes C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : IBA/2101/0584-HM9
Date du repérage : 26,27/01,09/02,08/03/2021

Références réglementaires et normatives	
Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4531-1 du code du travail conjointement à l'arrêté du 26 juin 2013 et conformément aux articles L.271-4 à L.271-6 du code de la construction et de l'habitation et aux articles R.1334-19, R.1334-22, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6 et l'annexe 13-9 liste C du Code de la Santé Publique, issues du décret 2011-629 du 3 juin 2011.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 de Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante
Immeuble bâti visité	
Adresse	Rue : ..... **BASE AERIENNE 118 (BA118)** **Avenue du Colonnel Rozanoff** **Projet COGA** Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: **HM9 Lot numéro Non communiqué,** Code postal, ville : . **40000 MONT-DE-MARSAN**
Périmètre de repérage :	..... **Zone travaux projet COGA** **Demolition du Bâtiment HM9** **Relevé par carottage des dalles béton si possible ensemble des bâtiments.**
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction :	.....**Bureaux et locaux techniques** .....**Industrie** **1940**
Le propriétaire et le commanditaire	
Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom **:** ... **Ministère de la défense** **Bon de comande n° 1510441922**
Le commanditaire	Nom et prénom : ... **ESID BX - ASC 1 BROCHARD Romain " Architecte du Pôle maîtrise d'œuvre"** Adresse : ..... **Division Investissement/ Pôle Maîtrise d'œuvre Interne** **Caserne Pelleport** **9 rue de Cursol** **CS 21152** **33068 BORDEAUX CEDEX (France)**

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage Personne signataire autorisant la diffusion du rapport	RABEAU VIRGINIE	Opérateur de repérage	LCC QUALIXPERT 17 rue Borrel 81100 CASTRES	Obtention : 10/07/2017 Échéance : 09/07/2022 N° de certification : C0188

Raison sociale de l'entreprise : **IBA (Inspection Bâtiment Atlantique)** (Numéro SIRET : **791 276 868 00019)**
Adresse : **39 impasse Frédéric Mistral, 33127 SAINT JEAN D ILLAC**
Désignation de la compagnie d'assurance : **ALLIANZ**
Numéro de police et date de validité : **80810566 / 30 09 2021**

Le rapport de repérage
Date d'émission du rapport de repérage : 07/06/2021, remis au propriétaire le 07/06/2021
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 85 pages

Sommaire

1 Les conclusions
2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses
3 La mission de repérage
3.1 L'objet de la mission
3.2 Le cadre de la mission
3.2.1 L'intitulé de la mission
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
3.2.3 L'objectif de la mission
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
4 Conditions de réalisation du repérage
4.1 Bilan de l'analyse documentaire
4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
4.4 Plan et procédures de prélèvements
5 Résultats détaillés du repérage
5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse
5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif
6 Signatures
7 Annexes

1. – Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire :

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation et préconisations
HM9/RDC - 14-Bureau	Identifiant: M012 Réf. échantillon: P011 Réf. laboratoire: IT072102-19646 Description: Peintures multiples Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Fractionnement	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	trace de peinture **Préconisation :** Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage
HM9/RDC - 11-Sanitaires	Identifiant: M021 Réf. échantillon: P019 Réf. laboratoire: IT072102-19654 Description: Peintures multiples Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Chape+colle ciment de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	trace de peinture **Préconisation :** Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage
HM9/RDC - 13-Bureau	Identifiant: M025-4 Réf. échantillon: P023-3 Réf. laboratoire: IT072103-48384 Description: Peintures multiples Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+chape(1)+plastique+peinture sur chape(2)+ragréages avec trace noire(1)+dalles béton avec trace noire(2) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	traces de peinture sous le carrelage **Préconisation :** Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage
HM9/RDC - 24-Bureau Chef atelier	Identifiant: M027-5 Réf. échantillon: P025-5 Réf. laboratoire: IT072103-48386 Description: Peinture en faible quantité non séparable matériau compact gris Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+joint+chape+trace de peinture+dalle bêton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Non accessible sans carottage **Préconisation :** Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage

- des matériaux et produits ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :

Localisation	Identifiant + Description
HM9/RDC - 20-Chaufferie	Identifiant: M001 Réf. échantillon: P001 Réf. laboratoire: IT072102-9737 Description: Joint de brûleur Composant de la construction: 9. Installations industrielles - Fours, étuves, tuyauteries… Partie à sonder: Joints Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Localisation sur croquis: M001
	Identifiant: M002 Réf. échantillon: P002 Réf. laboratoire: IT072102-9738 Description: Plaques isolantes internes Composant de la construction: 8. Equipements divers - Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes….. Partie à sonder: Plaques isolantes internes Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
Parties extérieures couverture du local 11à la chaudière n°20	Identifiant: M003 Réf. échantillon: P003 Réf. laboratoire: IT072102-9739 Description: Vermiculite en sous toiture Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments sous toiture Partie à sonder: Vermiculite en sous toiture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Localisation sur croquis: M003
HM9/RDC - 13-Bureau; HM9/RDC - 15-Bureau	Identifiant: M004 Réf. échantillon: P004 Réf. laboratoire: IT072102-9740 Description: Panneaux collés ou vissés Composant de la construction: 2. Planchers et plafonds - Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et Coffres Horizontaux Partie à sonder: Panneaux collés ou vissés Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
HM9/1er étage - 29-Secrétariat	Identifiant: M005 Réf. échantillon: P005 Réf. laboratoire: IT072102-9741 Description: Panneaux 60x60 fibreux rigides Composant de la construction: 2. Planchers et plafonds - Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et Coffres Horizontaux Partie à sonder: Panneaux 60x60 fibreux rigides Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
HM9/1er étage - 30-Bureau Chef	Identifiant: M006 Réf. échantillon: P006 Réf. laboratoire: IT072102-9742 Description: Panneaux collés ou vissés Composant de la construction: 2. Planchers et plafonds - Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et Coffres Horizontaux Partie à sonder: Panneaux collés ou vissés Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
HM9/RDC - 19-Magasin	Identifiant: M007 Réf. échantillon: P007 Réf. laboratoire: IT072102-9743 Description: Revêtement souple gris Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol et ragréage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: M007 Réf. échantillon: P007-2 Réf. laboratoire: IT072102-9743 Description: Colle polymère jaune en faible quantité non séparable ragréage gris non séparable matériau compact gris hétérogène non séparable Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol et ragréage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
HM9/RDC - 1-Atelier	Identifiant: M008 Réf. échantillon: P008 Réf. laboratoire: IT072102-9744 Description: Mastic bitumineuses, mousse, polystyrène (Joint de dilatation au sol) Composant de la construction: 5. Revêtements de sol - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Mastic bitumineuses, mousse, polystyrène (Joint de dilatation au sol) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: M010 Réf. échantillon: P009 Réf. laboratoire: IT072102-19644 Description: Calorifuge enveloppe (carton+peinture) Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge enveloppe (carton+peinture)…)
	Identifiant: M011 Réf. échantillon: P010 Réf. laboratoire: IT072102-19645 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
HM9/RDC - 14-Bureau	Identifiant: M012-2 Réf. échantillon: P011-2 Réf. laboratoire: IT072102-19646 Description: Revêtement cassant gris Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Localisation	Identifiant + Description
	Identifiant: IBA/2101/0584-HM9/M012-3 Description: Colle polymère jaune avec couche en papier Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: M012-4 Réf. échantillon: P011-4 Réf. laboratoire: IT072102-19646 Description: Carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: M012-5 Réf. échantillon: P011-5 Réf. laboratoire: IT072102-19646 Description: Colle grise Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: M012-6 Réf. échantillon: P011-6 Réf. laboratoire: IT072102-19646 Description: Matériau compact gris hétérogène Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: M012-7 Réf. échantillon: P011-7 Réf. laboratoire: IT072102-19646 Description: Joint cassant gris en faible quantité en vrac peintures multiples non séparable Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
HM9/RDC - 14-Bureau; HM9/RDC - 15-Bureau	Identifiant: M013 Réf. échantillon: P012 Réf. laboratoire: IT072102-19647 Description: Carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle ciment+ peinture + plinthes carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: M013 Réf. échantillon: P012-2 Réf. laboratoire: IT072102-19647 Description: Colle beige peinture non séparable Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle ciment+ peinture + plinthes carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: M013 Réf. échantillon: P012-3 Réf. laboratoire: IT072102-19647 Description: Matériau compact gris Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle ciment+ peinture + plinthes carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: M013 Réf. échantillon: P012-4 Réf. laboratoire: IT072102-19647 Description: Joint cassant gris Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle ciment+ peinture + plinthes carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: M013 Réf. échantillon: P012-5 Réf. laboratoire: IT072102-19647 Description: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle ciment+ peinture + plinthes carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
HM9/RDC - 13-Bureau; HM9/RDC - 15-Bureau	Identifiant: M014 Réf. échantillon: P013 Réf. laboratoire: IT072102-19648 Description: Carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle blanche+ joint gris+ plinthes carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: M014 Réf. échantillon: P013-2 Réf. laboratoire: IT072102-19648 Description: Colle beige Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle blanche+ joint gris+ plinthes carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: M014 Réf. échantillon: P013-3 Réf. laboratoire: IT072102-19648 Description: Peintures multiples non séparable joint cassant gris Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle blanche+ joint gris+ plinthes carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Localisation	Identifiant + Description
HM9/RDC - 1-Atelier	Identifiant: M015 Réf. échantillon: P014 Réf. laboratoire: IT072102-19649 Description: Peinture beige, trace noire sur raidisseur acier+peinture blanche Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Peinture beige, trace noire sur raidisseur acier+peinture blanc Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
HM9/RDC - 12-WC	Identifiant: M016 Réf. échantillon: P015 Réf. laboratoire: IT072102-19650 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques rigide zébré Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
HM9/RDC - 11-Sanitaires; HM9/RDC - 12-WC	Identifiant: M018 Réf. échantillon: P016 Réf. laboratoire: IT072102-19651 Description: Colle beige Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle beige+joint gris+divers peintures de plinthes carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: M018 Réf. échantillon: P016-2 Réf. laboratoire: IT072102-19651 Description: Peintures multiples Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle beige+joint gris+divers peintures de plinthes carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: M018 Réf. échantillon: P016-3 Réf. laboratoire: IT072102-19651 Description: Joint cassant gris Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle beige+joint gris+divers peintures de plinthes carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
HM9/RDC - 12-WC; HM9/RDC - 22-Salle de detente	Identifiant: M019 Réf. échantillon: P017 Réf. laboratoire: IT072102-19652 Description: Carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle beige de faïence blanche15x15 + divers peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: M019 Réf. échantillon: P017-2 Réf. laboratoire: IT072102-19652 Description: Colle beige peintures multiples non séparable Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle beige de faïence blanche15x15 + divers peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: M019 Réf. échantillon: P017-3 Réf. laboratoire: IT072102-19652 Description: Joint cassant beige Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle beige de faïence blanche15x15 + divers peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
HM9/RDC - 12-WC	Identifiant: M020 Réf. échantillon: P018 Réf. laboratoire: IT072102-19653 Description: Carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage +joint souple gris Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: M020 Réf. échantillon: P018-2 Réf. laboratoire: IT072102-19653 Description: Colle grise Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage +joint souple gris Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: M020 Réf. échantillon: P018-3 Réf. laboratoire: IT072102-19653 Description: Matériau compact gris hétérogène Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage +joint souple gris Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: M020 Réf. échantillon: P018-4 Réf. laboratoire: IT072102-19653 Description: Matériau souple gris avec poussières Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage +joint souple gris Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
HM9/RDC - 11-Sanitaires	Identifiant: M021-2 Réf. échantillon: P019-2 Réf. laboratoire: IT072102-19654 Description: Carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Chape+colle ciment de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Localisation	Identifiant + Description
	Identifiant: M021-3 Réf. échantillon: P019-3 Réf. laboratoire: IT072102-19654 Description: Colle grise hétérogène Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Chape+colle ciment de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
HM9/RDC - 11-Sanitaires; HM9/RDC - 12-WC	Identifiant: M022 Réf. échantillon: P020 Réf. laboratoire: IT072102-19655 Description: Panneaux et plaques rigide aspect gouttelette 120x60 Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques rigide aspect gouttelette 120x60 Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
HM9/RDC - 12-WC	Identifiant: M023 Réf. échantillon: P021 Réf. laboratoire: IT072103-48382 **Description: Carrelage** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Chape+colle ciment de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage
	Identifiant: M023 Réf. échantillon: P021-2 Réf. laboratoire: IT072103-48382 **Description: Colle grise** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Chape+colle ciment de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage
	Identifiant: M023 Réf. échantillon: P021-3 Réf. laboratoire: IT072103-48382 **Description: Matériau compact gris hétérogène** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Chape+colle ciment de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage
	Identifiant: M023 Réf. échantillon: P021-4 Réf. laboratoire: IT072103-48382 **Description: Peinture** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Chape+colle ciment de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage
HM9/RDC - 15-Bureau	Identifiant: M024 Echantillon: P022, réf. labo.: IT072103-48383 **Description: Carrelage** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Carrelage+colle+chape+ réagreage sur dallle béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage
	Identifiant: M024 Echantillon: P022-2, réf. labo.: IT072103-48383 **Description: Colle grise** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Carrelage+colle+chape+ réagreage sur dallle béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage
	Identifiant: M024 Echantillon:P022-3, réf. labo.: IT072103-48383 **Description: Matériau compact gris hétérogène** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Carrelage+colle+chape+ réagreage sur dallle béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage
	Identifiant: M024 Echantillon:P022-4, réf. labo.: IT072103-48383 **Description: Ragréage gris** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Carrelage+colle+chape+ réagreage sur dallle béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage
HM9/RDC - 13-Bureau	Identifiant: M025 echantillon: P023 **Description: Carrelage** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+chape(1)+plastique+peinture sur chape(2)+ragréages avec trace noire(1)+dalles béton avec trace noire(2) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage
	Identifiant: M025 echantillon: P023-2 **Description: Colle grise** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+chape(1)+plastique+peinture sur chape(2)+ragréages avec trace noire(1)+dalles béton avec trace noire(2) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage

Localisation	Identifiant + Description
	Identifiant: M025 echantillon: P023-3 **Description: Matériau compact gris hétérogène** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+chape(1)+plastique+peinture sur chape(2)+ragréages avec trace noire(1)+dalles béton avec trace noire(2) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage
	Identifiant: M025 echantillon: P023-5 **Description: Ragréage gris** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+chape(1)+plastique+peinture sur chape(2)+ragréages avec trace noire(1)+dalles béton avec trace noire(2) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage
	Identifiant: M025 echantillon: P023-6 **Description: Matériau bitumineux noir couche jaune avec poussières non séparable** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+chape(1)+plastique+peinture sur chape(2)+ragréages avec trace noire(1)+dalles béton avec trace noire(2) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage
HM9/RDC - 22-Salle de detente	Identifiant: M026 Réf. échantillon: P024 Réf. laboratoire: IT072103-48385 **Description: Carrelage** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+joint+chape+dalle béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: M026 Réf. échantillon: P024-2 Réf. laboratoire: IT072103-48385 **Description: Colle grise** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+joint+chape+dalle béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: M026 Réf. échantillon: P024-3 Réf. laboratoire: IT072103-48385 **Description: Matériau compact gris hétérogène** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+joint+chape+dalle béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: M026 Réf. échantillon: P024-4 Réf. laboratoire: IT072103-48385 **Description: Joint cassant gris** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+joint+chape+dalle béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
HM9/RDC - 24-Bureau Chef atelier	Identifiant: M027 Réf. échantillon: P025 Réf. laboratoire: IT072103-48386 **Description: Carrelage** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+joint+chape+trace de peinture+dalle bêton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage
	Identifiant: M027 Réf. échantillon: P025-2 Réf. laboratoire: IT072103-48386 **Description: Colle grise** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+joint+chape+trace de peinture+dalle bêton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage
	Identifiant: M027 Réf. échantillon: P025-3 Réf. laboratoire: IT072103-48386 **Description: Matériau compact gris hétérogène** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+joint+chape+trace de peinture+dalle bêton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage
	Identifiant: M027 Réf. échantillon: P025-4 Réf. laboratoire: IT072103-48386 **Description: Joint cassant gris** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+joint+chape+trace de peinture+dalle bêton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage
HM9/RDC - 7-Vestiaire	Identifiant: M028 Réf. échantillon: P026 Réf. laboratoire: IT072103-48387 **Description: Carrelage** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+chape Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage

Localisation	Identifiant + Description
	Identifiant: M028 Réf. échantillon: P026-2 Réf. laboratoire: IT072103-48387 **Description: Colle beige** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+chape Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage
	Identifiant: M028 Réf. échantillon: P026-3 Réf. laboratoire: IT072103-48387 **Description: Matériau compact gris hétérogène** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+chape Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage
HM9/RDC - 6-Bureau	Identifiant: M029 Réf. échantillon: P027 Réf. laboratoire: IT072103-48388 **Description: Carrelage** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Chape+colle de carrelage+ joint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: M029 Réf. échantillon: P027-2 Réf. laboratoire: IT072103-48388 **Description: Colle grise** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Chape+colle de carrelage+ joint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: M029 Réf. échantillon: P027-3 Réf. laboratoire: IT072103-48388 **Description: Matériau compact gris hétérogène** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Chape+colle de carrelage+ joint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
	Identifiant: M029 Réf. échantillon: P027-4 Réf. laboratoire: IT072103-48388 **Description: Joint cassant gris** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Chape+colle de carrelage+ joint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
HM9/RDC - 5-Bureau	Identifiant: M030 Réf. échantillon: P028 Réf. laboratoire: IT072103-48389 **Description: Peinture** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Peinture de sol+chape Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage
	Identifiant: M030 Réf. échantillon: P028-2 Réf. laboratoire: IT072103-48389 **Description: Matériau compact gris hétérogène** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Peinture de sol+chape Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage
HM9/RDC - 11-Sanitaires	Identifiant: Sondage S1 Réf. échantillon: P019-S1 Réf. laboratoire: IT072103-48381 **Description: Carrelage** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Chape+colle ciment de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage
	Identifiant: Sondage S1 Réf. échantillon: P019-S1 Réf. laboratoire: IT072103-48381 **Description: Colle grise** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Chape+colle ciment de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage
	Identifiant: Sondage S1 Réf. échantillon: P019-S1 Réf. laboratoire: IT072103-48381 **Description: Matériau compact gris hétérogène** Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Chape+colle ciment de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage

- des matériaux et produits ayant déjà fait l'objet d'analyse, statués ne contenant pas d'amiante :
Panneaux et plaques 120x80 (HM9/RDC - 9-Magasin; HM9/RDC - 10-Magasin)
Panneaux et plaques 120x80 (HM9/RDC - 2-Réserve; HM9/RDC - 3-Réserves; HM9/RDC - 5-Bureau; HM9/RDC - 6-Bureau; HM9/RDC - 8-Magasin)

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
HM9/RDC - 7-Vestiaire, HM9/RDC - 11-Sanitaires, HM9/RDC - 12-WC, HM9/RDC - 22-Salle de detente,	Conduits ou canalisations souterraines sous les dallages béton	Non accessible et visible à cette étape du projet en cas de doute des investigations complémentaires devront avoir lieux

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Institut technique des gaz et de l'air (ITGA)
Adresse : ..... Parc EDONIA rue de la Terre Bât R 66892 35768 Saint Grégoire Cedex
Numéro de l'accréditation Cofrac : 1-5967

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la démolition de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Pré-Rapport du 07/06/2021 de la mission de repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante avant démolition».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article R. 1334-19 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante ».
Conjointement, l'article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de l'évaluation des risques que le maître d'ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérogène portant sur les matériaux susceptibles d'en contenir et qui doivent faire l'objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante (articles R 4412-97 à 113 et R 4412-139 et suivants du code du travail)
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante dans l'immeuble à démolir.»
Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 13-9 du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par la liste C de l'Annexe 13.9 du Code de la santé publique et l'annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008

Extrait de l'annexe 13.9 (liste C) du Code de la santé publique modifié (liste non exhaustive)

Composant de la construction	*Partie du composant à vérifier ou à sonder*
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment
Ardoises	Ardoises composites
	Ardoises fibres-ciment
Eléments ponctuels	Conduits de cheminée
	Conduits de ventilation
	Conduits d'évacuation d'eau
Revêtements bitumineux d'étanchéité	Bardeaux d'asphalte
	Bardeaux bitume ("shingle")
	Pare-vapeur
	Revêtements
	Colles
Accessoires de toitures	Rivets
	Faîtages
	Closoirs
2. Façades	
Panneaux sandwichs	Plaques
	Joints d'assemblage
	Tresses
Bardages	Plaques fibres-ciment
	Bacs fibres-ciment
	Ardoises fibres-ciment
	Isolants sous bardages
Appuis de fenêtres	Eléments fibres-ciment
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons	Flocages
	Enduits projetés
	Revêtements durs (plaques planes fibres-ciment)
	Joints de dilatation
Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages
	Enduits projetés
	Joints de dilatation
	Entourage de poteaux (carton)
	Entourage de poteaux (fibres-ciment)
	Entourage de poteaux (matériau sandwich)
	Entourage de poteaux (carton+plâtre)
	Peintures intumescentes
Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (tresses)
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton)
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (fibres-ciment)
Gaines et coffres verticaux	Flocages
	Enduits projetés coupe-feu
	Enduits lissés coupe-feu
	Enduits talochés coupe-feu
	Panneaux
Portes coupe-feu, portes pare-flammes	Vantaux
	Joints
4. Plafonds et faux-plafonds	
Plafonds	Flocages
	Enduits projetés
	Panneaux collés ou vissés
	Coffrages perdus (carton-amiante)
	Coffrages perdus (fibres-ciment)
	Coffrages perdus (composites)
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)	Flocages
	Enduits projetés
	Peintures intumescentes
Interfaces entre structures	Rebouchage de trémies
	Jonctions avec la façade
	Calfeutrements
	Joints de dilatation
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits projetés
	Panneaux
	Jonction entre panneaux
Faux-plafonds	Panneaux
	Plaques
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Dalles plastiques
	Colles bitumineuses
	Revêtement plastique avec sous-couche
	Chape maigre
	Calfeutrement des passages de conduits
	Revêtement bitumineux des fondations
Revêtements de murs	Sous-couche des tissus muraux
	Revêtements durs (plaques de menuiseries)
	Revêtements durs (fibres-ciment)
	Colles des carrelages
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides)	Calorifugeages
	Enveloppes de calorifuges
	Conduits fibres-ciment

Conduits de vapeur, fumée, échappement	Conduits fibres-ciment
	joints entre éléments
	Mastics
	Tresses
	Manchons
Clapets / volets coupe-feu	Clapets coupe-feu
	Volets coupe-feu
	Rebouchage
Vide-ordures	Conduit fibres-ciment
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes et cloisons palières	Portes palières
	Cloisons palières
Trémie	Flocages
	Bourres
	Jonction murs / plancher
	Joints mousse
Machinerie	Flocages
	Bourres
	Jonction murs / plancher
	Joints mousse
8. Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes…..	Bourres
	Tresses
	Joints
	Calorifugeages
	Peintures anti-condensation
	Plaques isolantes internes
	Plaques isolantes externes
	Tissu amiante
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries…	Bourres
	Tresses
	Joints
	Calorifugeages
	Peintures anti-condensation
	Plaques isolantes
	Tissu amiante
	Freins
	Embrayages
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus	Eléments fibres-ciment

Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 (liste non exhaustive)

1-Toiture, terrasse et étanchéité	Plaques ondulées et planes
	Ardoises
	Eléments ponctuels
	Éléments de sous-toiture
	Bardeaux bitumé (type Shingle)
	Complexe d'étanchéité pour toiture
2-Parois verticales extérieures	Panneaux sandwiches
	Bardages
	Bardages métalliques à simple ou double peau
	Isolants sous bardage
	Mur et cloisons «en dur»
3-Parois verticales intérieures	Mur et cloisons «en dur»
	Poteaux (périphériques et intérieurs)
	Cloisons légères ou préfabriquées
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu / pare-flamme
	Revêtement de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme
4-Plafonds et faux plafonds	Plafonds
	Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)
	Interfaces entre structures
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux-plafonds
	Suspentes et contrevents
5-Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol
	Planchers
6-Conduits, canalisations et accessoires intérieurs et extérieurs	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)
	Conduits de vapeur, fumée, échappement
	Câbles électriques
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
7-Ascenseurs et monte-charges	Portes intérieures et extérieures de l'ascenseur et portes palières de l'étage
	Machinerie
	Trémie et Machinerie

8-Équipements divers et accessoires	Chaudières
	Tuyauteries
	Etuves
	Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs
	Aérothermes
	Installations autres
9-Installations industrielles	Fours
	Etuves Industrielles
	Tuyauteries Industrielles
	Racks
	Autres Industrielles
10-Voies et Réseaux divers	Conduits
	Revêtement routier


3.2.5 *Le périmètre de repérage effectif*



Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.



Etendu de la démolition :
HM9/RDC - 1-Atelier; HM9/RDC - 2-Réserve; HM9/RDC - 3-Réserves; HM9/RDC - 4-Rangement; HM9/RDC - 5-Bureau; HM9/RDC - 6-Bureau; HM9/RDC - 7-Vestiaire; HM9/RDC - 8-Magasin; HM9/RDC - 9-Magasin; HM9/RDC - 10-Magasin; HM9/RDC - 11-Sanitaires; HM9/RDC - 12-WC; HM9/RDC - 13-Bureau; HM9/RDC - 14-Bureau; HM9/RDC - 15-Bureau; HM9/RDC - 16-NBC; HM9/RDC - 17-Entrée /Sortie; HM9/RDC - 18-Magasin Trans; HM9/RDC - 19-Magasin; HM9/RDC - 20-Chaufferie; HM9/RDC - 20'-Rangement; HM9/RDC - 21-Vestiaire; HM9/RDC - 22-Salle de detente; HM9/RDC - 23-Vestiaire; HM9/RDC - 24-Bureau Chef atelier; HM9/RDC - 25-Bureau; HM9/RDC - 26-Magasin pièces détachées; HM9/RDC - 27-Magasin; HM9/1er étage - 28-Coursives; HM9/1er étage - 29-Secrétariat; HM9/1er étage - 30-Bureau Chef; HM9/Extérieur - 31-Air de lavage : Démolition du bâtiment pour laisser place à un nouveau projet .





Liste des pièces visitées




Localisation	Description	Photo
HM9/RDC - 5-Bureau	Sol : Béton et peinture Mur A, B, C : Briques,enduit et peinture Mur D : BA13 et peinture Faux plafond 120x80 : Laine de verre+pack alu Fenêtre A : Bois et Peinture Porte A : Bois et Peinture	
HM9/RDC - 3-Réserves	Sol : Béton Mur A, B, C, D : Enduit ciment et Peinture Faux plafond 120x80 : Laine de verre+pack alu Structure plafond : Acier Porte A : Bois et Peinture	
HM9/RDC - 6-Bureau	Mur A, B, C, D : BA13 et Tapisserie Mur A, B, C, D : Lambris bois Faux plafond 120x60 : Fibreux compact Porte A : Bois et Peinture Fenêtre C : Bois et Peinture Grille C : Métal et Peinture	

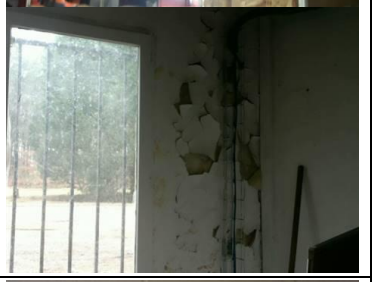
Localisation	Description	Photo
HM9/RDC - 9-Magasin	Sol : Béton Mur A : BA13 et Peinture Mur B, C, D : Enduit ciment et Peinture Faux plafond 120x60 : Laine de verre et pack alu Fenêtres C : Métal et peinture Porte 1 A : Bois Porte 2 D : Bois et Peinture	 
HM9/RDC - 10-Magasin	Sol : Béton Mur A, B, C, D : Enduit ciment et Peinture Faux plafond 120x60 : Fibreux compact Fenêtres 1 A : Bois et peinture Fenêtres 2 C : Bois et peinture Grilles C : Bois et peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 B : Bois et Peinture Radiateurs A : Acier et Peinture	 
HM9/RDC - 15-Bureau	Sol : béton et carrelage Mur A, B, C, D : Brique, enduits ciments et toile de verre peinte Faux plafond 60x60 : Fibreux compact Grilles B : Métal et peinture Plinthes A/D : pvc et peinture Porte 1 A : bois et peinture Porte 2 D : bois et peinture Radiateurs B : Acier et Peinture	 
HM9/RDC - 14-Bureau	Sol : Béton et Carrelage Mur A, B, C, D : Brique, enduits ciments et Toile de verre peint Faux plafond 60x60 : Fibreux compact Grilles C : Métal et peinture Plinthes A/D : pvc et peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 B : Bois et Peinture Porte 4 D : Bois et Peinture Radiateurs A : Acier et Peinture	

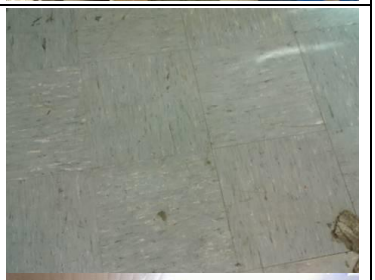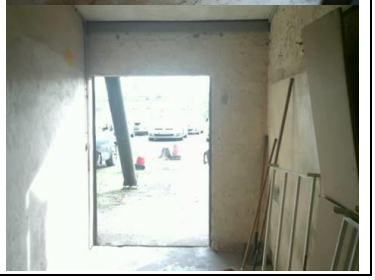
Localisation	Description	Photo
HM9/RDC - 13-Bureau	Sol : Béton et Carrelage Mur A, B, C, D : Brique, enduits ciments et Toile de verre peint Faux plafond 60x60 : Fibreux compact Fenêtre C : Bois et peinture Grilles C : Métal et peinture Plinthes A/D : pvc et peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 B : Bois et Peinture Radiateurs B : Acier et Peinture	
HM9/RDC - 16-NBC	Sol : Béton Mur A, B, C, D : Brique,enduit ciment et Peinture Plafond sous rampants : Lambris bois et Peinture Fenêtre D : Bois et Peinture Porte A : Bois et Peinture Grille D : Métal et Peinture	 
HM9/RDC - 19-Magasin	Sol : Béton et Dalles bleue Mur A, B, C, D : Brique,enduit ciment et peinture Plafond sous rampants : lambris bois et peinture Porte A : Bois et peinture Radiateurs B : Métal et Peinture Grille C : Métal et peinture Fenêtres C : Bois et peinture	 
HM9/RDC - 17-Entrée /Sortie	Sol : Béton Mur A, B, C, D : Brique,enduit ciment et Peinture Plafond sous rampants : Lambris bois et Peinture Porte AB : Bois et Peinture Porte D : Métal et Peinture	 

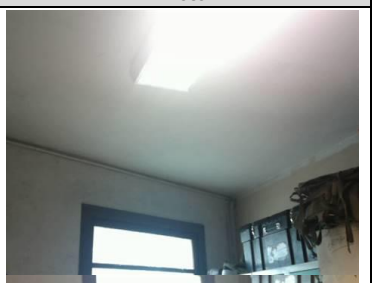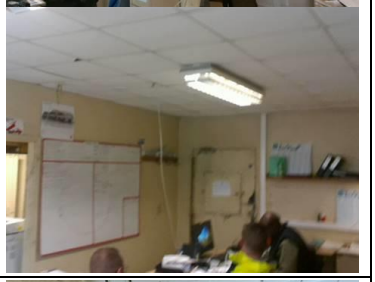Localisation	Description	Photo
HM9/RDC - 21-Vestiaire	Sol : Béton et Carrelage Mur A, B, C, D : Brique,enduit ciment et peinture Plafond : Enduit ciment et peinture Fenêtres C : Bois et peinture Grilles C : Métal et peinture Porte A : Bois et peinture	 
HM9/RDC - 24-Bureau Chef atelier	Sol : béton et Carrelage Mur A, B, C, D, E, F : Briques,enduit ciment et Peinture Faux Plafond 60x60 : Fibreux compact Plinthes A/F : Carrelage Fenêtres C : Bois et peinture Grilles C : Métal et peinture Porte 1 A : Métal et Peinture Porte 2 B : Bois et Peinture Cadre de porte F : Bois et Peinture Radiateurs C : Métal et Peinture	 
HM9/RDC - 25-Bureau	Radiateur elec B : Métal Sol : béton Mur A, B, D : Briques,enduit ciment et Peinture Mur C : BA13 et Peinture Faux Plafond 60x60 : Fibreux compact laine de verre Cadre de porte A : Bois et Peinture Porte D : Bois	  

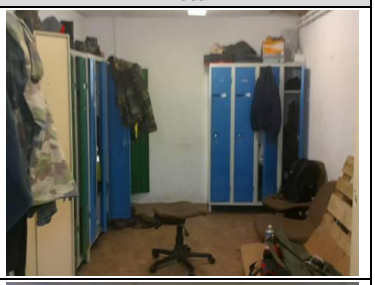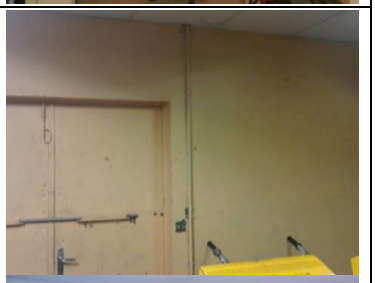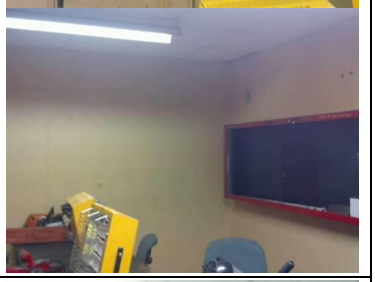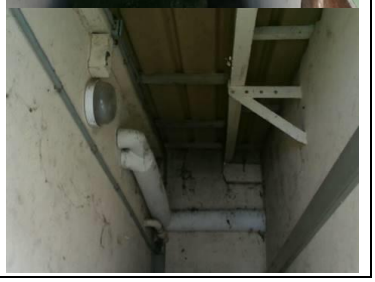
Localisation	Description	Photo
HM9/RDC - 23-Vestiaire	Sol : béton et Synthétique non collée Mur A, B, C, D : Enduit ciment et Peinture Faux Plafond 60x60 : Fibreux compact laine de verre Grilles D : Métal et peinture Fenêtre D : Bois et peinture Porte A : Bois et Peinture Radiateur D : Métal	
HM9/RDC - 27-Magasin	Sol : béton Mur A, B, C, D : Enduit ciment et Peinture Faux Plafond 60x60 : Fibreux compact laine de verre Porte B : Bois et Peinture	 
HM9/RDC - 26-Magasin pièces détachées	Radiateur C : Métal Sol : béton Mur B, C, D, E : Enduit ciment et Peinture Mur A : BA13 et Peinture Faux Plafond 60x60 : Fibreux compact laine de verre Fenêtre C : Bois et peinture Grille C : Métal et peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 C : Métal et Peinture Cadre Porte 3 E : Métal et Peinture	
HM9/RDC - 20'-Rangement	Sol : béton Mur A, B, C, D : Enduit ciment et Peinture Plafond : Bac acier vermiculite Porte A : bois et peinture Calorifugeages B : Bande de plâtre et Peinture	 

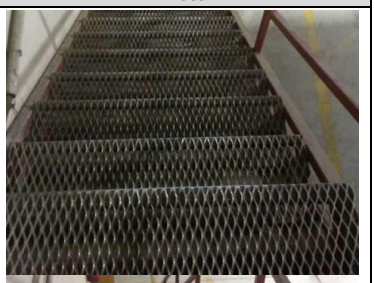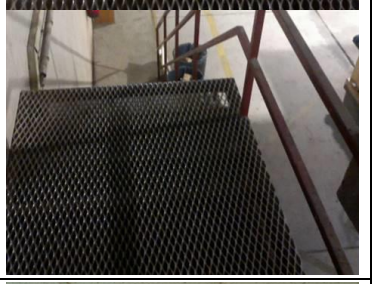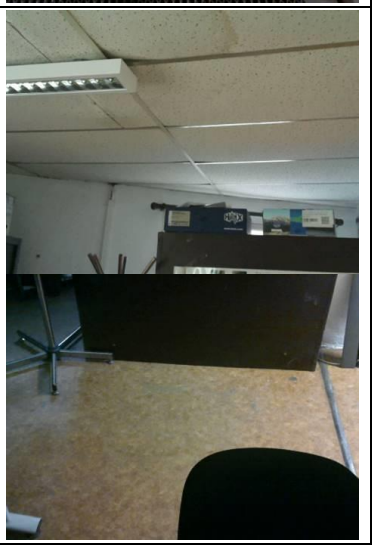Localisation	Description	Photo
HM9/1er étage - 28-ESC/Palier	Balustrade : Métal et peinture Main courante B : Métal et peinture Escalier et coursive : Métal	 
HM9/1er étage - 29-Secrétariat	Mur A, B, C, D : Brique enduit ciments et peinture Plafond 120x60 : Fibreux compact Porte A : bois et peinture Fenêtre 3 A : Bois et peinture Fenêtre 1 B : Métal et peinture Fenêtre 2 C : Bois et peinture Radiateur D : Métal et Peinture	


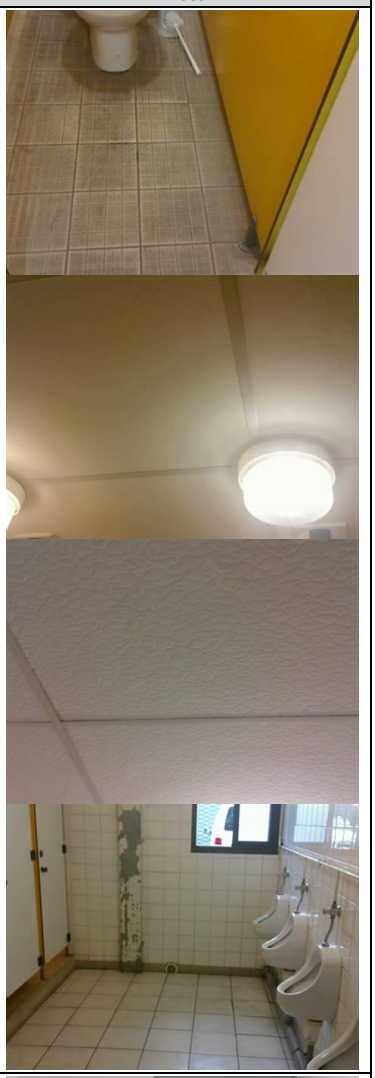
Localisation	Description	Photo
HM9/RDC - 12-WC	Radiateur D : Métal et Peinture Porte A : Bois et Peinture Mur A, B, C, D : Faïences Faux Plafond 120x60 : Compact zèbre Faux Plafond 120x60 : Compact goutte d'eau Plinthes : Carrelages Sol : Béton et Carrelage Fenêtre C : Aluminium Grilles C : Metal et Peinture	
HM9/RDC - 11-Sanitaires	Radiateur C : Métal et Peinture Porte A : Bois et Peinture Mur A, B, C : Faïences Cloison de separation : BA13 Neuf et peintureet faiences Mur D : Faïences Faux Plafond 120x60 : Compact goutte d'eau Plinthes : Carrelages Sol : Béton et Carrelage Fenêtre C : Aluminium Grilles C : Metal et Peinture Évacuation : PVC	


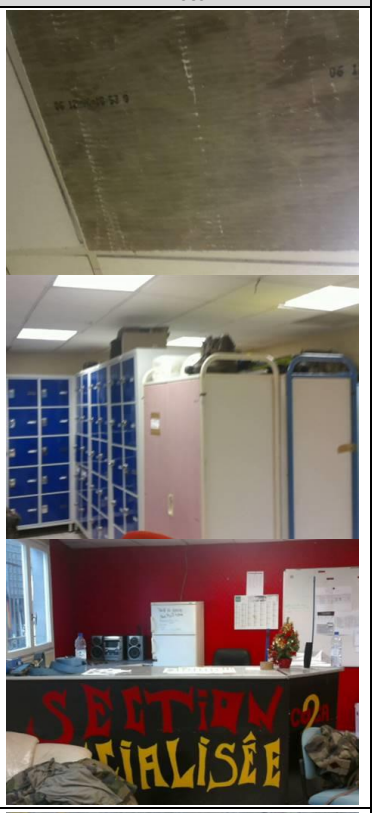
Localisation	Description	Photo
HM9/RDC - 7-Vestiaire	Radiateur elec D - Radiateur elec B - Sol : Béton et Carrelage Plafond 60x60 : Fibreux compact 2006 Mur A : Enduit ciment et Toile de verre peint Mur B, C, D : BA13 et Toile de verre peint Porte A : bois et Peinture Grilles C : Metal et Peinture Fenêtres C : Bois et Peinture Plinthes : Carrelages	
HM9/Extérieur - 31-Air de lavage	Sol : Béton	

Localisation	Description	Photo
HM9/RDC - 18-Magasin Trans	Sol : Béton et Synthétique non collée Mur A, B, C, D : Briques,enduit ciment et Peinture Plafond : Bois et Peinture Faux Plafond : Marque amstrong Fenêtre 1 A : Bois et Peinture Fenêtre 2 C : Bois et Peinture Grilles A, C : Métal et Peinture Porte A : Bois et Peinture	  
HM9/RDC - 20-Chaufferie	Sol : Béton Mur A, B, C, D : Briques,enduit ciment et peinture Plafond : BA13 et peinture Grilles B : Métal et peinture Fenêtre B : Métal et peinture Porte A : Métal et peinture Chaudière. Fioul : Viessmann 1998	  

Localisation	Description	Photo
HM9/RDC - 4-Rangement	Sol : Béton Mur A : Briques,enduit et peinture Mur B : Briques,enduit Mur C : Bac acier et Peinture Piliers centraux : Acier et peinture Porte A : Bois et Peinture Poteaux D : Acier et Peinture Plafond : Bac acier	  
HM9/RDC - 22-Salle de detente	Sol : béton et Carrelage Plafond : Enduit ciment et Toile de verre peint Mur A : Brique,enduit ciment et Toile de verre Peint Mur coin cuisine A : Faïences Mur B, C, D : Brique,enduit ciment et Toile de verre Peint Plinthes : Carrelage Grilles C : Métal et peinture Fenêtre C : PVC Porte A : bois et peinture Radiateurs B : Métal et Peinture	 

Localisation	Description	Photo
HM9/RDC - 8-Magasin	Sol : Béton Mur A, B, C, D : Enduit ciment et BA13 et Peinture Faux plafond 120x60 : Laine de verre et pack alu Grilles C : Métal et peinture Fenêtres C : Métal et peinture Porte A : Métal	  

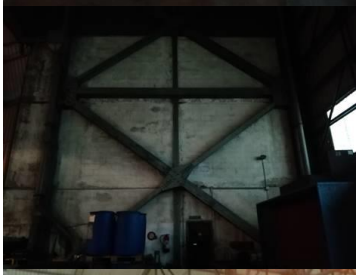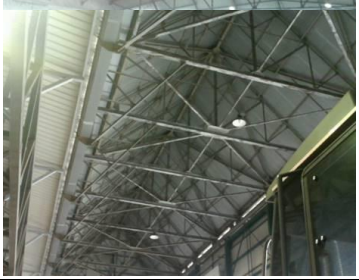Localisation	Description	Photo
HM9/RDC - 1-Atelier	Mur A : Structure et Bac acier et Peinture Mur B, C, D : Structure acier et Peinture Mur B, C, D : Briques,enduit et Peinture Plafond : Bac acier et Peinture Plafond : Bac onduline acier Plafond : Structure acier et Peinture Piliers centraux : Acier et Peinture Sol marquage : Jaune et Peinture Fenêtre 1 B : Métal et Peinture Fenêtre 2 C : Métal et Peinture Fenêtre 3 D : Métal et Peinture Portes electrique A : Métal isolé extrudé Descente EP : PVC Porte 1 B : Métal et Peinture Porte 2 D : Métal et Peinture	      

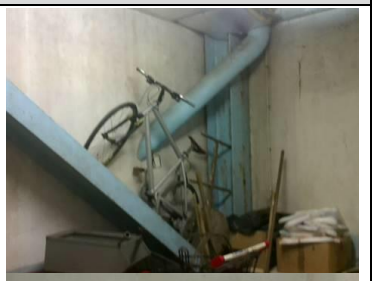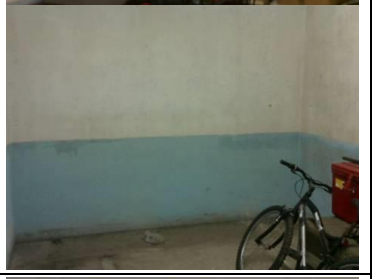Localisation	Description	Photo
HM9/RDC - 2-Réserve	Sol : Béton Mur A, B, C, D : Enduit ciment et Peinture Faux plafond 120x80 : Laine de verre+pack alu Structure plafond : Acier Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 B : Bois et Peinture Pilier D : Acier et Peinture Descente EP D : PVC et Peinture	 
HM9/1er étage - 30-Bureau Chef	Mur A, B, C, D : Brique enduit ciments et peinture Plafond 60x60 : Plaque compact Porte A : bois et peinture Fenêtre C : Bois et peinture Radiateur A : Métal et Peinture	  

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés DTA GRM	Rapport amiante n° 60278-03/396 indice 1daté du 2006
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Oui
Dossier de plans	Oui par ESID de bordeaux
Dossier technique Amiante fait par la Société DEFI	Rapport amiante n° 1981812 daté du 16/07/1998
Analyses Antérieures fait sur les faux plafonds	- réference HM9-01 local magasin ST "Absence d'amiante "
Analyses Antérieures fait sur les faux plafonds	- réference HM9-02 local magasin d'appui "Absence d'amiante "

Observations :
Les analyses des faux plafonds des anciens diagnostics DEFI correspondent aux pièces suivantes:
Local Magasin ST du HM9 -01 correspond à la pièce magasin n°10 d'aujourd'hui voir plan.
Local magasin de l'appui du HM09-02 correspond aux pièces magasin n°8 et vestiaire 7.

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 16/12/2020
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 26,27/01,09/02,08/03/2021
Heure d'arrivée : 10 h 45
Durée du repérage : +/-4J

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision de décembre 2008.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-
Vide sanitaire accessible		X	
Combles ou toiture accessibles et visitables	X		

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.
Remarques :
Cependant des investigations complémentaires ont du être nécessaire afin de répondre à notre devoir d'exhaustivité.

5. – Résultats détaillés du repérage

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation et préconisations	Photo
HM9/RDC - 14-Bureau	Identifiant: M012 Réf. échantillon: P011 Réf. laboratoire: IT072102-19646 Description: Peintures multiples Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Fractionnement	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	trace de peinture **Préconisation :** Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage	
HM9/RDC - 11-Sanitaires	Identifiant: M021 Réf. échantillon: P019 Réf. laboratoire: IT072102-19654 Description: Peintures multiples Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Chape+colle ciment de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	trace de peinture **Préconisation :** Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage	 
HM9/RDC - 13-Bureau	Identifiant: M025-4 Réf. échantillon: P023-4 Réf. laboratoire: IT072103-48384 Description: Peintures multiples Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+chape(1)+plastique+peinture sur chape(2)+ragréages avec trace noire(1)+dalles béton avec trace noire(2) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	traces de peinture sous le carrelage **Préconisation :** Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage	
HM9/RDC - 24-Bureau Chef atelier	Identifiant: M027-5 Réf. échantillon: P025-5 Réf. laboratoire: IT072103-48386 Description: Peinture en faible quantité non séparable matériau compact gris Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+joint+chape+trace de peinture+dalle bêton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Non accessible sans carottage **Préconisation :** Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage	

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Identifiant + Description	Photo
HM9/RDC - 20-Chaufferie	Identifiant: M001 Réf. échantillon: P001 Réf. laboratoire: IT072102-9737 Description: Joint de brûleur Composant de la construction: 9. Installations industrielles - Fours, étuves, tuyauteries… Partie à sonder: Joints Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Localisation sur croquis: M001	
	Identifiant: M002 Réf. échantillon: P002 Réf. laboratoire: IT072102-9738 Description: Plaques isolantes internes Composant de la construction: 8. Equipements divers - Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes….. Partie à sonder: Plaques isolantes internes Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
Parties extérieures couverture du local 11à la chaudière n°20	Identifiant: M003 Réf. échantillon: P003 Réf. laboratoire: IT072102-9739 Description: Vermiculite en sous toiture Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments sous toiture Partie à sonder: Vermiculite en sous toiture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Localisation sur croquis: M003	
HM9/RDC - 13-Bureau; HM9/RDC - 15-Bureau	Identifiant: M004 Réf. échantillon: P004 Réf. laboratoire: IT072102-9740 Description: Panneaux collés ou vissés Composant de la construction: 2. Planchers et plafonds - Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et Coffres Horizontaux Partie à sonder: Panneaux collés ou vissés Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
HM9/1er étage - 29-Secrétariat	Identifiant: M005 Réf. échantillon: P005 Réf. laboratoire: IT072102-9741 Description: Panneaux 60x60 fibreux rigides Composant de la construction: 2. Planchers et plafonds - Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et Coffres Horizontaux Partie à sonder: Panneaux 60x60 fibreux rigides Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
HM9/1er étage - 30-Bureau Chef	Identifiant: M006 Réf. échantillon: P006 Réf. laboratoire: IT072102-9742 Description: Panneaux collés ou vissés Composant de la construction: 2. Planchers et plafonds - Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et Coffres Horizontaux Partie à sonder: Panneaux collés ou vissés Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

HM9/RDC - 19-Magasin	Identifiant: M007 Réf. échantillon: P007 Réf. laboratoire: IT072102-9743 Description: Revêtement souple gris Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol et ragréage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M007 Réf. échantillon: P007 Réf. laboratoire: IT072102-9743 Description: Colle polymère jaune en faible quantité non séparable ragréage gris non séparable matériau compact gris hétérogène non séparable Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol et ragréage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
HM9/RDC - 1-Atelier	Identifiant: M008 Réf. échantillon: P008 Réf. laboratoire: IT072102-9744 Description: Mastic bitumineuses, mousse,polystyrène (Joint de dilatation au sol) Composant de la construction: 5. Revêtements de sol - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) Partie à sonder: Mastic bitumineuses, mousse,polystyrène (Joint de dilatation au sol) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M010 Réf. échantillon: P009 Réf. laboratoire: IT072102-19644 Description: Calorifuge enveloppe (carton+peinture) Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge enveloppe (carton+peinture)…)	
	Identifiant: M011 Réf. échantillon: P010 Réf. laboratoire: IT072102-19645 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
HM9/RDC - 14-Bureau	Identifiant: M012-2 Réf. échantillon: P011-2 Réf. laboratoire: IT072102-19646 Description: Revêtement cassant gris Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M012-3 Réf. échantillon: P011-3 Réf. laboratoire: IT072102-19646 Description: Colle polymère jaune avec couche en papier Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M012-4 Réf. échantillon: P011-4 Réf. laboratoire: IT072102-19646 Description: Carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M012-5 Réf. échantillon: P011-5 Réf. laboratoire: IT072102-19646 Description: Colle grise Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

	Identifiant: M012-6 Réf. échantillon: P011-6 Réf. laboratoire: IT072102-19646 Description: Matériau compact gris hétérogène Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M012-7 Réf. échantillon: P011-7 Réf. laboratoire: IT072102-19646 Description: Joint cassant gris en faible quantité en vrac peintures multiples non séparable Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
HM9/RDC - 14-Bureau; HM9/RDC - 15-Bureau	Identifiant: M013 Réf. échantillon: P012 Réf. laboratoire: IT072102-19647 Description: Carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle ciment+ peinture + plinthes carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M013 Réf. échantillon: P012-2 Réf. laboratoire: IT072102-19647 Description: Colle beige peinture non séparable Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle ciment+ peinture + plinthes carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M013 Réf. échantillon: P012-3 Réf. laboratoire: IT072102-19647 Description: Matériau compact gris Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle ciment+ peinture + plinthes carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M013 Réf. échantillon: P012-4 Réf. laboratoire: IT072102-19647 Description: Joint cassant gris Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle ciment+ peinture + plinthes carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M013 Réf. échantillon: P012-5 Réf. laboratoire: IT072102-19647 Description: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle ciment+ peinture + plinthes carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
HM9/RDC - 13-Bureau; HM9/RDC - 15-Bureau	Identifiant: M014 Réf. échantillon: P013 Réf. laboratoire: IT072102-19648 Description: Carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle blanche+ joint gris+ plinthes carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M014 Réf. échantillon: P013-2 Réf. laboratoire: IT072102-19648 Description: Colle beige Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle blanche+ joint gris+ plinthes carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M014 Réf. échantillon: P013-3 Réf. laboratoire: IT072102-19648 Description: Peintures multiples non séparable joint cassant gris Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle blanche+ joint gris+ plinthes carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
HM9/RDC - 1-Atelier	Identifiant: M015 Réf. échantillon: P014 Réf. laboratoire: IT072102-19649 Description: Peinture beige,trace noire sur raidisseur acier+peinture blanche Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Peinture beige,trace noire sur raidisseur acier+peinture blanc Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

HM9/RDC - 12-WC	Identifiant: M016 Réf. échantillon: P015 Réf. laboratoire: IT072102-19650 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques rigide zébré Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
HM9/RDC - 11-Sanitaires; HM9/RDC - 12-WC	Identifiant: M018 Réf. échantillon: P016 Réf. laboratoire: IT072102-19651 Description: Colle beige Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle beige+joint gris+divers peintures de plinthes carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M018 Réf. échantillon: P016-2 Réf. laboratoire: IT072102-19651 Description: Peintures multiples Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle beige+joint gris+divers peintures de plinthes carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M018 Réf. échantillon: P016-3 Réf. laboratoire: IT072102-19651 Description: Joint cassant gris Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle beige+joint gris+divers peintures de plinthes carrelages Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
HM9/RDC - 12-WC; HM9/RDC - 22-Salle de detente	Identifiant: M019 Réf. échantillon: P017 Réf. laboratoire: IT072102-19652 Description: Carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle beige de faïence blanche15x15 + divers peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M019 Réf. échantillon: P017-2 Réf. laboratoire: IT072102-19652 Description: Colle beige peintures multiples non séparable Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle beige de faïence blanche15x15 + divers peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M019 Réf. échantillon: P017-3 Réf. laboratoire: IT072102-19652 Description: Joint cassant beige Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle beige de faïence blanche15x15 + divers peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
HM9/RDC - 12-WC	Identifiant: M020 Réf. échantillon: P018 Réf. laboratoire: IT072102-19653 Description: Carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage +joint souple gris Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M020 Réf. échantillon: P018-2 Réf. laboratoire: IT072102-19653 Description: Colle grise Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage +joint souple gris Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M020 Réf. échantillon: P018-3 Réf. laboratoire: IT072102-19653 Description: Matériau compact gris hétérogène Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage +joint souple gris Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M020 Réf. échantillon: P018-4 Réf. laboratoire: IT072102-19653 Description: Matériau souple gris avec poussières Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage +joint souple gris Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

HM9/RDC - 11-Sanitaires	Identifiant: M021-2 Réf. échantillon: P019-2 Réf. laboratoire: IT072102-19654 Description: Carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Chape+colle ciment de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M021-3 Réf. échantillon: P019-3 Réf. laboratoire: IT072102-19654 Description: Colle grise hétérogène Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Chape+colle ciment de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
HM9/RDC - 11-Sanitaires; HM9/RDC - 12-WC	Identifiant: M022 Réf. échantillon: P020 Réf. laboratoire: IT072102-19655 Description: Panneaux et plaques rigide aspect gouttelette 120x60 Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques rigide aspect gouttelette 120x60 Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
HM9/RDC - 12-WC	Identifiant: M023 Réf. échantillon: P021 Réf. laboratoire: IT072103-48382 Description: Carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Chape+colle ciment de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	
	Identifiant: M023 Réf. échantillon: P021 Réf. laboratoire: IT072103-48382 Description: Colle grise Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Chape+colle ciment de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	
	Identifiant: M023 Réf. échantillon: P021 Réf. laboratoire: IT072103-48382 Description: Matériau compact gris hétérogène Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Chape+colle ciment de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	
	Identifiant: M023 Réf. échantillon: P021 Réf. laboratoire: IT072103-48382 Description: Peinture Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Chape+colle ciment de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	
HM9/RDC - 15-Bureau	Identifiant: M024 Echantillon: P022, réf. labo.: IT072103-48383 Description: Carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Carrelage+colle+chape+ réagreage sur dallle béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	

	Identifiant: M024 Echantillon: P022-2, réf. labo.: IT072103-48383 Description: Colle grise Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Carrelage+colle+chape+ réagreage sur dallle béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	
	Identifiant: M024 Echantillon: P022-3, réf. labo.: IT072103-48383 Description: Matériau compact gris hétérogène Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Carrelage+colle+chape+ réagreage sur dallle béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	
	Identifiant: M024 Echantillon: P022-4, réf. labo.: IT072103-48383 Description: Ragréage gris Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Carrelage+colle+chape+ réagreage sur dallle béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	
HM9/RDC - 13-Bureau	Identifiant: M025 echantillon: P023 Description: Carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+chape(1)+plastique+peinture sur chape(2)+ragréages avec trace noire(1)+dalles béton avec trace noire(2) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	
	Identifiant: M025 echantillon: P023-2 Description: Colle grise Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+chape(1)+plastique+peinture sur chape(2)+ragréages avec trace noire(1)+dalles béton avec trace noire(2) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	
	Identifiant: M025 echantillon: P023-4 Description: Matériau compact gris hétérogène Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+chape(1)+plastique+peinture sur chape(2)+ragréages avec trace noire(1)+dalles béton avec trace noire(2) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	
	Identifiant: M025 echantillon: P023-5 Description: Ragréage gris Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+chape(1)+plastique+peinture sur chape(2)+ragréages avec trace noire(1)+dalles béton avec trace noire(2) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	
	Identifiant: M025 echantillon: P023-6 Description: Matériau bitumineux noir couche jaune avec poussières non séparable Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+chape(1)+plastique+peinture sur chape(2)+ragréages avec trace noire(1)+dalles béton avec trace noire(2) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	
HM9/RDC - 22-Salle de detente	Identifiant: M026 Réf. échantillon: P024 Réf. laboratoire: IT072103-48385 Description: Carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+joint+chape+dalle béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M026 Réf. échantillon: P024-2 Réf. laboratoire: IT072103-48385 Description: Colle grise Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+joint+chape+dalle béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M026 Réf. échantillon: P024-3 Réf. laboratoire: IT072103-48385 Description: Matériau compact gris hétérogène Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+joint+chape+dalle béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

HM9/RDC - 22-Salle de detente	Identifiant: M026 Réf. échantillon: P024-4 Réf. laboratoire: IT072103-48385 Description: Joint cassant gris Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+joint+chape+dalle béton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
HM9/RDC - 24-Bureau Chef atelier	Identifiant: M027 Réf. échantillon: P025 Réf. laboratoire: IT072103-48386 Description: Carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+joint+chape+trace de peinture+dalle bêton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	
	Identifiant: M027 Réf. échantillon: P025-2 Réf. laboratoire: IT072103-48386 Description: Colle grise Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+joint+chape+trace de peinture+dalle bêton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	
	Identifiant: M027 Réf. échantillon: P025-3 Réf. laboratoire: IT072103-48386 Description: Matériau compact gris hétérogène Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+joint+chape+trace de peinture+dalle bêton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	
	Identifiant: M027 Réf. échantillon: P025-4 Réf. laboratoire: IT072103-48386 Description: Joint cassant gris Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+joint+chape+trace de peinture+dalle bêton Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	
HM9/RDC - 7-Vestiaire	Identifiant: M028 Réf. échantillon: P026 Réf. laboratoire: IT072103-48387 Description: Carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+chape Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	
	Identifiant: M028 Réf. échantillon: P026-2 Réf. laboratoire: IT072103-48387 Description: Colle beige Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+chape Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	
	Identifiant: M028 Réf. échantillon: P026-3 Réf. laboratoire: IT072103-48387 Description: Matériau compact gris hétérogène Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage+chape Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	
HM9/RDC - 6-Bureau	Identifiant: M029 Réf. échantillon: P027 Réf. laboratoire: IT072103-48388 Description: Carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Chape+colle de carrelage+ joint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M029 Réf. échantillon: P027-2 Réf. laboratoire: IT072103-48388 Description: Colle grise Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Chape+colle de carrelage+ joint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: M029 Réf. échantillon: P027-3 Réf. laboratoire: IT072103-48388 Description: Matériau compact gris hétérogène Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Chape+colle de carrelage+ joint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

	Identifiant: M029 Réf. échantillon: P027-4 Réf. laboratoire: IT072103-48388 Description: Joint cassant gris Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Chape+colle de carrelage+ joint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
HM9/RDC - 5-Bureau	Identifiant: M030 Réf. échantillon: P028 Réf. laboratoire: IT072103-48389 Description: Peinture Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Peinture de sol+chape Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	
	Identifiant: M030 Réf. échantillon: P028-2 Réf. laboratoire: IT072103-48389 Description: Matériau compact gris hétérogène Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Peinture de sol+chape Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	
HM9/RDC - 11-Sanitaires	Identifiant: Sondage S1 Réf. échantillon: P019-S1 Réf. laboratoire: IT072103-48381 Description: Carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Chape+colle ciment de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	
	Identifiant: Sondage S1 Réf. échantillon: P019-S1-2 Réf. laboratoire: IT072103-48381 Description: Colle grise Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Chape+colle ciment de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	
	Identifiant: Sondage S1 Réf. échantillon: P019-S1-3 Réf. laboratoire: IT072103-48381 Description: Matériau compact gris hétérogène Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Chape+colle ciment de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Sondage: Carottage	

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif

Localisation	Identifiant + Description	Photo
HM9/RDC - 1-Atelier	Identifiant: IBA/2101/0584-HM9/M009 Description: Couvre-joints cahoutchouc de fixation bac acier Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments associés à la toiture Partie à sonder: Couvre-joints cahoutchouc de fixation bac acier Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Justificatif: Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante	
HM9/RDC - 11-Sanitaires; HM9/RDC - 12-WC	Identifiant: IBA/2101/0584-HM9/M017 Description: Isolant laine de verre posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Justificatif: Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
HM9/RDC - 9-Magasin; HM9/RDC - 10-Magasin	Identifiant: IBA/2101/0584-HM9/M031 Description: Panneaux et plaques 120x80 Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques 120x80 Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Justificatif: Sur anciennes analyses DEFI 1981812 du 16/07/1998 intégré dans le rapport GRM 60278-03/396 indice 1 du 3/06/2006	
HM9/RDC - 2-Réserve; HM9/RDC - 3-Réserves; HM9/RDC - 5-Bureau; HM9/RDC - 6-Bureau; HM9/RDC - 8-Magasin	Identifiant: IBA/2101/0584-HM9/M032 Description: Panneaux et plaques 120x80 Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques 120x80 Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Justificatif: Sur anciennes analyses DEFI 1981813 du 16/07/1998 dont l'information est intégré dans le rapport GRM 60278-03/396 indice 1 du 3/06/2006	
HM9/RDC - 11-Sanitaires; HM9/RDC - 12-WC; HM9/RDC - 13-Bureau; HM9/RDC - 14-Bureau; HM9/RDC - 15-Bureau; HM9/RDC - 21-Vestiaire; HM9/RDC - 22-Salle de detente; HM9/RDC - 23-Vestiaire; HM9/RDC - 24-Bureau Chef atelier; HM9/RDC - 25-Bureau; HM9/RDC - 26-Magasin pièces détachées; HM9/RDC - 27-Magasin; HM9/1er étage - 29-Secrétariat; HM9/1er étage - 30-Bureau Chef	Identifiant: IBA/2101/0584-HM9/M033 Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Justificatif: Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante	
HM9/RDC - 14-Bureau; HM9/RDC - 18-Magasin Trans; HM9/RDC - 23-Vestiaire; HM9/RDC - 24-Bureau Chef atelier; HM9/RDC - 25-Bureau; HM9/RDC - 26-Magasin pièces détachées; HM9/RDC - 27-Magasin	Identifiant: IBA/2101/0584-HM9/ZPSO-001 Description: Panneaux collés ou vissés panneau 60x60 **Amstrong sans amiante sur déclaration du fabricant** Composant de la construction: 2. Planchers et plafonds - Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et Coffres Horizontaux Partie à sonder: Panneaux collés ou vissés Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Justificatif: Sur marquage du matériau	

6. – Signatures

*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **LCC QUALIXPERT** 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)*

Fait à **Saint Jean d'Illac**, le **07/06/2021**

Signature du représentant :

Par : RABEAU VIRGINIE

Virginie RABEAU

Signature numérique de Virginie RABEAU
Date : 2021.06.08 15:11:48 +02'00'

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° IBA/2101/0584-HM9

Informations

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Recommandations générales de sécurité

7.4 Documents annexés au présent rapport

7.1 - Annexe - Schéma de repérage

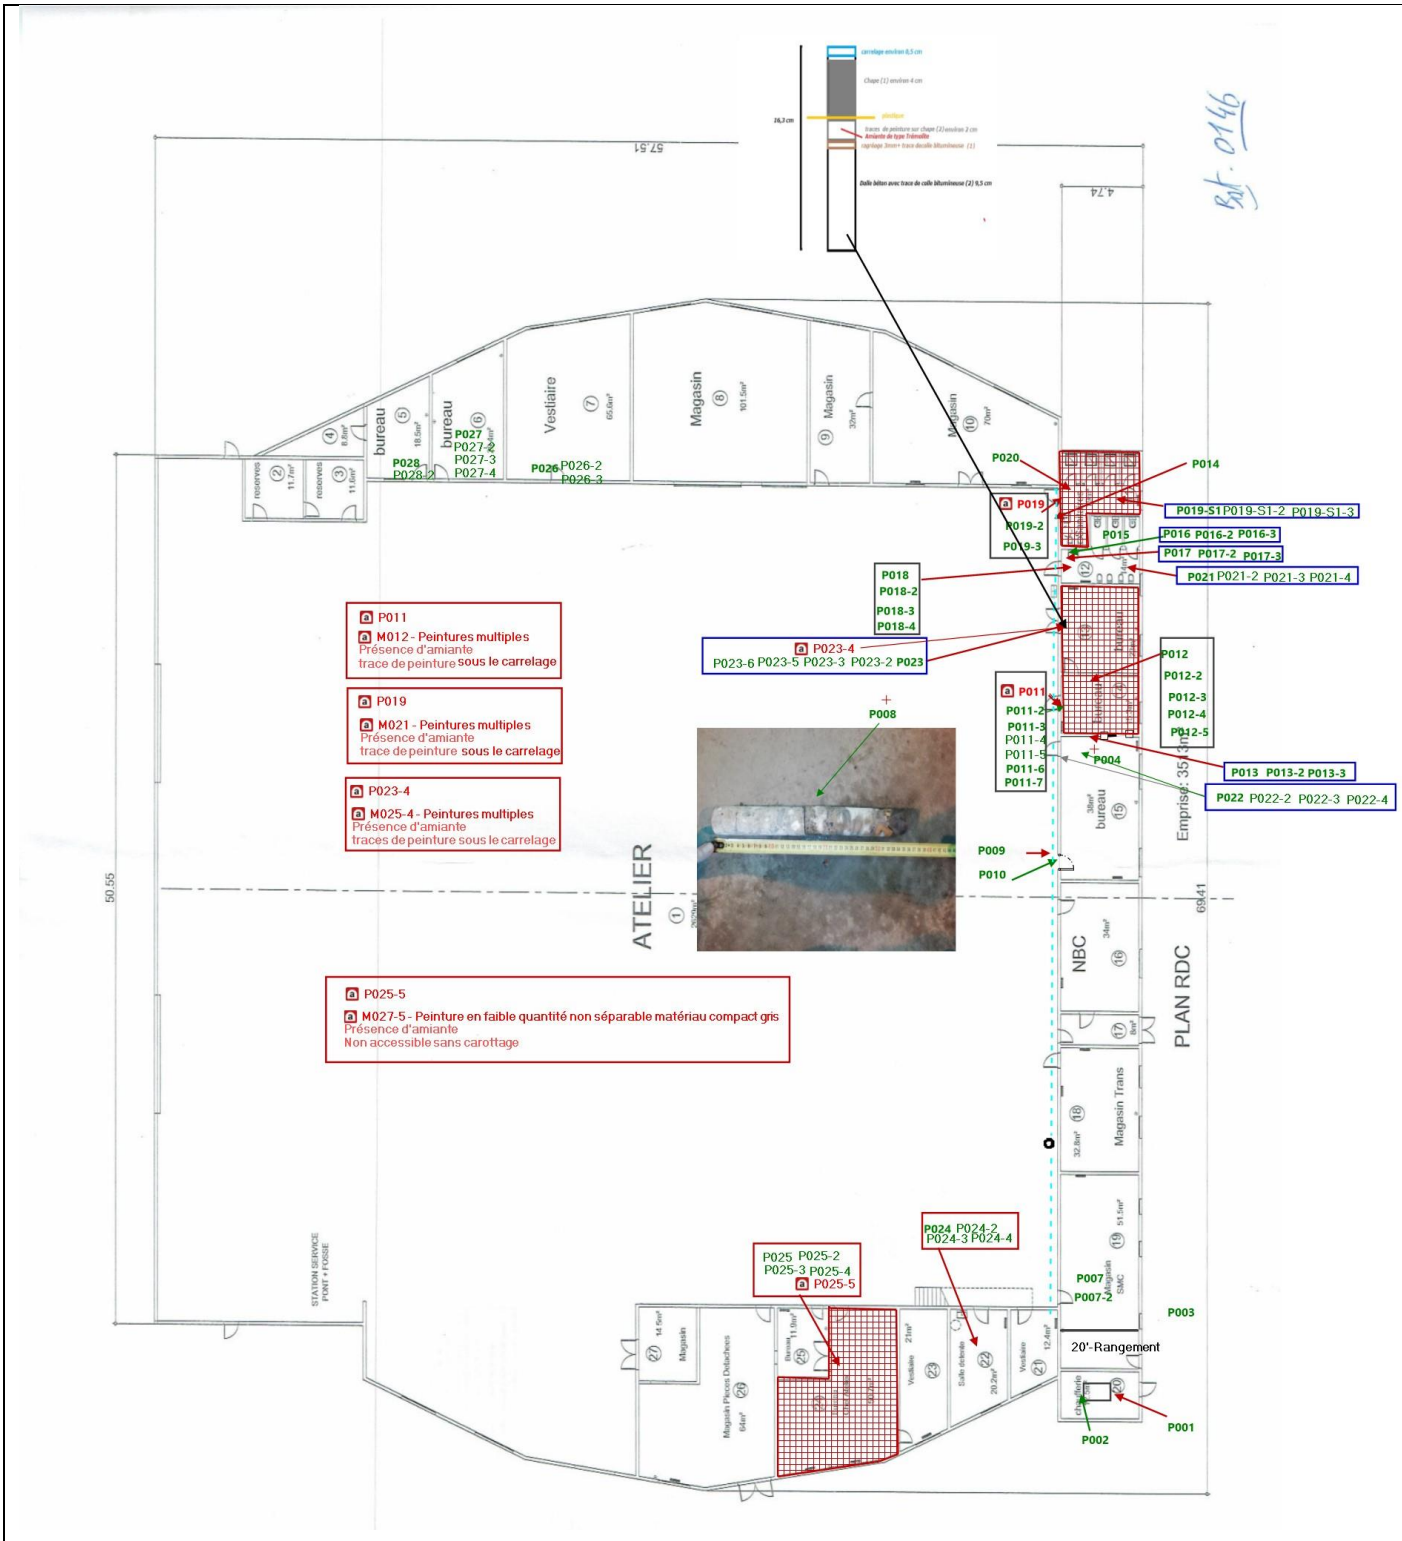


Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : IBA (Inspection Bâtiment Atlantique), auteur : RABEAU VIRGINIE
Dossier n° IBA/2101/0584-HM9 du 26,27/01,09/02,08/03/2021
Adresse du bien : BASE AERIENNE 118 (BA118)
Avenue du Colonnel Rozanoff
Projet COGA (Non communiqué) 40000 MONT-DE-MARSAN

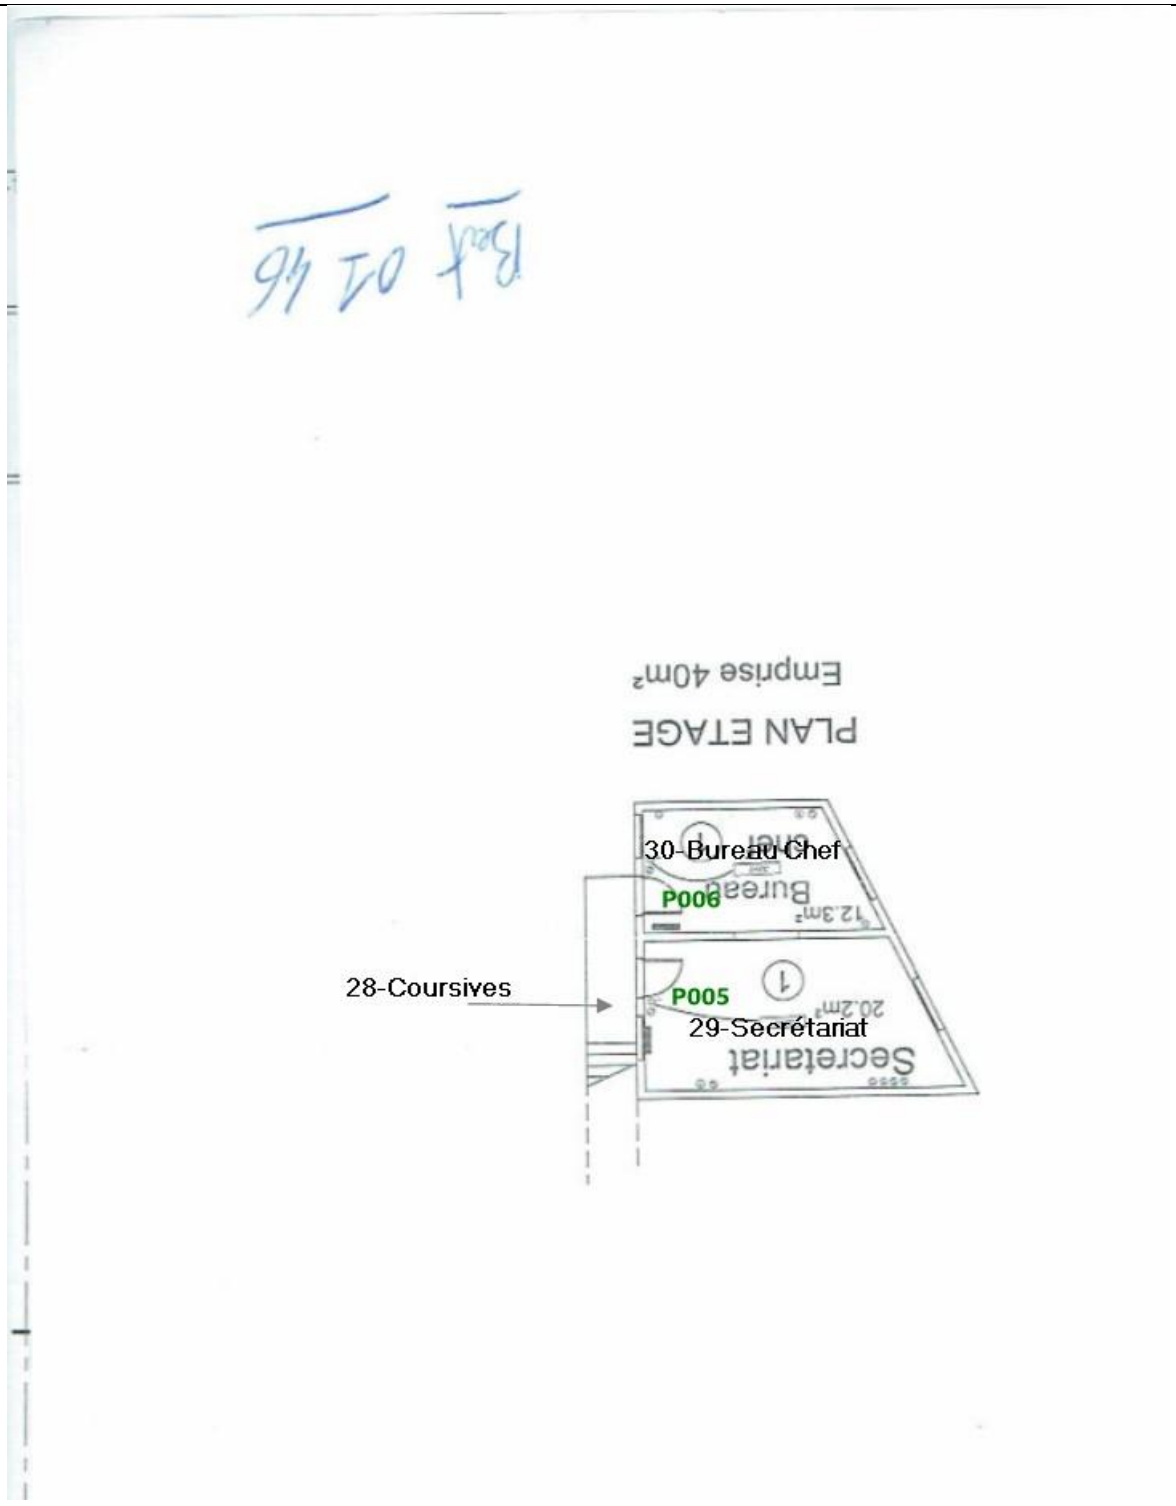


Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : IBA (Inspection Bâtiment Atlantique), auteur : RABEAU VIRGINIE
Dossier n° IBA/2101/0584-HM9 du 26,27/01,09/02,08/03/2021
Adresse du bien : BASE AERIENNE 118 (BA118)
Avenue du Colonnel Rozanoff
Projet COGA (Non communiqué) 40000 MONT-DE-MARSAN

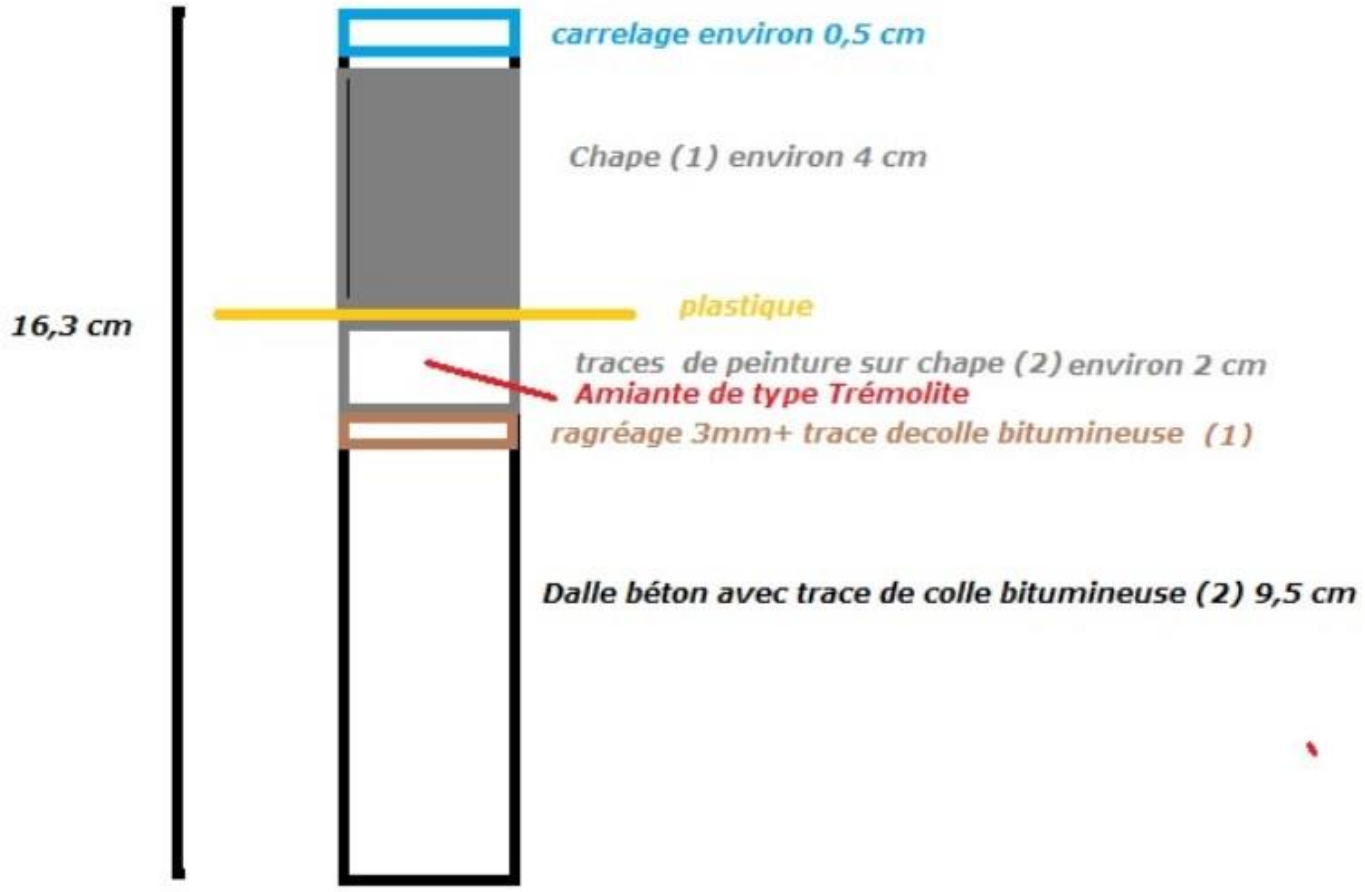


Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : IBA (Inspection Bâtiment Atlantique), auteur : RABEAU VIRGINIE
Dossier n° IBA/2101/0584-HM9 du 26,27/01,09/02,08/03/2021
Adresse du bien : BASE AERIENNE 118 (BA118)
Avenue du Colonnel Rozanoff
Projet COGA (Non communiqué) 40000 MONT-DE-MARSAN

Légende

	Conduit en fibro-ciment		Dalles de sol
	Conduit autre que fibro-ciment		Carrelage
	Brides		Colle Amiante Uniquement
	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante		Dalles de faux-plafond
	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste		Toiture en fibro-ciment
	Présence d'amiante		Toiture en matériaux composites
NV ou NC	Non visité	ZS	zone de similitude d'ouvrage et /ou matériau
N ou NA	Matériau non amianté	N° de prélèvement sur plan	

Nom du propriétaire **:**
Ministère de la défense
Adresse du bien :
BASE AERIENNE 118 (BA118)
Avenue du Colonnel Rozanoff
Projet COGA
40000
MONT-DE-MARSAN

Photos «divers»

	Photo n° PhA001 Localisation : HM9/RDC - 14-Bureau; HM9/RDC - 18-Magasin Trans; HM9/RDC - 23-Vestiaire; HM9/RDC - 24-Bureau Chef atelier; HM9/RDC - 25-Bureau; HM9/RDC - 26-Magasin pièces détachées; HM9/RDC - 27-Magasin Ouvrage : 2. Planchers et plafonds - Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et Coffres Horizontaux Partie d'ouvrage : Panneaux collés ou vissés Description : Panneaux collés ou visséspanneau 60x60 Amstrong sans amiante sur déclaration du fabricant
	Photo n° PhA002 Localisation : HM9/RDC - 20-Chaufferie Ouvrage : 9. Installations industrielles - Fours, étuves, tuyauteries… Partie d'ouvrage : Joints Description : Joint de brûleur Localisation sur croquis : M001
	Photo n° PhA003 Localisation : Parties extérieures couverture du local 11à la chaudière n°20 Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments sous toiture Partie d'ouvrage : Vermiculite en sous toiture Description : Vermiculite en sous toiture Localisation sur croquis : M003
	Photo n° PhA001 Localisation : HM9/RDC - 14-Bureau; HM9/RDC - 18-Magasin Trans; HM9/RDC - 23-Vestiaire; HM9/RDC - 24-Bureau Chef atelier; HM9/RDC - 25-Bureau; HM9/RDC - 26-Magasin pièces détachées; HM9/RDC - 27-Magasin Ouvrage : 2. Planchers et plafonds - Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et Coffres Horizontaux Partie d'ouvrage : Panneaux collés ou vissés Description : Panneaux collés ou visséspanneau 60x60 Amstrong sans amiante sur déclaration du fabricant
	Photo n° PhA004 Localisation : HM9/RDC - 11-Sanitaires; HM9/RDC - 12-WC Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie d'ouvrage : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Description : Isolant laine de verre posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond

	Photo n° PhA005 Localisation : HM9/RDC - 1-Atelier Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments associés à la toiture Partie d'ouvrage : Couvre-joints cahoutchouc de fixation bac acier Description : Couvre-joints cahoutchouc de fixation bac acier
	Photo n° PhA006 Localisation : HM9/RDC - 12-WC Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Chape+colle ciment de carrelage Description : Carrelage
	Photo n° PhA007 Localisation : HM9/RDC - 11-Sanitaires; HM9/RDC - 12-WC; HM9/RDC - 13-Bureau; HM9/RDC - 14-Bureau; HM9/RDC - 15-Bureau; HM9/RDC - 21-Vestiaire; HM9/RDC - 22-Salle de detente; HM9/RDC - 23-Vestiaire; HM9/RDC - 24-Bureau Chef atelier; HM9/RDC - 25-Bureau; HM9/RDC - 26-Magasin pièces détachées; HM9/RDC - 27-Magasin; HM9/1er étage - 29-Secrétariat; HM9/1er étage - 30-Bureau Chef Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie d'ouvrage : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Description : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélèvements :

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M001-P001	HM9/RDC - 20-Chaufferie	9. Installations industrielles - Fours, étuves, tuyauteries…	Joints	Joint de brûleur **Commentaires prélèvement:** 26/01/2021Joint de brûleur **Réf. laboratoire:** IT072102-9737 **Commentaires Laboratoire:** Matériau fibreux beige:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M002-P002	HM9/RDC - 20-Chaufferie	8. Equipements divers - Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes…..	Plaques isolantes internes	Plaques isolantes internes **Commentaires prélèvement:** Plaques isolantes internes chaudière. 1998 27/01/2021 **Réf. laboratoire:** IT072102-9738 **Commentaires Laboratoire:** Matériau fibreux blanc avec poussières:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M003-P003	Parties extérieures couverture du local 11à la chaudière n°20	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments sous toiture	Vermiculite en sous toiture	Vermiculite en sous toiture **Commentaires prélèvement:** 26/01/2021Vermiculite en sous toiture **Réf. laboratoire:** IT072102-9739 **Commentaires Laboratoire:** Matériau brillant beige en vrac:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M004-P004	HM9/RDC - 15-Bureau	2. Planchers et plafonds - Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et Coffres Horizontaux	Panneaux collés ou vissés	Panneaux collés ou vissés **Commentaires prélèvement:** Panneaux 60x60 type fibre de bois et verre compact 27/01/2021 **Réf. laboratoire:** IT072102-9740 **Commentaires Laboratoire:** Matériau granuleux et brillant beige + peinture non séparable:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M005-P005	HM9/1er étage - 29-Secrétariat	2. Planchers et plafonds - Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et Coffres Horizontaux	Panneaux 60x60 fibreux rigides	Panneaux 60x60 fibreux rigides **Commentaires prélèvement:** Panneaux 60x60 fibreux rigides 27/01/2021 **Réf. laboratoire:** IT072102-9741 **Commentaires Laboratoire:** Enduit blanc non séparable + matériau fibreux avec paillettes avec poussières:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M006-P006	HM9/1er étage - 30-Bureau Chef	2. Planchers et plafonds - Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et Coffres Horizontaux	Panneaux collés ou vissés	Panneaux collés ou vissés **Commentaires prélèvement:** Panneaux fibreux 120x60 27/01/2021 **Réf. laboratoire:** IT072102-9742 **Commentaires Laboratoire:** Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M007-P007	HM9/RDC - 19-Magasin	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol et ragréage	Revêtement souple gris **Commentaires prélèvement:** Dalle de sol et ragréage 27/01/2021 Envoyé au labo en tant que : Dalle de sol et ragréage **Réf. laboratoire:** IT072102-9743 **Commentaires Laboratoire:** Revêtement souple gris:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M007-2-P007-2	HM9/RDC - 19-Magasin	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol et ragréage	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable ragréage gris non séparable matériau compact gris hétérogène non séparable **Commentaires prélèvement:** Dalle de sol et ragréage 27/01/2021 Envoyé au labo en tant que : Dalle de sol et ragréage **Réf. laboratoire:** IT072102-9743 **Commentaires Laboratoire:** Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M008-P008	HM9/RDC - 1-Atelier	5. Revêtements de sol - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Mastic bitumineuses, mousse,polystyrène (Joint de dilatation au sol)	Mastic bitumineuses, mousse,polystyrène (Joint de dilatation au sol) **Commentaires prélèvement:** 27/01/2021-Mastic bitumineuses, mousse,polystyrène (Joint de dilatation au sol) **Réf. laboratoire:** IT072102-9744 **Commentaires Laboratoire:** Mousse grise non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + matériau mou noir non séparable + polystyrène expansé (billes) blanc non séparable:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M010-P009	HM9/RDC - 1-Atelier	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge enveloppe (carton+peinture)…	Calorifuge enveloppe (carton+peinture) **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Calorifuge enveloppe (carton+peinture) **Réf. laboratoire:** IT072102-19644 **Commentaires Laboratoire:** Peinture non séparable + carton bitumé avec poussières:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M011-P010	HM9/RDC - 1-Atelier	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Joint de masticrigide de vitrage (notamment châssis aluminium) **Réf. laboratoire:** IT072102-19645 **Commentaires Laboratoire:** Peinture non séparable + matériau compact beige:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M012-P011	HM9/RDC - 14-Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages	Peintures multiples **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages Envoyé au labo en tant que : Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages **Réf. laboratoire:** IT072102-19646 **Commentaires Laboratoire:** Peintures multiples:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M012-2-P011-2	HM9/RDC - 14-Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages	Revêtement cassant gris **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages Envoyé au labo en tant que : Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages **Réf. laboratoire:** IT072102-19646 **Commentaires Laboratoire:** Revêtement cassant gris:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P011
M012-3-P011-3	HM9/RDC - 14-Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages	Colle polymère jaune avec couche en papier **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages Envoyé au labo en tant que : Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages **Réf. laboratoire:** IT072102-19646 **Commentaires Laboratoire:** Colle polymère jaune avec couche en papier:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P011

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M012-4-P011-4	HM9/RDC - 14-Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages	Carrelage **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages Envoyé au labo en tant que : Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages **Réf. laboratoire:** IT072102-19646 **Commentaires Laboratoire:** Carrelage:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P011
M012-5-P011-5	HM9/RDC - 14-Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages	Colle grise **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages Envoyé au labo en tant que : Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages **Réf. laboratoire:** IT072102-19646 **Commentaires Laboratoire:** Colle grise:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P011
M012-6-P011-6	HM9/RDC - 14-Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages	Matériau compact gris hétérogène **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages Envoyé au labo en tant que : Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages **Réf. laboratoire:** IT072102-19646 **Commentaires Laboratoire:** Matériau compact gris hétérogène:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P011
M012-7-P011-7	HM9/RDC - 14-Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages	Joint cassant gris en faible quantité en vrac peintures multiples non séparable **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages Envoyé au labo en tant que : Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages **Réf. laboratoire:** IT072102-19646 **Commentaires Laboratoire:** Joint cassant gris en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P011
M013-P012	HM9/RDC - 14-Bureau	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle ciment+ peinture + plinthes carrelages	Carrelage **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Colle ciment+ peinture + plinthes carrelages Envoyé au labo en tant que : Colle ciment+ peinture + plinthes carrelages **Réf. laboratoire:** IT072102-19647 **Commentaires Laboratoire:** Carrelage:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M013-2-P012-2	HM9/RDC - 14-Bureau	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle ciment+ peinture + plinthes carrelages	Colle beige peinture non séparable **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Colle ciment+ peinture + plinthes carrelages Envoyé au labo en tant que : Colle ciment+ peinture + plinthes carrelages **Réf. laboratoire:** IT072102-19647 **Commentaires Laboratoire:** Colle beige + peinture non séparable:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P012

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M013-3-P012-3	HM9/RDC - 14-Bureau	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle ciment+ peinture + plinthes carrelages	Matériau compact gris **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Colle ciment+ peinture + plinthes carrelages Envoyé au labo en tant que : Colle ciment+ peinture + plinthes carrelages **Réf. laboratoire:** IT072102-19647 **Commentaires Laboratoire:** Matériau compact gris:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P012
M013-4-P012-4	HM9/RDC - 14-Bureau	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle ciment+ peinture + plinthes carrelages	Joint cassant gris **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Colle ciment+ peinture + plinthes carrelages Envoyé au labo en tant que : Colle ciment+ peinture + plinthes carrelages **Réf. laboratoire:** IT072102-19647 **Commentaires Laboratoire:** Joint cassant gris:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P012
M013-5-P012-5	HM9/RDC - 14-Bureau	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle ciment+ peinture + plinthes carrelages	Peinture **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Colle ciment+ peinture + plinthes carrelages Envoyé au labo en tant que : Colle ciment+ peinture + plinthes carrelages **Réf. laboratoire:** IT072102-19647 **Commentaires Laboratoire:** Peinture:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P012
M014-P013	HM9/RDC - 15-Bureau	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle blanche+ joint gris+ plinthes carrelages	Carrelage **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Colle blanche+ joint gris+ plinthes carrelages Envoyé au labo en tant que : Colle blanche+ joint gris+ plinthes carrelages **Réf. laboratoire:** IT072102-19648 **Commentaires Laboratoire:** Carrelage:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M014-2-P013-2	HM9/RDC - 15-Bureau	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle blanche+ joint gris+ plinthes carrelages	Colle beige **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Colle blanche+ joint gris+ plinthes carrelages Envoyé au labo en tant que : Colle blanche+ joint gris+ plinthes carrelages **Réf. laboratoire:** IT072102-19648 **Commentaires Laboratoire:** Colle beige:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P013
M014-3-P013-3	HM9/RDC - 15-Bureau	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle blanche+ joint gris+ plinthes carrelages	Peintures multiples non séparable joint cassant gris **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Colle blanche+ joint gris+ plinthes carrelages Envoyé au labo en tant que : Colle blanche+ joint gris+ plinthes carrelages **Réf. laboratoire:** IT072102-19648 **Commentaires Laboratoire:** Peintures multiples non séparable + joint cassant gris:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P013

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M015-P014	HM9/RDC - 1-Atelier	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture beige,trace noire sur raidisseur acier+peinture blanc	Peinture beige,trace noire sur raidisseur acier+peinture blanche **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Peinture beige,trace noire sur raidisseur acier+peinture blanche **Réf. laboratoire:** IT072102-19649 **Commentaires Laboratoire:** Peintures multiples en vrac + couche noire non séparable:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M016-P015	HM9/RDC - 12-WC	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques rigide zébré	Panneaux et plaques **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021- Panneaux et plaques rigide zébré **Réf. laboratoire:** IT072102-19650 **Commentaires Laboratoire:** Enduit blanc non séparable + matériau fibreux avec paillettes:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	 
M018-P016	HM9/RDC - 12-WC	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle beige+joint gris+divers peintures de plinthes carrelages	Colle beige **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Colle beige+joint gris+divers peintures de plinthes carrelages Envoyé au labo en tant que : Colle beige+joint gris+divers peintures de plinthes carrelages **Réf. laboratoire:** IT072102-19651 **Commentaires Laboratoire:** Colle beige:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M018-2-P016-2	HM9/RDC - 12-WC	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle beige+joint gris+divers peintures de plinthes carrelages	Peintures multiples **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Colle beige+joint gris+divers peintures de plinthes carrelages Envoyé au labo en tant que : Colle beige+joint gris+divers peintures de plinthes carrelages **Réf. laboratoire:** IT072102-19651 **Commentaires Laboratoire:** Peintures multiples:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P016
M018-3-P016-3	HM9/RDC - 12-WC	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle beige+joint gris+divers peintures de plinthes carrelages	Joint cassant gris **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Colle beige+joint gris+divers peintures de plinthes carrelages Envoyé au labo en tant que : Colle beige+joint gris+divers peintures de plinthes carrelages **Réf. laboratoire:** IT072102-19651 **Commentaires Laboratoire:** Joint cassant gris:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P016
M019-P017	HM9/RDC - 12-WC	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle beige de faïence blanche15x15 + divers peinture	Carrelage **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Colle beige de faïence blanche15x15 + divers peinture Envoyé au labo en tant que : Colle beige de faïence blanche15x15 + divers peinture **Réf. laboratoire:** IT072102-19652 **Commentaires Laboratoire:** Carrelage:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M019-2-P017-2	HM9/RDC - 12-WC	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle beige de faïence blanche15x15 + divers peinture	Colle beige peintures multiples non séparable **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Colle beige de faïence blanche15x15 + divers peinture Envoyé au labo en tant que : Colle beige de faïence blanche15x15 + divers peinture **Réf. laboratoire:** IT072102-19652 **Commentaires Laboratoire:** Colle beige + peintures multiples non séparable:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P017
M019-3-P017-3	HM9/RDC - 12-WC	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle beige de faïence blanche15x15 + divers peinture	Joint cassant beige **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Colle beige de faïence blanche15x15 + divers peinture Envoyé au labo en tant que : Colle beige de faïence blanche15x15 + divers peinture **Réf. laboratoire:** IT072102-19652 **Commentaires Laboratoire:** Joint cassant beige:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P017
M020-P018	HM9/RDC - 12-WC	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage +joint souple gris	Carrelage **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Colle de carrelage +joint souple gris Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage +joint souple gris **Réf. laboratoire:** IT072102-19653 **Commentaires Laboratoire:** Carrelage:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M020-2-P018-2	HM9/RDC - 12-WC	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage +joint souple gris	Colle grise **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Colle de carrelage +joint souple gris Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage +joint souple gris **Réf. laboratoire:** IT072102-19653 **Commentaires Laboratoire:** Colle grise:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P018
M020-3-P018-3	HM9/RDC - 12-WC	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage +joint souple gris	Matériau compact gris hétérogène **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Colle de carrelage +joint souple gris Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage +joint souple gris **Réf. laboratoire:** IT072102-19653 **Commentaires Laboratoire:** Matériau compact gris hétérogène:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P018
M020-4-P018-4	HM9/RDC - 12-WC	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage +joint souple gris	Matériau souple gris avec poussières **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Colle de carrelage +joint souple gris Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage +joint souple gris **Réf. laboratoire:** IT072102-19653 **Commentaires Laboratoire:** Matériau souple gris avec poussières:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P018


Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M021-P019	HM9/RDC - 11-Sanitaires	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Chape+colle ciment de carrelage	Peintures multiples **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Chape+colle ciment de carrelage Envoyé au labo en tant que : Chape+colle ciment de carrelage **Réf. laboratoire:** IT072102-19654 **Commentaires Laboratoire:** Peintures multiples:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M021-2-P019-2	HM9/RDC - 11-Sanitaires	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Chape+colle ciment de carrelage	Carrelage **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Chape+colle ciment de carrelage Envoyé au labo en tant que : Chape+colle ciment de carrelage **Réf. laboratoire:** IT072102-19654 **Commentaires Laboratoire:** Carrelage:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P019
M021-3-P019-3	HM9/RDC - 11-Sanitaires	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Chape+colle ciment de carrelage	Colle grise hétérogène **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Chape+colle ciment de carrelage Envoyé au labo en tant que : Chape+colle ciment de carrelage **Réf. laboratoire:** IT072102-19654 **Commentaires Laboratoire:** Colle grise hétérogène:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P019
Sondage S1-P019-S1	HM9/RDC - 11-Sanitaires	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Chape+colle ciment de carrelage	Carrelage **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Chape+colle de carrelage Envoyé au labo en tant que : Chape+colle ciment de carrelage **Réf. laboratoire:** IT072103-48381 **Commentaires Laboratoire:** Carrelage:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
Sondage S1-2-P019-S1-2	HM9/RDC - 11-Sanitaires	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Chape+colle ciment de carrelage	Colle grise **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Chape+colle de carrelage Envoyé au labo en tant que : Chape+colle ciment de carrelage **Réf. laboratoire:** IT072103-48381 **Commentaires Laboratoire:** Colle grise:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P019 S1
Sondage S1-3-P019-S1-3	HM9/RDC - 11-Sanitaires	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Chape+colle ciment de carrelage	Matériau compact gris hétérogène **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Chape+colle de carrelage Envoyé au labo en tant que : Chape+colle ciment de carrelage **Réf. laboratoire:** IT072103-48381 **Commentaires Laboratoire:** Matériau compact gris hétérogène:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P019 S1
M022-P020	HM9/RDC - 11-Sanitaires	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques rigide aspect gouttelette 120x60	Panneaux et plaques rigide aspect gouttelette 120x60 **Commentaires prélèvement:** 09/02/2021-Panneaux et plaques rigide aspect gouttelette 120x60 **Réf. laboratoire:** IT072102-19655 **Commentaires Laboratoire:** Enduit blanc non séparable + matériau fibreux avec paillettes:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M023-P021	HM9/RDC - 12-WC	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Chape+colle ciment de carrelage	Carrelage **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Chape++peinture+colle ciment de carrelage Sondage supplémentaire sur la zone idem au prélèvement Envoyé au labo en tant que : Chape++peinture+colle ciment de carrelage **Réf. laboratoire:** IT072103-48382 **Commentaires Laboratoire:** Carrelage:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M023-2-P021-2	HM9/RDC - 12-WC	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Chape+colle ciment de carrelage	Colle grise **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Chape++peinture+colle ciment de carrelage Sondage supplémentaire sur la zone idem au prélèvement Envoyé au labo en tant que : Chape++peinture+colle ciment de carrelage **Réf. laboratoire:** IT072103-48382 **Commentaires Laboratoire:** Colle grise:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M023-3-P021-3	HM9/RDC - 12-WC	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Chape+colle ciment de carrelage	Matériau compact gris hétérogène **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Chape++peinture+colle ciment de carrelage Sondage supplémentaire sur la zone idem au prélèvement Envoyé au labo en tant que : Chape++peinture+colle ciment de carrelage **Réf. laboratoire:** IT072103-48382 **Commentaires Laboratoire:** Matériau compact gris hétérogène:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P021
M023-4-P021-4	HM9/RDC - 12-WC	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Chape+colle ciment de carrelage	Peinture **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Chape++peinture+colle ciment de carrelage Sondage supplémentaire sur la zone idem au prélèvement Envoyé au labo en tant que : Chape++peinture+colle ciment de carrelage **Réf. laboratoire:** IT072103-48382 **Commentaires Laboratoire:** Peinture:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P021
M024-P022	HM9/RDC - 15-Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Carrelage+colle+chape+ réagreage sur dallle béton	Carrelage **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Carrelage+colle+chape+ réagreage sur dallle béton +Sondage dans la zone Envoyé au labo en tant que : Carrelage+colle+chape+ réagreage sur dallle béton **Réf. laboratoire:** IT072103-48383 **Commentaires Laboratoire:** Carrelage:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M024-2-P022-2	HM9/RDC - 15-Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Carrelage+colle+chape+ réagreage sur dallle béton	Colle grise **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Carrelage+colle+chape+ réagreage sur dallle béton +Sondage dans la zone Envoyé au labo en tant que : Carrelage+colle+chape+ réagreage sur dallle béton **Réf. laboratoire:** IT072103-48383 **Commentaires Laboratoire:** Colle grise:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P022

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M024-3-P022-3	HM9/RDC - 15-Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Carrelage+colle+chape+ réagreage sur dallle béton	Matériau compact gris hétérogène **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Carrelage+colle+chape+ réagreage sur dallle béton +Sondage dans la zone Envoyé au labo en tant que : Carrelage+colle+chape+ réagreage sur dallle béton **Réf. laboratoire:** IT072103-48383 **Commentaires Laboratoire:** Matériau compact gris hétérogène:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P022
M024-4-P022-4	HM9/RDC - 15-Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Carrelage+colle+chape+ réagreage sur dallle béton	Ragréage gris **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Carrelage+colle+chape+ réagreage sur dallle béton +Sondage dans la zone Envoyé au labo en tant que : Carrelage+colle+chape+ réagreage sur dallle béton **Réf. laboratoire:** IT072103-48383 **Commentaires Laboratoire:** Ragréage gris:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P022
M024-P023	HM9/RDC - 13-Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage+chape(1) +plastique+peinture sur chape(2)+ragréages avec trace noire(1)+dalles béton avec trace noire(2)	Carrelage **Matériau présent dans les pièces:** HM9/RDC - 15-Bureau, HM9/RDC - 13-Bureau **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Carrelage+chape (1)+plastique+peinture+chape(2)+ragréage+trace de colle bitumineuse(1)+dalle béton avec trace de colle bitumineuse(2) Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage+chape(1)+plastique+peinture sur chape(2)+ragréages avec trace noire(1)+dalles béton avec trace noire(2) **Réf. laboratoire:** IT072103-48384 **Commentaires Laboratoire:** Carrelage:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M025-2-P023-2	HM9/RDC - 13-Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage+chape(1) +plastique+peinture sur chape(2)+ragréages avec trace noire(1)+dalles béton avec trace noire(2)	Colle grise **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Carrelage+chape (1)+plastique+peinture+chape(2)+ragréage+trace de colle bitumineuse(1)+dalle béton avec trace de colle bitumineuse(2) Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage+chape(1)+plastique+peinture sur chape(2)+ragréages avec trace noire(1)+dalles béton avec trace noire(2) **Réf. laboratoire:** IT072103-48384 **Commentaires Laboratoire:** Colle grise:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P023
M025-3-P023-3	HM9/RDC - 13-Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage+chape(1) +plastique+peinture sur chape(2)+ragréages avec trace noire(1)+dalles béton avec trace noire(2)	Matériau compact gris hétérogène **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Carrelage+chape (1)+plastique+peinture+chape(2)+ragréage+trace de colle bitumineuse(1)+dalle béton avec trace de colle bitumineuse(2) Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage+chape(1)+plastique+peinture sur chape(2)+ragréages avec trace noire(1)+dalles béton avec trace noire(2) **Réf. laboratoire:** IT072103-48384 **Commentaires Laboratoire:** Matériau compact gris hétérogène:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P023

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M025-4-P023-4	HM9/RDC - 13-Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage+chape(1) +plastique+peinture sur chape(2)+ragréages avec trace noire(1)+dalles béton avec trace noire(2)	Peintures multiples **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Carrelage+chape (1)+plastique+peinture+chape(2)+ragréage+trace de colle bitumineuse(1)+dalle béton avec trace de colle bitumineuse(2) Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage+chape(1)+plastique+peinture sur chape(2)+ragréages avec trace noire(1)+dalles béton avec trace noire(2) **Réf. laboratoire:** IT072103-48384 **Commentaires Laboratoire:** Peintures multiples:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P023
M025-5-P023-5	HM9/RDC - 13-Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage+chape(1) +plastique+peinture sur chape(2)+ragréages avec trace noire(1)+dalles béton avec trace noire(2)	Ragréage gris **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Carrelage+chape (1)+plastique+peinture+chape(2)+ragréage+trace de colle bitumineuse(1)+dalle béton avec trace de colle bitumineuse(2) Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage+chape(1)+plastique+peinture sur chape(2)+ragréages avec trace noire(1)+dalles béton avec trace noire(2) **Réf. laboratoire:** IT072103-48384 **Commentaires Laboratoire:** Ragréage gris:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P023
M025-6-P023-6	HM9/RDC - 13-Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage+chape(1) +plastique+peinture sur chape(2)+ragréages avec trace noire(1)+dalles béton avec trace noire(2)	Matériau bitumineux noir couche jaune avec poussières non séparable **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Carrelage+chape (1)+plastique+peinture+chape(2)+ragréage+trace de colle bitumineuse(1)+dalle béton avec trace de colle bitumineuse(2) Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage+chape(1)+plastique+peinture sur chape(2)+ragréages avec trace noire(1)+dalles béton avec trace noire(2) **Réf. laboratoire:** IT072103-48384 **Commentaires Laboratoire:** Matériau bitumineux noir + couche jaune avec poussières non séparable:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P023
M026-P024	HM9/RDC - 22-Salle de detente	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage+joint+chape+dalle béton	Carrelage **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Colle de carrelage+joint+chape sur dalle béton Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage+joint+chape+dalle béton **Réf. laboratoire:** IT072103-48385 **Commentaires Laboratoire:** Carrelage:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M026-2-P024-2	HM9/RDC - 22-Salle de detente	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage+joint+chape+dalle béton	Colle grise **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Colle de carrelage+joint+chape sur dalle béton Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage+joint+chape+dalle béton **Réf. laboratoire:** IT072103-48385 **Commentaires Laboratoire:** Colle grise:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P024

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M026-3-P024-3	HM9/RDC - 22-Salle de detente	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage+joint+chape+dalle béton	Matériau compact gris hétérogène **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Colle de carrelage+joint+chape sur dalle béton Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage+joint+chape+dalle béton **Réf. laboratoire:** IT072103-48385 **Commentaires Laboratoire:** Matériau compact gris hétérogène:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P024
M026-4-P024-4	HM9/RDC - 22-Salle de detente	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage+joint+chape+dalle béton	Joint cassant gris **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Colle de carrelage+joint+chape sur dalle béton Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage+joint+chape+dalle béton **Réf. laboratoire:** IT072103-48385 **Commentaires Laboratoire:** Joint cassant gris:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P024
M027-P025	HM9/RDC - 24-Bureau Chef atelier	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage+joint+chape+trace de peinture+dalle bêton	Carrelage **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Colle de carrelage+joint+chape+trace de peinture+dalle béton Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage+joint+chape+trace de peinture+dalle béton **Réf. laboratoire:** IT072103-48386 **Commentaires Laboratoire:** Carrelage:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M027-2-P025-2	HM9/RDC - 24-Bureau Chef atelier	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage+joint+chape+trace de peinture+dalle bêton	Colle grise **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Colle de carrelage+joint+chape+trace de peinture+dalle béton Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage+joint+chape+trace de peinture+dalle béton **Réf. laboratoire:** IT072103-48386 **Commentaires Laboratoire:** Colle grise:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P025
M027-3-P025-3	HM9/RDC - 24-Bureau Chef atelier	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage+joint+chape+trace de peinture+dalle bêton	Matériau compact gris hétérogène **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Colle de carrelage+joint+chape+trace de peinture+dalle béton Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage+joint+chape+trace de peinture+dalle béton **Réf. laboratoire:** IT072103-48386 **Commentaires Laboratoire:** Matériau compact gris hétérogène:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P025
M027-4-P025-4	HM9/RDC - 24-Bureau Chef atelier	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage+joint+chape+trace de peinture+dalle bêton	Joint cassant gris **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Colle de carrelage+joint+chape+trace de peinture+dalle béton Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage+joint+chape+trace de peinture+dalle béton **Réf. laboratoire:** IT072103-48386 **Commentaires Laboratoire:** Joint cassant gris:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P025

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M027-5-P025-5	HM9/RDC - 24-Bureau Chef atelier	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage+joint+chape+trace de peinture+dalle bêton	Peinture en faible quantité non séparable matériau compact gris **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Colle de carrelage+joint+chape+trace de peinture+dalle béton Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage+joint+chape+trace de peinture+dalle béton **Réf. laboratoire:** IT072103-48386 **Commentaires Laboratoire:** Peinture en faible quantité non séparable + matériau compact gris:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P025
M028-P026	HM9/RDC - 7-Vestiaire	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage+chape	Carrelage **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Colle de carrelage+chape Carotte 8,8cm carrelage +colle 0,7cm Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage+chape **Réf. laboratoire:** IT072103-48387 **Commentaires Laboratoire:** Carrelage:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M028-2-P026-2	HM9/RDC - 7-Vestiaire	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage+chape	Colle beige **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Colle de carrelage+chape Carotte 8,8cm carrelage +colle 0,7cm Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage+chape **Réf. laboratoire:** IT072103-48387 **Commentaires Laboratoire:** Colle beige:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P026
M028-3-P026-3	HM9/RDC - 7-Vestiaire	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage+chape	Matériau compact gris hétérogène **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Colle de carrelage+chape Carotte 8,8cm carrelage +colle 0,7cm Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage+chape **Réf. laboratoire:** IT072103-48387 **Commentaires Laboratoire:** Matériau compact gris hétérogène:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P026
M029-P027	HM9/RDC - 6-Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Chape+colle de carrelage+ joint	Carrelage **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021Chape+colle de carrelage+ joint Envoyé au labo en tant que : Chape+colle de carrelage+joint **Réf. laboratoire:** IT072103-48388 **Commentaires Laboratoire:** Carrelage:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M029-2-P027-2	HM9/RDC - 6-Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Chape+colle de carrelage+ joint	Colle grise **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021Chape+colle de carrelage+ joint Envoyé au labo en tant que : Chape+colle de carrelage+joint **Réf. laboratoire:** IT072103-48388 **Commentaires Laboratoire:** Colle grise:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P027

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M029-3-P027-3	HM9/RDC - 6-Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Chape+colle de carrelage+ joint	Matériau compact gris hétérogène **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021Chape+colle de carrelage+ joint Envoyé au labo en tant que : Chape+colle de carrelage+joint **Réf. laboratoire:** IT072103-48388 **Commentaires Laboratoire:** Matériau compact gris hétérogène:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P027
M029-4-P027-4	HM9/RDC - 6-Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Chape+colle de carrelage+ joint	Joint cassant gris **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021Chape+colle de carrelage+ joint Envoyé au labo en tant que : Chape+colle de carrelage+joint **Réf. laboratoire:** IT072103-48388 **Commentaires Laboratoire:** Joint cassant gris:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P027
M030-P028	HM9/RDC - 5-Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Peinture de sol+chape	Peinture **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Peinture de sol+chape Envoyé au labo en tant que : Peinture de sol+chape **Réf. laboratoire:** IT072103-48389 **Commentaires Laboratoire:** Peinture:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
M030-2-P028-2	HM9/RDC - 5-Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Peinture de sol+chape	Matériau compact gris hétérogène **Commentaires prélèvement:** 08/03/2021 Peinture de sol+chape Envoyé au labo en tant que : Peinture de sol+chape **Réf. laboratoire:** IT072103-48389 **Commentaires Laboratoire:** Matériau compact gris hétérogène:MET **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	Idem P028

Copie des rapports d'essais :

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072102-19645 EN DATE DU 15/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

IBA - INSPECTION BATIMENT ATLANTIQUE
Mme Virginie RABEAU
39 Impasse Frédéric Mistral
33127 Saint-Jean d'Illac

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0721-9579
Echantillon ITGA : IT072102-19645
Reçu au laboratoire le : 11/02/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	IBA/2101/0584-HM9_2021_02_10_0800_3934
Dossier client	IBA/2101/0584-HM9 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN
Echantillon	P010 - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - HM9/RDC - 1-Atelier

Description ITGA	Peinture / Matériau compact beige

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + matériau compact beige	META (1) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072102-19646 EN DATE DU 15/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

IBA - INSPECTION BATIMENT ATLANTIQUE
Mme Virginie RABEAU
39 Impasse Frédéric Mistral
33127 Saint-Jean d'Illac

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0721-9579
Echantillon ITGA : IT072102-19646
Reçu au laboratoire le : 11/02/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	IBA/2101/0584-HM9_2021_02_10_0800_3934
Dossier client	IBA/2101/0584-HM9 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN
Echantillon	P011 - Dalle de sol+colle+chape ciment+carrelages - HM9/RDC - 14-Bureau

Description ITGA	Peintures multiples / Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune avec couche en papier / Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Joint cassant gris en faible quantité en vrac / Peintures multiples

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :


Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples	META (1) le 15/02/2021	Présence de fibres d'amiante	Trémolite	1
Revêtement cassant gris	META (1) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	1
Colle polymère jaune avec couche en papier	META (1) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	META (1) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	1
Colle grise	META (1) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	1
Matériau compact gris hétérogène	META (1) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	1

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT D'ESSAI N° IT072102-19646 EN DATE DU 15/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Joint cassant gris en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	META (1) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072102-19647 EN DATE DU 15/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

IBA - INSPECTION BATIMENT ATLANTIQUE
Mme Virginie RABEAU
39 Impasse Frédéric Mistral
33127 Saint-Jean d'Illac

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0721-9579
Echantillon ITGA : IT072102-19647
Reçu au laboratoire le : 11/02/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	IBA/2101/0584-HM9_2021_02_10_0800_3934
Dossier client	IBA/2101/0584-HM9 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN
Echantillon	P012 - Colle ciment+ peinture + plinthes carrelages - HM9/RDC - 14-Bureau

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle beige / Peinture / Matériau compact gris / Joint cassant gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.


Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture	META (1) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	2
Carrelage	META (1) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	1
Colle beige + peinture non séparable	META (1) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	1
Matériau compact gris	META (1) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	1
Joint cassant gris	META (1) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	1

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT D'ESSAI N° IT072102-19647 EN DATE DU 15/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072102-19648 EN DATE DU 15/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

IBA - INSPECTION BATIMENT ATLANTIQUE
Mme Virginie RABEAU
39 Impasse Frédéric Mistral
33127 Saint-Jean d'Illac

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0721-9579
Echantillon ITGA : IT072102-19648
Reçu au laboratoire le : 11/02/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	IBA/2101/0584-HM9_2021_02_10_0800_3934
Dossier client	IBA/2101/0584-HM9 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN
Echantillon	P013 - Colle blanche+ joint gris+ plinthes carrelages - HM9/RDC - 15-Bureau

Description ITGA	Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Joint cassant gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples non séparable + joint cassant gris	META (1) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	2
Carrelage	META (1) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	1
Colle beige	META (1) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072102-19649 EN DATE DU 15/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

IBA - INSPECTION BATIMENT ATLANTIQUE
Mme Virginie RABEAU
39 Impasse Frédéric Mistral
33127 Saint-Jean d'Illac

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0721-9579
Echantillon ITGA : IT072102-19649
Reçu au laboratoire le : 11/02/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	IBA/2101/0584-HM9_2021_02_10_0800_3934
Dossier client	IBA/2101/0584-HM9 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN
Echantillon	P014 - Peinture beige,trace noire sur raidisseur acier+peinture blanche - HM9/RDC - 1-Atelier

Description ITGA	Peintures multiples en vrac / Couche noire

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples en vrac + couche noire non séparable	META (1) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072102-19650 EN DATE DU 15/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

IBA - INSPECTION BATIMENT ATLANTIQUE
Mme Virginie RABEAU
39 Impasse Frédéric Mistral
33127 Saint-Jean d'Illac

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0721-9579
Echantillon ITGA : IT072102-19650
Reçu au laboratoire le : 11/02/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	IBA/2101/0584-HM9_2021_02_10_0800_3934
Dossier client	IBA/2101/0584-HM9 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN
Echantillon	P015 - Panneaux et plaques - HM9/RDC - 12-WC

Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux avec paillettes

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Enduit blanc non séparable + matériau fibreux avec paillettes	META (1) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072102-19651 EN DATE DU 15/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

IBA - INSPECTION BATIMENT ATLANTIQUE
Mme Virginie RABEAU
39 Impasse Frédéric Mistral
33127 Saint-Jean d'Illac

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0721-9579
Echantillon ITGA : IT072102-19651
Reçu au laboratoire le : 11/02/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	IBA/2101/0584-HM9_2021_02_10_0800_3934
Dossier client	IBA/2101/0584-HM9 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN
Echantillon	P016 - Colle beige+joint gris+divers peintures de plinthes carrelages - HM9/RDC - 12-WC

Description ITGA	Colle beige / Peintures multiples / Joint cassant gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Colle beige	META (1) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	1
Peintures multiples	META (1) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	1
Joint cassant gris	META (1) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072102-19652 EN DATE DU 15/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

IBA - INSPECTION BATIMENT ATLANTIQUE
Mme Virginie RABEAU
39 Impasse Frédéric Mistral
33127 Saint-Jean d'Illac

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0721-9579
Echantillon ITGA : IT072102-19652
Reçu au laboratoire le : 11/02/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	IBA/2101/0584-HM9_2021_02_10_0800_3934
Dossier client	IBA/2101/0584-HM9 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN
Echantillon	P017 - Colle beige de faience blanche15x15 + divers peinture - HM9/RDC - 12-WC

Description ITGA	Carrelage / Colle beige / Peintures multiples / Joint cassant beige

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Carrelage	META (1) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	1
Colle beige + peintures multiples non séparable	META (1) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	1
Joint cassant beige	META (1) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072102-19653 EN DATE DU 15/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
IBA - INSPECTION BATIMENT ATLANTIQUE
Mme Virginie RABEAU
39 Impasse Frédéric Mistral
33127 Saint-Jean d'Illac

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0721-9579
Echantillon ITGA : IT072102-19653
Reçu au laboratoire le : 11/02/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	IBA/2101/0584-HM9_2021_02_10_0800_3934
Dossier client	IBA/2101/0584-HM9 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN
Echantillon	P018 - Colle de carrelage +joint souple gris - HM9/RDC - 12-WC

Description ITGA	Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Matériau souple gris avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Carrelage	META (1) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	1
Colle grise	META (1) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	1
Matériau compact gris hétérogène	META (1) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	1
Matériau souple gris avec poussières	META (2) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072102-19654 EN DATE DU 15/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

IBA - INSPECTION BATIMENT ATLANTIQUE
Mme Virginie RABEAU
39 Impasse Frédéric Mistral
33127 Saint-Jean d'Illac

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0721-9579
Echantillon ITGA : IT072102-19654
Reçu au laboratoire le : 11/02/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	IBA/2101/0584-HM9_2021_02_10_0800_3934
Dossier client	IBA/2101/0584-HM9 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN
Echantillon	P019 - Chape+colle ciment de carrelage - HM9/RDC - 11-Sanitaires

Description ITGA	Peintures multiples / Carrelage / Colle grise hétérogène

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples	META (1) le 15/02/2021	Présence de fibres d'amiante	Trémolite	1
Carrelage	META (1) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	1
Colle grise hétérogène	META (1) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072102-19655 EN DATE DU 15/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

IBA - INSPECTION BATIMENT ATLANTIQUE
Mme Virginie RABEAU
39 Impasse Frédéric Mistral
33127 Saint-Jean d'Illac

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0721-9579
Echantillon ITGA : IT072102-19655
Reçu au laboratoire le : 11/02/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	IBA/2101/0584-HM9_2021_02_10_0800_3934
Dossier client	IBA/2101/0584-HM9 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN
Echantillon	P020 - Panneaux et plaques rigide aspect gouttelette 120x60 - HM9/RDC - 11-Sanitaires

Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux avec paillettes

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Enduit blanc non séparable + matériau fibreux avec paillettes	META (1) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072102-9737 EN DATE DU 09/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

IBA - INSPECTION BATIMENT ATLANTIQUE
Mme Virginie RABEAU
39 Impasse Frédéric Mistral
33127 Saint-Jean d'Illac

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0721-8144
Echantillon ITGA : IT072102-9737
Reçu au laboratoire le : 05/02/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	IBA/2101/0584-HM9_2021_02_03_1453_5962
Dossier client	IBA/2101/0584-HM9 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN
Echantillon	P001 - Joint de bruleur - HM9/RDC - 20-Chaufferie

Description ITGA	Matériau fibreux beige

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Matériau fibreux beige	META (1) le 09/02/2021	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072102-9738 EN DATE DU 09/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

IBA - INSPECTION BATIMENT ATLANTIQUE
Mme Virginie RABEAU
39 Impasse Frédéric Mistral
33127 Saint-Jean d'Illac

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0721-8144
Echantillon ITGA : IT072102-9738
Reçu au laboratoire le : 05/02/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	IBA/2101/0584-HM9_2021_02_03_1453_5962
Dossier client	IBA/2101/0584-HM9 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN
Echantillon	P002 - Plaques isolantes internes - HM9/RDC - 20-Chaufferie

Description ITGA	Matériau fibreux blanc avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Matériau fibreux blanc avec poussières	META (1) le 09/02/2021	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072102-9739 EN DATE DU 09/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

IBA - INSPECTION BATIMENT ATLANTIQUE
Mme Virginie RABEAU
39 Impasse Frédéric Mistral
33127 Saint-Jean d'Illac

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0721-8144
Echantillon ITGA : IT072102-9739
Reçu au laboratoire le : 05/02/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	IBA/2101/0584-HM9_2021_02_03_1453_5962
Dossier client	IBA/2101/0584-HM9 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN
Echantillon	P003 - Vermiculite en sous toiture - Parties exterieures couverture du local 11a la chaudiere no20

Description ITGA	Matériau brillant beige en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Matériau brillant beige en vrac	META (1) le 09/02/2021	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072102-9740 EN DATE DU 09/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

IBA - INSPECTION BATIMENT ATLANTIQUE
Mme Virginie RABEAU
39 Impasse Frédéric Mistral
33127 Saint-Jean d'Illac

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0721-8144
Echantillon ITGA : IT072102-9740
Reçu au laboratoire le : 05/02/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	IBA/2101/0584-HM9_2021_02_03_1453_5962
Dossier client	IBA/2101/0584-HM9 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN
Echantillon	P004 - Panneaux collés ou visses - HM9/RDC - 15-Bureau

Description ITGA	Matériau granuleux et brillant beige / Peinture

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Matériau granuleux et brillant beige + peinture non séparable	META (1) le 09/02/2021	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072102-9741 EN DATE DU 09/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

IBA - INSPECTION BATIMENT ATLANTIQUE
Mme Virginie RABEAU
39 Impasse Frédéric Mistral
33127 Saint-Jean d'Illac

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0721-8144
Echantillon ITGA : IT072102-9741
Reçu au laboratoire le : 05/02/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	IBA/2101/0584-HM9_2021_02_03_1453_5962
Dossier client	IBA/2101/0584-HM9 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN
Echantillon	P005 - Panneaux 60x60 fibreux rigides - HM9/1er etage - 29-Secretariat

Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux avec paillettes avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Enduit blanc non séparable + matériau fibreux avec paillettes avec poussières	META (1) le 09/02/2021	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072102-9742 EN DATE DU 09/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

IBA - INSPECTION BATIMENT ATLANTIQUE
Mme Virginie RABEAU
39 Impasse Frédéric Mistral
33127 Saint-Jean d'Illac

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0721-8144
Echantillon ITGA : IT072102-9742
Reçu au laboratoire le : 05/02/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	IBA/2101/0584-HM9_2021_02_03_1453_5962
Dossier client	IBA/2101/0584-HM9 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN
Echantillon	P006 - Panneaux colles ou visses - HM9/1er etage - 30-Bureau Chef

Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	META (1) le 09/02/2021	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072102-9743 EN DATE DU 09/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

IBA - INSPECTION BATIMENT ATLANTIQUE
Mme Virginie RABEAU
39 Impasse Frédéric Mistral
33127 Saint-Jean d'Illac

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0721-8144
Echantillon ITGA : IT072102-9743
Reçu au laboratoire le : 05/02/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	IBA/2101/0584-HM9_2021_02_03_1453_5962
Dossier client	IBA/2101/0584-HM9 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN
Echantillon	P007 - Dalle de sol et ragreage - HM9/RDC - 19-Magasin

Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Revêtement souple gris	META (1) le 09/02/2021	Amiante non détecté	---	1
Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	META (1) le 09/02/2021	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072102-9744 EN DATE DU 09/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

IBA - INSPECTION BATIMENT ATLANTIQUE
Mme Virginie RABEAU
39 Impasse Frédéric Mistral
33127 Saint-Jean d'Illac

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0721-8144
Echantillon ITGA : IT072102-9744
Reçu au laboratoire le : 05/02/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	IBA/2101/0584-HM9_2021_02_03_1453_5962
Dossier client	IBA/2101/0584-HM9 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN
Echantillon	P008 - Mastic bitumineuses, mousse,polystyrene (Joint de dilatation au sol) - HM9/RDC - 1-Atelier

Description ITGA	Mousse grise / Matériau compact gris hétérogène / Matériau mou noir / Polystyrène expansé (billes) blanc

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Mousse grise non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + matériau mou noir non séparable + polystyrène expansé (billes) blanc non séparable	META (2) le 09/02/2021	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

itga
innovateur en fiabilité

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072102-19644 EN DATE DU 15/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
IBA - INSPECTION BATIMENT ATLANTIQUE
Mme Virginie RABEAU
39 Impasse Frédéric Mistral
33127 Saint-Jean d'Illac

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0721-9579
Echantillon ITGA : IT072102-19644
Reçu au laboratoire le : 11/02/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	IBA/2101/0584-HM9_2021_02_10_0800_3934
Dossier client	IBA/2101/0584-HM9 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN
Echantillon	P009 - Calorifuge enveloppe (carton+peinture) - HM9/RDC - 1-Atelier

Description ITGA	Peinture / Carton bitumé avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + carton bitumé avec poussières	META (2) le 15/02/2021	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-22222 EN DATE DU 26/03/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : IBA - INSPECTION BATIMENT ATLANTIQUE 39 Impasse Frédéric Mistral 33127 Saint-Jean d'Illac	Réf. Commande ITGA : IT0721-22222 Réf. Commande Client : IBA/2101/0584-HM9_2021_03_19_1836_5149

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 23/03/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : IBA/2101/0584-HM9 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN — Réf échantillon ITGA : IT072103-48381				
Réf échantillon client : P019-S1 - Chape+colle ciment de carrelage - HM9/RDC - 11-Sanitaires — Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène				
Carrelage	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Colle grise	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : IBA/2101/0584-HM9 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN — Réf échantillon ITGA : IT072103-48382				
Réf échantillon client : P021 - Chape++peinture+colle ciment de carrelage - HM9/RDC - 12-WC — Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Peinture				
Carrelage	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Colle grise	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Peinture	META (1)	2	26/03/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-22222 EN DATE DU 26/03/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : IBA/2101/0584-HM9 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA :		IT072103-48383
Réf échantillon client : P022 - Carrelage+colle+chape+ reagreage sur dalle beton - HM9/RDC - 15-Bureau		Description ITGA :		Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Ragréage gris
Carrelage	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Colle grise	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Ragréage gris	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : IBA/2101/0584-HM9 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA :		IT072103-48384
Réf échantillon client : P023 - Colle de carrelage+chape(1)+plastique+peinture sur chape(2)+ragreages avec trace noire(1)+dalles beton avec trace noire(2) - HM9/ RDC - 13-Bureau		Description ITGA :		Carrelage / Colle grise / Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène / Matériau bitumineux noir / Couche jaune avec poussières / Ragréage gris
Carrelage	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Colle grise	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Peintures multiples	META (1)	1	26/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Trémolite
Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Matériau bitumineux noir + couche jaune avec poussières non séparable	META (2)	2	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Ragréage gris	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : IBA/2101/0584-HM9 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA :		IT072103-48385
Réf échantillon client : P024 - Colle de carrelage+joint+chape+dalle beton - HM9/RDC - 22-Salle de detente		Description ITGA :		Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Joint cassant gris
Carrelage	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Colle grise	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Joint cassant gris	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : IBA/2101/0584-HM9 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA :		IT072103-48386
Réf échantillon client : P025 - Colle de carrelage+joint+chape+trace de peinture+dalle beton - HM9/ RDC - 24-Bureau Chef atelier		Description ITGA :		Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Joint cassant gris / Peinture en faible quantité / Matériau compact gris
Carrelage	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Colle grise	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Joint cassant gris	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Peinture en faible quantité non séparable + matériau compact gris	META (1)	4	26/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Trémolite

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-22222 EN DATE DU 26/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : IBA/2101/0584-HM9 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA : IT072103-48387		
Réf échantillon client : P026 - Colle de carrelage+chape - HM9/RDC - 7-Vestiaire		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau compact gris hétérogène		
Carrelage	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Colle beige	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : IBA/2101/0584-HM9 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA : IT072103-48388		
Réf échantillon client : P027 - Chape+colle de carrelage+joint - HM9/RDC - 6-Bureau		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Joint cassant gris		
Carrelage	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Colle grise	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Joint cassant gris	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : IBA/2101/0584-HM9 - BASE AERIENNE 118 (BA118) Avenue du Colonnel Rozanoff Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN		Réf échantillon ITGA : IT072103-48389		
Réf échantillon client : P028 - Peinture de sol+chape - HM9/RDC - 5-Bureau		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène		
Peinture	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -
Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	26/03/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

7.3 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux

déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.4 - Annexe - Autres documents

PLAFONDS SYSTEMES

Date : 09/06/2010

N° VERT 08 00 41 36 43

Objet : Absence d'amiante dans les produits ARMSTRONG

==========

Monsieur,

Nous vous certifions par la présente que les produits ARMSTRONG sont fabriqués selon le procédé WET FELT (chaîne humide) et sont composés de laine de roche (à faible biopersistance suivant la Directive 67/548 CE), d'argile, de perlite, d'amidon et de cellulose.

Ils ne contiennent pas et n'ont jamais contenu d'amiante sous quelle que forme que ce soit.

Espérant ainsi avoir répondu à votre attente, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.

B. ALLGEYER

SERVICE TECHNIQUE - DIVISION PLAFONDS

Armstrong Building Products SAS

www.armstrong.fr/plafonds

Armstrong

Cabinet CONDORCET
AUDIT ET COURTAGE EN ASSURANCE

Allianz

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 2 Rue Grignan – 13001 Marseille, attestons par la présente que la Société :

INSPECTION BATIMENT ATLANTIQUE
39 IMPASSE FREDERIC MISTRAL
33127 ST JEAN D ILLAC
Siret n°791 276 868 00019

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, un contrat d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier », sous le numéro N°86517808/ 80810566.

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : **DIAGNOSTIC IMMOBILIER :**

Assainissement Autonome - Collectif
Attestation de prise en compte de la réglementation thermique
Audit énergétique sans préconisation de travaux
Certificat de décence (loi SRU 2000-1208 SRU du 13/12/2000)
Certificat de norme d'habitabilité dans le cadre de l'obtention d'un prêt conventionné et/ou d'un prêt à taux zéro
Coordination SPS
Diagnostic Accessibilité (Hors ERP)
Diagnostic acoustique
Diagnostic amiante avant travaux / démolition sans préconisation de travaux
Diagnostic amiante avant vente
Diagnostic Amiante dans les Parties Privatives
Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux (Hors milieu industriel)
Diagnostic de performance énergétique
Diagnostic humidité
Diagnostic Légionellose
Diagnostic monoxyde de carbone
Diagnostic Plomb dans l'eau
Diagnostic radon
Diagnostic sécurité piscine
Diagnostic surface habitable Loi Boutin
Diagnostic Technique SRU
Diagnostic termites
Document Unique
Dossier technique amiante
DRIPP- Diagnostic de risque d'intoxication au plomb
Etat de l'installation intérieure de l'électricité des parties privatives et communes (DTT)
Etat des installations de gaz (Dossier de diagnostic technique)
Etat des lieux locatifs
Etat des risques et pollutions
Etat parasitaire
Etude thermique règlementaire RT 2005
Etude thermique règlementaire RT 2012
Evaluation Périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
Evaluation valeur vénale et locative
Exposition au plomb (CREP)
Loi Carrez
Loi Scellier
Millièmes de copropriété
Recherche de métaux lourds(Hors Détection toxique chez l'Homme)
Recherche de plomb avant travaux/Démolition
Risques naturels et technologiques
Test d'infiltrométrie sur l'enveloppe des bâtiments
Thermographie infrarouge
Vérification des équipements et installations incendie (Hors ERP)
Vérifications générales périodiques électricité
Vérifications générales périodiques gaz

La garantie du contrat porte exclusivement :

- **Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus,**
- **Et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications correspondantes exigées par la réglementation**

Tél. : 09 72 36 90 00
2 rue Grignan 13001 Marseille
contact@cabinetcondorcet.com • www.cabinetcondorcet.com
Service Réclamation : contact@cabinetcondorcet.com - 2 Rue Grignan 13001 Marseille 09 72 36 90 00
SAS au capital de 50 000 € - RCS Marseille 494 253 982 - Immatriculation ORIAS 07 026 627 www.orias.fr - Sous le contrôle de l'ACPR
Autorité de contrôle Prudentiel et Résolution - 61 Rue Taitbout 75009 Paris

Cabinet CONDORCET
AUDIT ET COURTAGE EN ASSURANCE

Allianz

Période de validité : **du 01/10/2020 au 30/09/2021**

L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations.

La Société ALLIANZ garantit l'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales n° COM08813, des conventions spéciales n° DIG20704 et des conditions particulières (feuillet d'adhésion 80810566), établies sur les bases des déclarations de l'adhérent. Les garanties sont subordonnées au paiement des cotisations d'assurances pour la période de la présente attestation.

Tél. : 09 72 36 90 00
2 rue Grignan 13001 Marseille
contact@cabinetcondorcet.com • www.cabinetcondorcet.com
Service Réclamation : contact@cabinetcondorcet.com - 2 Rue Grignan 13001 Marseille 09 72 36 90 00
SAS au capital de 50 000 € - RCS Marseille 494 253 982 - Immatriculation ORIAS 07 026 627 www.orias.fr - Sous le contrôle de l'ACPR
Autorité de contrôle Prudentiel et Résolution - 61 Rue Taitbout 75009 Paris

Cabinet CONDORCET
AUDIT ET COURTAGE EN ASSURANCE

Allianz


TABLEAU DE GARANTIE

Responsabilité civile « Exploitation »	
Nature des dommages	**Montant des garanties**
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	9 000 000 € par sinistre
dont :	
- Dommages matériels et immatériels consécutifs :	1 500 000 € par sinistre
- Dommages immatériels non consécutifs :	150 000 € par année d'assurance
- Atteintes à l'environnement accidentelles (corporels, matériels et immatériels) :	750 000 € par année d'assurance
- Dommages aux bâtiments loués ou empruntés et à leur contenu	300 000 € par sinistre
Responsabilité civile « Professionnelle » ***(garantie par Assuré)***	
Nature des dommages	**Montant des garanties**
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	600 000 € par sinistre avec un maximum de 600 000 € par année d'assurance
dont :	
- Destruction ou détérioration des documents et autres supports d'informations confiés à l'Assuré pour l'exécution des prestations, y compris les frais de reconstitution des informations :	30 000 € par sinistre
Défense – Recours	
Défense devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives. Défense des intérêts civils devant les juridictions répressives :	Frais à la charge de l'Assureur, sauf dépassement du plafond de garantie en cause.
Recours (préjudices supérieurs à 150 €) :	15 000 € par sinistre

La présente attestation ne peut engager l'assureur en dehors des limites prévues par les clauses et conditions du contrat auxquelles elle se réfère.

Fait à Marseille, le 18 septembre 2020

POUR LE CABINET CONDORCET



Tél. : 09 72 36 90 00
2 rue Grignan 13001 Marseille
contact@cabinetcondorcet.com • www.cabinetcondorcet.com
Service Réclamation : contact@cabinetcondorcet.com - 2 Rue Grignan 13001 Marseille 09 72 36 90 00
SAS au capital de 50 000 € - RCS Marseille 494 253 982 - Immatriculation ORIAS 07 026 627 www.orias.fr - Sous le contrôle de l'ACPR
Autorité de contrôle Prudentiel et Résolution - 61 Rue Taitbout 75009 Paris

QUALIXPERT

Certificat N° C0188

Madame Virginie RABEAU

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES ACCREDITATION N° 4-0094 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Amiante avec mention	**Certificat valable Du 10/07/2017 au 09/07/2022**	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Constat de risque d'exposition au plomb	**Certificat valable Du 23/04/2019 au 22/04/2024**	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	**Certificat valable Du 14/11/2018 au 13/11/2023**	Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Date d'établissement le mardi 23 avril 2019

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

F09 Certification de compétence version M 250119

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible

I.B.A
Inspection Bâtiment Atlantique

Rapport de constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis et sur les ouvrages

Numéro de dossier :	IBA/2101/0584-HM9
Norme méthodologique employée :	AFNOR NF P 03-200 – Mai 2016
Date du repérage :	26,27/01/2021
Heure d'arrivée :	10 h 45
Durée du repérage :	+/-2J

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :
Département :..... **Landes**
Adresse : ..... **BASE AERIENNE 118 (BA118)**
Avenue du Colonnel Rozanoff
Projet COGA
Commune :..... **40000 MONT-DE-MARSAN**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
HM9 Lot numéro Non communiqué,
Documents fournis:
..... **Plans**
Désignation du (ou des) bâtiment(s) et périmètre de repérage :
..... **Industrie**
..... **Zone travaux projet COGA**
Demolition du Bâtiment HM9
Relevé par carottage des dalles béton si possible ensemble des bâtiments.
Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH délimitant les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme par les termites et L 133-8 du CCH délimitant les zones de présence d'un risque de mérule :
..... **Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral:**
40000 MONT-DE-MARSAN (Information au 27/01/2020)
Niveau d'infestation fort 26/06/2002 - Arrêté préfectoral

B. - Désignation du client

Désignation du client :
Nom et prénom : ..... **Ministère de la défense**
Adresse : ..... **Bon de comande n° 1510441922**
Si le client n'est pas le donneur d'ordre :
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :
Autre
Nom et prénom : ..... **ESID BX - ASC 1 BROCHARD Romain " Architecte du Pôle maîtrise d'œuvre"**
Adresse : ..... **Division Investissement/ Pôle Maîtrise d'œuvre Interne**
Caserne Pelleport
9 rue de Cursol
CS 21152
33068 BORDEAUX CEDEX (France)

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :
Nom et prénom : ..... **RABEAU VIRGINIE**
Raison sociale et nom de l'entreprise : ..... **IBA (Inspection Bâtiment Atlantique)**
Adresse : ..... **39 impasse Frédéric Mistral, 33127 SAINT JEAN D ILLAC**
Numéro SIRET : **791 276 868 00019**
Désignation de la compagnie d'assurance : ... **ALLIANZ**
Numéro de police et date de validité : ..... **80810566 / 30 09 2021**

Conclusion : Il n'a pas été repéré d'indice de présence d'agents de dégradation biologique du bois.

D. - Identification des parties d'immeubles ou de l'ouvrage visitées et résultat du constat (identification des éléments infestés ou ayant été infestés et de ceux qui ne le sont pas) ainsi que des agents de dégradation biologique :

Liste des pièces visitées

HM9/RDC - 1-Atelier,
HM9/RDC - 2-Réserve,
HM9/RDC - 3-Réserves,
HM9/RDC - 4-Rangement,
HM9/RDC - 5-Bureau,
HM9/RDC - 6-Bureau,
HM9/RDC - 7-Vestiaire,
HM9/RDC - 8-Magasin,
HM9/RDC - 9-Magasin,
HM9/RDC - 10-Magasin,
HM9/RDC - 11-Sanitaires,
HM9/RDC - 12-WC,
HM9/RDC - 13-Bureau,
HM9/RDC - 14-Bureau,
HM9/RDC - 15-Bureau,
HM9/RDC - 16-NBC,
HM9/RDC - 17-Entrée /Sortie,
HM9/RDC - 18-Magasin Trans,
HM9/RDC - 19-Magasin,
HM9/RDC - 20-Chaufferie,
HM9/RDC - 20'-Rangement,
HM9/RDC - 21-Vestiaire,
HM9/RDC - 22-Salle de detente,
HM9/RDC - 23-Vestiaire,
HM9/RDC - 24-Bureau Chef atelier,
HM9/RDC - 25-Bureau,
HM9/RDC - 26-Magasin pièces détachées,
HM9/RDC - 27-Magasin,
HM9/1er étage - 28-ESC/Palier,
HM9/1er étage - 29-Secrétariat,
HM9/1er étage - 30-Bureau Chef,
HM9/Extérieur - 31-Air de lavage

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores
1-Atelier	Mur - A - Structure et Bac acier et Peinture	-	-	-
	Mur - B, C, D - Structure acier et Peinture	-	-	-
	Mur - B, C, D - Briques,enduit et Peinture	-	-	-
	Plafond - Bac acier et Peinture	-	-	-
	Plafond - Bac onduline acier	-	-	-
	Plafond - Structure acier et Peinture	-	-	-
	Piliers centraux - Acier et Peinture	-	-	-
	Sol marquage - Jaune et Peinture	-	-	-
	Fenêtre 1 - B - Métal et Peinture	-	-	-
	Fenêtre 2 - C - Métal et Peinture	-	-	-
	Fenêtre 3 - D - Métal et Peinture	-	-	-
	Portes electrique - A - Métal isolé extrudé	-	-	-
	Descente EP - PVC	-	-	-
	Porte 1 - B - Métal et Peinture	-	-	-
	Porte 2 - D - Métal et Peinture	-	-	-
2-Réserve	Sol - Béton	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Enduit ciment et Peinture	-	-	-
	Faux plafond 120x80 - Laine de verre+pack alu	-	-	-
	Structure plafond - Acier	-	-	-
	Porte 1 - A - Bois et Peinture	-	-	-
	Porte 2 - B - Bois et Peinture	-	-	-
	Pilier - D - Acier et Peinture	-	-	-
	Descente EP - D - PVC et Peinture	-	-	-
3-Réserves	Sol - Béton	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Enduit ciment et Peinture	-	-	-
	Faux plafond 120x80 - Laine de verre+pack alu	-	-	-
	Structure plafond - Acier	-	-	-
	Porte - A - Bois et Peinture	-	-	-
4-Rangement	Sol - Béton	-	-	-
	Mur - A - Briques,enduit et peinture	-	-	-
	Mur - B - Briques,enduit	-	-	-
	Mur - C - Bac acier et Peinture	-	-	-
	Piliers centraux - Acier et peinture	-	-	-
	Porte - A - Bois et Peinture	-	-	-
	Poteaux - D - Acier et Peinture	-	-	-
	Plafond - Bac acier	-	-	-
5-Bureau	Sol - Béton et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C - Briques,enduit et peinture	-	-	-

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores
	Mur - D - BA13 et peinture	-	-	-
	Faux plafond 120x80 - Laine de verre+pack alu	-	-	-
	Fenêtre - A - Bois et Peinture	-	-	-
	Porte - A - Bois et Peinture	-	-	-
6-Bureau	Mur - A, B, C, D - BA13 et Tapisserie	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Lambris bois	-	-	-
	Faux plafond 120x60 - Fibreux compact	-	-	-
	Porte - A - Bois et Peinture	-	-	-
	Fenêtre - C - Bois et Peinture	-	-	-
	Grille - C - Métal et Peinture	-	-	-
7-Vestiaire	Radiateur elec - D -	-	-	-
	Radiateur elec - B -	-	-	-
	Sol - Béton et Carrelage	-	-	-
	Plafond 60x60 - Fibreux compact 2006	-	-	-
	Mur - A - Enduit ciment et Toile de verre peint	-	-	-
	Mur - B, C, D - BA13 et Toile de verre peint	-	-	-
	Porte - A - bois et Peinture	-	-	-
	Grilles - C - Metal et Peinture	-	-	-
	Fenêtres - C - Bois et Peinture	-	-	-
	Plinthes - Carrelages	-	-	-
8-Magasin	Sol - Béton	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Enduit ciment et BA13 et Peinture	-	-	-
	Faux plafond 120x60 - Laine de verre et pack alu	-	-	-
	Grilles - C - Métal et peinture	-	-	-
	Fenêtres - C - Métal et peinture	-	-	-
	Porte - A - Métal	-	-	-
9-Magasin	Sol - Béton	-	-	-
	Mur - A - BA13 et Peinture	-	-	-
	Mur - B, C, D - Enduit ciment et Peinture	-	-	-
	Faux plafond 120x60 - Laine de verre et pack alu	-	-	-
	Fenêtres - C - Métal et peinture	-	-	-
	Porte 1 - A - Bois	-	-	-
	Porte 2 - D - Bois et Peinture	-	-	-
10-Magasin	Sol - Béton	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Enduit ciment et Peinture	-	-	-
	Faux plafond 120x60 - Fibreux compact	-	-	-
	Fenêtres 1 - A - Bois et peinture	-	-	-
	Fenêtres 2 - C - Bois et peinture	-	-	-
	Grilles - C - Bois et peinture	-	-	-
	Porte 1 - A - Bois et Peinture	-	-	-
	Porte 2 - B - Bois et Peinture	-	-	-
	Radiateurs - A - Acier et Peinture	-	-	-
11-Sanitaires	Radiateur - C - Métal et Peinture	-	-	-
	Porte - A - Bois et Peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C - Faïences	-	-	-
	Cloison de separation - BA13 Neuf et peintureet faiences	-	-	-
	Mur - D - Faïences	-	-	-
	Faux Plafond 120x60 - Compact goutte d'eau	-	-	-
	Plinthes - Carrelages	-	-	-
	Sol - Béton et Carrelage	-	-	-
	Fenêtre - C - Aluminium	-	-	-
	Grilles - C - Metal et Peinture	-	-	-
	Évacuation - PVC	-	-	-
12-WC	Radiateur - D - Métal et Peinture	-	-	-
	Porte - A - Bois et Peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Faïences	-	-	-
	Faux Plafond 120x60 - Compact zèbre	-	-	-
	Faux Plafond 120x60 - Compact goutte d'eau	-	-	-

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores
	Plinthes - Carrelages	-	-	-
	Sol - Béton et Carrelage	-	-	-
	Fenêtre - C - Aluminium	-	-	-
	Grilles - C - Metal et Peinture	-	-	-
13-Bureau	Sol - Béton et Carrelage	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Brique, enduits ciments et Toile de verre peint	-	-	-
	Faux plafond 60x60 - Fibreux compact	-	-	-
	Fenêtre - C - Bois et peinture	-	-	-
	Grilles - C - Métal et peinture	-	-	-
	Plinthes A/D - pvc et peinture	-	-	-
	Porte 1 - A - Bois et Peinture	-	-	-
	Porte 2 - B - Bois et Peinture	-	-	-
	Radiateurs - B - Acier et Peinture	-	-	-
14-Bureau	Sol - Béton et Carrelage	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Brique, enduits ciments et Toile de verre peint	-	-	-
	Faux plafond 60x60 - Fibreux compact	-	-	-
	Grilles - C - Métal et peinture	-	-	-
	Plinthes A/D - pvc et peinture	-	-	-
	Porte 1 - A - Bois et Peinture	-	-	-
	Porte 2 - B - Bois et Peinture	-	-	-
	Porte 4 - D - Bois et Peinture	-	-	-
	Radiateurs - A - Acier et Peinture	-	-	-
15-Bureau	Sol - béton et carrelage	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Brique, enduits ciments et toile de verre peinte	-	-	-
	Faux plafond 60x60 - Fibreux compact	-	-	-
	Grilles - B - Métal et peinture	-	-	-
	Plinthes A/D - pvc et peinture	-	-	-
	Porte 1 - A - bois et peinture	-	-	-
	Porte 2 - D - bois et peinture	-	-	-
	Radiateurs - B - Acier et Peinture	-	-	-
16-NBC	Sol - Béton	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Brique,enduit ciment et Peinture	-	-	-
	Plafond sous rampants - Lambris bois et Peinture	-	-	-
	Fenêtre - D - Bois et Peinture	-	-	-
	Porte - A - Bois et Peinture	-	-	-
	Grille - D - Métal et Peinture	-	-	-
17-Entrée /Sortie	Sol - Béton	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Brique,enduit ciment et Peinture	-	-	-
	Plafond sous rampants - Lambris bois et Peinture	-	-	-
	Porte - AB - Bois et Peinture	-	-	-
	Porte - D - Métal et Peinture	-	-	-
18-Magasin Trans	Sol - Béton et Synthétique non collée	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Briques,enduit ciment et Peinture	-	-	-
	Plafond - Bois et Peinture	-	-	-
	Faux Plafond - Marque amstrong	-	-	-
	Fenêtre 1 - A - Bois et Peinture	-	-	-
	Fenêtre 2 - C - Bois et Peinture	-	-	-
	Grilles - A, C - Métal et Peinture	-	-	-
	Porte - A - Bois et Peinture	-	-	-
19-Magasin	Sol - Béton et Dalles bleue	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Brique,enduit ciment et peinture	-	-	-
	Plafond sous rampants - lambris bois et peinture	-	-	-
	Porte - A - Bois et peinture	-	-	-

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores
	Radiateurs - B - Métal et Peinture	-	-	-
	Grille - C - Métal et peinture	-	-	-
	Fenêtres - C - Bois et peinture	-	-	-
20-Chaufferie	Sol - Béton	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Briques,enduit ciment et peinture	-	-	-
	Plafond - BA13 et peinture	-	-	-
	Grilles - B - Métal et peinture	-	-	-
	Fenêtre - B - Métal et peinture	-	-	-
	Porte - A - Métal et peinture	-	-	-
	Chaudière. Fioul - Viessmann 1998	-	-	-
20'-Rangement	Sol - béton	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Enduit ciment et Peinture	-	-	-
	Plafond - Bac acier vermiculite	-	-	-
	Porte - A - bois et peinture	-	-	-
	Calorifugeages - B - Bande de plâtre et Peinture	-	-	-
21-Vestiaire	Sol - Béton et Carrelage	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Brique,enduit ciment et peinture	-	-	-
	Plafond - Enduit ciment et peinture	-	-	-
	Fenêtres - C - Bois et peinture	-	-	-
	Grilles - C - Métal et peinture	-	-	-
	Porte - A - Bois et peinture	-	-	-
22-Salle de detente	Sol - béton et Carrelage	-	-	-
	Plafond - Enduit ciment et Toile de verre peint	-	-	-
	Mur - A - Brique,enduit ciment et Toile de verre Peint	-	-	-
	Mur coin cuisine - A - Faïences	-	-	-
	Mur - B, C, D - Brique,enduit ciment et Toile de verre Peint	-	-	-
	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Grilles - C - Métal et peinture	-	-	-
	Fenêtre - C - PVC	-	-	-
	Porte - A - bois et peinture	-	-	-
	Radiateurs - B - Métal et Peinture	-	-	-
23-Vestiaire	Sol - béton et Synthétique non collée	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Enduit ciment et Peinture	-	-	-
	Faux Plafond 60x60 - Fibreux compact laine de verre	-	-	-
	Grilles - D - Métal et peinture	-	-	-
	Fenêtre - D - Bois et peinture	-	-	-
	Porte - A - Bois et Peinture	-	-	-
	Radiateur - D - Métal	-	-	-
24-Bureau Chef atelier	Sol - béton et Carrelage	-	-	-
	Mur - A, B, C, D, E, F - Briques,enduit ciment et Peinture	-	-	-
	Faux Plafond 60x60 - Fibreux compact	-	-	-
	Plinthes A/F - Carrelage	-	-	-
	Fenêtres - C - Bois et peinture	-	-	-
	Grilles - C - Métal et peinture	-	-	-
	Porte 1 - A - Métal et Peinture	-	-	-
	Porte 2 - B - Bois et Peinture	-	-	-
	Cadre de porte - F - Bois et Peinture	-	-	-
	Radiateurs - C - Métal et Peinture	-	-	-
25-Bureau	Radiateur elec - B - Métal	-	-	-
	Sol - béton	-	-	-
	Mur - A, B, D - Briques,enduit ciment et Peinture	-	-	-
	Mur - C - BA13 et Peinture	-	-	-
	Faux Plafond 60x60 - Fibreux compact laine de verre	-	-	-

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores
25-Bureau	Cadre de porte - A - Bois et Peinture	-	-	-
	Porte - D - Bois	-	-	-
26-Magasin pièces détachées	Radiateur - C - Métal	-	-	-
	Sol - béton	-	-	-
	Mur - B, C, D, E - Enduit ciment et Peinture	-	-	-
	Mur - A - BA13 et Peinture	-	-	-
	Faux Plafond 60x60 - Fibreux compact laine de verre	-	-	-
	Fenêtre - C - Bois et peinture	-	-	-
	Grille - C - Métal et peinture	-	-	-
	Porte 1 - A - Bois et Peinture	-	-	-
	Porte 2 - C - Métal et Peinture	-	-	-
	Cadre Porte 3 - E - Métal et Peinture	-	-	-
27-Magasin	Sol - béton	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Enduit ciment et Peinture	-	-	-
	Faux Plafond 60x60 - Fibreux compact laine de verre	-	-	-
	Porte - B - Bois et Peinture	-	-	-
28-ESC/Palier	Balustrade - Métal et peinture	-	-	-
	Main courante - B - Métal et peinture	-	-	-
	Escalier et coursive - Métal	-	-	-
29-Secrétariat	Mur - A, B, C, D - Brique enduit ciments et peinture	-	-	-
	Plafond 120x60 - Fibreux compact	-	-	-
	Porte - A - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre 3 - A - Bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre 1 - B - Métal et peinture	-	-	-
	Fenêtre 2 - C - Bois et peinture	-	-	-
	Radiateur - D - Métal et Peinture	-	-	-
30-Bureau Chef	Mur - A, B, C, D - Brique enduit ciments et peinture	-	-	-
	Plafond 60x60 - Plaque compact	-	-	-
	Porte - A - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre - C - Bois et peinture	-	-	-
	Radiateur - A - Métal et Peinture	-	-	-
31-Air de lavage zone extérieur	Sol - Béton	-	-	-
1-Atelier	Mur - A - Structure et Bac acier et Peinture	-	-	-
	Mur - B, C, D - Structure acier et Peinture	-	-	-
	Mur - B, C, D - Briques,enduit et Peinture	-	-	-
	Plafond - Bac acier et Peinture	-	-	-
	Plafond - Bac onduline acier	-	-	-
	Plafond - Structure acier et Peinture	-	-	-
	Piliers centraux - Acier et Peinture	-	-	-
	Sol marquage - Jaune et Peinture	-	-	-
	Fenêtre 1 - B - Métal et Peinture	-	-	-
	Fenêtre 2 - C - Métal et Peinture	-	-	-
	Fenêtre 3 - D - Métal et Peinture	-	-	-
	Portes electrique - A - Métal isolé extrudé	-	-	-
	Descente EP - PVC	-	-	-
	Porte 1 - B - Métal et Peinture	-	-	-
	Porte 2 - D - Métal et Peinture	-	-	-
2-Réserve	Sol - Béton	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Enduit ciment et Peinture	-	-	-
	Faux plafond 120x80 - Laine de verre+pack alu	-	-	-
	Structure plafond - Acier	-	-	-
	Porte 1 - A - Bois et Peinture	-	-	-
	Porte 2 - B - Bois et Peinture	-	-	-
	Pilier - D - Acier et Peinture	-	-	-

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores
	Descente EP - D - PVC et Peinture	-	-	-
3-Réserves	Sol - Béton	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Enduit ciment et Peinture	-	-	-
	Faux plafond 120x80 - Laine de verre+pack alu	-	-	-
	Structure plafond - Acier	-	-	-
	Porte - A - Bois et Peinture	-	-	-
4-Rangement	Sol - Béton	-	-	-
	Mur - A - Briques,enduit et peinture	-	-	-
	Mur - B - Briques,enduit	-	-	-
	Mur - C - Bac acier et Peinture	-	-	-
	Piliers centraux - Acier et peinture	-	-	-
	Porte - A - Bois et Peinture	-	-	-
	Poteaux - D - Acier et Peinture	-	-	-
	Plafond - Bac acier	-	-	-
5-Bureau	Sol - Béton et peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C - Briques,enduit et peinture	-	-	-
	Mur - D - BA13 et peinture	-	-	-
	Faux plafond 120x80 - Laine de verre+pack alu	-	-	-
	Fenêtre - A - Bois et Peinture	-	-	-
	Porte - A - Bois et Peinture	-	-	-
6-Bureau	Mur - A, B, C, D - BA13 et Tapisserie	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Lambris bois	-	-	-
	Faux plafond 120x60 - Fibreux compact	-	-	-
	Porte - A - Bois et Peinture	-	-	-
	Fenêtre - C - Bois et Peinture	-	-	-
	Grille - C - Métal et Peinture	-	-	-
7-Vestiaire	Radiateur elec - D -	-	-	-
	Radiateur elec - B -	-	-	-
	Sol - Béton et Carrelage	-	-	-
	Plafond 60x60 - Fibreux compact 2006	-	-	-
	Mur - A - Enduit ciment et Toile de verre peint	-	-	-
	Mur - B, C, D - BA13 et Toile de verre peint	-	-	-
	Porte - A - bois et Peinture	-	-	-
	Grilles - C - Metal et Peinture	-	-	-
	Fenêtres - C - Bois et Peinture	-	-	-
	Plinthes - Carrelages	-	-	-
8-Magasin	Sol - Béton	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Enduit ciment et BA13 et Peinture	-	-	-
	Faux plafond 120x60 - Laine de verre et pack alu	-	-	-
	Grilles - C - Métal et peinture	-	-	-
	Fenêtres - C - Métal et peinture	-	-	-
	Porte - A - Métal	-	-	-
9-Magasin	Sol - Béton	-	-	-
	Mur - A - BA13 et Peinture	-	-	-
	Mur - B, C, D - Enduit ciment et Peinture	-	-	-
	Faux plafond 120x60 - Laine de verre et pack alu	-	-	-
	Fenêtres - C - Métal et peinture	-	-	-
	Porte 1 - A - Bois	-	-	-
	Porte 2 - D - Bois et Peinture	-	-	-
10-Magasin	Sol - Béton	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Enduit ciment et Peinture	-	-	-
	Faux plafond 120x60 - Fibreux compact	-	-	-
	Fenêtres 1 - A - Bois et peinture	-	-	-
	Fenêtres 2 - C - Bois et peinture	-	-	-
	Grilles - C - Bois et peinture	-	-	-
	Porte 1 - A - Bois et Peinture	-	-	-
	Porte 2 - B - Bois et Peinture	-	-	-
	Radiateurs - A - Acier et Peinture	-	-	-
11-Sanitaires	Radiateur - C - Métal et Peinture	-	-	-

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores
11-Sanitaires	Porte - A - Bois et Peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C - Faïences	-	-	-
	Cloison de separation - BA13 Neuf et peintureet faiences	-	-	-
	Mur - D - Faïences	-	-	-
	Faux Plafond 120x60 - Compact goutte d'eau	-	-	-
	Plinthes - Carrelages	-	-	-
	Sol - Béton et Carrelage	-	-	-
	Fenêtre - C - Aluminium	-	-	-
	Grilles - C - Metal et Peinture	-	-	-
	Évacuation - PVC	-	-	-
12-WC	Radiateur - D - Métal et Peinture	-	-	-
	Porte - A - Bois et Peinture	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Faïences	-	-	-
	Faux Plafond 120x60 - Compact zèbre	-	-	-
	Faux Plafond 120x60 - Compact goutte d'eau	-	-	-
	Plinthes - Carrelages	-	-	-
	Sol - Béton et Carrelage	-	-	-
	Fenêtre - C - Aluminium	-	-	-
	Grilles - C - Metal et Peinture	-	-	-
13-Bureau	Sol - Béton et Carrelage	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Brique, enduits ciments et Toile de verre peint	-	-	-
	Faux plafond 60x60 - Fibreux compact	-	-	-
	Fenêtre - C - Bois et peinture	-	-	-
	Grilles - C - Métal et peinture	-	-	-
	Plinthes A/D - pvc et peinture	-	-	-
	Porte 1 - A - Bois et Peinture	-	-	-
	Porte 2 - B - Bois et Peinture	-	-	-
	Radiateurs - B - Acier et Peinture	-	-	-
14-Bureau	Sol - Béton et Carrelage	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Brique, enduits ciments et Toile de verre peint	-	-	-
	Faux plafond 60x60 - Fibreux compact	-	-	-
	Grilles - C - Métal et peinture	-	-	-
	Plinthes A/D - pvc et peinture	-	-	-
	Porte 1 - A - Bois et Peinture	-	-	-
	Porte 2 - B - Bois et Peinture	-	-	-
	Porte 4 - D - Bois et Peinture	-	-	-
	Radiateurs - A - Acier et Peinture	-	-	-
15-Bureau	Sol - béton et carrelage	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Brique, enduits ciments et toile de verre peinte	-	-	-
	Faux plafond 60x60 - Fibreux compact	-	-	-
	Grilles - B - Métal et peinture	-	-	-
	Plinthes A/D - pvc et peinture	-	-	-
	Porte 1 - A - bois et peinture	-	-	-
	Porte 2 - D - bois et peinture	-	-	-
	Radiateurs - B - Acier et Peinture	-	-	-
16-NBC	Sol - Béton	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Brique,enduit ciment et Peinture	-	-	-
	Plafond sous rampants - Lambris bois et Peinture	-	-	-
	Fenêtre - D - Bois et Peinture	-	-	-
	Porte - A - Bois et Peinture	-	-	-
	Grille - D - Métal et Peinture	-	-	-
17-Entrée /Sortie	Sol - Béton	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Brique,enduit ciment et Peinture	-	-	-
	Plafond sous rampants - Lambris bois et Peinture	-	-	-

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores
17-Entrée /Sortie	Porte - AB - Bois et Peinture	-	-	-
	Porte - D - Métal et Peinture	-	-	-
18-Magasin Trans	Sol - Béton et Synthétique non collée	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Briques,enduit ciment et Peinture	-	-	-
	Plafond - Bois et Peinture	-	-	-
	Faux Plafond - Marque amstrong	-	-	-
	Fenêtre 1 - A - Bois et Peinture	-	-	-
	Fenêtre 2 - C - Bois et Peinture	-	-	-
	Grilles - A, C - Métal et Peinture	-	-	-
	Porte - A - Bois et Peinture	-	-	-
19-Magasin	Sol - Béton et Dalles bleue	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Brique,enduit ciment et peinture	-	-	-
	Plafond sous rampants - lambris bois et peinture	-	-	-
	Porte - A - Bois et peinture	-	-	-
	Radiateurs - B - Métal et Peinture	-	-	-
	Grille - C - Métal et peinture	-	-	-
	Fenêtres - C - Bois et peinture	-	-	-
20-Chaufferie	Sol - Béton	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Briques,enduit ciment et peinture	-	-	-
	Plafond - BA13 et peinture	-	-	-
	Grilles - B - Métal et peinture	-	-	-
	Fenêtre - B - Métal et peinture	-	-	-
	Porte - A - Métal et peinture	-	-	-
	Chaudière. Fioul - Viessmann 1998	-	-	-
20'-Rangement	Sol - béton	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Enduit ciment et Peinture	-	-	-
	Plafond - Bac acier vermiculite	-	-	-
	Porte - A - bois et peinture	-	-	-
	Calorifugeages - B - Bande de plâtre et Peinture	-	-	-
21-Vestiaire	Sol - Béton et Carrelage	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Brique,enduit ciment et peinture	-	-	-
	Plafond - Enduit ciment et peinture	-	-	-
	Fenêtres - C - Bois et peinture	-	-	-
	Grilles - C - Métal et peinture	-	-	-
	Porte - A - Bois et peinture	-	-	-
22-Salle de detente	Sol - béton et Carrelage	-	-	-
	Plafond - Enduit ciment et Toile de verre peint	-	-	-
	Mur - A - Brique,enduit ciment et Toile de verre Peint	-	-	-
	Mur coin cuisine - A - Faïences	-	-	-
	Mur - B, C, D - Brique,enduit ciment et Toile de verre Peint	-	-	-
	Plinthes - Carrelage	-	-	-
	Grilles - C - Métal et peinture	-	-	-
	Fenêtre - C - PVC	-	-	-
	Porte - A - bois et peinture	-	-	-
	Radiateurs - B - Métal et Peinture	-	-	-
23-Vestiaire	Sol - béton et Synthétique non collée	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Enduit ciment et Peinture	-	-	-
	Faux Plafond 60x60 - Fibreux compact laine de verre	-	-	-
	Grilles - D - Métal et peinture	-	-	-
	Fenêtre - D - Bois et peinture	-	-	-
	Porte - A - Bois et Peinture	-	-	-
	Radiateur - D - Métal	-	-	-

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores
24-Bureau Chef atelier	Sol - béton et Carrelage	-	-	-
	Mur - A, B, C, D, E, F - Briques,enduit ciment et Peinture	-	-	-
	Faux Plafond 60x60 - Fibreux compact	-	-	-
	Plinthes A/F - Carrelage	-	-	-
	Fenêtres - C - Bois et peinture	-	-	-
	Grilles - C - Métal et peinture	-	-	-
	Porte 1 - A - Métal et Peinture	-	-	-
	Porte 2 - B - Bois et Peinture	-	-	-
	Cadre de porte - F - Bois et Peinture	-	-	-
	Radiateurs - C - Métal et Peinture	-	-	-
25-Bureau	Radiateur elec - B - Métal	-	-	-
	Sol - béton	-	-	-
	Mur - A, B, D - Briques,enduit ciment et Peinture	-	-	-
	Mur - C - BA13 et Peinture	-	-	-
	Faux Plafond 60x60 - Fibreux compact laine de verre	-	-	-
	Cadre de porte - A - Bois et Peinture	-	-	-
	Porte - D - Bois	-	-	-
26-Magasin pièces détachées	Radiateur - C - Métal	-	-	-
	Sol - béton	-	-	-
	Mur - B, C, D, E - Enduit ciment et Peinture	-	-	-
	Mur - A - BA13 et Peinture	-	-	-
	Faux Plafond 60x60 - Fibreux compact laine de verre	-	-	-
	Fenêtre - C - Bois et peinture	-	-	-
	Grille - C - Métal et peinture	-	-	-
	Porte 1 - A - Bois et Peinture	-	-	-
	Porte 2 - C - Métal et Peinture	-	-	-
	Cadre Porte 3 - E - Métal et Peinture	-	-	-
27-Magasin	Sol - béton	-	-	-
	Mur - A, B, C, D - Enduit ciment et Peinture	-	-	-
	Faux Plafond 60x60 - Fibreux compact laine de verre	-	-	-
	Porte - B - Bois et Peinture	-	-	-
HM9- 1er étage				
28-ESC/Palier	Balustrade - Métal et peinture	-	-	-
	Main courante - B - Métal et peinture	-	-	-
	Escalier et coursive - Métal	-	-	-
29-Secrétariat	Mur - A, B, C, D - Brique enduit ciments et peinture	-	-	-
	Plafond 120x60 - Fibreux compact	-	-	-
	Porte - A - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre 3 - A - Bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre 1 - B - Métal et peinture	-	-	-
	Fenêtre 2 - C - Bois et peinture	-	-	-
	Radiateur - D - Métal et Peinture	-	-	-
30-Bureau Chef	Mur - A, B, C, D - Brique enduit ciments et peinture	-	-	-
	Plafond 60x60 - Plaque compact	-	-	-
	Porte - A - bois et peinture	-	-	-
	Fenêtre - C - Bois et peinture	-	-	-
	Radiateur - A - Métal et Peinture	-	-	-
Extérieur				
31-Air de lavage	Sol - Béton	-	-	-

« - » : absence d'indice d'infestation par un agent de dégradation biologique du bois

Nota : Le présent constat n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité au constat de présence ou d'absence d'agents de dégradation biologique du bois.

E. – Identification des parties d'immeubles n'ayant pu être visitées et justification :

Néant

F. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification :

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
Néant	-	

Nota : notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.

G. - Constatations diverses :

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Observations et constatations diverses	Photos
Néant	-	-	

H. - Moyens d'investigation utilisés :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-200 – Mai 2016.

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux

Sondage manuel systématique à l'aide d'un poinçon.
Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations.
À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.
Pour chacun des éléments inspectés, le type d'outil utilisé est précisé

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :
Les plans du bâti
Informations communiquées à l'opérateur par le donneur d'ordre, concernant des traitements antérieurs ou une présence de termites dans le bâtiment :
Néant
Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
La responsable du magasin sur place
Commentaires (Ecart par rapport à la norme, …) :
Le diagnostic se limite aux zones rendues visibles et accessibles par le propriétaire

I. - Conclusions :

Conclusion relative à la présence de termites :

Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.

Nota 1 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation. Pour faciliter cette déclaration, un modèle de déclaration peut vous être fourni sur demande.

Conclusion relative à la présence d'autres agents de dégradation du bois :

Il n'a pas été repéré d'indice de présence d'autres agents de dégradation biologique du bois.

Nota 2 : Dans le cas de la présence de mérule, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue à l'article L 133-7 du code de la construction et de l'habitation. Pour faciliter cette déclaration, un modèle de déclaration peut vous être fourni sur demande.

Récapitulatif des agents de dégradation observés :

Termites :

Agents de dégradation	Traces observées	Localisation
Néant	-	-

Parasites :

Agents de dégradation	Traces observées	Localisation
Néant	-	-

Champignons :


Agents de dégradation	Traces observées	Localisation
Néant	-	-


L'identification détaillée de l'immeuble visité figure en partie D de ce rapport de repérage.

Fait à **Saint Jean d'Illac**, le **07/06/2021**
Par : RABEAU VIRGINIE

Inspection Bâtiment Atlantique (IBA)
39,Impasse Frédéric Mistral 33127 St Jean d'illac
Port : 06.52.14.37.98 Fax : 08.26.99.52.14
vrabeau@ibadiag.com RCS 791276868 de Bx
Siret: 791 276 868 00019 Code APE 7120 TVA
intra FR 56 791276868 SARL au capital de 3000€

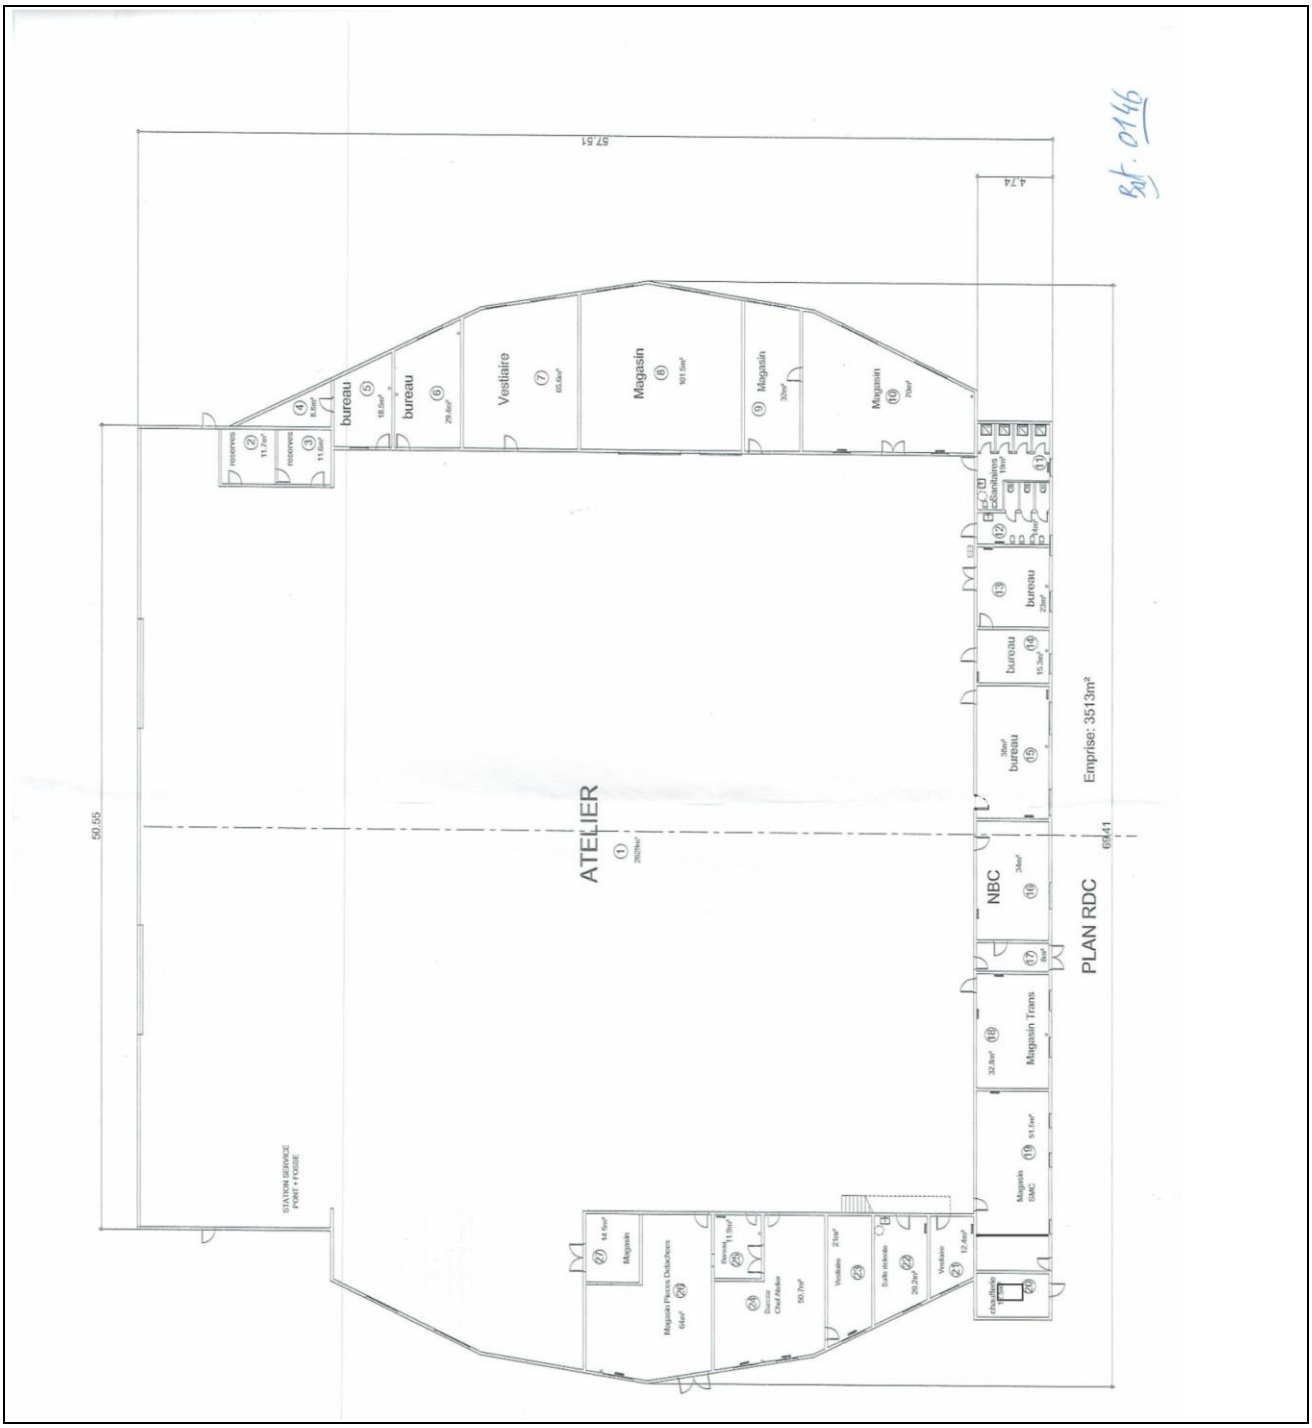Annexe – Croquis de repérage

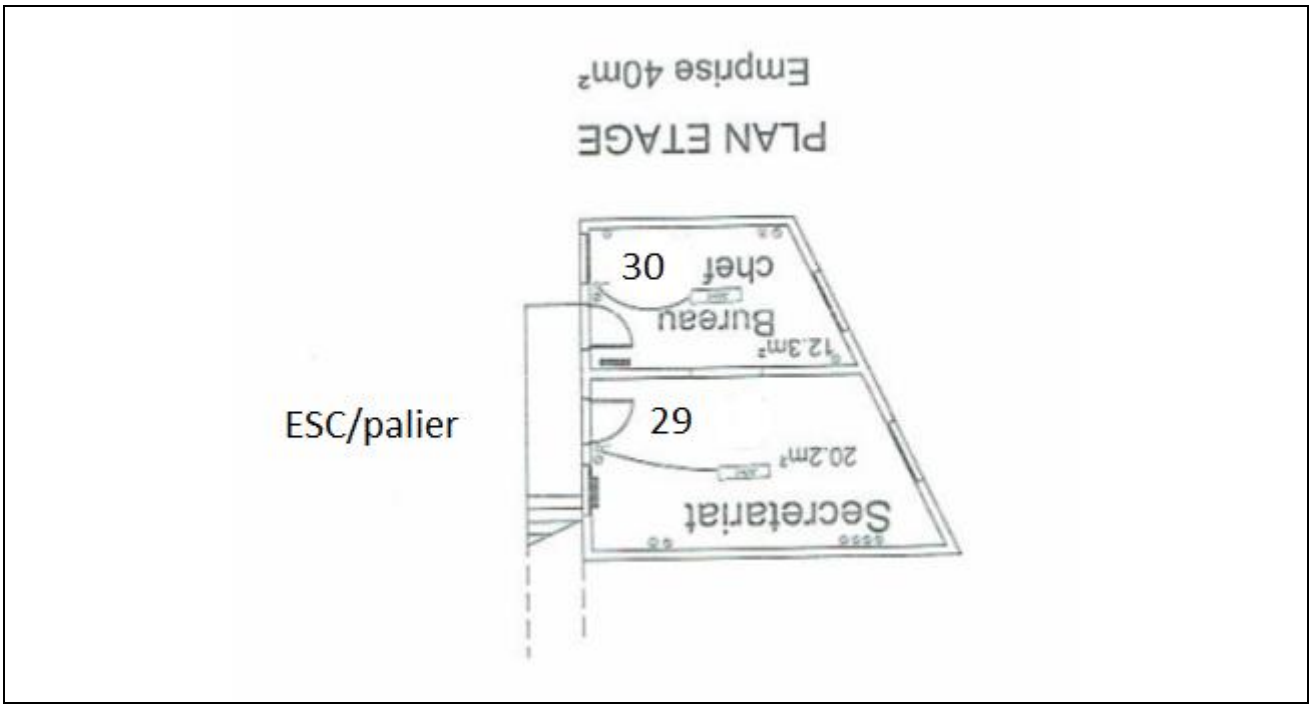
57.51
4.74
bureau
bureau
Vestiaire
Magasin
Magasin
Magasin
Sanitaires
bureau
bureau
bureau
Emprise: 3513m²
50.55
ATELIER
NBC
Magasin Trans
Magasin SMC
PLAN RDC
68.41
STATION SERVICE POINT + FOSSE
Magasin
Magasin Pieces Detachees
Bureau Chef Atelier
Vestiaire
Vestiaire
Vestiaire



Annexe – Ordre de mission / Assurance / Attestation sur l'honneur

Le bon de commande 1510441922 du 16/12/2020 est attaché au devis DE20-0597

Cabinet CONDORCET
AUDIT ET COURTAGE EN ASSURANCE

Allianz

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 2 Rue Grignan – 13001 Marseille, attestons par la présente que la Société :

INSPECTION BATIMENT ATLANTIQUE
39 IMPASSE FREDERIC MISTRAL
33127 ST JEAN D ILLAC
Siret n°791 276 868 00019

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, un contrat d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier », sous le numéro N°86517808/ 80810566.

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : **DIAGNOSTIC IMMOBILIER :**

Assainissement Autonome - Collectif
Attestation de prise en compte de la réglementation thermique
Audit énergétique sans préconisation de travaux
Certificat de décence (loi SRU 2000-1208 SRU du 13/12/2000)
Certificat de norme d'habitabilité dans le cadre de l'obtention d'un prêt conventionné et/ou d'un prêt à taux zéro
Coordination SPS
Diagnostic Accessibilité (Hors ERP)
Diagnostic acoustique
Diagnostic amiante avant travaux / démolition sans préconisation de travaux
Diagnostic amiante avant vente
Diagnostic Amiante dans les Parties Privatives
Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux (Hors milieu industriel)
Diagnostic de performance énergétique
Diagnostic humidité
Diagnostic Légionellose
Diagnostic monoxyde de carbone
Diagnostic Plomb dans l'eau
Diagnostic radon
Diagnostic sécurité piscine
Diagnostic surface habitable Loi Boutin
Diagnostic Technique SRU
Diagnostic termites
Document Unique
Dossier technique amiante
DRIPP- Diagnostic de risque d'intoxication au plomb
Etat de l'installation intérieure de l'électricité des parties privatives et communes (DTT)
Etat des installations de gaz (Dossier de diagnostic technique)
Etat des lieux locatifs
Etat des risques et pollutions
Etat parasitaire
Etude thermique règlementaire RT 2005
Etude thermique règlementaire RT 2012
Evaluation Périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
Evaluation valeur vénale et locative
Exposition au plomb (CREP)
Loi Carrez
Loi Scellier
Millièmes de copropriété
Recherche de métaux lourds(Hors Détection toxique chez l'Homme)
Recherche de plomb avant travaux/Démolition
Risques naturels et technologiques
Test d'infiltrométrie sur l'enveloppe des bâtiments
Thermographie infrarouge
Vérification des équipements et installations incendie (Hors ERP)
Vérifications générales périodiques électricité
Vérifications générales périodiques gaz

La garantie du contrat porte exclusivement :

- **Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus,**
- **Et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications correspondantes exigées par la réglementation**

Tél. : 09 72 36 90 00
2 rue Grignan 13001 Marseille
contact@cabinetcondorcet.com • www.cabinetcondorcet.com
Service Réclamation : contact@cabinetcondorcet.com - 2 Rue Grignan 13001 Marseille 09 72 36 90 00
SAS au capital de 50 000 € - RCS Marseille 494 253 982 - Immatriculation ORIAS 07 026 627 www.orias.fr - Sous le contrôle de l'ACPR
Autorité de contrôle Prudentiel et Résolution - 61 Rue Taitbout 75009 Paris

Cabinet CONDORCET
AUDIT ET COURTAGE EN ASSURANCE

Allianz

Période de validité : **du 01/10/2020 au 30/09/2021**

L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations.

La Société ALLIANZ garantit l'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales n° COM08813, des conventions spéciales n° DIG20704 et des conditions particulières (feuillet d'adhésion 80810566), établies sur les bases des déclarations de l'adhérent. Les garanties sont subordonnées au paiement des cotisations d'assurances pour la période de la présente attestation.

Tél. : 09 72 36 90 00
2 rue Grignan 13001 Marseille
contact@cabinetcondorcet.com • www.cabinetcondorcet.com
Service Réclamation : contact@cabinetcondorcet.com - 2 Rue Grignan 13001 Marseille 09 72 36 90 00
SAS au capital de 50 000 € - RCS Marseille 494 253 982 - Immatriculation ORIAS 07 026 627 www.orias.fr - Sous le contrôle de l'ACPR
Autorité de contrôle Prudentiel et Résolution - 61 Rue Taitbout 75009 Paris

Cabinet CONDORCET
AUDIT ET COURTAGE EN ASSURANCE

Allianz


TABLEAU DE GARANTIE

Responsabilité civile « Exploitation »	
Nature des dommages	**Montant des garanties**
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	9 000 000 € par sinistre
dont :	
- Dommages matériels et immatériels consécutifs :	1 500 000 € par sinistre
- Dommages immatériels non consécutifs :	150 000 € par année d'assurance
- Atteintes à l'environnement accidentelles (corporels, matériels et immatériels) :	750 000 € par année d'assurance
- Dommages aux bâtiments loués ou empruntés et à leur contenu	300 000 € par sinistre
Responsabilité civile « Professionnelle » ***(garantie par Assuré)***	
Nature des dommages	**Montant des garanties**
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	600 000 € par sinistre avec un maximum de 600 000 € par année d'assurance
dont :	
- Destruction ou détérioration des documents et autres supports d'informations confiés à l'Assuré pour l'exécution des prestations, y compris les frais de reconstitution des informations :	30 000 € par sinistre
Défense – Recours	
Défense devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives. Défense des intérêts civils devant les juridictions répressives :	Frais à la charge de l'Assureur, sauf dépassement du plafond de garantie en cause.
Recours (préjudices supérieurs à 150 €) :	15 000 € par sinistre

La présente attestation ne peut engager l'assureur en dehors des limites prévues par les clauses et conditions du contrat auxquelles elle se réfère.

Fait à Marseille, le 18 septembre 2020

POUR LE CABINET CONDORCET



Tél. : 09 72 36 90 00
2 rue Grignan 13001 Marseille
contact@cabinetcondorcet.com • www.cabinetcondorcet.com
Service Réclamation : contact@cabinetcondorcet.com - 2 Rue Grignan 13001 Marseille 09 72 36 90 00
SAS au capital de 50 000 € - RCS Marseille 494 253 982 - Immatriculation ORIAS 07 026 627 www.orias.fr - Sous le contrôle de l'ACPR
Autorité de contrôle Prudentiel et Résolution - 61 Rue Taitbout 75009 Paris

QUALIXPERT

Certificat N° C0188

Madame Virginie RABEAU

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N° 4-0094 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Amiante avec mention	**Certificat valable Du 10/07/2017 au 09/07/2022**	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Constat de risque d'exposition au plomb	**Certificat valable Du 23/04/2019 au 22/04/2024**	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	**Certificat valable Du 14/11/2018 au 13/11/2023**	Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Date d'établissement le mardi 23 avril 2019

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

F09 Certification de compétence version M 250119

ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° **IBA/2101/0584-HM9** relatif à l'immeuble bâti visité situé au :

BASE AERIENNE 118 (BA118) HM9
Avenue du Colonnel Rozanoff
Projet COGA 40000 MONT-DE-MARSAN.

Je soussignée, **RABEAU VIRGINIE**, technicienne de la construction pour la société **IBA (Inspection Bâtiment Atlantique)** atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :


- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences :

Prestations	Nom du diagnostiqueur	Entreprise de certification	N° Certification	Echéance certif
Termites	RABEAU VIRGINIE	LCC QUALIXPERT	C0188	13/11/2023 (Date d'obtention : 14/11/2018)
Amiante Mention				09/07/2022 (Date d'obtention : 10/07/2017)
Plomb				22/04/2024 (Date d'obtention : 23/04/2019)

- Avoir souscrit à une assurance (ALLIANZ n° 80810566 valable jusqu'au 30 09 2021) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.
-

Fait à SAINT JEAN D ILLAC , le **07/06/2021**

Signature de l'opérateur de diagnostics :



Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation

« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »

I.B.A
Inspection Bâtiment Atlantique

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

(Hors champ du code de la santé publique)

Numéro de dossier : IBA/2101/0584-HM9
Date du repérage : 26/01/2021

Adresse du bien immobilier

Localisation du ou des bâtiments :
Département :... **Landes**
Adresse : ..... **BASE AERIENNE 118 (BA118)**
Avenue du Colonnel Rozanoff
Projet COGA
Commune : ..... **40000 MONT-DE-MARSAN**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
HM9 Lot numéro Non communiqué,
Année de construction :
1940

Donneur d'ordre / Propriétaire :

Donneur d'ordre :
ESID BX - ASC 1 BROCHARD Romain " Architecte du Pôle maîtrise d'œuvre"
Division Investissement/ Pôle Maîtrise d'œuvre Interne
Caserne Pelleport
9 rue de Cursol
CS 21152
33068 BORDEAUX CEDEX (France)

Propriétaire :
Ministère de la défense
Bon de comande n° 1510441922

Le Diagnostic suivant concerne

X	Les parties privatives		Avant la vente
	Les parties occupées		Avant la mise en location
X	Les parties communes d'un immeuble	X	Avant travaux *N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP*

Nature des travaux : Rénovation / Réhabilitation : Non Démolition : OUI

Société réalisant le constat

Nom et prénom de l'auteur du constat	**RABEAU VIRGINIE**
N° de certificat de certification	**C0188 le 23/04/2019**
Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC	**LCC QUALIXPERT**
Organisme d'assurance professionnelle	**ALLIANZ**
N° de contrat d'assurance	**80810566**
Date de validité :	**30 09 2021**

Ce diagnostic plomb avant travaux a été rédigé par RABEAU VIRGINIE le 26/01/2021.
En mode avant travaux ou démolition le tableau des mesures fait office de conclusion.

Inspection Bâtiment Atlantique (IBA)
39,Impasse Frédéric Mistral 33127 St Jean d'Illac
Port : 06.52.14.37.98 Fax : 08.26.99.52.14
virabeau@ibadiag.com RCS 791276868 de Bx
Siret : 791 276 868 00019 Code APE 7120 TVA
intra FR 89 791276868 SARL au capital de 3000€

Objectif de la mission :

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Périmètre des travaux :

Le donneur d'ordre remet au diagnostiqueur ces informations via un tableau synthétique dont le modèle est téléchargeable sur le site de la DIRECCTE Centre : Annexe 2 Tableau de recensement des travaux établi par le donneur d'ordre ainsi qu'une description détaillée des travaux, de leur localisation et si déjà définis le nom et adresse des entreprises intervenantes. Il est important de disposer d'informations précises pour définir la stratégie de mesures.

Appareil utilisé

Nom du fabricant de l'appareil	**PROTEC**
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	**LPA1 / 3104**
Nature du radionucléide	**Cobalt 57**
Date du dernier chargement de la source	**05/11/2019**

Activité à cette date et durée de vie de la source	**444MBq**

Tableau de recensement des travaux :

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenante
Bâtiment -HM9	Démoliton totale	Non communiqué

1. Rappel des références règlementaires

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail,
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants,
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb,
- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb.

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	**PROTEC**	
Modèle de l'appareil	**LPA1**	
N° de série de l'appareil	**3104**	
Nature du radionucléide	**Cobalt 57**	
Date du dernier chargement de la source	**05/11/2019**	Activité à cette date et durée de vie : **444MBq**
Récepissé de déclaration ASN	**CODEP-BDX-2021-001615**	Date de déclaration **08/01/2021**
	(*)Justificatif d'attestation de la durée de vie de la source disponible sur demande.	
Nom du responsable de l'activitée Nucléaire	**RABEAU**	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	**Virginie RABEAU**	

Étalon : CRETAMABETH; n° NIST 2573 ; 1,00 mg/cm² +/- 0,04 mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm²)
Etalonnage entrée	1	26/01/2021	1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	604	26/01/2021	1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	**Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse**
Nom du contact	**-**
Coordonnées	**-**
Référence du rapport d'essai	**-**
Date d'envoi des prélèvements	**-**
Date de réception des résultats	**-**

Liste des locaux visités

HM9/RDC - 1-Atelier,
HM9/RDC - 2-Réserve,
HM9/RDC - 3-Réserves,
HM9/RDC - 4-Rangement,
HM9/RDC - 5-Bureau,
HM9/RDC - 6-Bureau,
HM9/RDC - 7-Vestiaire,
HM9/RDC - 8-Magasin,
HM9/RDC - 9-Magasin,
HM9/RDC - 10-Magasin,
HM9/RDC - 11-Sanitaires,
HM9/RDC - 12-WC,
HM9/RDC - 13-Bureau,
HM9/RDC - 14-Bureau,
HM9/RDC - 15-Bureau,
HM9/RDC - 16-NBC,
HM9/RDC - 17-Entrée /Sortie,
HM9/RDC - 18-Magasin Trans,
HM9/RDC - 19-Magasin,
HM9/RDC - 20-Chaufferie,
HM9/RDC - 20'-Rangement,
HM9/RDC - 21-Vestiaire,
HM9/RDC - 22-Salle de detente,
HM9/RDC - 23-Vestiaire,
HM9/RDC - 24-Bureau Chef atelier,
HM9/RDC - 25-Bureau,
HM9/RDC - 26-Magasin pièces détachées,
HM9/RDC - 27-Magasin,
HM9/1er étage - 28-ESC/Palier,
HM9/1er étage - 29-Secrétariat,
HM9/1er étage - 30-Bureau Chef,
HM9/Extérieur - 31-Air de lavage

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)
HM9/Extérieur - 31-Air de lavage (Sans objet)

3. Méthodologie employée

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

3.1 Stratégie de mesurage

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic (UD) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, …).

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire (idem réglementation du CREP).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis.
- Les mesures contenant du plomb sont indiquées en **violet** dans le tableau et sur le croquis, il est parfois additionné d'un pictogramme sur les croquis comme suit :
- Légende : 

ou /et (+) indication de mesure positive en plomb

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, …) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

5. Résultats des mesures

HM9/RDC - 1-Atelier

Nombre d'unités de diagnostic : 22

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2	A	Mur	Structure et Bac acier	Peinture	partie basse (< 1m)	0,59	
3					partie haute (> 1m)	0,66	
4	B	Mur (raidisseurs)	Structure acier	Peinture	partie basse (< 1m)	1,9	Retrait
5	C	Mur (raidisseurs)	Structure acier	Peinture	partie basse (< 1m)	2,3	Retrait
6	D	Mur (raidisseurs)	Structure acier	Peinture	partie basse (< 1m)	4,9	Retrait
7	B	Mur	Briques,enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,18	
8					partie haute (> 1m)	0,67	
9	C	Mur	Briques,enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,69	
10					partie haute (> 1m)	0,32	
11	D	Mur	Briques,enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,09	
12					partie haute (> 1m)	0,28	
13		Plafond	Bac acier	Peinture	mesure 1	0,24	
14					mesure 2	0,23	
15		Plafond	Bac onduline acier		mesure 1	0,44	TCRu
16					mesure 2	0,24	TCRu
17		Plafond	Structure acier	Peinture	mesure 1	4,8	Retrait
18		Piliers centraux	Acier	Peinture	mesure 1	0,54	
19					mesure 2	0,25	
20		Sol marquage	Jaune	Peinture	mesure 1	0,4	
21					mesure 2	0,19	
22	B	Fenêtre 1 intérieure	Métal	Peinture	partie mobile	0,46	
23					huisserie	0,09	
24	B	Fenêtre 1 extérieure	Métal	Peinture	partie mobile	0,56	
25					huisserie	0,39	
26	C	Fenêtre 2 intérieure	Métal	Peinture	partie mobile	0,6	
27					huisserie	0,02	
28	C	Fenêtre 2 extérieure	Métal	Peinture	partie mobile	0,07	
29					huisserie	0,47	
30	D	Fenêtre 3 intérieure	Métal	Peinture	partie mobile	0,45	
31					huisserie	0,66	
32	D	Fenêtre 3 extérieure	Métal	Peinture	partie mobile	0,04	
33					huisserie	0,27	
34	A	Portes electrique	Métal isolé extrudé		partie mobile	0,35	
35					huisserie	0,14	
36		Descente EP	PVC		mesure 1	0,16	
37					mesure 2	0,49	
38	B	Porte 1	Métal	Peinture	partie mobile	15	Retrait

39	D	Porte 2	Métal	Peinture	partie mobile	1,9	Retrait

HM9/RDC - 2-Réserve

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
40		Sol	Béton		mesure 1	0,54	
41					mesure 2	0,67	
42	A	Mur	Enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,07	
43					partie haute (> 1m)	0,07	
44	B	Mur	Enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,39	
45					partie haute (> 1m)	0,65	
46	C	Mur	Enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,47	
47					partie haute (> 1m)	0,58	
48	D	Mur	Enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,6	
49					partie haute (> 1m)	0,56	
-		Faux plafond 120x80	Laine de verre+pack alu			-	
50		Structure plafond	Acier		mesure 1	0,21	
51					mesure 2	0,49	
52	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	0,6	
53					huisserie	0,28	
54	B	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	0,17	
55					huisserie	0,34	
56	D	Pilier	Acier	Peinture	mesure 1	1,7	Retrait
57	D	Descente EP	PVC	Peinture	mesure 1	0,16	
58					mesure 2	0,27	

HM9/RDC - 3-Réserves

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
59		Sol	Béton		mesure 1	0,54	
60					mesure 2	0,5	
61	A	Mur	Enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,19	
62					partie haute (> 1m)	0,14	
63	B	Mur	Enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,15	
64					partie haute (> 1m)	0,44	
65	C	Mur	Enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,1	
66					partie haute (> 1m)	0,66	
67	D	Mur	Enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,11	
68					partie haute (> 1m)	0,28	
-		Faux plafond 120x80	Laine de verre+pack alu		-	-	
69		Structure plafond	Acier		mesure 1	0,7	
70					mesure 2	0,3	
71	A	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	0,07	
72					huisserie	0,39	

HM9/RDC - 4-Rangement

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
73		Sol	Béton		mesure 1	0,24	
74					mesure 2	0,61	
75	A	Mur	Briques,enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,23	
76					partie haute (> 1m)	0,21	
77	B	Mur	Briques,enduit		partie basse (< 1m)	0,17	
78					partie haute (> 1m)	0,49	
79	C	Mur	Bac acier	Peinture	partie basse (< 1m)	0,36	
80					partie haute (> 1m)	0,26	
81		Piliers centraux	Acier	peinture	mesure 1	0,18	
82					mesure 2	0,56	
83	A	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	0,44	
84					huisserie	0,18	
85	D	Poteaux	Acier	Peinture	mesure 1	0,28	
86					mesure 2	0,1	
87		Plafond	Bac acier		mesure 1	0,58	
88					mesure 2	0,44	

HM9/RDC - 5-Bureau

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
89		Sol	Béton	peinture	mesure 1	0,04	
90					mesure 2	0,44	
91	A	Mur	Briques,enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,17	
92					partie haute (> 1m)	0,37	
93	B	Mur	Briques,enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,61	
94					partie haute (> 1m)	0,63	
95	C	Mur	Briques,enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,52	
96					partie haute (> 1m)	0,13	
97	D	Mur	BA13	peinture	partie basse (< 1m)	0,32	
98					partie haute (> 1m)	0,23	
-		Faux plafond 120x80	Laine de verre+pack alu		-	-	
99	A	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,65	
100					huisserie	0,69	
101	A	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,39	
102					huisserie	0,2	
103	A	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	0,58	
104					huisserie	0,67	

HM9/RDC - 6-Bureau

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
105	A	Mur	BA13	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,58	
106					partie haute (> 1m)	0,08	
107	B	Mur	BA13	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,15	
108					partie haute (> 1m)	0,59	
109	C	Mur	BA13	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,69	
110					partie haute (> 1m)	0,51	
111	D	Mur	BA13	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,3	
112					partie haute (> 1m)	0,65	
-	A	Mur	Lambris bois			-	
-	B	Mur	Lambris bois			-	
-	C	Mur	Lambris bois			-	
-	D	Mur	Lambris bois			-	
-		Faux plafond 120x60	Fibreux compact			-	
113	A	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	0,02	
114					huisserie	0,5	
115	C	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,35	
116					huisserie	0,39	
117	C	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,1	
118					huisserie	0,6	
119	C	Grille	Métal	Peinture	mesure 1	0,29	
120					mesure 2	0,37	

HM9/RDC - 7-Vestiaire

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
121	D	Radiateur elec			mesure 1	0,29	
122					mesure 2	0,67	
123	B	Radiateur elec			mesure 1	0,04	
124					mesure 2	0,49	
125		Sol	Béton	Carrelage	mesure 1	0,39	
126					mesure 2	0,4	
-		Plafond 60x60	Fibreux compact 2006		mesure 1	-	
127	A	Mur	Enduit ciment	Toile de verre peint	partie basse (< 1m)	0,35	
128					partie haute (> 1m)	0,04	
129	B	Mur	BA13	Toile de verre peint	partie basse (< 1m)	0,47	
130					partie haute (> 1m)	0,67	
131	C	Mur	BA13	Toile de verre peint	partie basse (< 1m)	0,21	
132					partie haute (> 1m)	0,05	
133	D	Mur	BA13	Toile de verre peint	partie basse (< 1m)	0,63	
134					partie haute (> 1m)	0,06	
135	A	Porte	bois	Peinture	partie mobile	0,01	
136					huisserie	0,43	

137	C	Grilles	Metal	Peinture	mesure 1	0,51	
138					mesure 2	0,48	
139	C	Fenêtres intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,33	
140					huisserie	0,38	
141	C	Fenêtres extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,08	
142					huisserie	0,58	
143		Plinthes	Carrelages		mesure 1	0,27	
144					mesure 2	0,35	

HM9/RDC - 8-Magasin

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Béton		mesure 1	-	
145	A	Mur	Enduit ciment et BA13	Peinture	partie basse (< 1m)	0,53	
146					partie haute (> 1m)	0,28	
147	B	Mur	Enduit ciment et BA13	Peinture	partie basse (< 1m)	0,19	
148					partie haute (> 1m)	0,01	
149	C	Mur	Enduit ciment et BA13	Peinture	partie basse (< 1m)	0,68	
150					partie haute (> 1m)	0,53	
151	D	Mur	Enduit ciment et BA13	Peinture	partie basse (< 1m)	0,14	
152					partie haute (> 1m)	0,03	
-		Faux plafond 120x60	Laine de verre et pack alu		-	-	
153	C	Grilles	Métal	peinture	mesure 1	7,5	Retrait
154	C	Fenêtres intérieure	Métal	peinture	partie mobile	0,03	
155					huisserie	0,42	
156	C	Fenêtres extérieure	Métal	peinture	partie mobile	0,02	
157					huisserie	0,16	
158	A	Porte	Métal		partie mobile	0,11	
159					huisserie	0,58	

HM9/RDC - 9-Magasin

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Béton			-	
160	A	Mur	BA13	Peinture	partie basse (< 1m)	0,53	
161					partie haute (> 1m)	0,39	
162	B	Mur	Enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,3	
163					partie haute (> 1m)	0,65	
164	C	Mur	Enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,07	
165					partie haute (> 1m)	0,29	
166	D	Mur	Enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,37	
167					partie haute (> 1m)	0,67	
-		Faux plafond 120x60	Laine de verre et pack alu		-	-	
168	C	Fenêtres intérieure	Métal	peinture	partie mobile	0,6	
169					huisserie	0,28	
170	C	Fenêtres extérieure	Métal	peinture	partie mobile	0,56	
171					huisserie	0,5	
172	A	Porte 1	Bois		partie mobile	0,09	
173					huisserie	0,09	
174	D	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	0,22	
175					huisserie	0,49	

HM9/RDC - 10-Magasin

Nombre d'unités de diagnostic : 14

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Béton			-	
176	A	Mur	Enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,42	
177					partie haute (> 1m)	0,57	
178	B	Mur	Enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,52	
179					partie haute (> 1m)	0,46	
180	C	Mur	Enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,22	
181					partie haute (> 1m)	0,51	
182	D	Mur	Enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,42	
183					partie haute (> 1m)	0,29	

-		Faux plafond 120x60	Fibreux compact			-	
184	A	Fenêtres 1 intérieure	Bois	peinture	partie mobile	0,47	
185					huisserie	0,7	
186	A	Fenêtres 1 extérieure	Bois	peinture	partie mobile	0,1	
187					huisserie	0,53	
188	C	Fenêtres 2 intérieure	Bois	peinture	partie mobile	0,52	
189					huisserie	0,58	
190	C	Fenêtres 2 extérieure	Bois	peinture	partie mobile	0,49	
191					huisserie	0,31	
192	C	Grilles	Bois	peinture	mesure 1	0,19	
193					mesure 2	0,56	
194	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	0,35	
195					huisserie	0,06	
196	B	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	0,48	
197					huisserie	0,68	
198	A	Radiateurs	Acier	Peinture	mesure 1	0,22	
199					mesure 2	0,24	

HM9/RDC - 11-Sanitaires

Nombre d'unités de diagnostic : 14

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
200	C	Radiateur	Métal	Peinture	mesure 1	0,64	
201					mesure 2	0,25	
202	A	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	0,44	
203					huisserie	0,35	
204	A	Mur	Faïences		partie basse (< 1m)	0,43	
205					partie haute (> 1m)	0,21	
206	B	Mur	Faïences		partie basse (< 1m)	0,07	
207					partie haute (> 1m)	0,11	
208	C	Mur	Faïences		partie basse (< 1m)	0,61	
209					partie haute (> 1m)	0,5	
210		Cloison de separation	BA13 Neuf	peintureet faiences	mesure 1	0,24	
211					mesure 2	0,16	
212	D	Mur	Faïences		partie basse (< 1m)	0,6	
213					partie haute (> 1m)	0,15	
-		Faux Plafond 120x60	Compact goutte d'eau			-	
214		Plinthes	Carrelages		mesure 1	0,29	
215					mesure 2	0,63	
216		Sol	Béton	Carrelage	mesure 1	0,58	
217					mesure 2	0,02	
-	C	Fenêtre intérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-	C	Fenêtre extérieure	Aluminium		huisserie	-	
218	C	Grilles	Metal	Peinture	mesure 1	0,11	
219					mesure 2	0,65	
220		Évacuation	PVC		mesure 1	0,53	
221					mesure 2	0,66	

HM9/RDC - 12-WC

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
222	D	Radiateur	Métal	Peinture	mesure 1	0,33	
223					mesure 2	0,06	
224	A	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	0,14	
225					huisserie	0,11	
226	A	Mur	Faïences		partie basse (< 1m)	0,66	
227					partie haute (> 1m)	0	
228	B	Mur	Faïences		partie basse (< 1m)	0,51	
229					partie haute (> 1m)	0,39	
230	C	Mur	Faïences		partie basse (< 1m)	0,13	
231					partie haute (> 1m)	0,06	
232	D	Mur	Faïences		partie basse (< 1m)	0,5	
233					partie haute (> 1m)	0,04	
-		Faux Plafond 120x60	Compact zèbre			-	

-		Faux Plafond 120x60	Compact goutte d'eau			-	
234		Plinthes	Carrelages		mesure 1	0,48	
235					mesure 2	0,42	
236		Sol	Béton	Carrelage	mesure 1	0,01	
237					mesure 2	0,01	
-	C	Fenêtre intérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-	C	Fenêtre extérieure	Aluminium		partie mobile	-	
238	C	Grilles	Metal	Peinture	mesure 1	0,51	
239					mesure 2	0,64	

HM9/RDC - 13-Bureau

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
240		Sol	Béton	Carrelage	mesure 1	0,32	
241					mesure 2	0,04	
242	A	Mur	Brique, enduits ciments	Toile de verre peint	partie basse (< 1m)	0,12	
243					partie haute (> 1m)	0,09	
244	B	Mur	Brique, enduits ciments	Toile de verre peint	partie basse (< 1m)	0,46	
245					partie haute (> 1m)	0,5	
246	C	Mur	Brique, enduits ciments	Toile de verre peint	partie basse (< 1m)	0,49	
247					partie haute (> 1m)	0,37	
248	D	Mur	Brique, enduits ciments	Toile de verre peint	partie basse (< 1m)	0,44	
249					partie haute (> 1m)	0,37	
-		Faux plafond 60x60	Fibreux compact			-	
250	C	Fenêtre intérieure	Bois	peinture	partie mobile	0,53	
251					huisserie	0,07	
252	C	Fenêtre extérieure	Bois	peinture	partie mobile	0,68	
253					huisserie	0,51	
254	C	Grilles	Métal	peinture	mesure 1	0,29	
255					mesure 2	0,14	
256		Plinthes A/D	pvc	peinture	mesure 1	0,44	
257					mesure 2	0,15	
258	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	0,58	
259					huisserie	0,08	
260	B	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	0,31	
261					huisserie	0,34	
262	B	Radiateurs	Acier	Peinture	mesure 1	0,04	
263					mesure 2	0,35	

HM9/RDC - 14-Bureau

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
264		Sol	Béton	Carrelage	mesure 1	0,53	
265					mesure 2	0,44	
266	A	Mur	Brique, enduits ciments	Toile de verre peint	partie basse (< 1m)	0,01	
267					partie haute (> 1m)	0,68	
268	B	Mur	Brique, enduits ciments	Toile de verre peint	partie basse (< 1m)	0,35	
269					partie haute (> 1m)	0,39	
270	C	Mur	Brique, enduits ciments	Toile de verre peint	partie basse (< 1m)	0,19	
271					partie haute (> 1m)	0,26	
272	D	Mur	Brique, enduits ciments	Toile de verre peint	partie basse (< 1m)	0,33	
273					partie haute (> 1m)	0,26	
-		Faux plafond 60x60	Fibreux compact			-	
274	C	Grilles	Métal	peinture	mesure 1	0,42	
275					mesure 2	0,49	
276		Plinthes A/D	pvc	peinture	mesure 1	0,39	
277					mesure 2	0,03	
278	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	0,16	
279					huisserie	0,11	
280	B	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	0,39	
281					huisserie	0,58	
282	D	Porte 4	Bois	Peinture	partie mobile	0,02	
283					huisserie	0,28	
284	A	Radiateurs	Acier	Peinture	mesure 1	0,28	

285					mesure 2	0,39	

HM9/RDC - 15-Bureau

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
286		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,22	
287					mesure 2	0,37	
288	A	Mur	Brique, enduits ciments	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0,13	
289					partie haute (> 1m)	0,59	
290	B	Mur	Brique, enduits ciments	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0,35	
291					partie haute (> 1m)	0,62	
292	C	Mur	Brique, enduits ciments	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0,03	
293					partie haute (> 1m)	0,6	
294	D	Mur	Brique, enduits ciments	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0,31	
295					partie haute (> 1m)	0,47	
-		Faux plafond 60x60	Fibreux compact			-	
296	B	Grilles	Métal	peinture	mesure 1	0,29	
297					mesure 2	0,08	
298		Plinthes A/D	pvc	peinture	mesure 1	0,1	
299					mesure 2	0,43	
300	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,21	
301					huisserie	0,39	
302	D	Porte 2	bois	peinture	partie mobile	0,35	
303					huisserie	0,34	
304	B	Radiateurs	Acier	Peinture	mesure 1	0,55	
305					mesure 2	0,35	

HM9/RDC - 16-NBC

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
306		Sol	Béton		mesure 1	0,48	
307					mesure 2	0,38	
308	A	Mur	Brique,enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,56	
309					partie haute (> 1m)	0,24	
310	B	Mur	Brique,enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,56	
311					partie haute (> 1m)	0,3	
312	C	Mur	Brique,enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,14	
313					partie haute (> 1m)	0,15	
314	D	Mur	Brique,enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,19	
315					partie haute (> 1m)	0,04	
316		Plafond sous rampants	Lambris bois	Peinture	mesure 1	0,09	
317					mesure 2	0,5	
318	D	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,48	
319					huisserie	0,68	
320	D	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,07	
321					huisserie	0,3	
322	A	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	0,18	
323					huisserie	0,67	
324	D	Grille	Métal	Peinture	mesure 1	0,7	
325					mesure 2	0,14	

HM9/RDC - 17-Entrée /Sortie

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
326		Sol	Béton		mesure 1	0,43	
327					mesure 2	0,09	
328	A	Mur	Brique,enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,06	
329					partie haute (> 1m)	0,23	
330	B	Mur	Brique,enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,44	
331					partie haute (> 1m)	0,25	
332	C	Mur	Brique,enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,18	
333					partie haute (> 1m)	0,28	
334	D	Mur	Brique,enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,44	
335					partie haute (> 1m)	0,13	
336		Plafond sous rampants	Lambris bois	Peinture	mesure 1	0,45	
337					mesure 2	0,2	

338	AB	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	0,55	
339					huisserie	0,37	
340	D	Porte	Métal	Peinture	partie mobile	0,6	
341					huisserie	0,26	

HM9/RDC - 18-Magasin Trans

Nombre d'unités de diagnostic : 14

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
342		Sol	Béton	Synthétique non collée	mesure 1	0,59	
343					mesure 2	0,48	
344	A	Mur	Briques,enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,46	
345					partie haute (> 1m)	0,66	
346	B	Mur	Briques,enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,45	
347					partie haute (> 1m)	0,48	
348	C	Mur	Briques,enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,62	
349					partie haute (> 1m)	0,04	
350	D	Mur	Briques,enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,67	
351					partie haute (> 1m)	0,58	
352		Plafond	Bois	Peinture	mesure 1	0,41	
353					mesure 2	0,19	
-		Faux Plafond	Marque Amstrong		-	-	
354	A	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,08	
355					huisserie	0,66	
356	A	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,17	
357					huisserie	0,25	
358	C	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,43	
359					huisserie	0,11	
360	C	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,42	
361					huisserie	0,56	
362	A	Grilles	Métal	Peinture	mesure 1	0,32	
363					mesure 2	0,27	
364	C	Grilles	Métal	Peinture	mesure 1	0,02	
365					mesure 2	0,3	
366	A	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	0,42	
367					huisserie	0,28	

HM9/RDC - 19-Magasin

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
368		Sol	Béton	Dalles bleue	mesure 1	0,69	
369					mesure 2	0,16	
370	A	Mur	Brique,enduit ciment	peinture	partie basse (< 1m)	0,46	
371					partie haute (> 1m)	0,68	
372	B	Mur	Brique,enduit ciment	peinture	partie basse (< 1m)	0,58	
373					partie haute (> 1m)	0,36	
374	C	Mur	Brique,enduit ciment	peinture	partie basse (< 1m)	0,38	
375					partie haute (> 1m)	0,01	
376	D	Mur	Brique,enduit ciment	peinture	partie basse (< 1m)	0,3	
377					partie haute (> 1m)	0,49	
378		Plafond sous rampants	lambris bois	peinture	mesure 1	0,44	
379					mesure 2	0,43	
380	A	Porte	Bois	peinture	partie mobile	0,65	
381					huisserie	0,45	
382	B	Radiateurs	Métal	Peinture	mesure 1	0,58	
383					mesure 2	0,66	
384	C	Grille	Métal	peinture	mesure 1	0,32	
385					mesure 2	0,52	
386	C	Fenêtres intérieure	Bois	peinture	partie mobile	0,32	
387					huisserie	0,59	
388	C	Fenêtres extérieure	Bois	peinture	partie mobile	0,21	
389					huisserie	0,67	

HM9/RDC - 20-Chaufferie

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Béton			-	
390	A	Mur		peinture	partie basse (< 1m)	0,12	

391			Briques,enduit ciment		partie haute (> 1m)	0,69	
392	B	Mur	Briques,enduit ciment	peinture	partie basse (< 1m)	0,39	
393					partie haute (> 1m)	0,56	
394	C	Mur	Briques,enduit ciment	peinture	partie basse (< 1m)	0,16	
395					partie haute (> 1m)	0,39	
396	D	Mur	Briques,enduit ciment	peinture	partie basse (< 1m)	0,28	
397					partie haute (> 1m)	0,07	
398		Plafond	placoplâtre	peinture	mesure 1	0,19	
399		Plafond	pacoplâtre	peinture	mesure 2	0,51	
400	B	Grilles	Métal	peinture	mesure 1	0,11	
401					mesure 2	0,29	
402	B	Fenêtre intérieure	Métal	peinture	partie mobile et fixe	1,6	Retrait
403	B	Fenêtre extérieure	Métal	peinture	partie mobile et fixe	1,6	Retrait
404	A	Porte	Métal	peinture	partie mobile	0,04	
405					huisserie	0,45	
406		Chaudière. Fioul	Viessmann 1998		mesure 1	0,18	
407					mesure 2	0,38	

HM9/RDC - 20'-Rangement

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	béton			-	
408	A	Mur	Enduit ciment	Peinture	Partie basse (< 1m)	0,23	
409					partie haute (> 1m)	0,46	
410	B	Mur	Enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,14	
411					partie haute (> 1m)	0,56	
412	C	Mur	Enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,13	
413					partie haute (> 1m)	0,09	
414	D	Mur	Enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,65	
415					partie haute (> 1m)	0,7	
-		Plafond	Bac acier vermiculite			-	
416	A	Porte	bois	peinture	partie mobile	0,63	
417					huisserie	0,56	
418	B	Calorifugeages	Bande de plâtre	Peinture	mesure 1	0,3	
419					mesure 2	0,54	

HM9/RDC - 21-Vestiaire

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
420		Sol	Béton	Carrelage	mesure 1	0,53	
421					mesure 2	0,09	
422	A	Mur	Brique,enduit ciment	peinture	partie basse (< 1m)	0,69	
423					partie haute (> 1m)	0,33	
424	B	Mur	Brique,enduit ciment	peinture	partie basse (< 1m)	0,46	
425					partie haute (> 1m)	0,41	
426	C	Mur	Brique,enduit ciment	peinture	partie basse (< 1m)	0,7	
427					partie haute (> 1m)	0,7	
428	D	Mur	Brique,enduit ciment	peinture	partie basse (< 1m)	0,32	
429					partie haute (> 1m)	0,39	
430		Plafond	Enduit ciment	peinture	mesure 1	0,4	
431					mesure 2	0,51	
432	C	Fenêtres intérieure	Bois	peinture	partie mobile	0,34	
433					huisserie	0,48	
434	C	Fenêtres extérieure	Bois	peinture	partie mobile	0,03	
435					huisserie	0,45	
436	C	Grilles	Métal	peinture	mesure 1	0,53	
437					mesure 2	0,5	
438	A	Porte	Bois	peinture	partie mobile	0,17	
439					huisserie	0,21	

HM9/RDC - 22-Salle de detente

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
440		Sol	béton	Carrelage	mesure 1	0,39	

441					mesure 2	0,27	
442		Plafond	Enduit ciment	Toile de verre peint	mesure 1	0,34	
443					mesure 2	0,27	
444	A	Mur	Brique,enduit ciment	Toile de verre Peint	partie basse (< 1m)	0,01	
445					partie haute (> 1m)	0,44	
446	A	Mur coin cuisine	Faïences		mesure 1	0,43	
447					mesure 2	0,49	
448	B	Mur	Brique,enduit ciment	Toile de verre Peint	partie basse (< 1m)	0,39	
449					partie haute (> 1m)	0,23	
450	C	Mur	Brique,enduit ciment	Toile de verre Peint	partie basse (< 1m)	0,18	
451					partie haute (> 1m)	0,11	
452	D	Mur	Brique,enduit ciment	Toile de verre Peint	partie basse (< 1m)	0,4	
453					partie haute (> 1m)	0,41	
454		Plinthes	Carrelage		mesure 1	0,53	
455					mesure 2	0,1	
456	C	Grilles	Métal	peinture	mesure 1	0,38	
457					mesure 2	0,49	
458	C	Fenêtre intérieure	PVC		partie mobile	0,32	
459					huisserie	0,46	
460	C	Fenêtre extérieure	PVC		partie mobile	0,53	
461					huisserie	0,43	
462	A	Porte	bois	peinture	partie mobile	0,51	
463					huisserie	0,48	
464	B	Radiateurs	Métal	Peinture	mesure 1	0,15	
465					mesure 2	0,2	

HM9/RDC - 23-Vestiaire

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
466		Sol	béton	Synthétique non collée	mesure 1	0,7	
467					mesure 2	0,07	
468	A	Mur	Enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,14	
469					partie haute (> 1m)	0,06	
470	B	Mur	Enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,5	
471					partie haute (> 1m)	0,23	
472	C	Mur	Enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,41	
473					partie haute (> 1m)	0,47	
474	D	Mur	Enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,37	
475					partie haute (> 1m)	0,02	
-		Faux Plafond 60x60	Fibreux compact laine de verre			-	
476	D	Grilles	Métal	peinture	mesure 1	0,2	
477					mesure 2	0,39	
478	D	Fenêtre intérieure	Bois	peinture	partie mobile	0,51	
479					huisserie	0,08	
480	D	Fenêtre extérieure	Bois	peinture	partie mobile	0,01	
481					huisserie	0,04	
482	A	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	0,62	
483					huisserie	0,23	
484	D	Radiateur	Métal		mesure 1	0,42	
485					mesure 2	0,32	

HM9/RDC - 24-Bureau Chef atelier

Nombre d'unités de diagnostic : 16

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
486		Sol	béton	Carrelage	mesure 1	0,41	
487					mesure 2	0,19	
488	A	Mur	Briques,enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,04	
489					partie haute (> 1m)	0,09	
490	B	Mur	Briques,enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,59	
491					partie haute (> 1m)	0,47	
492	C	Mur	Briques,enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,03	
493					partie haute (> 1m)	0,65	
494	D	Mur	Briques,enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,39	
495					partie haute (> 1m)	0,64	
496	E	Mur	Briques,enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,11	
497					partie haute (> 1m)	0,37	
498	F	Mur		Peinture	partie basse (< 1m)	0,27	

499			Briques,enduit ciment		partie haute (> 1m)	0,61	
-		Faux Plafond 60x60	Fibreux compact			-	
500		Plinthes A/F	Carrelage		mesure 1	0,09	
501					mesure 2	0,09	
502	C	Fenêtres intérieure	Bois	peinture	partie mobile	0,41	
503					huisserie	0,67	
504	C	Fenêtres extérieure	Bois	peinture	partie mobile	0,6	
505					huisserie	0,44	
506	C	Grilles	Métal	peinture	mesure 1	0,43	
507					mesure 2	0,55	
508	A	Porte 1	Métal	Peinture	partie mobile	0,23	
509					huisserie	0,65	
510	B	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	0,03	
511					huisserie	0,7	
512	F	Cadre de porte	Bois	Peinture	mesure 1	0,55	
513					mesure 2	0,6	
514	C	Radiateurs	Métal	Peinture	mesure 1	0,39	
515					mesure 2	0,28	

HM9/RDC - 25-Bureau

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-	B	Radiateur elec	Métal			-	
-		Sol	béton			-	
516	A	Mur	Briques,enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,62	
517					partie haute (> 1m)	0,17	
518	B	Mur	Briques,enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,07	
519					partie haute (> 1m)	0,42	
520	D	Mur	Briques,enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,37	
521					partie haute (> 1m)	0,31	
522	C	Mur	BA13	Peinture	partie basse (< 1m)	0,6	
523					partie haute (> 1m)	0,6	
-		Faux Plafond 60x60	Fibreux compact laine de verre			-	
524	A	Cadre de porte	Bois	Peinture	mesure 1	0,3	
525					mesure 2	0,41	
-	D	Porte	Bois		partie mobile	-	
-					huisserie	-	

HM9/RDC - 26-Magasin pièces détachées

Nombre d'unités de diagnostic : 14

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-	C	Radiateur	Métal		mesure 1	-	
-		Sol	béton		mesure 1	-	
526	B	Mur	Enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,23	
527					partie haute (> 1m)	0,1	
528	C	Mur	Enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,51	
529					partie haute (> 1m)	0,16	
530	D	Mur	Enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,28	
531					partie haute (> 1m)	0,51	
532	E	Mur	Enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,58	
533					partie haute (> 1m)	0,18	
534	A	Mur	BA13	Peinture	partie basse (< 1m)	0,21	
535					partie haute (> 1m)	0,53	
-		Faux Plafond 60x60	Fibreux compact laine de verre			-	
536	C	Fenêtre intérieure	Bois	peinture	partie mobile	0,64	
537					huisserie	0,62	
538	C	Fenêtre extérieure	Bois	peinture	partie mobile	0,49	
539					huisserie	0,49	
540	C	Grille	Métal	peinture	mesure 1	0,62	
541					mesure 2	0,19	
542	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	0,19	
543					huisserie	0,3	
544	C	Porte 2	Métal	Peinture	partie mobile	0,13	
545					huisserie	0,28	

546	E	Cadre Porte 3	Métal	Peinture	mesure 1	0,04	
547					mesure 2	0,68	

HM9/RDC - 27-Magasin

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	béton			-	
548	A	Mur	Enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,64	
549					partie haute (> 1m)	0,51	
550	B	Mur	Enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,49	
551					partie haute (> 1m)	0,66	
552	C	Mur	Enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,26	
553					partie haute (> 1m)	0,49	
554	D	Mur	Enduit ciment	Peinture	partie basse (< 1m)	0,37	
555					partie haute (> 1m)	0,16	
-		Faux Plafond 60x60	Fibreux compact laine de verre			-	
556	B	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	0,1	
557					huisserie	0,29	

HM9/1er étage - 28-ESC/Palier

Nombre d'unités de diagnostic : 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
558		Balustrade	Métal	peinture	mesure 1	0,25	
559					mesure 2	0,23	
560	B	Main courante	Métal	peinture	mesure 1	0,63	
561					mesure 2	0,44	
-		Escalier et coursive	Métal			-	

HM9/1er étage - 29-Secrétariat

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
562	A	Mur	Brique enduit ciments	peinture	partie basse (< 1m)	0,12	
563					partie haute (> 1m)	0,32	
564	B	Mur	Brique enduit ciments	peinture	partie basse (< 1m)	0,13	
565					partie haute (> 1m)	0,39	
566	C	Mur	Brique enduit ciments	peinture	partie basse (< 1m)	0,23	
567					partie haute (> 1m)	0,05	
568	D	Mur	Brique enduit ciments	peinture	partie basse (< 1m)	0,09	
569					partie haute (> 1m)	0,64	
-		Plafond 120x60	Fibreux compact	peinture		-	
570	A	Porte	bois	peinture	partie mobile	0,37	
571					huisserie	0,58	
572	A	Fenêtre 3 intérieure	Bois	peinture	partie mobile	0,04	
573					huisserie	0,58	
574	A	Fenêtre 3 extérieure	Bois	peinture	partie mobile	0,27	
575					huisserie	0,06	
576	B	Fenêtre 1 intérieure	Métal	peinture	partie mobile	0,08	
577					huisserie	0,41	
578	B	Fenêtre 1 extérieure	Métal	peinture	partie mobile	0,17	
579					huisserie	0,51	
580	C	Fenêtre 2 intérieure	Bois	peinture	partie mobile	0,46	
581					huisserie	0,59	
582	C	Fenêtre 2 extérieure	Bois	peinture	partie mobile	0,64	
583					huisserie	0,34	
584	D	Radiateur	Métal	Peinture	mesure 1	0,07	
585					mesure 2	0,27	

HM9/1er étage - 30-Bureau Chef

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
586	A	Mur	Brique enduit ciments	peinture	partie basse (< 1m)	0,5	
587					partie haute (> 1m)	0,35	
588	B	Mur	Brique enduit ciments	peinture	partie basse (< 1m)	0,23	
589					partie haute (> 1m)	0,35	
590	C	Mur		peinture	partie basse (< 1m)	0,21	

591			Brique enduit ciments		partie haute (> 1m)	0,63	
592	D	Mur	Brique enduit ciments	peinture	partie basse (< 1m)	0,02	
593					partie haute (> 1m)	0,68	
594		Plafond 60x60	Plaque compact	peinture	mesure 1	0,54	
595					mesure 2	0,58	
596	A	Porte	bois	peinture	partie mobile	0,39	
597					huisserie	0,27	
598	C	Fenêtre intérieure	Bois	peinture	partie mobile	0,53	
599					huisserie	0,45	
600	C	Fenêtre extérieure	Bois	peinture	partie mobile	0,29	
601					huisserie	0,67	
602	A	Radiateur	Métal	Peinture	mesure 1	0,04	
603					mesure 2	0,49	

TCRu : Des traces importantes de coulures, de ruissellement ou d'écoulement d'eau ont été repérées

Photo de l'écoulement d'eau lors de notre visite du 27/01/2021:



Analyses chimiques du laboratoire
Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Constatations diverses :
Néant

Validité du constat : jusqu'à la fin des travaux

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :
Les plans

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
L responsable magasin

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ***LCC QUALIXPERT - 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)***

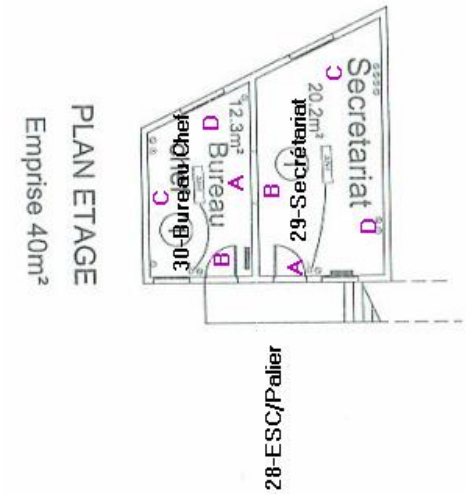
Fait à **Saint Jean d'Illac** le **07/06/2021**

Par : RABEAU VIRGINIE

Inspection Bâtiment Atlantique (IBA)
39,Impasse Frédéric Mistral 33127 St Jean d'illac
Port : 06.52.14.37.98 Fax : 08.26.99.52.14
vrabeau@ibadiag.com RCS 791276868 de Bx
Siret: 791 276 868 00019 Code APE 7120 TVA
intra FR 56 791276868 SARL au capital de 3000€

6. Localisation des mesures sur croquis de repérage





Illustrations



7. Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)

Notice d'information à remettre systématiquement aux donneurs d'ordre en annexe du diagnostic

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine –t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
    - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
    - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
    - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
    - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :
  Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

8. Autres documents et rapports antérieurs

QUALIXPERT

Certificat N° C0188

Madame Virginie RABEAU

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N° 4-0094
PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Amiante avec mention	**Certificat valable** **Du 10/07/2017** **au 09/07/2022**	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Constat de risque d'exposition au plomb	**Certificat valable** **Du 23/04/2019** **au 22/04/2024**	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	**Certificat valable** **Du 14/11/2018** **au 13/11/2023**	Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Date d'établissement le mardi 23 avril 2019

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

F09 Certification de compétence version M 250119
