
Rénovation des toitures des halles GCCD et GMP
UGA, Grenoble (38)

Planning DCE

N°	Lot	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		OS Démarrage travaux	0 jr	Lun 12/04/27	Lun 12/04/27
2		Préparation de chantier	20 jrs	Lun 12/04/27	Ven 07/05/27
3		Etudes EXE	30 jrs	Lun 12/04/27	Ven 21/05/27
4	Lot 01	Dépôt Plan de retrait	5 jrs	Lun 12/04/27	Ven 16/04/27
5		Instruction du plan de retrait	23 jrs	Lun 19/04/27	Mer 19/05/27
6	Lot 01	Mise au point caissons toiture	20 jrs	Lun 12/04/27	Ven 07/05/27
7	Lot 01	Commande et fabrication des caissons	20 jrs	Lun 10/05/27	Ven 04/06/27
8		Commandes prioritaires (isolants, MEX, ferraillage …)	0 jr	Lun 26/04/27	Lun 26/04/27
9		**Phase 1 - Toiture GMP**	**140 jrs**	**Lun 12/04/27**	**Mar 02/11/27**
10		Evacuation du mobilier (MOA)	9 jrs	Lun 12/04/27	Jeu 22/04/27
11	Lot 01	Installation de la plateforme de protection / circulation	10 jrs	Ven 23/04/27	Jeu 06/05/27
12	Lot 05 - 06 - 04	Dépose des éléments techniques et FPL / neutralisation des réseaux	10 jrs	Mar 04/05/27	Lun 17/05/27
13	Lot 05 - 06	Dépose complémentaire des réseaux (GER)	10 jrs	Mar 18/05/27	Lun 31/05/27
14	Lot 01	Installation des protections en sous face toiture	10 jrs	Jeu 20/05/27	Mer 02/06/27
15	Lot 01	Désamiantage cis protections provisoires	45 jrs	Jeu 03/06/27	Jeu 05/08/27
16	Lot 01	Zone 1	8 jrs	Ven 16/07/27	Mar 27/07/27
17	Lot 01	Zone 2	8 jrs	Jeu 03/06/27	Lun 14/06/27
18	Lot 01	Zone 3	7 jrs	Ven 25/06/27	Lun 05/07/27
19	Lot 01	Zone 4	8 jrs	Mar 15/06/27	Jeu 24/06/27
20	Lot 01	Zone 5	7 jrs	Mar 06/07/27	Jeu 15/07/27
21	Lot 01	Zone 6	7 jrs	Mer 28/07/27	Jeu 05/08/27
22	Lot 01	Pose des caissons définitifs (compris préparations)	94 jrs	Mar 15/06/27	Mar 02/11/27
23	Lot 01	Zone 1	10 jrs	Ven 30/07/27	Jeu 12/08/27
24	Lot 01	Zone 2	8 jrs	Mar 15/06/27	Jeu 24/06/27
25	Lot 01	Zone 3	8 jrs	Jeu 08/07/27	Mar 20/07/27
26	Lot 01	Zone 4	10 jrs	Ven 25/06/27	Jeu 08/07/27
27	Lot 01	Zone 5	8 jrs	Mer 21/07/27	Ven 30/07/27
28	Lot 01	Zone 6	7 jrs	Ven 13/08/27	Lun 30/08/27
29	Lot 01	Traitement des EP + raccordement sur réseaux existants	25 jrs	Ven 13/08/27	Jeu 23/09/27
30	Lot 01	Sciage acrotères / carottage en toiture	5 jrs	Mar 15/06/27	Lun 21/06/27
31	Lot 01	Réalisation des acrotères	10 jrs	Mar 22/06/27	Lun 05/07/27
32	Lot 01 - 02	Finitions toiture (étanchéité / GC / saut de loup)	20 jrs	Mar 31/08/27	Lun 27/09/27
33	Lot 01	Refection étanchéité toiture terrasse existante	30 jrs	Mar 06/07/27	Mar 24/08/27
34	Lot 07	Pose panneaux solaires	25 jrs	Mar 28/09/27	Mar 02/11/27
35	Lot 07	Liaison TGBT / PV	15 jrs	Lun 19/07/27	Ven 06/08/27
36	Lot 01	Réseaux VRD	5 jrs	Mar 31/08/27	Lun 06/09/27
37	Lot 04	Plafonds bois sheds	10 jrs	Mar 31/08/27	Lun 13/09/27
38	Lot 04	Cloisons - Peintures / finitions en sous-face	25 jrs	Ven 06/08/27	Jeu 16/09/27
39	Lot 05 - 06 - 04	Réseaux en plafonds / FPL	30 jrs	Ven 13/08/27	Jeu 30/09/27
40	Lot 06	Réseaux elec complémentaires lustrerie / machines	10 jrs	Ven 17/09/27	Jeu 30/09/27
41	Lot 06	Pose de la lustrerie	10 jrs	Mar 21/09/27	Lun 04/10/27
42	Lot 06	Reprise modification des armoires elec	10 jrs	Mer 04/08/27	Mar 24/08/27
43	Lot 05	Réseaux air comprimé	15 jrs	Mer 04/08/27	Mar 31/08/27
44	Lot 05	Test / mise en pression de réseaux air comprimé	8 jrs	Mer 01/09/27	Ven 10/09/27
45	Lot 05	Réseaux Eau potable compris essais	10 jrs	Mer 25/08/27	Mar 07/09/27
46	Lot 01	Fondations escaliers	5 jrs	Mar 24/08/27	Mar 31/08/27
47	Lot 02	Création de l'escalier ext .	15 jrs	Mar 31/08/27	Lun 20/09/27
48	Lot 01	Démontage de la protection interieure de la halle	8 jrs	Ven 01/10/27	Mar 12/10/27
49					
50		**Phase 2 - Toiture GCCD**	**214 jrs**	**Ven 09/07/27**	**Mer 31/05/28**
51		Evacuation du mobilier (MOA)	10 jrs	Ven 09/07/27	Ven 23/07/27
52		Toiture haute	130 jrs	Lun 26/07/27	Mar 15/02/28
53	Lot 05 - 06 - 04	Dépose des éléments techniques FPL / neutralisation des réseaux	15 jrs	Lun 26/07/27	Ven 13/08/27
54	Lot 05 - 06	Dépose complémentaire des réseaux (GER)	10 jrs	Lun 23/08/27	Ven 03/09/27
55	Lot 01	Installation des protections en sous face toiture	10 jrs	Lun 06/09/27	Ven 17/09/27
56	Lot 01	Désamiantage cis protections provisoires	40 jrs	Lun 20/09/27	Mar 16/11/27
57	Lot 01	Zone 13	8 jrs	Lun 20/09/27	Mer 29/09/27
58	Lot 01	Zone 15	8 jrs	Jeu 30/09/27	Lun 11/10/27
59	Lot 01	Zone 12	8 jrs	Mar 12/10/27	Jeu 21/10/27
60	Lot 01	Zone 14	8 jrs	Ven 22/10/27	Mer 03/11/27
61	Lot 01	Zone 16	8 jrs	Jeu 04/11/27	Mar 16/11/27
62	Lot 01	Pose des caissons définitifs (compris préparations)	87 jrs	Jeu 30/09/27	Mar 15/02/28
63	Lot 01	Zone 13	8 jrs	Jeu 30/09/27	Lun 11/10/27
64	Lot 01	Zone 15	8 jrs	Mar 12/10/27	Jeu 21/10/27
65	Lot 01	Zone 12	8 jrs	Ven 22/10/27	Mer 03/11/27
66	Lot 01	Zone 14	8 jrs	Jeu 04/11/27	Mar 16/11/27
67	Lot 01	Zone 16	8 jrs	Mer 17/11/27	Ven 26/11/27
68	Lot 03	Remplacement des MEX	30 jrs	Ven 01/10/27	Lun 15/11/27

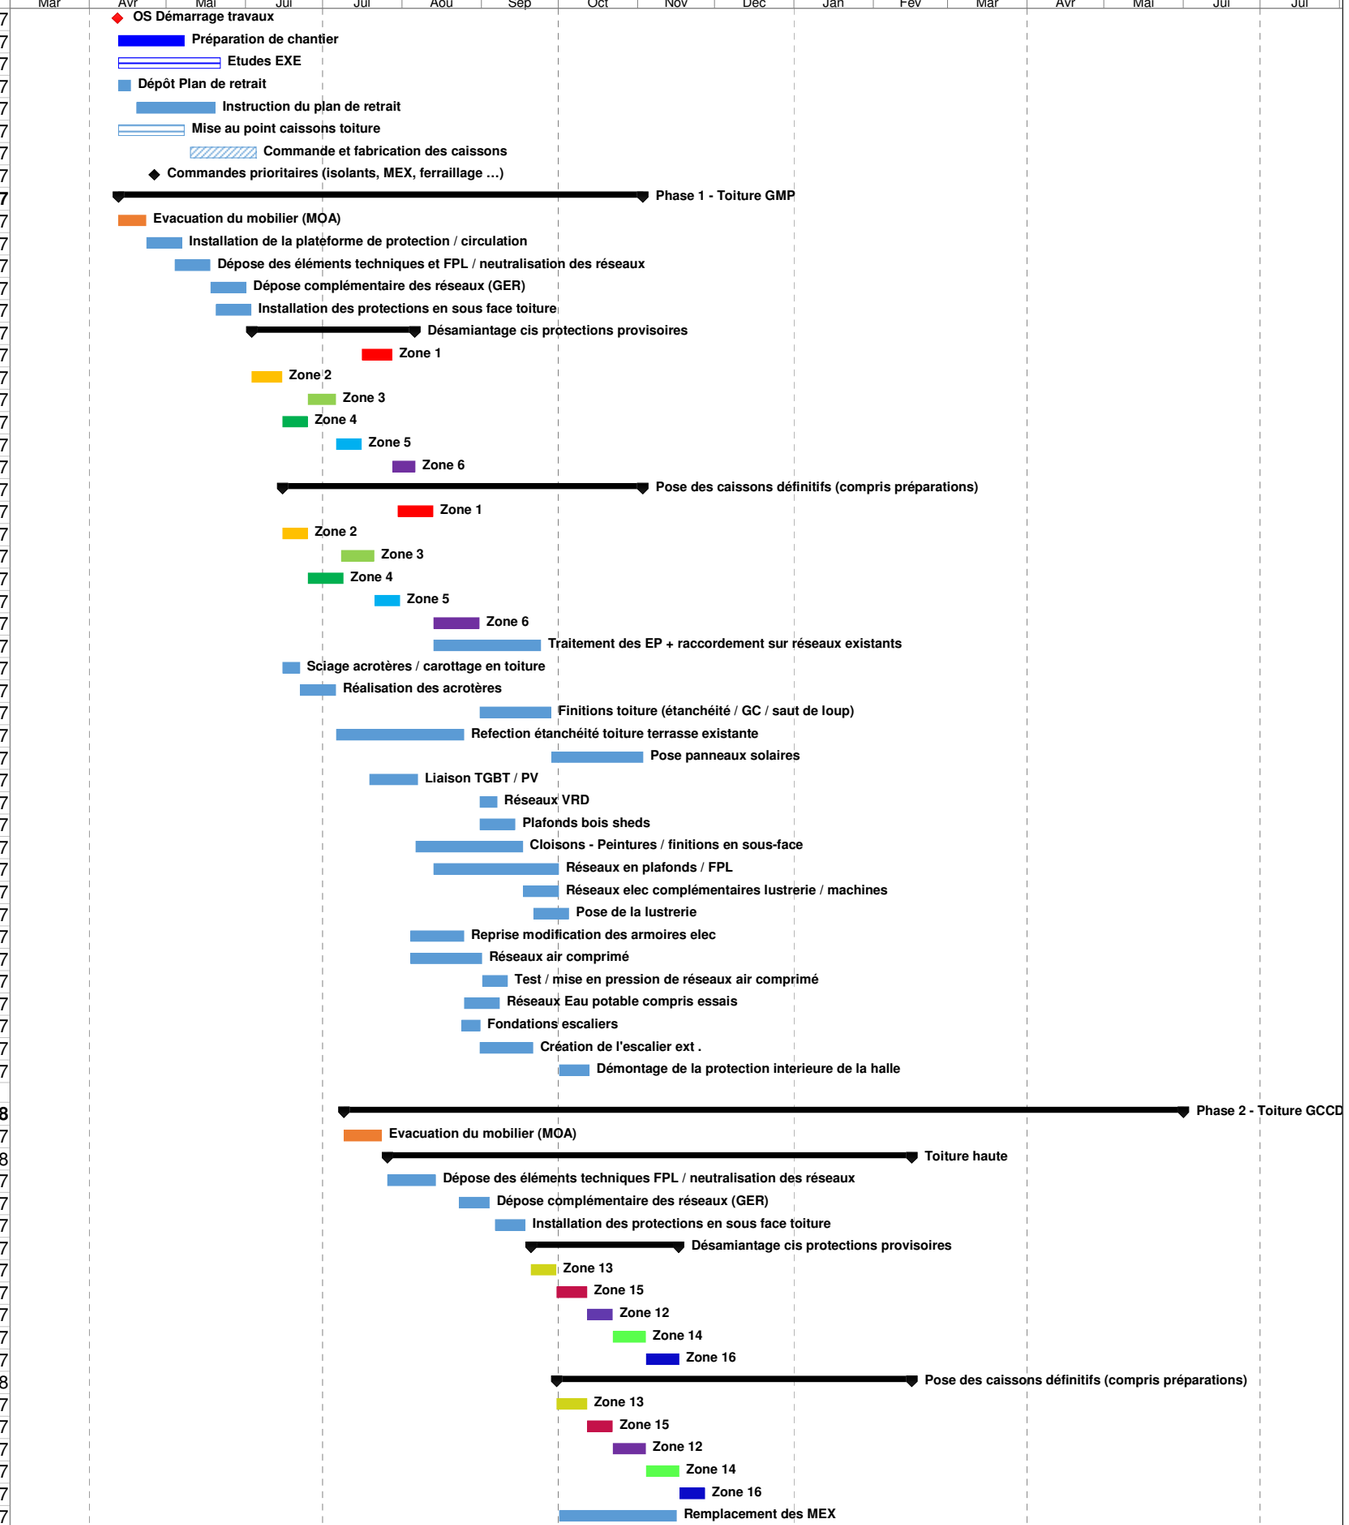

Rénovation des toitures des halles GCCD et GMP
UGA, Grenoble (38)

Planning DCE

N°	Lot	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
69	Lot 01	Traitement des EP + raccordement sur réseaux existants	25 jrs	Lun 29/11/27	Ven 14/01/28
70	Lot 01 - 02	Finitions toiture	30 jrs	Mer 17/11/27	Mar 11/01/28
71	Lot 07	Pose panneaux solaires	25 jrs	Mer 12/01/28	Mar 15/02/28
72	Lot 04	Plafonds bois sheds	10 jrs	Lun 29/11/27	Ven 10/12/27
73	Lot 04	Cloisons - Peintures / finitions en sous-face	30 jrs	Mer 17/11/27	Mar 11/01/28
74	Lot 05 - 06 - 04	Réseaux en plafonds / FPL	35 jrs	Mer 17/11/27	Mar 18/01/28
75	Lot 06	Réseaux elec complémentaires lustrerie / machines	10 jrs	Ven 07/01/28	Jeu 20/01/28
76	Lot 06	Pose de la lustrerie	10 jrs	Mar 11/01/28	Lun 24/01/28
77	Lot 06	Reprise modification des armoires elec	10 jrs	Mar 09/11/27	Mar 23/11/27
78	Lot 05	Réseaux air comprimé	15 jrs	Mar 09/11/27	Mar 30/11/27
79	Lot 05	Test / mise en pression de réseaux air comprimé	8 jrs	Mer 01/12/27	Ven 10/12/27
80	Lot 05	Réseaux Eau potable compris essais	10 jrs	Mer 01/12/27	Mar 14/12/27
81					
82		Toiture basse	123 jrs	Lun 11/10/27	Ven 14/04/28
83		Evacuation du mobilier (MOA)	10 jrs	Lun 11/10/27	Ven 22/10/27
84	Lot 05 - 06 - 04	Dépose des éléments techniques FPL / neutralisation des réseaux	10 jrs	Lun 25/10/27	Lun 08/11/27
85	Lot 05 - 06	Dépose complémentaire des réseaux (GER)	10 jrs	Mar 02/11/27	Mar 16/11/27
86	Lot 01	Installation des protections en sous face toiture	10 jrs	Mer 17/11/27	Mar 30/11/27
87	Lot 01	Désamiantage cis protections provisoires	40 jrs	Lun 29/11/27	Ven 04/02/28
88	Lot 01	Zone 8	8 jrs	Lun 29/11/27	Mer 08/12/27
89	Lot 01	Zone 10	8 jrs	Jeu 09/12/27	Lun 03/01/28
90	Lot 01	Zone 7	8 jrs	Mar 04/01/28	Jeu 13/01/28
91	Lot 01	Zone 9	8 jrs	Ven 14/01/28	Mar 25/01/28
92	Lot 01	Zone 11	8 jrs	Mer 26/01/28	Ven 04/02/28
93	Lot 01	Pose des caissons définitifs (compris préparations)	82 jrs	Jeu 09/12/27	Ven 14/04/28
94	Lot 01	Zone 8	8 jrs	Jeu 09/12/27	Lun 03/01/28
95	Lot 01	Zone 10	8 jrs	Mar 04/01/28	Jeu 13/01/28
96	Lot 01	Zone 7	8 jrs	Ven 14/01/28	Mar 25/01/28
97	Lot 01	Zone 9	8 jrs	Mer 26/01/28	Ven 04/02/28
98	Lot 01	Zone 11	8 jrs	Lun 07/02/28	Mer 16/02/28
99	Lot 03	Remplacement des MEX	25 jrs	Jeu 13/01/28	Mer 16/02/28
100	Lot 01	Traitement des EP + raccordement sur réseaux existants	25 jrs	Jeu 17/02/28	Mer 22/03/28
101	Lot 01 - 02	Finitions toiture	30 jrs	Lun 07/02/28	Ven 17/03/28
102	Lot 07	Pose panneaux solaires	20 jrs	Lun 20/03/28	Ven 14/04/28
103	Lot 01	Fondations escaliers	5 jrs	Jeu 10/02/28	Jeu 17/02/28
104	Lot 02	Pose escaliers accès toiture	10 jrs	Jeu 17/02/28	Mer 01/03/28
105	Lot 01	Réseaux VRD	5 jrs	Jeu 17/02/28	Mer 23/02/28
106	Lot 04	Plafonds bois sheds	5 jrs	Jeu 17/02/28	Mer 23/02/28
107	Lot 04	Cloisons - Peintures / finitions en sous-face	30 jrs	Lun 07/02/28	Ven 17/03/28
108	Lot 05 - 06 - 04	Réseaux en plafonds / FPL	35 jrs	Jeu 17/02/28	Mer 05/04/28
109	Lot 06	Réseaux elec complémentaires lustrerie / machines	10 jrs	Jeu 23/03/28	Mer 05/04/28
110	Lot 06	Pose de la lustrerie	10 jrs	Jeu 30/03/28	Mer 12/04/28
111	Lot 06	Reprise modification des armoires elec	10 jrs	Lun 07/02/28	Ven 18/02/28
112	Lot 05	Réseaux air comprimé	15 jrs	Lun 07/02/28	Ven 25/02/28
113	Lot 05	Test / mise en pression de réseaux air comprimé	8 jrs	Lun 28/02/28	Mer 08/03/28
114	Lot 05	Réseaux Eau potable compris essais	10 jrs	Lun 28/02/28	Ven 10/03/28
115					
116		**Opérations de réception**	**31 jrs**	**Ven 14/04/28**	**Mer 31/05/28**
117		Fin des travaux	0 jr	Ven 14/04/28	Ven 14/04/28
118		Nettoyage d'OPR	5 jrs	Lun 17/04/28	Ven 21/04/28
119		OPR / RVRAT	1 jr	Lun 24/04/28	Lun 24/04/28
120		Levée des réserves	20 jrs	Mar 25/04/28	Mer 24/05/28
121		Nettoyage de réception	5 jrs	Jeu 25/05/28	Mer 31/05/28
122		Réception	0 jr	Mer 31/05/28	Mer 31/05/28
123					
124		Début GPA (12 mois)	0 jr	Mer 31/05/28	Mer 31/05/28
125					
126		**Neutralisation minimum des espaces GMP et GCCD**	**245 jrs**	**Lun 12/04/27**	**Mer 12/04/28**
127		Libération locaux GMP	10 jrs	Lun 12/04/27	Ven 23/04/27
128		Neutralisation locaux GMP	0 jr	Jeu 22/04/27	Jeu 22/04/27
129		Aménagement GMP	0 jr	Mar 12/10/27	Mar 12/10/27
130		Libération locaux GCCD haut	10 jrs	Ven 09/07/27	Ven 23/07/27
131		Neutralisation locaux GCCD haut	0 jr	Ven 23/07/27	Ven 23/07/27
132		Aménagement GCCD toiture haute	0 jr	Mer 01/03/28	Mer 01/03/28
133		Libération locaux GCCD bas	10 jrs	Lun 11/10/27	Ven 22/10/27
134		Neutralisation locaux GCCD bas	0 jr	Ven 22/10/27	Ven 22/10/27
135		Aménagement GCCD toiture basse	0 jr	Mer 12/04/28	Mer 12/04/28

