VS-A.EU
Façade Design
& Engineering

CENTRE HOSPITALIER DE DOUAI

Réparation des façades et menuiseries

DCE
OCTOBRE 2026

MOA	Centre Hospitalier de Douai	Rue de Cambrai, 59507 DOUAI
BET FACADE	VS-A.EU	41 Place Rihour, 59000 LILLE
OPC	CICANORD	37 Av. des Fleurs, 59110 La Madeleine

Affaire	*Phase*	*Entité*	*Emetteur*	*N° Pièce*	*Type*	*Indice*
CHD	**DCE**	**OPC**	**CIC**	**03**	**PLG**	**0**

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX




CENTRE HOSPITALIER DE DOUAI

REFECTION DES FACADES & MENUISERIES EXTERIEURES DU BATIMENT PRINCIPAL

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX - PHASE DCE

PLT 001 ind.B
Etabli par CD le 06/10/26

N°	Nom de la tâche	Concerne	Durée
1	**MARCHE**	**TOUS**	**490 jours**
2	OS DE DEMARRAGE PERIODE DE PREPARATION DE CHANTIER	TOUS	0 jour
3	PERIODE DE PREPARATION DE CHANTIER	TOUS	90 jours
4	OS DE DEMARRAGE DES TRAVAUX	TOUS	0 jour
5	PERIODE D'EXECUTION DES TRAVAUX VETURE FACADES PERIPHERIQUES	FAC EXT BARD VEC	395 jours
6	RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX VETURE FACADES PERIPHERIQUES	FAC EXT BARD VEC	0 jour
7	PERIODE D'EXECUTION DES TRAVAUX OUVRANTS FACADES PERIPHERIQUES & GRANDS PATIOS (TF)	MEN EXT	275 jours
8	RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX OUVRANTS FACADES PERIPHERIQUES & GRANDS PATIOS (TF)	MEN EXT	0 jour
9	PERIODE D'EXECUTION DES TRAVAUX OUVRANTS A PROJECTION & DE DESENFUMAGE (TO)	MEN EXT	91 jours
10	RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX OUVRANTS A PROJECTION & DE DESENFUMAGE (TO)	MEN EXT	0 jour
11	**TRAVAUX**	**TOUS**	**745 jours**
12	OS DE DEMARRAGE PERIODE DE PREPARATION DE CHANTIER	TOUS	0 jour
13	PERIODE DE PREPARATION DE CHANTIER	TOUS	45 jours
14	INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER	FAC EXT BARD VEC	10 jours
15	OS DE DEMARRAGE DES TRAVAUX	TOUS	0 jour
16	**CHANTIER VETURE FACADES PERIPHERIQUES**		**490 jours**
17	ETUDES & VISAS	FAC EXT BARD VEC	60 jours
18	**PROTOTYPE**	**FAC EXT BARD VEC**	**55 jours**
19	COMMANDE & APPROVISIONNEMENT PANNEAU NEUF POUR PROTOTYPE	FAC EXT BARD VEC	50 jours
20	REALISATION PROTOTYPE AVEC PANNEAU NEUF	FAC EXT BARD VEC	5 jours
21	PRESENTATION PROTOTYPE PANNEAU NEUF POUR MISE EN FABRICATION	FAC EXT BARD VEC	0 jour
22	**MAQUETTE**	**FAC EXT BARD VEC**	**50 jours**
23	COMMANDE & APPROVISIONNEMENT POUR MAQUETTE	FAC EXT BARD VEC	30 jours
24	REALISATION MAQUETTE POUR ESSAIS	FAC EXT BARD VEC	5 jours
25	ESSAIS SUR MAQUETTE EN LABORATOIRE	FAC EXT BARD VEC	15 jours
26	TRANSMISSION RAPPORT AVEC CONCLUSIONS DEFINITIVES DU LABORATOIRE SUITE ESSAIS	FAC EXT BARD VEC	0 jour
27	**TRAVAUX SUR VETURE**	**FAC EXT BARD VEC**	**400 jours**
28	COMMANDES & FABRICATION (OSSATURES, ATTACHES, …)	FAC EXT BARD VEC	80 jours
29	PREMIERES DEPOSES EN FACADE EST (HORS MAQUETTE)	FAC EXT BARD VEC	10 jours
30	RECONDITIONNEMENT PANNEAUX VITRES VETURE	FAC EXT BARD VEC	380 jours
31	REFECTION VETURE FACADE EST	FAC EXT BARD VEC	160 jours
32	REFECTION VETURE FACADE NORD	FAC EXT BARD VEC	75 jours
33	REFECTION VETURE FACADE OUEST	FAC EXT BARD VEC	140 jours
34	REFECTION VETURE FACADE SUD	FAC EXT BARD VEC	100 jours
35	CONTRÔLES VISUELS PAR MOE & LEVEE DES OBSERVATIONS (à l'avancement de la pose)	MOE	350 jours
36	PERIODE DE RECEPTION DES TRAVAUX	FAC EXT BARD VEC	5 jours
37	RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX	FAC EXT BARD VEC	0 jour
38	GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT	TOUS	255 jours
39	**CHANTIER OUVRANTS FACADES PERIPHERIQUES & GRANDS PATIOS (TRANCHE FERME)**	**MEN EXT**	**370 jours**
40	ETUDES & VISAS	MEN EXT	40 jours
41	COMMANDES & FABRICATION (QUINCAILLERIE, JOINTS, …)	MEN EXT	90 jours
42	**DEPOSE, REVISION & REPOSE OUVRANTS FACADES PERIPHERIQUES & GRANDS PATIOS**	**MEN EXT**	**275 jours**
43	NIVEAU SOUS-SOL	MEN EXT	10 jours
44	NIVEAU RDC	MEN EXT	45 jours
45	NIVEAU R+1	MEN EXT	50 jours
46	NIVEAU R+2	MEN EXT	55 jours
47	NIVEAU R+3	MEN EXT	60 jours
48	NIVEAU R+4	MEN EXT	55 jours
49	CONTRÔLES VISUELS PAR MOE & LEVEE DES OBSERVATIONS (à l'avancement de la pose)	MOE	275 jours
50	PERIODE DE RECEPTION DES TRAVAUX	MEN EXT	5 jours
51	RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX TRANCHE FERME	MEN EXT	0 jour
52	GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT	TOUS	239 jours
53	**CHANTIER OUVRANTS A PROJECTION HORIZONTALE & DE DESENFUMAGE (TRANCHE OPTIONNELLE)**	**MEN EXT**	**186 jours**
54	ETUDES & VISAS	MEN EXT	30 jours
55	COMMANDES & FABRICATION (QUINCAILLERIE, JOINTS, …)	MEN EXT	60 jours
56	**CONFORTEMENT OUVRANTS PETITS PATIOS**	**MEN EXT**	**91 jours**
57	PATIO 11	MEN EXT	10 jours
58	PATIO 12	MEN EXT	9 jours
59	PATIO 13	MEN EXT	9 jours
60	PATIO 14	MEN EXT	9 jours
61	PATIO 15	MEN EXT	10 jours
62	PATIO 16	MEN EXT	10 jours
63	PATIO 17	MEN EXT	8 jours
64	PATIO 18	MEN EXT	3 jours
65	PATIO 19	MEN EXT	9 jours
66	PATIO 20	MEN EXT	5 jours
67	PATIO 21	MEN EXT	6 jours
68	PATIO 22	MEN EXT	3 jours
69	CONTRÔLES VISUELS PAR MOE & LEVEE DES OBSERVATIONS (à l'avancement de la pose)	MOE	91 jours
70	PERIODE DE RECEPTION DES TRAVAUX	MEN EXT	5 jours
71	RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE	MEN EXT	0 jour
72	GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT	TOUS	233 jours

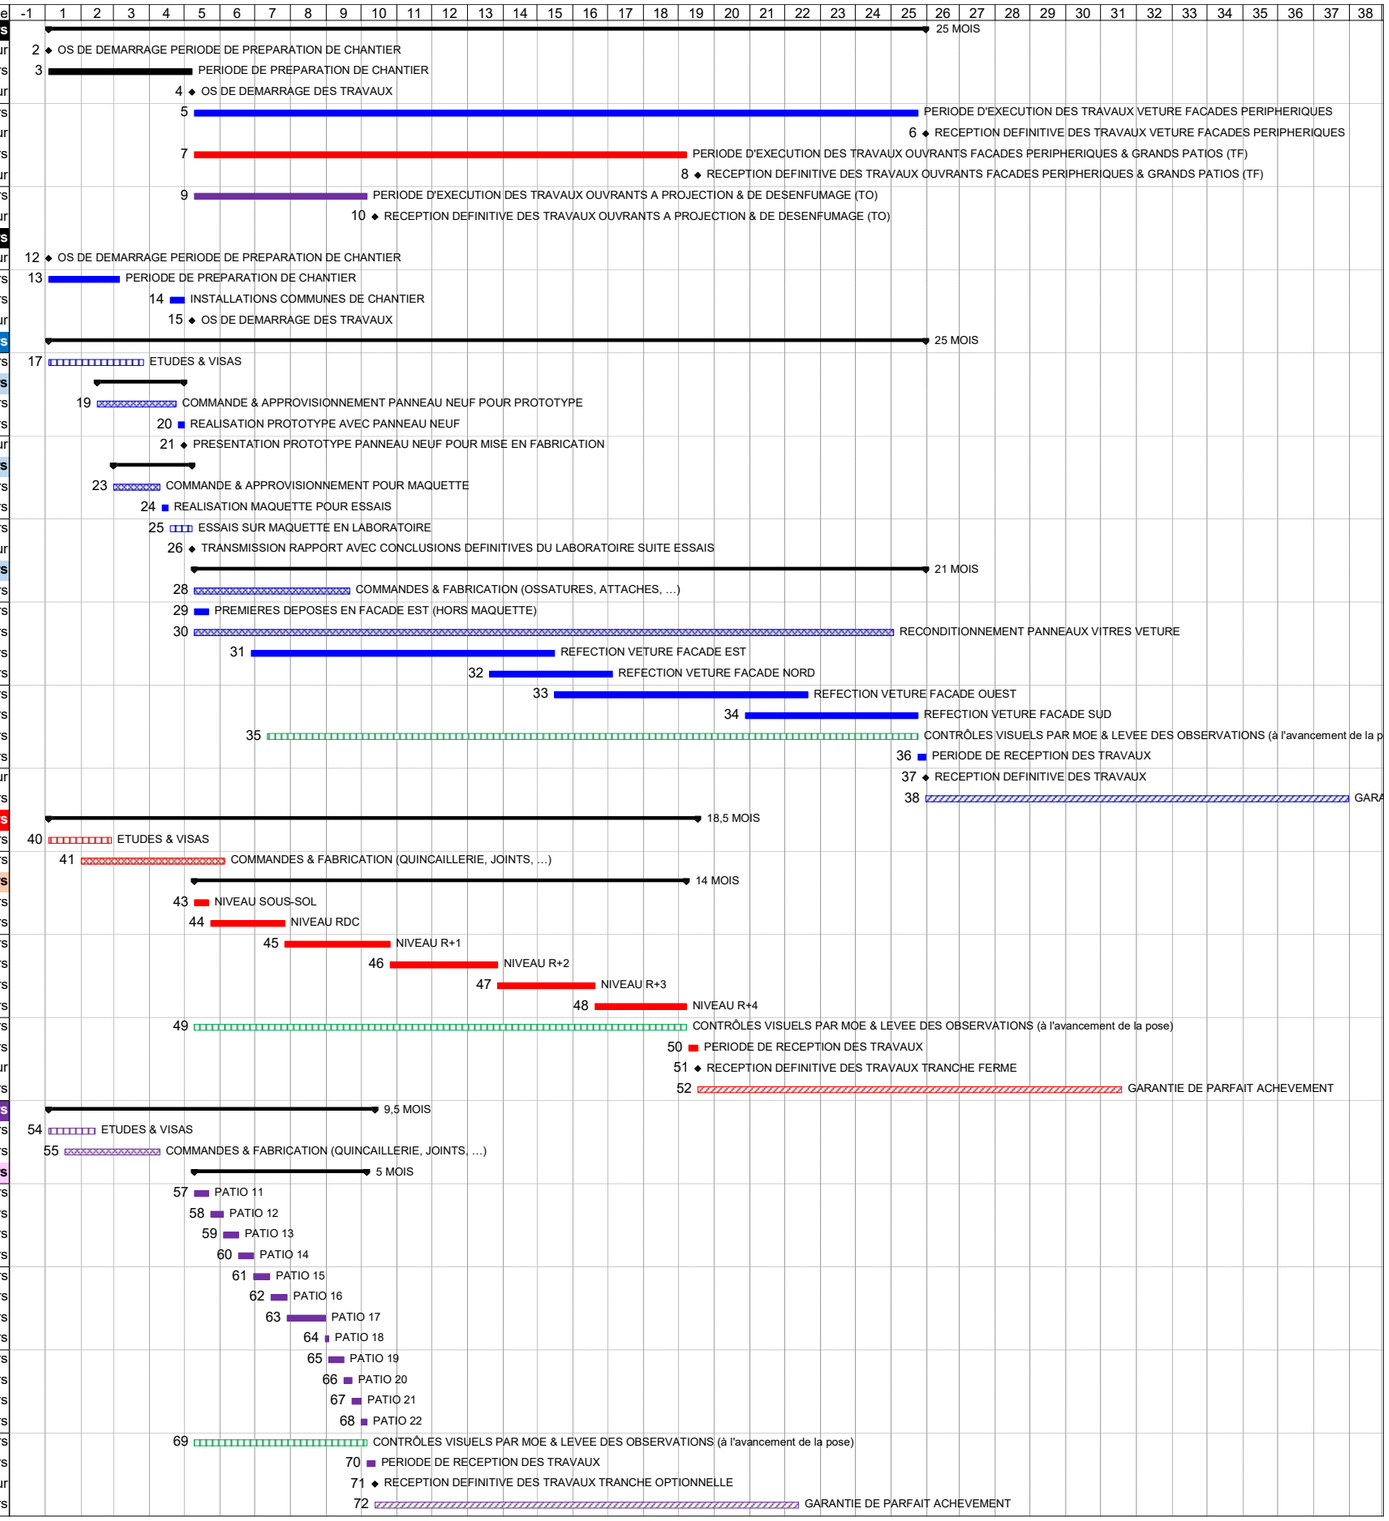

CICANORD - 37 Avenue des Fleurs - 59110 LA MADELEINE
T. 03 20 74 00 73 / Email. opc-facades-ch-douai@cicanord.fr
