

	Tâches
1	**TRAVAUX (18 mois)**
2	**BÂTIMENT GMP - PHASE 01**
3	Période de préparation - 1 mois
4	Installation de chantier
5	Dépose menuiseries existantes
6	Préfabrication caisson bois
7	Préfabrication menuiseries
8	Pose des caissons préfabriqués
9	Pose des accrotères
10	Pose des menuiseries et stores
11	Complément isolation + bardage equitone
12	isolation périphérique pied de façade
13	Isolation du vide sanitaire
14	**Travaux de toiture**
15	Dépose toiture existante
16	Isolation toiture - pare-vapeur
17	Étanchéité
18	Couvertines
19	**travaux intérieurs**
20	Dépose faux-plafonds
21	Percement amiante réseaux
22	Réseaux CVC
23	Réseaux Élec
24	Pose des luminaires
25	Faux-plafonds et finitions
26	Finition et nettoyage
27	Fin travaux GMP
28	Ouverture GMP étudiants
29	**BÂTIMENT H - PHASE 02**
30	Déménagement installation - 1 mois
31	Dépose menuiseries existantes
32	Préfabrication caisson bois
33	Préfabrication menuiseries
34	Pose des caissons préfabriqués
35	Pose des accrotères
36	Pose des menuiseries et stores
37	Complément isolation + bardage equitone
38	Pose des menuiseries métallique
39	isolation périphérique pied de façade
40	**travaux intérieurs**
41	Dépose faux-plafonds
42	Réseaux CVC
43	Réseaux Élec
44	Pose des luminaires
45	Faux-plafonds et finitions
46	Finition et nettoyage
47	Fin bâtiment H
48	**ATELIERS ET BUREAUX - PHASE 03**
49	Déménagement installation - 1 mois
50	Dépose menuiseries existantes
51	Préfabrication menuiseries
52	Pose des menuiseries
53	ITE façades
54	Enduit et finitions
55	ITE sur sheds
56	Enduit et finitions toiture - Sheds
57	isolation périphérique pied de façade
58	**Travaux de toiture**
59	Dépose toiture existante
60	Isolation toiture - pare-vapeur
61	Étanchéité
62	Couvertine
63	**travaux intérieurs**
64	Dépose faux-plafonds
65	Réseaux CVC
66	Réseaux Élec
67	Pose des luminaires
68	Faux-plafonds et finitions
69	Finition et nettoyage
70	Fin Ateliers et bureaux
71	OPR: 5 semaines
72	Levées réserves: 5 semaines
73	RÉCEPTION - Septembre 2028

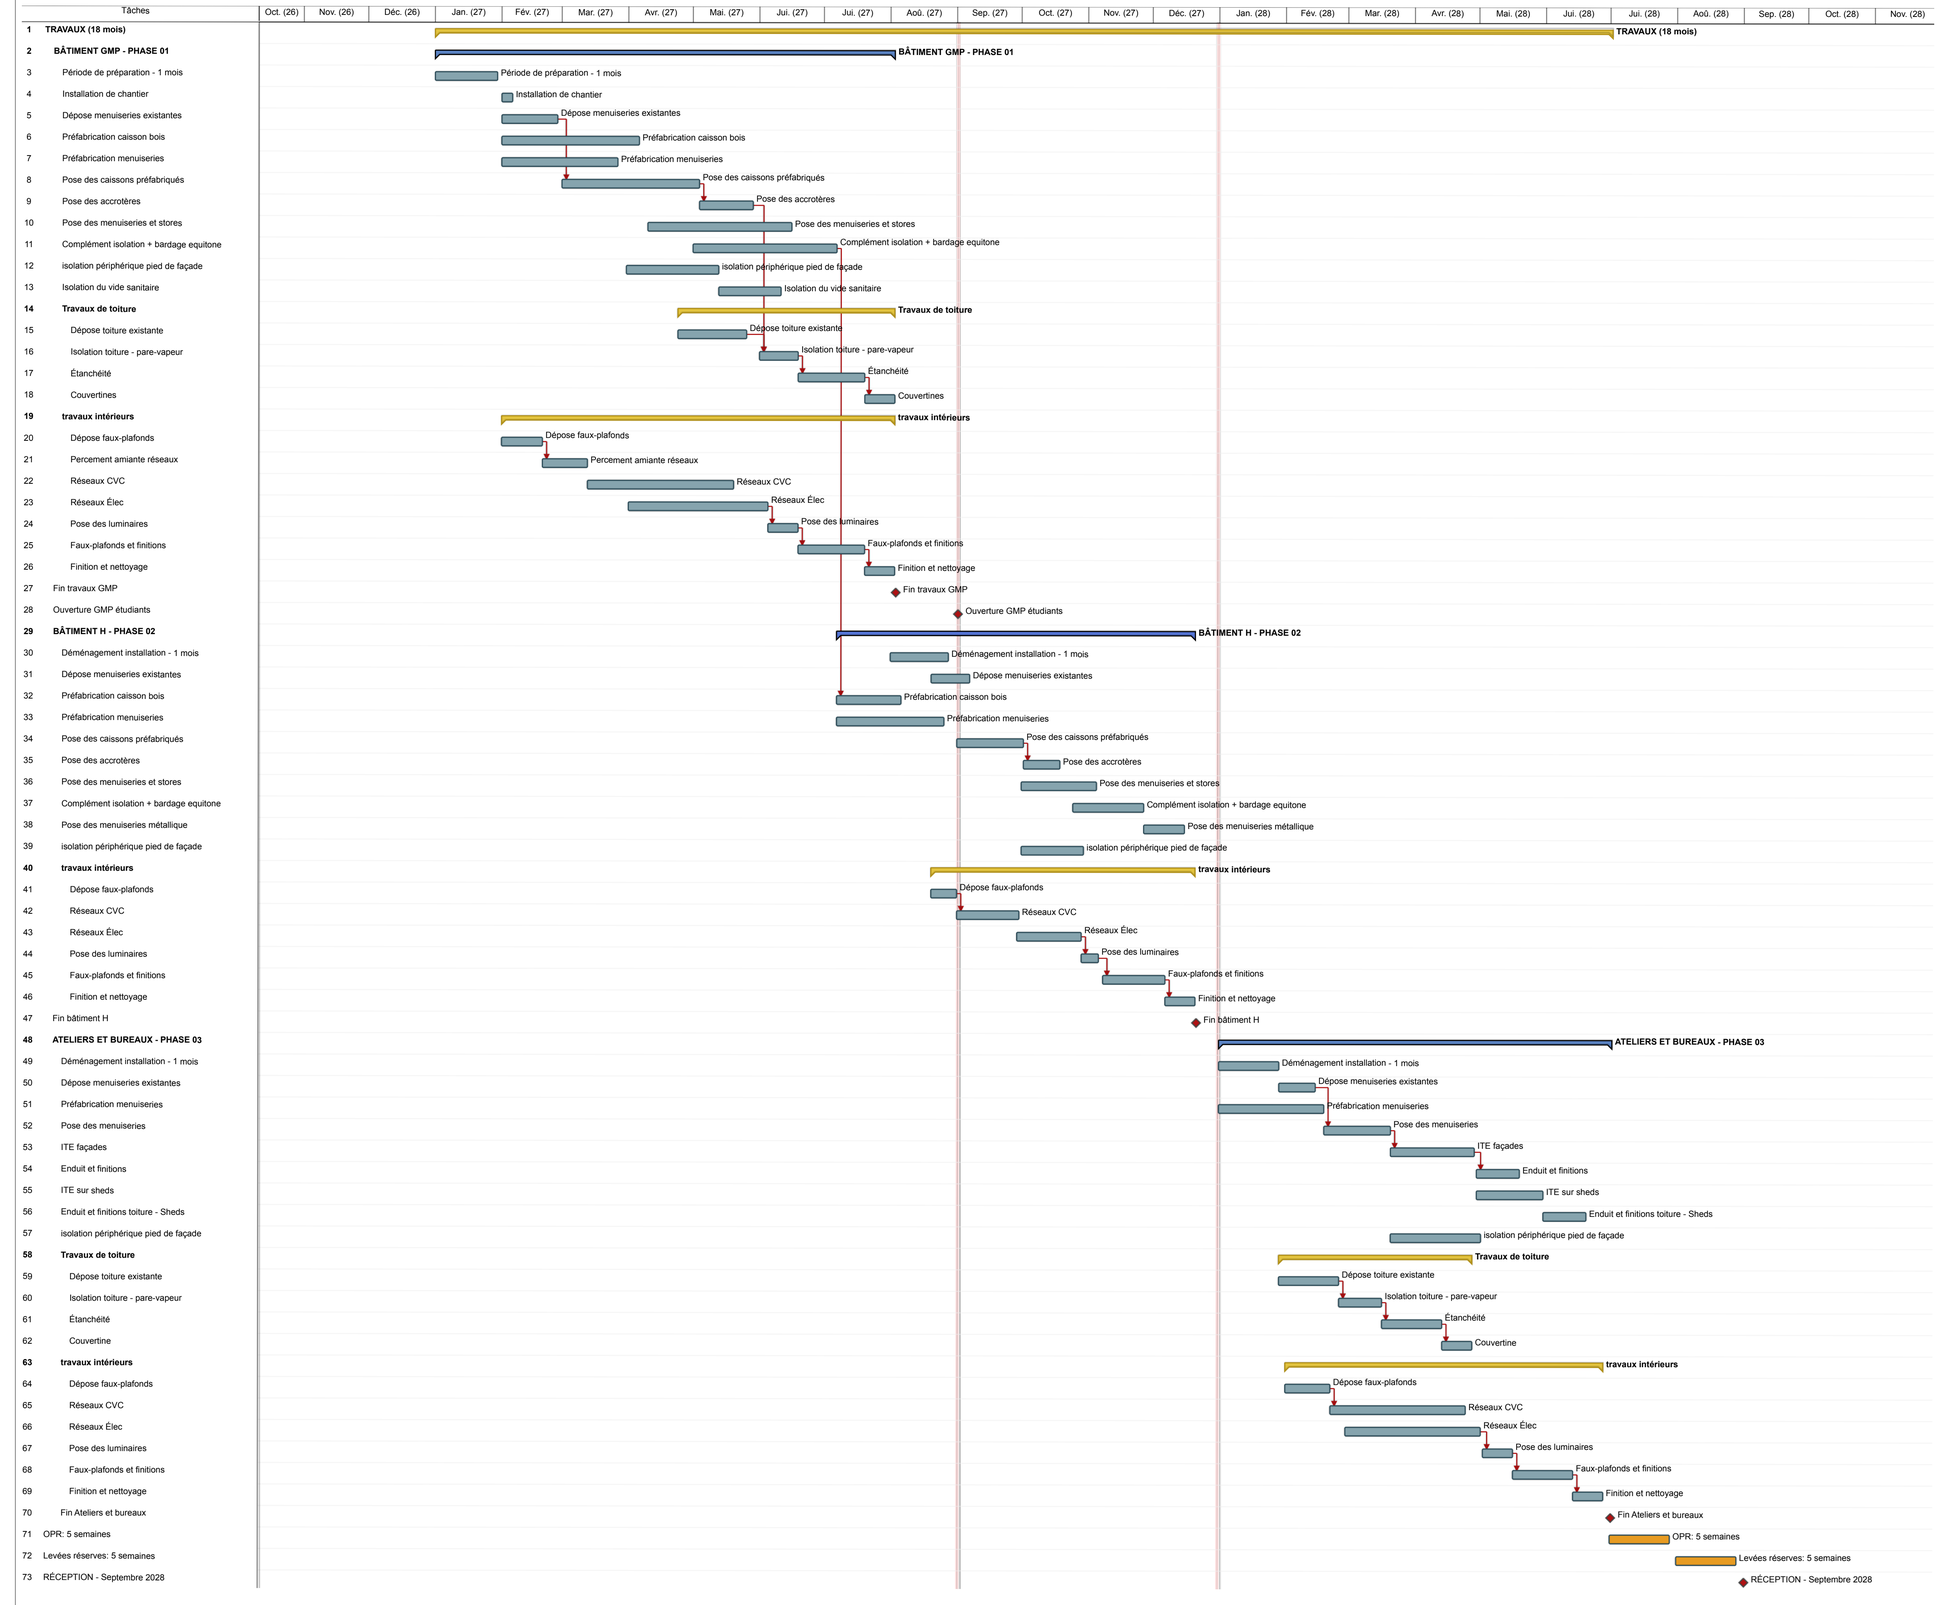

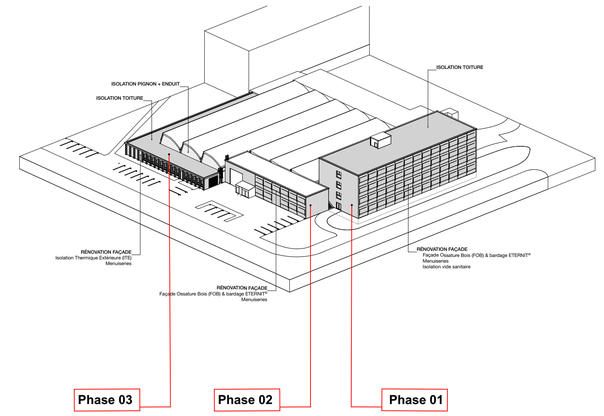

Date	Nom de changement	RevID
09/10/2026	Première édition - Octobre 2026	01

Maître d'ouvrage
Université de Lorraine
34 Cours Leopold
54000 NANCY

Rénovation thermique département GMP
IUT METZ

Architecte mandataire et économiste
MIL LIEUX
22, rue Erckmann Chatrian
54000 NANCY
tel : 03 83 28 86 03 - fax : 03 83 28 87 33
e-mail : jp.donze@mil-lieux.fr - m.fucks@mil-lieux.fr

BET FLUIDES	**PLAN 9** 5b rue du Grand Rabbin Haguenauer 54 000 NANCY tel : 03 83 31 77 72 e-mail: plan9nancy@free.fr	**BET Structure**	**OMNITECH** 7 chemin de la Moselle 57160 SCY-CHAZELLES tel : 03 87 18 11 40 e-mail: contact@betomnitech.fr	**Bureau de Contrôle**	**BTP CONSULTANT** 92 boulevard de la Solidarité 57050 METZ tel : 03 72 39 54 63 e-mail: sebastien.mallica@btp-consultants.fr
CSPS	**ALPES CONTROLES** 1 rue Jean Antoine Chaptal 57 000 METZ tel : 03 72 39 53 47 e-mail : metz@alpes-controles.fr				



DCE

OPC-01
Planning général

11/10/2026 | 01

FORMAT D'ÉDITION :

EMETTEUR : MIL LIEUX

RDC NGF : + 168,10
