DIAGOBAH
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

UNIVERSITÉ DE LORRAINE

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFERENCES	DÉSIGNATION DU BIEN	PROPRIÉTAIRE
Référence dossier : **26LGU0145** Réalisé le : **30/04/2026** Référence bien : **GMP du RDC à la Toiture - DPI657/4500807904**	**CAMPUS DE SAULCY GMP** **57000 METZ**	**UNIVERSITE DE LORRAINE** **34 Cours Léopold** **54052 NANCY CEDEX**

OBJET DE LA MISSION

PRÉ-REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

SYNTHÈSE DU REPÉRAGE



SOMMAIRE

1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

1.1 Désignation de l'immeuble bâti visité
1.2 Désignation du propriétaire
1.3 Désignation du donneur d'ordre
1.4 Opérateur de repérage
1.5 Société
1.6 Laboratoire d'analyses

2. CONCLUSIONS

2.1 Conclusion du repérage
2.2 Réserves et commentaires

3. LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S)

3.1 Liste des locaux visités
3.2 Liste des locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

4. ÉTUDE PRÉALABLE

4.1 Programme de travaux du donneur d'ordre
4.2 Périmètre défini par le donneur d'ordre
4.3 Objectif de la mission
4.4 Programme de repérage de la mission
4.5 Analyse des documents transmis
4.6 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapports aux normes en vigueur
4.7 Plan et procédures de prélèvements

5. CONDITIONS DE REPÉRAGES

5.1 Modalités de repérages
5.2 Obligations de communication du rapport de repérage

6. RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE

6.1 Tableau des mesures
6.2 Quantitatif de matériaux amiantés

7. ANNEXES

PRÉ-RAPPORT DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT RÉALISATION DE TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BÂTI

La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis. Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

1.1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE BÂTI VISITÉ

Adresse : **CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ**

Référence bien : **GMP du RDC à la Toiture - DPI657/4500807904**

Date de construction : **Date du permis de construire non connue**

1.2 DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

UNIVERSITE DE LORRAINE
34 Cours Léopold
54052 NANCY CEDEX

1.3 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

UNIVERSITE DE LORRAINE
34 Cours Léopold
54052 NANCY CEDEX

1.4 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

*Nom : **M VEGEZZI Thibault***
*N° de certification : **1495***
*Délivré le : **26/04/2023***
*Échéance le : **25/04/2030***
*Accompagnateur : **Sans accompagnateur***



Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LA CERTIFICATION DE PERSONNES - 25 Avenue Léonard de Vinci, Immeuble Europarc, 33600 PESSAC

1.5 SOCIÉTÉ

Raison sociale : **DIAGOBAH** (SIRET : **88429685600039**)

Adresse : **1 rue René Laennec, 67300 Schiltigheim**

Assurance : **AXA**

Numéro de police et date de validité : **10825380704 / 30/06/2026**

1.6 LABORATOIRE D'ANALYSES

Raison sociale : **ITGA Metz**

Adresse : **1 Rue Graham Bell - Technopole 2000 57070 METZ**

Numéro de l'accréditation Cofrac : **n° 1-6091 - 39408269700506**

2. CONCLUSIONS

2.1 CONCLUSION DU REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE DEGRADATION
P042	Extérieur - Façades	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Non visible
P047 ; P056 ; P022	Extérieur - Façades	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic	Joint de mastic	Bon état
P028 ; P048 ; P053	Extérieur - Façades	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de caisson de volets	Joint de mastic de caisson de volets	Bon état
P058	R+1 - Pièce 52	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre	Bon état
	R+1 - Pièce 54	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre	Bon état
P064	R+1 - Pièce 56	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre	Bon état
	Rez-de-Chaussée - Circulation 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	Rez-de-Chaussée - Circulation 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	Rez-de-Chaussée - Pièce 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	Rez-de-Chaussée - Pièce 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	Rez-de-Chaussée - Dégagement 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	Rez-de-Chaussée - Placard 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	Rez-de-Chaussée - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	Rez-de-Chaussée - Circulation 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	Rez-de-Chaussée - Circulation 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	Rez-de-Chaussée - Circulation 5	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
P032	Rez-de-Chaussée - Circulation 6	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	Rez-de-Chaussée - Pièce 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	Rez-de-Chaussée - Pièce 5	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	Rez-de-Chaussée - Pièce 6	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	Rez-de-Chaussée - Pièce 9	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
P026	Rez-de-Chaussée - Pièce 13	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE DEGRADATION
	Rez-de-Chaussée - Pièce 14	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	Rez-de-Chaussée - Pièce 15	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	Rez-de-Chaussée - Pièce 16	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
P021	Rez-de-Chaussée - Pièce 17	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	Rez-de-Chaussée - Pièce 18	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
P017	Rez-de-Chaussée - Pièce 19	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	Rez-de-Chaussée - Pièce 20	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	Rez-de-Chaussée - SAS 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
P010	Rez-de-Chaussée - Circulation 7	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
P005	Rez-de-Chaussée - Circulation 8	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	Rez-de-Chaussée - SAS 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
P013	Rez-de-Chaussée - Pièce 22	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	Rez-de-Chaussée - Escalier 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	Rez-de-Chaussée - Pièce 23	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	Rez-de-Chaussée - Pièce 24	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
P008	Rez-de-Chaussée - Pièce 25	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	Rez-de-Chaussée - Pièce 26	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	Rez-de-Chaussée - Pièce 27	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	Rez-de-Chaussée - Pièce 28	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+1 - Pièce 48	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+1 - Pièce 49	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+1 - Pièce 50	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+1 - Placard 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+1 - Circulation 11	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
P043	R+1 - Circulation 13	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE DEGRADATION
	R+1 - Circulation 14	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+1 - Circulation 15	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+1 - Circulation 16	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+1 - Circulation 17	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+1 - Pièce 51	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+1 - Pièce 52	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+1 - Pièce 53	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+1 - Pièce 54	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+1 - Pièce 55	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+1 - Pièce 56	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+1 - Pièce 57	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+1 - Pièce 58	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+1 - Pièce 60	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+1 - Dégagement 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+1 - Sanitaire 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
P060	R+1 - Pièce 61	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+1 - Pièce 62	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+1 - Pièce 63	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
P066	R+1 - Pièce 64	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+1 - Pièce 65	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+1 - Pièce 66	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+1 - Pièce 67	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+2 - Escalier 5	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+2 - Escalier 6	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
P070	R+2 - Circulation 18	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE DEGRADATION
P067	R+2 - Circulation 19	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
P079	R+2 - Dégagement 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+2 - Sanitaire 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+2 - Pièce 69	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
P074	R+2 - Pièce 70	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+2 - Sanitaire 5	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+2 - Pièce 71	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
P076	R+2 - Pièce 72	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+2 - Pièce 73	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+3 - Escalier 8	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
P086	R+3 - Circulation 20	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
P088	R+3 - Circulation 21	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
P072	R+2 - Dégagement 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+3 - Sanitaire 7	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+3 - Pièce 74	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+3 - Pièce 75	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
P082	R+3 - Dégagement 5	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
P095	R+3 - Dégagement 6	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+3 - Sanitaire 9	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+3 - Pièce 76	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
P084	R+3 - Pièce 77	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+3 - Pièce 78	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+3 - Pièce 79	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+3 - Pièce 80	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+3 - Pièce 81	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE DEGRADATION
	R+3 - Pièce 82	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+3 - Pièce 83	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
P090	R+3 - Pièce 84	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
	R+3 - Pièce 85	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Bon état
P014 ;P018	Rez-de-Chaussée - Pièce 19	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
	Rez-de-Chaussée - Pièce 20	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
	Rez-de-Chaussée - WC 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
	Rez-de-Chaussée - WC 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
	Rez-de-Chaussée - WC 3	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
	Rez-de-Chaussée - WC 4	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
	Rez-de-Chaussée - Local Technique 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
P012	Rez-de-Chaussée - Pièce 22	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
	Rez-de-Chaussée - Pièce 24	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
P007	Rez-de-Chaussée - Pièce 25	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
	Rez-de-Chaussée - Local Technique 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
	Rez-de-Chaussée - Local Technique 3	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
	Rez-de-Chaussée - Local Technique 4	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
	Rez-de-Chaussée – Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
	Rez-de-Chaussée – Circulation 3	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
	Rez-de-Chaussée - Circulation 4	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE DEGRADATION
	Rez-de-Chaussée - Circulation 5	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
P024	Rez-de-Chaussée - Pièce 13	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
	Rez-de-Chaussée - Pièce 14	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
	Rez-de-Chaussée - Pièce 15	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
	Rez-de-Chaussée - Pièce 17	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
P019	Rez-de-Chaussée - Pièce 18	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
P057	R+1 - Pièce 52	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
	R+1 - Pièce 54	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
P063	R+1 - Pièce 56	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
	R+1 - Local Technique 5	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
	R+1 - Local Technique 6	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
	R+1 - Local Technique 7	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
	R+2 - Pièce 71	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
	R+2 - Pièce 72	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
	R+2 - Pièce 73	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
	R+2 - Local Technique 8	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
	R+2 - Local Technique 9	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
	R+2 - Local Technique 10	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
	R+3 - Pièce 80	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE DEGRADATION
	R+3 - Pièce 82	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
	R+3 - Pièce 84	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
	R+3 - Local Technique 11	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
	R+3 - Local Technique 12	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible
P092	R+3 - Local Technique 13	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non visible

2.2 RÉSERVES ET COMMENTAIRES

Commentaire n°01 : Interprétation des résultats
Lors de nos investigations initiales, il s'est avéré qu'il a été décelé une incohérence des résultats sur certains matériaux pour lesquels des investigations complémentaires seraient judicieuses. A savoir :

_ Enduit ciment sur les murs porteurs de l'ensemble du bâtiment
_ Enduit de jointement des plaques de plâtre (Colle de carreaux de plâtre) ainsi que l'enduit plâtre de la zone courante de ces cloisons
_ Joint d'étanchéité entre la menuiserie et la structure (Compriband) des menuiseries extérieures

Ces investigations ont pour objectif d'affiner précisément et de manière exhaustive, la localisation du matériau contenant de l'amiante.
Pour ce faire, une campagne d'investigation est à prévoir sur ces matériaux.

Commentaire n°02 : Edition du rapport
L'édition de ce rapport a été réalisé en prenant en considération les incohérences des résultats obtenues (voir commentaire n°01). De fait, la localisation des matériaux contenant de l'amiante dans ce rapport est « au plus défavorable » en attendant la réalisation d'une intervention complémentaire.

Commentaire n°03 : Quantitatif des matériaux contenant de l'amiante
Dans le cadre de cette première édition de rapport, le quantitatif n'a pas été réalisé dans l'attente de la réalisation des compléments d'investigations.
Le quantitatif sera établit après étude de notre seconde intervention permettant de statuer de manière exhaustive la localisation des matériaux contenant de l'amiante

3. LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S)

3.1 *LISTE DES LOCAUX VISITÉS*

Nombre de locaux visités : 171

Rez-de-Chaussée - Atelier, Rez-de-Chaussée - Circulation 1, Rez-de-Chaussée - Circulation 2, Rez-de-Chaussée - Pièce 1, Rez-de-Chaussée - Escalier 1, Rez-de-Chaussée - Pièce 2, Rez-de-Chaussée - Pièce 3, Rez-de-Chaussée - Dégagement 1, Rez-de-Chaussée - Placard 1, Rez-de-Chaussée - Escalier 2, Rez-de-Chaussée - Circulation 3, Rez-de-Chaussée - Circulation 4, Rez-de-Chaussée - Circulation 5, Rez-de-Chaussée - Circulation 6, Rez-de-Chaussée - Pièce 4, Rez-de-Chaussée - Pièce 5, Rez-de-Chaussée - Pièce 6, Rez-de-Chaussée - Pièce 7, Rez-de-Chaussée - Pièce 8, Rez-de-Chaussée - Pièce 9, Rez-de-Chaussée - Pièce 10, Rez-de-Chaussée - Pièce 11, Rez-de-Chaussée - Pièce 12, Rez-de-Chaussée - Pièce 13, Rez-de-Chaussée - Pièce 14, Rez-de-Chaussée - Pièce 15, Rez-de-Chaussée - Pièce 16, Rez-de-Chaussée - Pièce 17, Rez-de-Chaussée - Pièce 18, Rez-de-Chaussée - Pièce 19, Rez-de-Chaussée - Pièce 20, Rez-de-Chaussée - WC 1, Rez-de-Chaussée - WC 2, Rez-de-Chaussée - WC 3, Rez-de-Chaussée - WC 4, Rez-de-Chaussée - Local Technique 1, Rez-de-Chaussée - SAS 1, Rez-de-Chaussée - Circulation 7, Rez-de-Chaussée - Circulation 8, Rez-de-Chaussée - SAS 2, Rez-de-Chaussée - Pièce 21, Rez-de-Chaussée - Pièce 22, Rez-de-Chaussée - Escalier 3, Rez-de-Chaussée - Escalier 4, Rez-de-Chaussée - Pièce 23, Rez-de-Chaussée - Pièce 24, Rez-de-Chaussée - Pièce 25, Rez-de-Chaussée - Pièce 26, Rez-de-Chaussée - Pièce 27, Rez-de-Chaussée - Pièce 28, Rez-de-Chaussée - Local Technique 2, Rez-de-Chaussée - Local Technique 3, Rez-de-Chaussée - Local Technique 4, Atelier - Pièce 29, Atelier - Pièce 30, Atelier - Pièce 31, Atelier - Pièce 32, Atelier - Circulation 9, Atelier - Pièce 33, Atelier - Pièce 34, Atelier - Pièce 35, Atelier - Pièce 36, Atelier - Pièce 37, Atelier - Pièce 38, Atelier - Pièce 39, Atelier - Pièce 40, Atelier - Pièce 41, Atelier - Pièce 42, Atelier - Pièce 43, Atelier - Pièce 44, Atelier - Pièce 45, Atelier - Circulation 10, Atelier - Pièce 46, Atelier - Pièce 47, R+1 - Pièce 48, R+1 - Pièce 49, R+1 - Pièce 50, R+1 - Placard 2, R+1 - Circulation 11, R+1 - Circulation 12, R+1 - Circulation 13, R+1 - Circulation 14, R+1 - Circulation 15, R+1 - Circulation 16, R+1 - Circulation 17, R+1 - Pièce 51, R+1 - Pièce 52, R+1 - Pièce 53, R+1 - Pièce 54, R+1 - Pièce 55, R+1 - Pièce 56, R+1 - Pièce 57, R+1 - Pièce 58, R+1 - Pièce 59, R+1 - Pièce 60, R+1 - Local Technique 5, R+1 - Local Technique 6, R+1 - Local Technique 7, R+1 - Dégagement 2, R+1 - Sanitaire 1, R+1 - Sanitaire 2, R+1 - WC 1, R+1 - WC 2, R+1 - WC 3, R+1 - Pièce 61, R+1 - Pièce 62, R+1 - Pièce 63, R+1 - Pièce 64, R+1 - Pièce 65, R+1 - Pièce 66, R+1 - Pièce 67, R+1 - Pièce 68, R+2 - Escalier 5, R+2 - Escalier 6, R+2 - Circulation 18, R+2 - Circulation 19, R+2 - Dégagement 3, R+2 - Sanitaire 3, R+2 - Sanitaire 4, R+2 - WC 4, R+2 - WC 5, R+2 - WC 6, R+2 - Pièce 69, R+2 - Pièce 70, R+2 - Sanitaire 5, R+2 - Sanitaire 6, R+2 - WC 7, R+2 - WC 8, R+2 - WC 9, R+2 - Pièce 71, R+2 - Pièce 72, R+2 - Pièce 73, R+2 - Local Technique 8, R+2 - Local Technique 9, R+2 - Local Technique 10, R+3 - Escalier 7, R+3 - Escalier 8, R+3 - Circulation 20, R+3 - Circulation 21, R+2 - Dégagement 4, R+3 - WC 10, R+3 - WC 11, R+3 - WC 12, R+3 - Sanitaire 7, R+3 - Sanitaire 8, R+3 - Pièce 74, R+3 - Pièce 75, R+3 - Dégagement 5, R+3 - Dégagement 6, R+3 - WC 13, R+3 - WC 14, R+3 - WC 15, R+3 - Sanitaire 9, R+3 - Sanitaire 10, R+3 - Pièce 76, R+3 - Pièce 77, R+3 - Pièce 78, R+3 - Pièce 79, R+3 - Pièce 80, R+3 - Pièce 81, R+3 - Pièce 82, R+3 - Pièce 83, R+3 - Pièce 84, R+3 - Pièce 85, R+3 - Local Technique 11, R+3 - Local Technique 12, R+3 - Local Technique 13, Extérieur - Toiture 1, Extérieur - Pièce 86, Extérieur - Façades, Toiture 2

3.2 *LISTE DES LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)*

Nombre de locaux non visités : 0

LOCALISATION	*PARTIES DU LOCAL*	*RAISON*
Néant	-	

4. ÉTUDE PRÉALABLE

4.1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

_ Percement pour le passage des gaines de ventilation conformément aux plans transmis
_ Remplacement des menuiseries extérieures

4.2 PÉRIMÈTRE DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

4.3 OBJECTIF DE LA MISSION

« Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux ». Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

4.4 PROGRAMME DE REPÉRAGE DE LA MISSION

Le programme de repérage est défini par l'arrêté du 16 juillet 2019 et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017. **Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020** d'août 2017 (liste non exhaustive) :

1 - COUVERTURES, TOITURES, TERRASSES ET ETANCHEITES	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
	Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières
2 - PAROIS VERTICALES EXTERIEURES ET FAÇADES	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
	Éléments associés aux façades
3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
4 - PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
	Suspentes et contrevents
5 - PLANCHERS ET PLANCHERS TECHNIQUES	Revêtements de sols
6 - CONDUITS ET ACCESSOIRES INTERIEURS	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
7 - ASCENSEURS, MONTE-CHARGES ET ESCALIERS MECANIQUES	Portes et cloisons palières
	Parois des équipements
	Matériels en machinerie
8 - ÉQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	Fusibles à broche
	Canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
9 - FONDATIONS ET SOUBASSEMENTS	Étanchéité des murs enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées
	Conduits et fourreaux
10 - AMENAGEMENTS, VOIRIES ET RESEAUX DIVERS	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs

	Aménagements extérieurs

4.5 *ANALYSE DES DOCUMENTS TRANSMIS*

DOCUMENTS DEMANDÉS	*DOCUMENTS REMIS*
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :
Néant

4.6 ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORTS AUX NORMES EN VIGUEUR

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017.

OBSERVATIONS	*OUI*	*NON*	*SANS OBJET*
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	x
Vide sanitaire accessible			x
Combles ou toiture accessibles et visitables			x

4.7 PLAN ET PROCÉDURES DE PRÉLÈVEMENTS

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. CONDITIONS DE REPÉRAGES

5.1 MODALITÉS DE REPÉRAGES

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage rechercher la présence de Matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autres aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la liste des matériaux de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers.

L'ensemble du périmètre du bien concerné par les travaux doit être inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés, l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas exceptionnels, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être menées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de Zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendues des ZPSO.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux ou produits utilisées, il atteste, le cas échant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaire pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017, les analyses des échantillons de ces matériaux ou produits sont réalisées couches par couches par un organismes accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

5.2 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPÉRAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personnes physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti. Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

6. RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE

6.1 TABLEAU DES MESURES

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
M001	-	Extérieur - Toiture 1	-	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments associés à la toiture	-isolant polystyrène	-isolant polystyrène	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
M002		Toiture 2		1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments associés à la toiture	-Isolant extrudé 20cm	-Isolant extrudé 20cm	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-001		Rez-de-Chaussée - Pièce 13		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 14		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 15		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 16		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 17		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 18		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 21		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 22		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 23		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 24		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 25		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-001		Rez-de-Chaussée - Pièce 26		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P001	Rez-de-Chaussée - Pièce 27		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	P009	Rez-de-Chaussée - Circulation 7		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Circulation 8		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P002	Rez-de-Chaussée - Pièce 27		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	P027	Rez-de-Chaussée - Pièce 13		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 14		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 15		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 16		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 17		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 18		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 21		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 22		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 24		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 25		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 26		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-003	P003	Rez-de-Chaussée - Pièce 27		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 27		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004		Rez-de-Chaussée - Pièce 13		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 14		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 15		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 16		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 17		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 18		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 21		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 22		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 23		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 24		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 25		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 26		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P004	Rez-de-Chaussée - Pièce 27		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	P010	Rez-de-Chaussée - Circulation 7	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-005	P005	Rez-de-Chaussée - Circulation 8	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
ZPSO-006	P011	Rez-de-Chaussée - Circulation 7	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	Joint de dilatation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P006	Rez-de-Chaussée - Circulation 8	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	Joint de dilatation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	P012	Rez-de-Chaussée - Pièce 22		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 24		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P007	Rez-de-Chaussée - Pièce 25		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
ZPSO-008	P013	Rez-de-Chaussée - Pièce 22		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 24		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P008	Rez-de-Chaussée - Pièce 25		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009		Rez-de-Chaussée - Circulation 7		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Béton brut	Béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Rez-de-Chaussée - Circulation 8		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Béton brut	Béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-010		Rez-de-Chaussée - Pièce 13		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Rez-de-Chaussée - Pièce 14		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Rez-de-Chaussée - Pièce 15		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Rez-de-Chaussée - Pièce 16		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Rez-de-Chaussée - Pièce 17		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-010		Rez-de-Chaussée - Pièce 18		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Rez-de-Chaussée - Pièce 20		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Rez-de-Chaussée - Pièce 21		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Rez-de-Chaussée - Pièce 22		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Rez-de-Chaussée - Pièce 23		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Rez-de-Chaussée - Pièce 24		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Rez-de-Chaussée - Pièce 25		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Rez-de-Chaussée - Pièce 26		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-011	P014	Rez-de-Chaussée - Pièce 19	Cloison pièces humides	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 20		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
ZPSO-012	P015	Rez-de-Chaussée - Pièce 19	Cloison pièces humides	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 20		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	P034	Rez-de-Chaussée - Circulation 6		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 6		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P016	Rez-de-Chaussée - Pièce 19		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 20		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-014	P032	Rez-de-Chaussée - Circulation 6		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 6		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P017	Rez-de-Chaussée - Pièce 19		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 20		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	P018	Rez-de-Chaussée - Pièce 19		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
ZPSO-016		Rez-de-Chaussée - Escalier 2		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Circulation 3		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Circulation 4		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Circulation 5		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P024	Rez-de-Chaussée - Pièce 13		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 14		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 15		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 17		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P019	Rez-de-Chaussée - Pièce 18		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
ZPSO-017		Rez-de-Chaussée - Escalier 2	Cloisons légères	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Circulation 3	Cloisons légères	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-017		Rez-de-Chaussée - Circulation 4	Cloisons légères	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Circulation 5	Cloisons légères	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P025	Rez-de-Chaussée - Pièce 13	Cloisons légères	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 14	Cloisons légères	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 15	Cloisons légères	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 17	Cloisons légères	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P020	Rez-de-Chaussée - Pièce 18	Cloisons légères	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018		Rez-de-Chaussée - Escalier 2	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Circulation 3	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Circulation 4	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Circulation 5	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P026	Rez-de-Chaussée - Pièce 13	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 14	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 15	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P021	Rez-de-Chaussée - Pièce 17	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 18	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-020		Rez-de-Chaussée - Pièce 21	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 22	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 23	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P023	Rez-de-Chaussée - Pièce 24	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 25	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 26	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	P033	Rez-de-Chaussée - Circulation 6		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 6		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P029	Rez-de-Chaussée - Pièce 15		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-023	P030	Rez-de-Chaussée - Pièce 15		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-024	P031	Rez-de-Chaussée - Pièce 15		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-025	P035	Rez-de-Chaussée - Atelier	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P037	Rez-de-Chaussée - Atelier	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026	P036	Rez-de-Chaussée - Atelier	Mezzanine	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-027	P038	Rez-de-Chaussée - Atelier	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint d'assemblage	Joint d'assemblage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P039	Rez-de-Chaussée - Atelier		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint d'assemblage	Joint d'assemblage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-028	P040	R+1 - Pièce 68	Cloison pièces humides	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-029	P041	R+1 - Pièce 68		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-031	P043	R+1 - Circulation 13	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Circulation 14	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
ZPSO-032	P044	R+1 - Circulation 13	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	Joint de dilatation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Circulation 14	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	Joint de dilatation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-033		R+1 - Circulation 16	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mastic partie basse	Mastic partie basse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P051	R+1 - Pièce 51		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mastic partie basse	Mastic partie basse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 52	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mastic partie basse	Mastic partie basse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 53	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mastic partie basse	Mastic partie basse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 54	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mastic partie basse	Mastic partie basse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 55	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mastic partie basse	Mastic partie basse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 56	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mastic partie basse	Mastic partie basse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 57	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mastic partie basse	Mastic partie basse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 58	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mastic partie basse	Mastic partie basse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 59	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mastic partie basse	Mastic partie basse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-033		R+1 - Pièce 60	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mastic partie basse	Mastic partie basse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 61	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mastic partie basse	Mastic partie basse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 62	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mastic partie basse	Mastic partie basse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 63	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mastic partie basse	Mastic partie basse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 64	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mastic partie basse	Mastic partie basse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P045	R+1 - Pièce 65	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mastic partie basse	Mastic partie basse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-034	P046	Extérieur - Façades		2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P042	Extérieur - Façades		2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P052	Extérieur - Façades		2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
ZPSO-035	P047	Extérieur - Façades		2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Couche1: Joint de mastic	Joint de mastic	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P056	Extérieur - Façades		2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Couche1: Joint de mastic	Joint de mastic	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P022	Extérieur - Façades		2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures		Joint de mastic	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-036	P048	Extérieur - Façades		2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de caisson de volets	Joint de mastic de caisson de volets	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P053	Extérieur - Façades		2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de caisson de volets	Joint de mastic de caisson de volets	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P028	Extérieur - Façades		2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de caisson de volets	Joint de mastic de caisson de volets	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-037		R+1 - Pièce 51	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-037		R+1 - Pièce 52	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 53	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P054	R+1 - Pièce 54	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 55	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 56	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 57	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 58	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 59	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 60	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P049	R+1 - Pièce 61	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 62	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 63	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 64	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 65	Murs sur Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-038		R+1 - Pièce 51		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	Joint de dilatation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 52		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	Joint de dilatation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-038		R+1 - Pièce 53		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	Joint de dilatation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 54		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	Joint de dilatation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 55		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	Joint de dilatation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P055	R+1 - Pièce 56		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	Joint de dilatation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 57		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	Joint de dilatation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 58		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	Joint de dilatation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 59		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	Joint de dilatation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 60		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	Joint de dilatation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P050	R+1 - Pièce 61		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	Joint de dilatation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 62		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	Joint de dilatation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 63		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	Joint de dilatation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 64		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	Joint de dilatation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 65		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	Joint de dilatation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-039	P057	R+1 - Pièce 52	Cloisons pièces sèches	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 54	Cloisons pièces sèches	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P063	R+1 - Pièce 56	Cloisons pièces sèches	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-040	P058	R+1 - Pièce 52	Cloisons pièces sèches	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Pièce 54	Cloisons pièces sèches	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P064	R+1 - Pièce 56	Cloisons pièces sèches	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-041	P059	R+1 - Circulation 13		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P062	R+1 - Circulation 14		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-042		R+1 - Pièce 51	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P060	R+1 - Pièce 61	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Pièce 62	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Pièce 63	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P066	R+1 - Pièce 64	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Pièce 65	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
ZPSO-043	P065	R+1 - Pièce 51		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 52		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 53		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 54		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 55		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-043		R+1 - Pièce 56		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 57		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 58		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 59		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 60		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 61		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 62		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 63		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Pièce 64		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P061	R+1 - Pièce 65		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-044	P070	R+2 - Circulation 18	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P067	R+2 - Circulation 19	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
ZPSO-045	P069	R+2 - Circulation 18	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	Joint de dilatation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P068	R+2 - Circulation 19	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	Joint de dilatation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-046	P078	R+2 - Dégagement 3	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P071	R+2 - Dégagement 4	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-047	P079	R+2 - Dégagement 3	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P072	R+2 - Dégagement 4	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
ZPSO-048	P080	R+2 - Dégagement 3		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P073	R+2 - Dégagement 4		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-049		R+2 - Pièce 69	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P074	R+2 - Pièce 70	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+2 - Pièce 71	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P076	R+2 - Pièce 72	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+2 - Pièce 73	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-050		R+2 - Pièce 69		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P075	R+2 - Pièce 70		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+2 - Pièce 71		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+2 - Pièce 72		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P077	R+2 - Pièce 73		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-051	P081	R+3 - Dégagement 5		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P094	R+3 - Dégagement 6		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-052	P082	R+3 - Dégagement 5	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P095	R+3 - Dégagement 6	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-053	P083	R+3 - Dégagement 5		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P096	R+3 - Dégagement 6		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-054		R+3 - Pièce 74	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+3 - Pièce 75	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+3 - Pièce 76	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P084	R+3 - Pièce 77	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+3 - Pièce 78	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+3 - Pièce 79	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+3 - Pièce 80	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+3 - Pièce 81	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+3 - Pièce 82	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+3 - Pièce 83	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P090	R+3 - Pièce 84	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+3 - Pièce 85	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-055		R+3 - Pièce 74		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+3 - Pièce 75		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+3 - Pièce 76		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P085	R+3 - Pièce 77		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+3 - Pièce 78		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+3 - Pièce 79		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+3 - Pièce 80		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+3 - Pièce 81		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+3 - Pièce 82		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+3 - Pièce 83		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P091	R+3 - Pièce 84		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+3 - Pièce 85		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-056	P086	R+3 - Circulation 20		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P088	R+3 - Circulation 21		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
ZPSO-057	P087	R+3 - Circulation 20		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	Joint de dilatation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P089	R+3 - Circulation 21		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	Joint de dilatation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-058		R+3 - Local Technique 11		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+3 - Local Technique 12		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P092	R+3 - Local Technique 13		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
ZPSO-059		R+3 - Local Technique 11	Cloisons pièces sèches	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+3 - Local Technique 12	Cloisons pièces sèches	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P093	R+3 - Local Technique 13	Cloisons pièces sèches	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-060	P097	Rez-de-Chaussée - Circulation 2	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P098	Rez-de-Chaussée - Circulation 2	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
ZPSO-061	P099	Rez-de-Chaussée - Circulation 2		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-062	P100	R+1 - Circulation 11	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
ZPSO-063	P101	R+1 - Circulation 11		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-064	P102	Extérieur - Toiture 1		1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	Susceptible de contenir de l'amiante (En attente des résultats d'analyse)
	P105	Extérieur - Toiture 1		1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	Susceptible de contenir de l'amiante (En attente des résultats d'analyse)
ZPSO-065	P103	Extérieur - Toiture 1		1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments sous toiture	Pare-vapeur	Pare-vapeur	Susceptible de contenir de l'amiante (En attente des résultats d'analyse)
	P106	Extérieur - Toiture 1		1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments sous toiture	Pare-vapeur	Pare-vapeur	Susceptible de contenir de l'amiante (En attente des résultats d'analyse)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-066	P104	Extérieur - Toiture 1		1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Produit d'accrochage	Produit d'accrochage	Susceptible de contenir de l'amiante (En attente des résultats d'analyse)
	P107	Extérieur - Toiture 1		1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Produit d'accrochage	Produit d'accrochage	Susceptible de contenir de l'amiante (En attente des résultats d'analyse)
ZPSO-067	P108	Toiture 2		1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	Susceptible de contenir de l'amiante (En attente des résultats d'analyse)
	P111	Toiture 2		1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	Susceptible de contenir de l'amiante (En attente des résultats d'analyse)
ZPSO-068	P109	Toiture 2		1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : pare vapeur	Partie plane : pare vapeur	Susceptible de contenir de l'amiante (En attente des résultats d'analyse)
	P112	Toiture 2		1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : pare vapeur	Partie plane : pare vapeur	Susceptible de contenir de l'amiante (En attente des résultats d'analyse)
ZPSO-069	P110	Toiture 2		1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Produit d'accrochage	Produit d'accrochage	Susceptible de contenir de l'amiante (En attente des résultats d'analyse)
	P113	Toiture 2		1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Produit d'accrochage	Produit d'accrochage	Susceptible de contenir de l'amiante (En attente des résultats d'analyse)
ZPSO-070		Rez-de-Chaussée - Circulation 1	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Circulation 2	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 2	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 3	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Dégagement 1	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-070		Rez-de-Chaussée - Placard 1	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Escalier 2	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Circulation 3	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Circulation 4	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Circulation 5	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P032	Rez-de-Chaussée - Circulation 6	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 4	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 5	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 6	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 9	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P026	Rez-de-Chaussée - Pièce 13	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 14	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 15	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 16	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P021	Rez-de-Chaussée - Pièce 17	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 18	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-070	P017	Rez-de-Chaussée - Pièce 19	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 20	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - SAS 1	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P010	Rez-de-Chaussée - Circulation 7	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P005	Rez-de-Chaussée - Circulation 8	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - SAS 2	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P013	Rez-de-Chaussée - Pièce 22	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Escalier 4	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 23	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 24	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P008	Rez-de-Chaussée - Pièce 25	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 26	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 27	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 28	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Pièce 48	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Pièce 49	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-070		R+1 - Pièce 50	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Placard 2	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Circulation 11	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P043	R+1 - Circulation 13	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Circulation 14	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Circulation 15	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Circulation 16	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Circulation 17	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Pièce 51	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Pièce 52	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Pièce 53	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Pièce 54	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Pièce 55	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Pièce 56	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Pièce 57	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Pièce 58	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-070		R+1 - Pièce 60	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Dégagement 2	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Sanitaire 1	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P060	R+1 - Pièce 61	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Pièce 62	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Pièce 63	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P066	R+1 - Pièce 64	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Pièce 65	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Pièce 66	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Pièce 67	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+2 - Escalier 5	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+2 - Escalier 6	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P070	R+2 - Circulation 18	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P067	R+2 - Circulation 19	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P079	R+2 - Dégagement 3	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+2 - Sanitaire 3	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-070		R+2 - Pièce 69	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P074	R+2 - Pièce 70	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+2 - Sanitaire 5	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+2 - Pièce 71	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P076	R+2 - Pièce 72	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+2 - Pièce 73	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+3 - Escalier 8	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P086	R+3 - Circulation 20	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P088	R+3 - Circulation 21	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P072	R+2 - Dégagement 4	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+3 - Sanitaire 7	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+3 - Pièce 74	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+3 - Pièce 75	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P082	R+3 - Dégagement 5	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P095	R+3 - Dégagement 6	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+3 - Sanitaire 9	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
		R+3 - Pièce 76	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P084	R+3 - Pièce 77	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+3 - Pièce 78	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+3 - Pièce 79	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+3 - Pièce 80	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+3 - Pièce 81	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+3 - Pièce 82	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+3 - Pièce 83	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
	P090	R+3 - Pièce 84	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+3 - Pièce 85	Refends	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
ZPSO-071		Rez-de-Chaussée - Pièce 19		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 20		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - WC 1		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - WC 2		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - WC 3		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - WC 4		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-071		Rez-de-Chaussée - Local Technique 1		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 22		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 24		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 25		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Local Technique 2		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Local Technique 3		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Local Technique 4		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée – Escalier 2		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée – Circulation 3		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Circulation 4		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Circulation 5		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 13		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 14		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 15		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 17		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		Rez-de-Chaussée - Pièce 18		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-071		R+1 - Pièce 52		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Pièce 54		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Pièce 56		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Local Technique 5		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Local Technique 6		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+1 - Local Technique 7		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+2 - Pièce 71		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+2 - Pièce 72		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+2 - Pièce 73		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+2 - Local Technique 8		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+2 - Local Technique 9		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+2 - Local Technique 10		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+3 - Pièce 80		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+3 - Pièce 82		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+3 - Pièce 84		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+3 - Local Technique 11		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-071		R+3 - Local Technique 12		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)
		R+3 - Local Technique 13		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Présence d'amiante (Voir commentaire n°01)

6.2 QUANTITATIF DE MATÉRIAUX AMIANTÉS

Dans le cadre de cette première édition de rapport, le quantitatif n'a pas été réalisé dans l'attente de la réalisation des compléments d'investigations.
Le quantitatif sera établit après étude de notre seconde intervention permettant de statuer de manière exhaustive la localisation des matériaux contenant de l'amiante

7. ANNEXES

SOMMAIRE

7.1 SCHÉMA DE REPÉRAGE

7.2 REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

7.3 RAPPORT D'ESSAIS

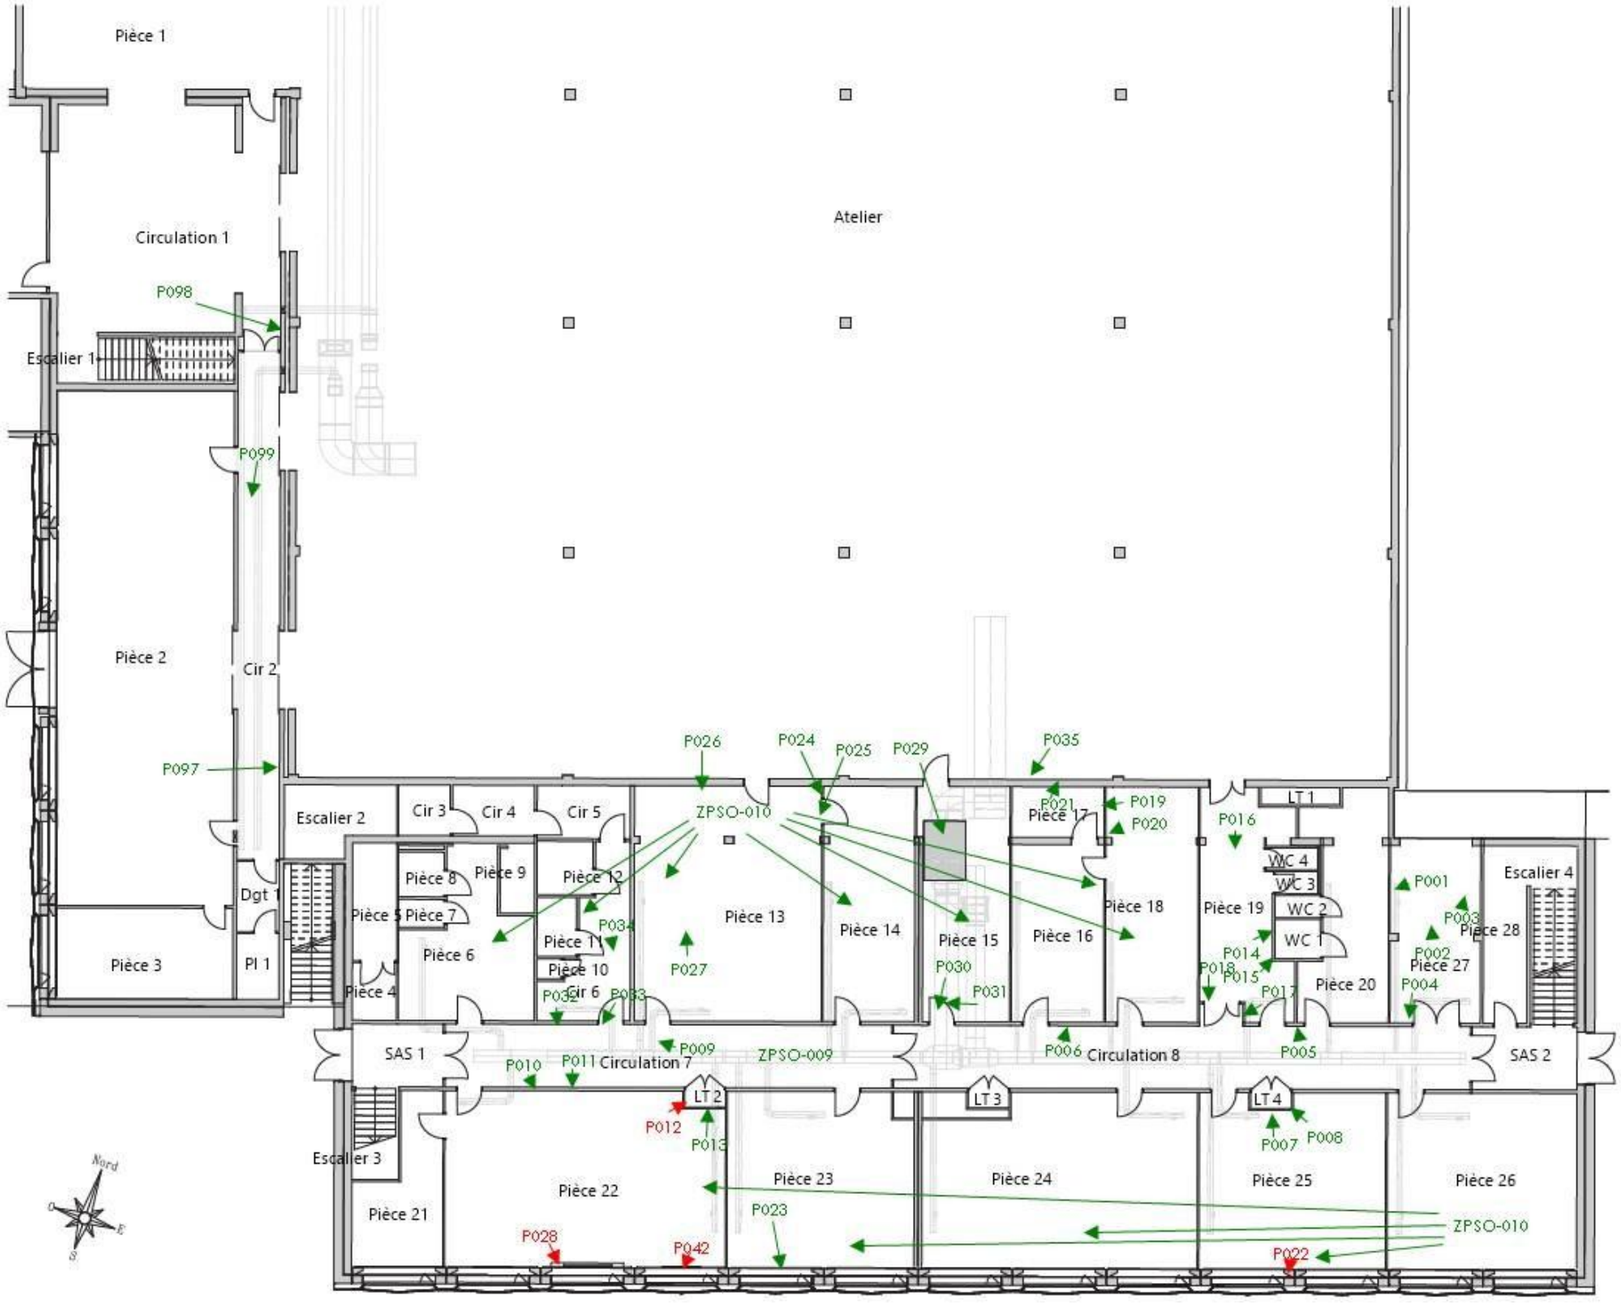
7.4 EVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

7.5 CONSÉQUENCES RÉGLEMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS

7.6 RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

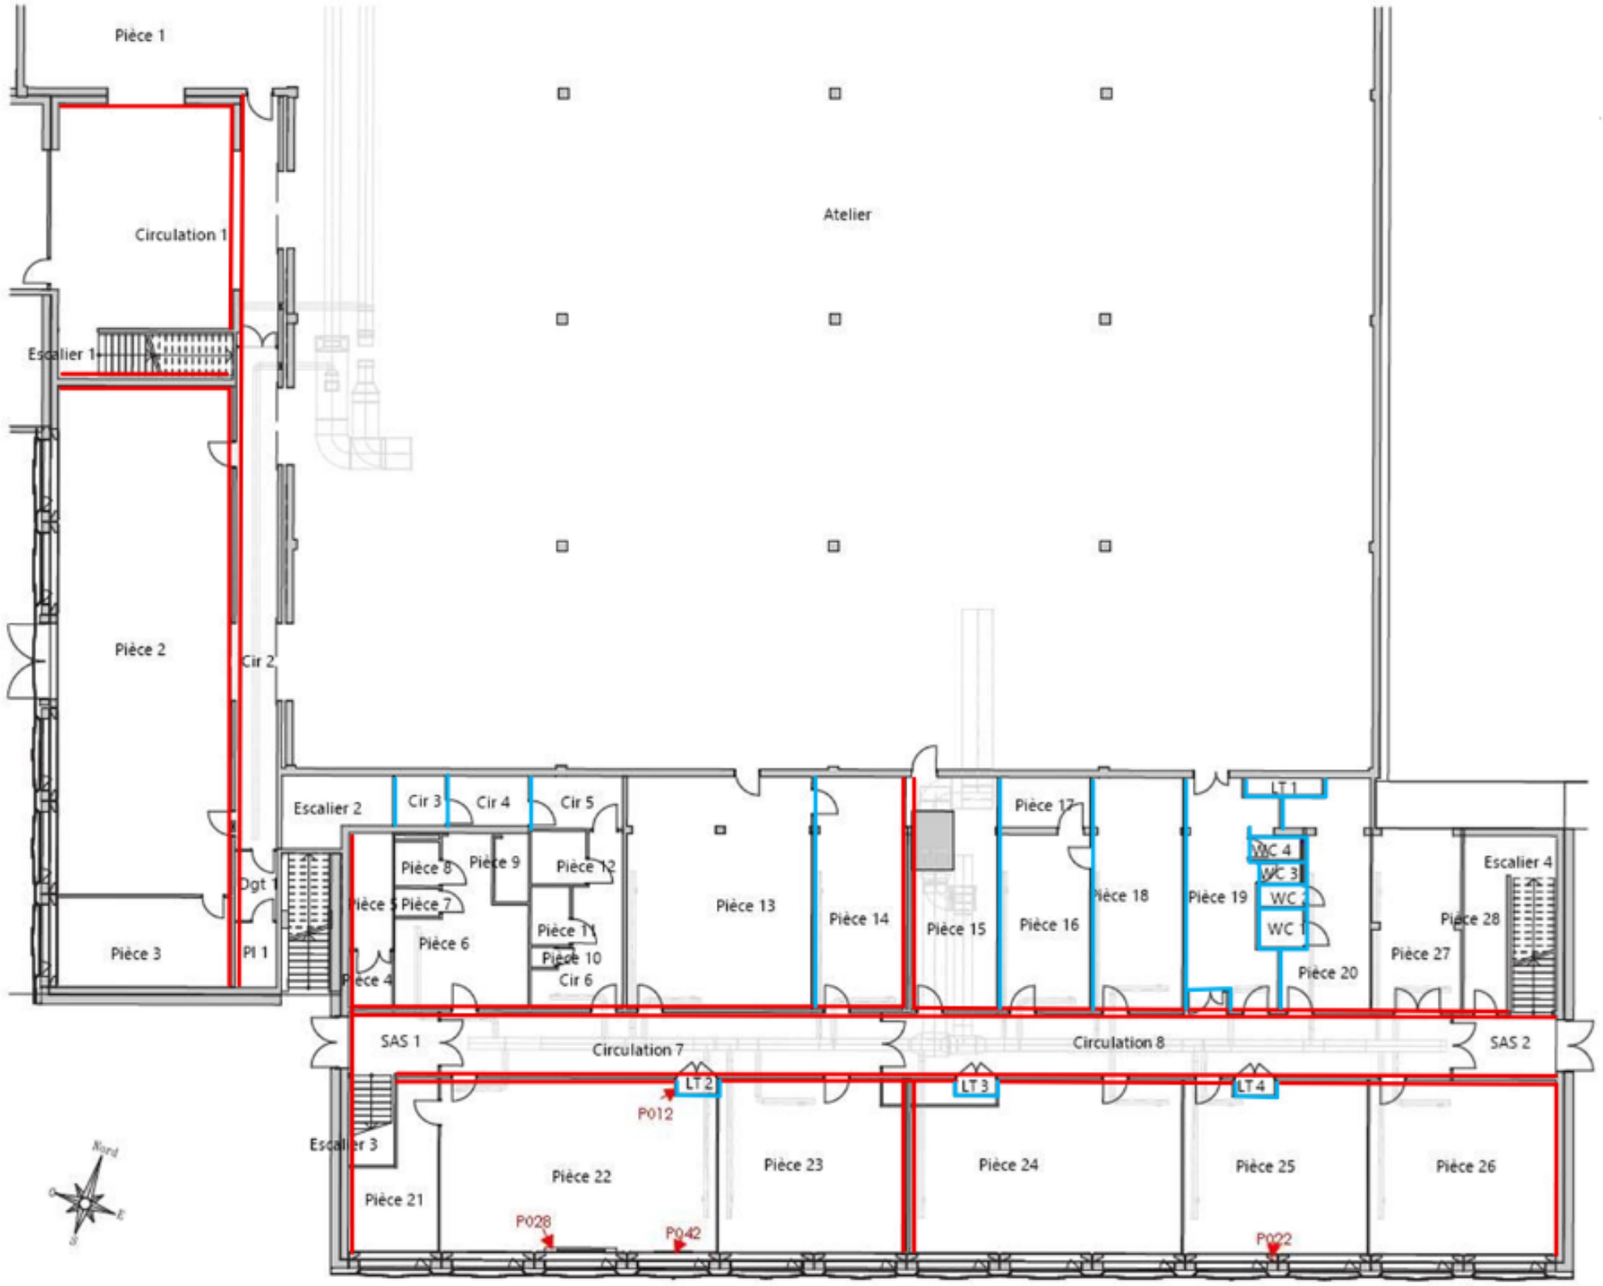
7.7 AUTRES DOCUMENTS

7.1 Annexe : SCHÉMA DE REPÉRAGE



P XXX →	Localisation d'un prélèvement - Négatif
P XXX →	Localisation d'un prélèvement - Positif
ZPSO - XXX →	Localisation d'une ZPSO - Négative
ZPSO - XXX →	Localisation d'une ZPSO - Positive
S XXX →	Localisation d'un sondage - Négatif
S XXX →	Localisation d'un sondage - Positif

Planche (croquis) de repérage technique : RDC
DIAGOBAH, auteur : M VEGEZZI Thibault
Dossier n° 26LGU0145 du 30/04/2026
Adresse du bien : CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ

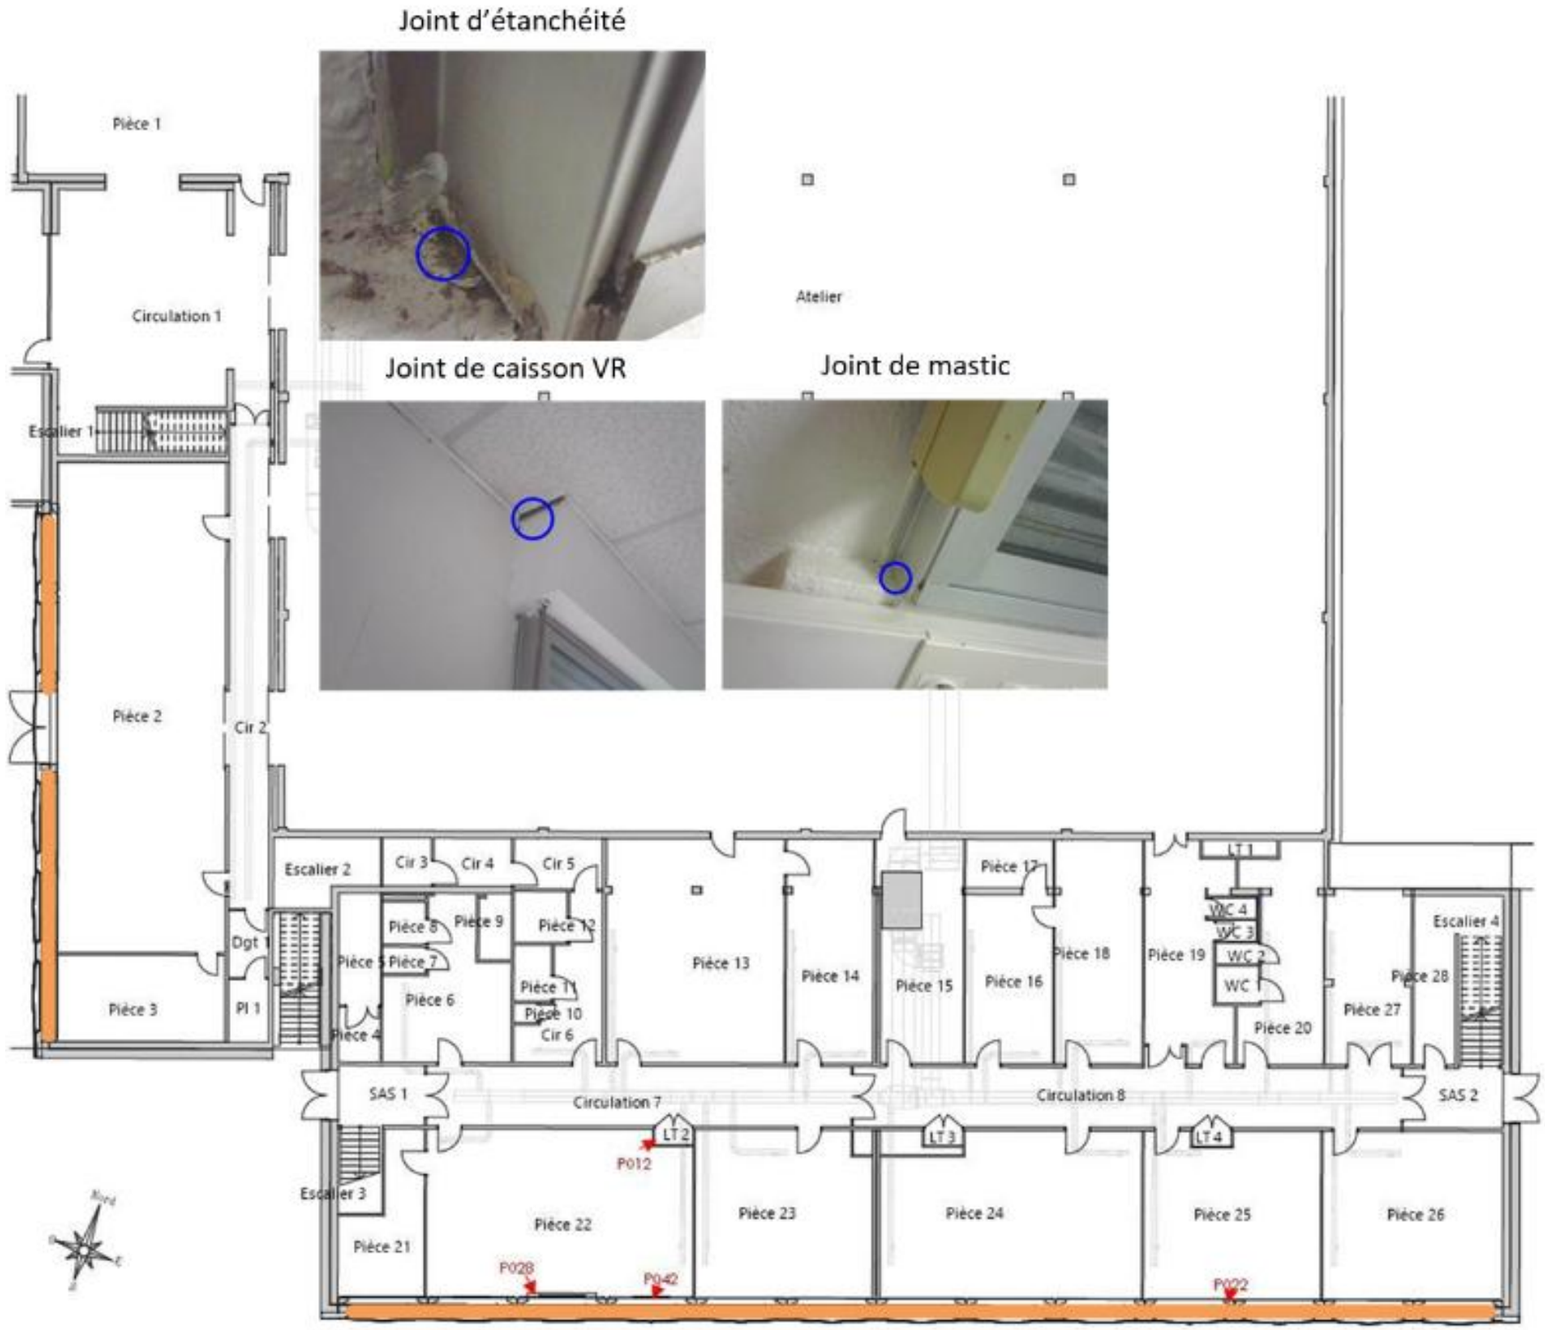


	Enduit ciment (murs de refend)
	Enduit de Jointoiement des plaques de plâtre

Matériaux et Produits contenant de l’amiante : RDC – Murs et cloisons

DIAGOBAH, auteur : M VEGEZZI Thibault
Dossier n° 26LGU0145 du 30/04/2026
Adresse du bien : CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ

	Joint de VR / Joint de mastic / Joint d'étanchéité



Matériaux et Produits contenant de l'amiante : RDC - Menuiseries extérieures

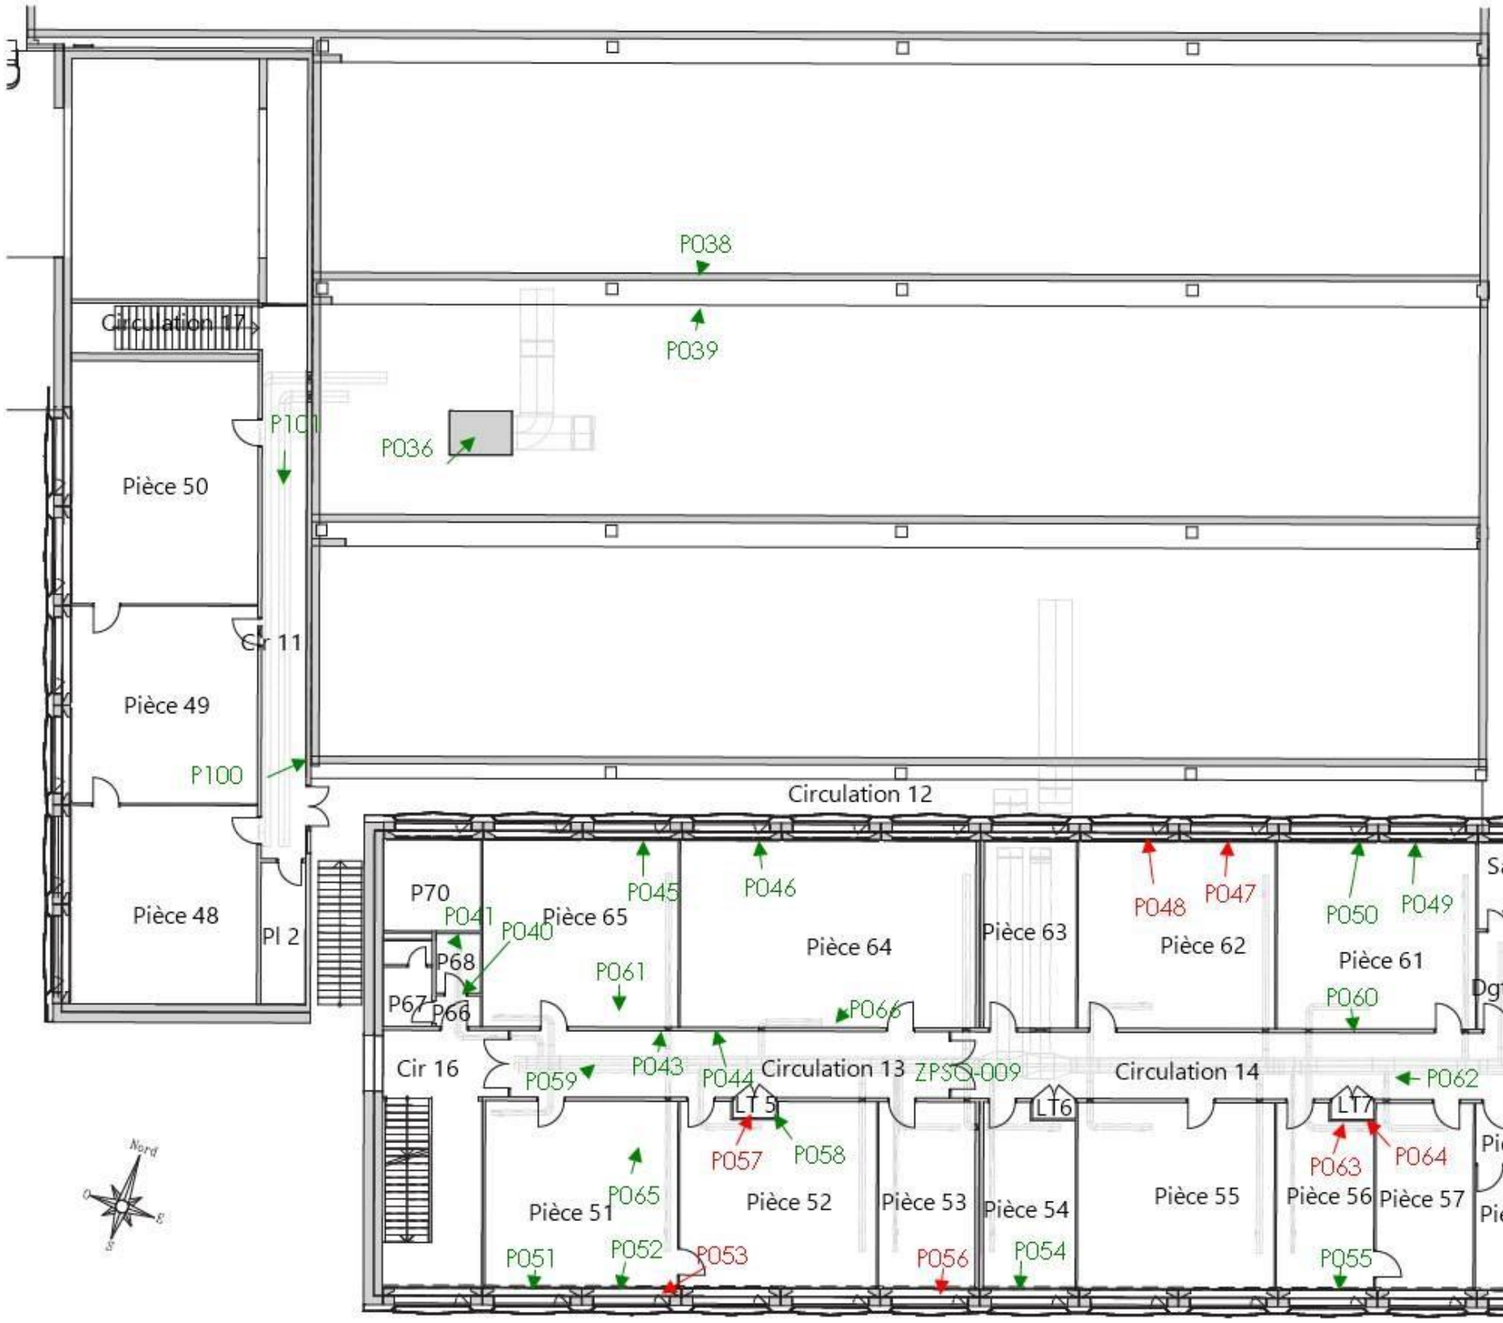
DIAGOBAH, auteur : M VEGEZZI Thibault
Dossier n° 26LGU0145 du 30/04/2026
Adresse du bien : CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ



P XXX →	Localisation d'un prélèvement - Négatif
P XXX →	Localisation d'un prélèvement - Positif
ZPSO - XXX →	Localisation d'une ZPSO - Négative
ZPSO - XXX →	Localisation d'une ZPSO - Positive
S XXX →	Localisation d'un sondage - Négatif
S XXX →	Localisation d'un sondage - Positif

Planche (croquis) de repérage technique : Atelier

DIAGOBAH, auteur : M VEGEZZI Thibault
Dossier n° 26LGU0145 du 30/04/2026
Adresse du bien : CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ



P XXX →	Localisation d'un prélèvement - Négatif
P XXX →	Localisation d'un prélèvement - Positif
ZPSO - XXX →	Localisation d'une ZPSO - Négative
ZPSO - XXX →	Localisation d'une ZPSO - Positive
S XXX →	Localisation d'un sondage - Négatif
S XXX →	Localisation d'un sondage - Positif

Planche (croquis) de repérage technique : R+1

DIAGOBAH, auteur : M VEGEZZI Thibault
Dossier n° 26LGU0145 du 30/04/2026
Adresse du bien : CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ

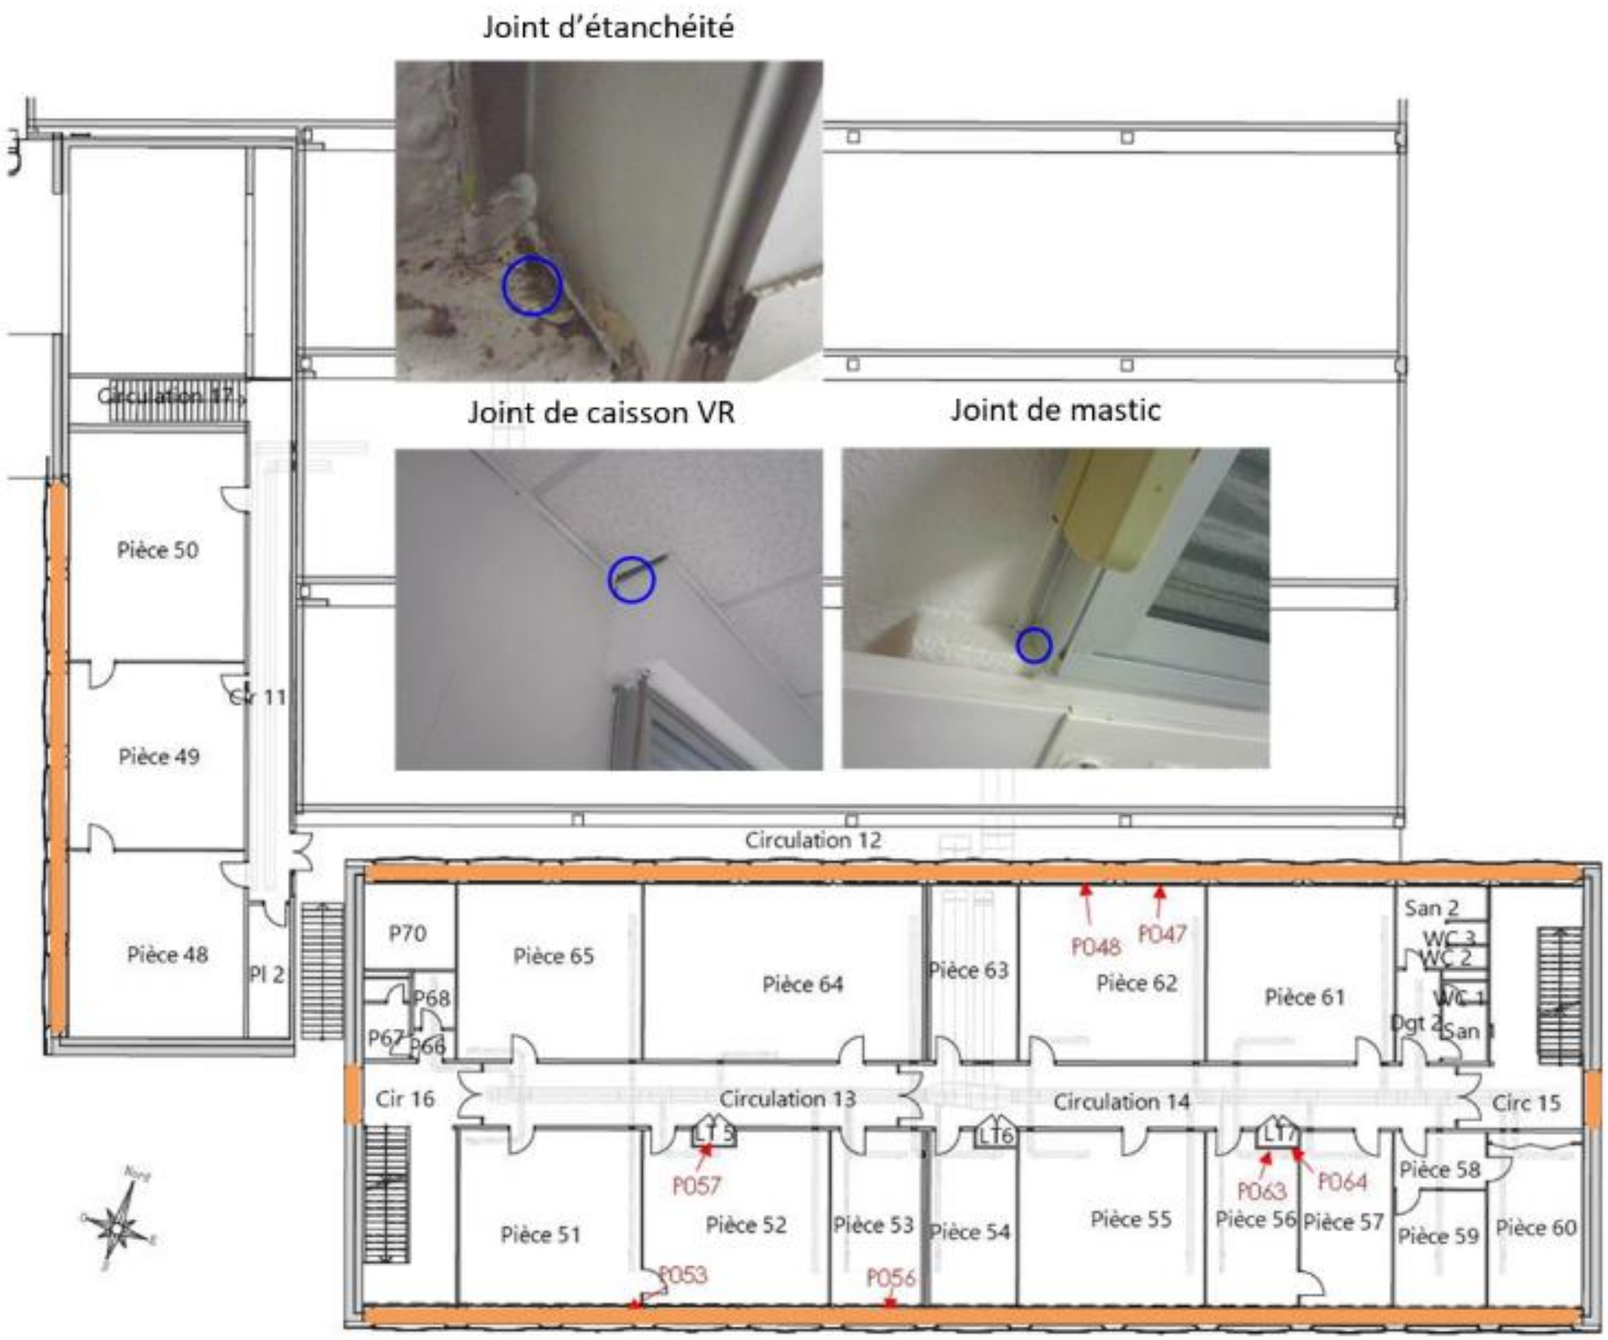
	Enduit ciment (murs de refend)
	Enduit de Jointoiement des plaques de plâtre



Matériaux et Produits contenant de l'amiante : R+1 – Murs et cloisons

DIAGOBAH, auteur : M VEGEZZI Thibault
Dossier n° 26LGU0145 du 30/04/2026
Adresse du bien : CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ

	Joint de VR / Joint de mastic / Joint d'étanchéité



Matériaux et Produits contenant de l'amiante : R+1 - Menuiseries extérieures

DIAGOBAH, auteur : M VEGEZZI Thibault
Dossier n° 26LGU0145 du 30/04/2026
Adresse du bien : CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ

P XXX →	Localisation d'un prélèvement - Négatif
P XXX →	Localisation d'un prélèvement - Positif
ZPSO - XXX →	Localisation d'une ZPSO - Négative
ZPSO - XXX →	Localisation d'une ZPSO - Positive
S XXX →	Localisation d'un sondage - Négatif
S XXX →	Localisation d'un sondage - Positif

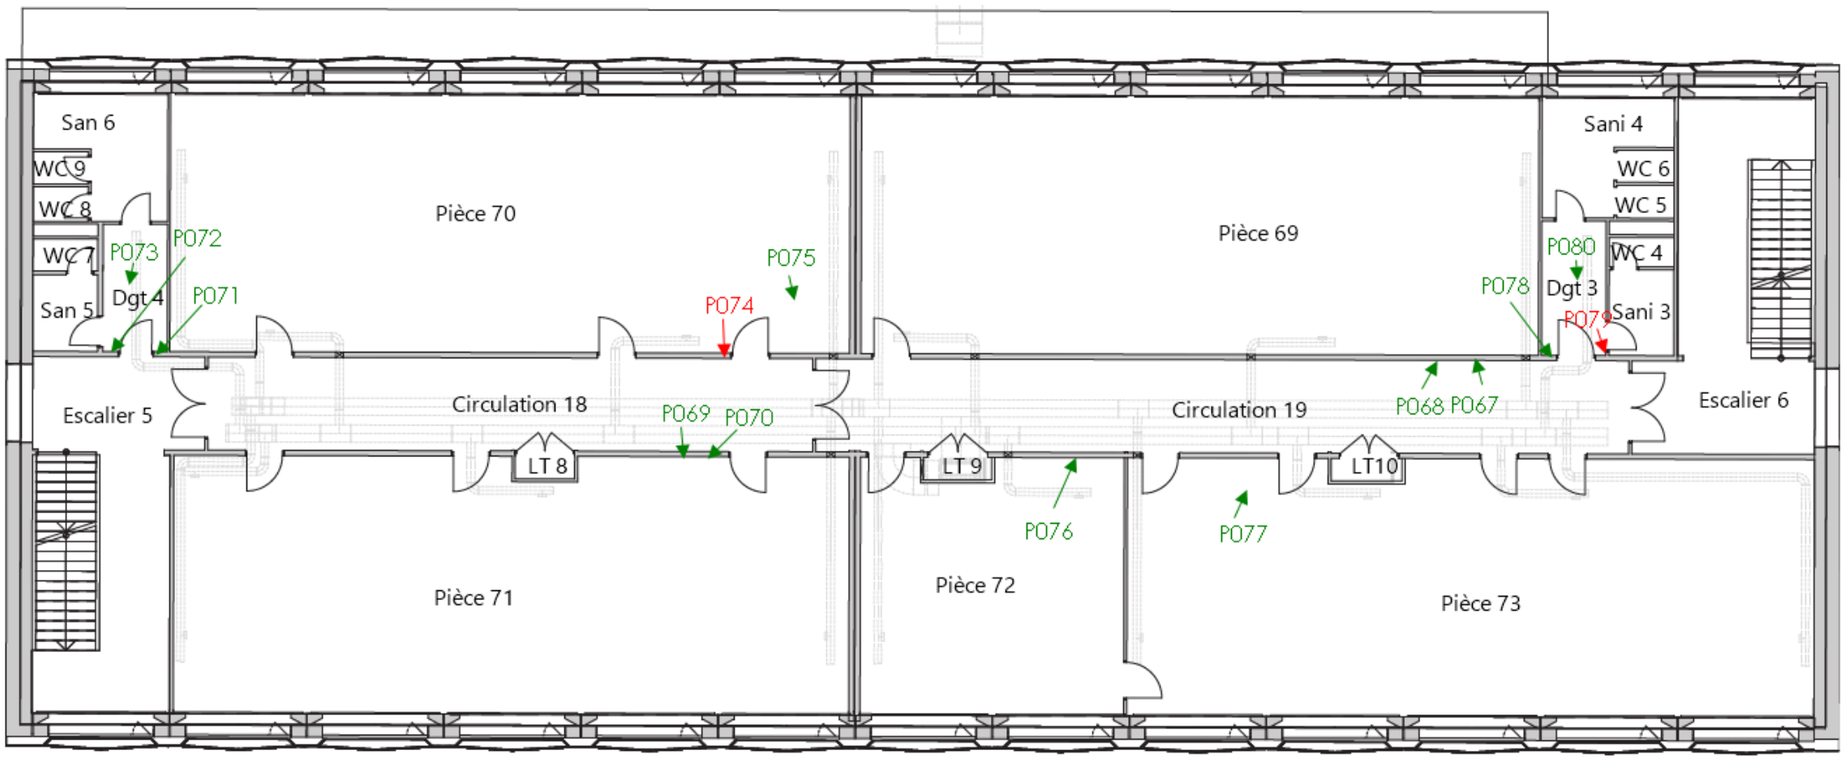
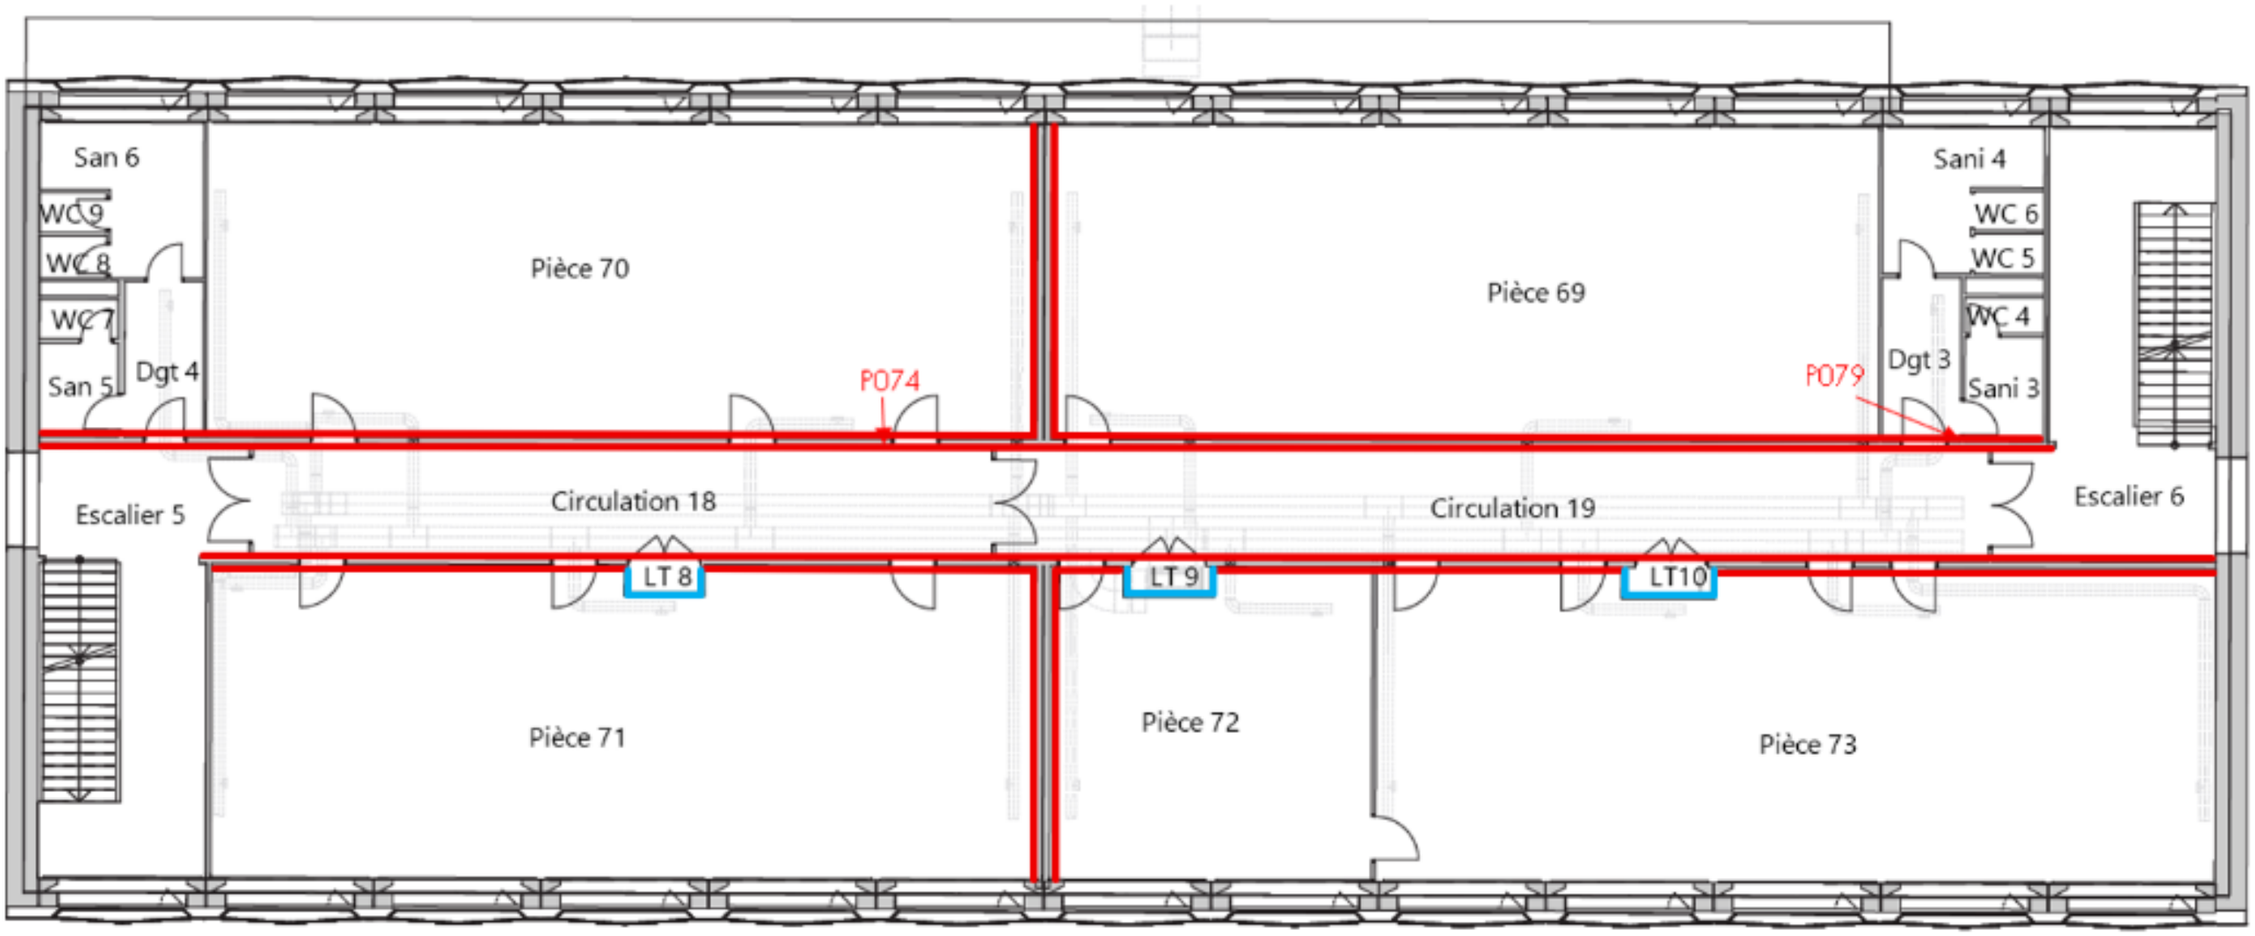


Planche (croquis) de repérage technique : R+2

DIAGOBAH, auteur : M VEGEZZI Thibault
Dossier n° 26LGU0145 du 30/04/2026
Adresse du bien : CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ

	Enduit ciment (murs de refend)
	Enduit de Jointoiement des plaques de plâtre



Matériaux et Produits contenant de l'amiante : R+2 – Murs et cloisons

DIAGOBAH, auteur : M VEGEZZI Thibault
Dossier n° 26LGU0145 du 30/04/2026
Adresse du bien : CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ

Joint d’étanchéité



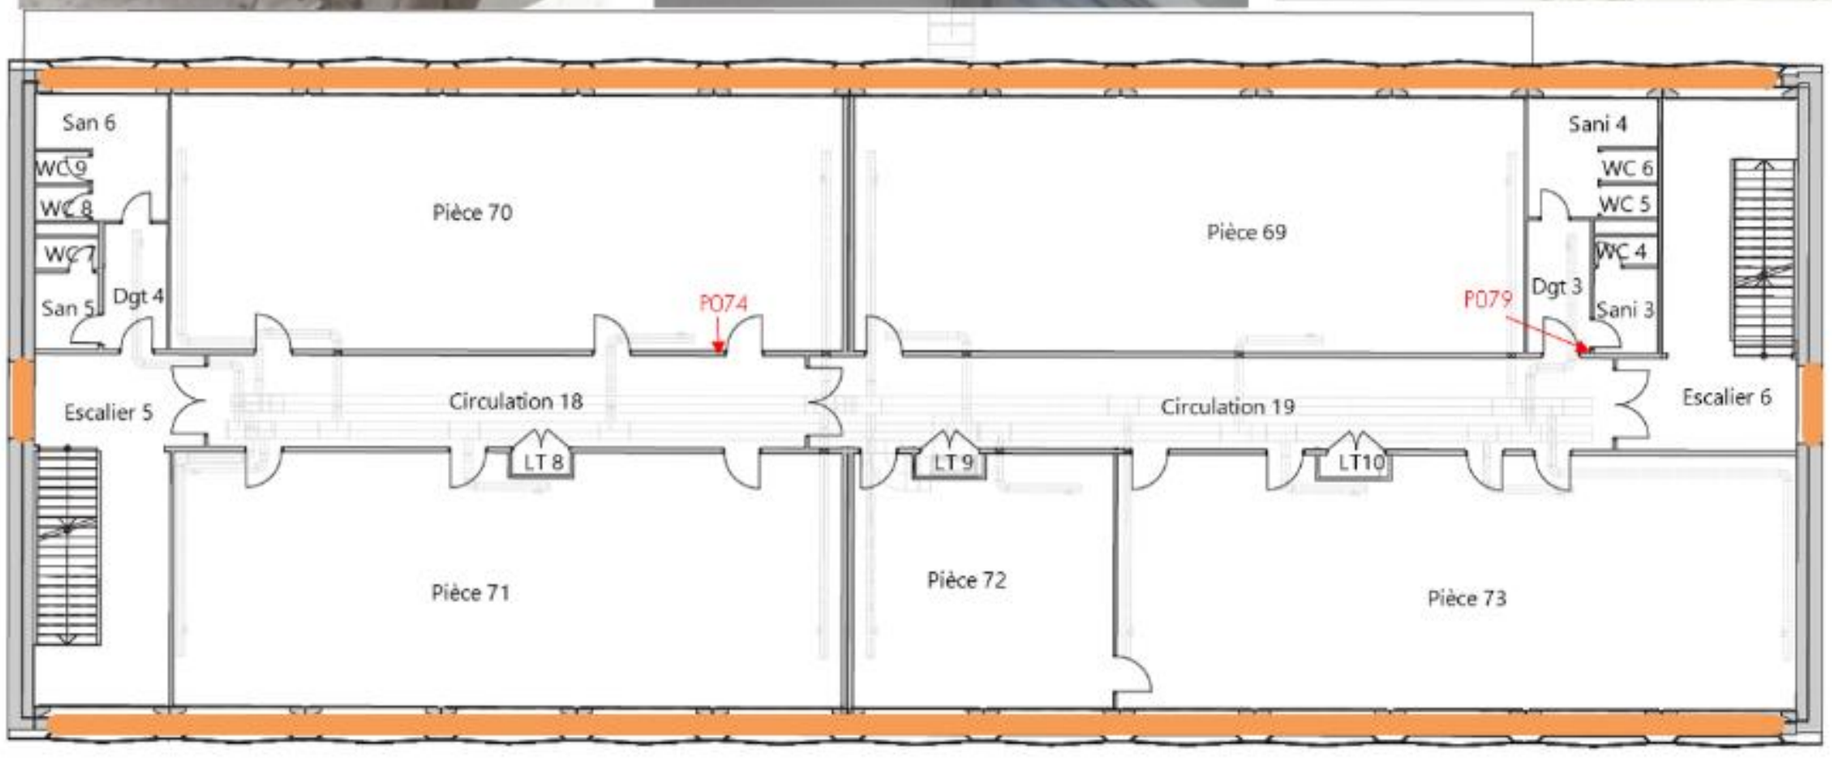
Joint de caisson VR



Joint de mastic



	Joint de VR / Joint de mastic / Joint d’étanchéité



Matériaux et Produits contenant de l’amiante : R+2 - Menuiseries extérieures

DIAGOBAH, auteur : M VEGEZZI Thibault
Dossier n° 26LGU0145 du 30/04/2026
Adresse du bien : CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ

P XXX	Localisation d'un prélèvement - Négatif
P XXX	Localisation d'un prélèvement - Positif
ZPSO - XXX	Localisation d'une ZPSO - Négative
ZPSO - XXX	Localisation d'une ZPSO - Positive
S XXX	Localisation d'un sondage - Négatif
S XXX	Localisation d'un sondage - Positif

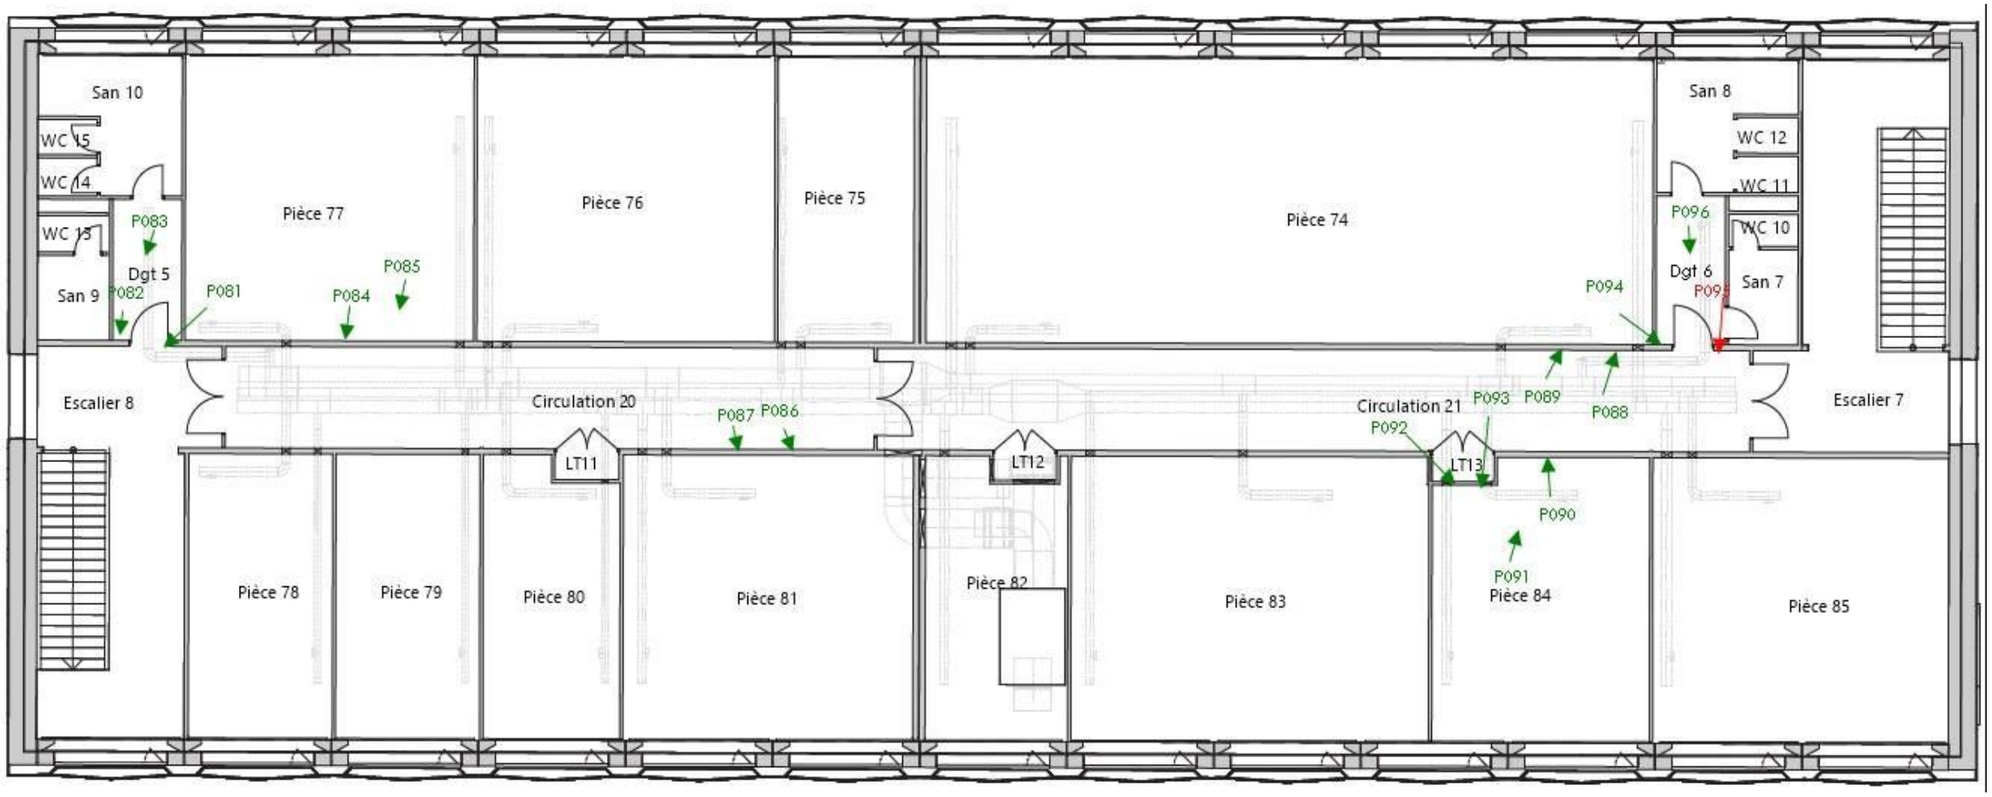
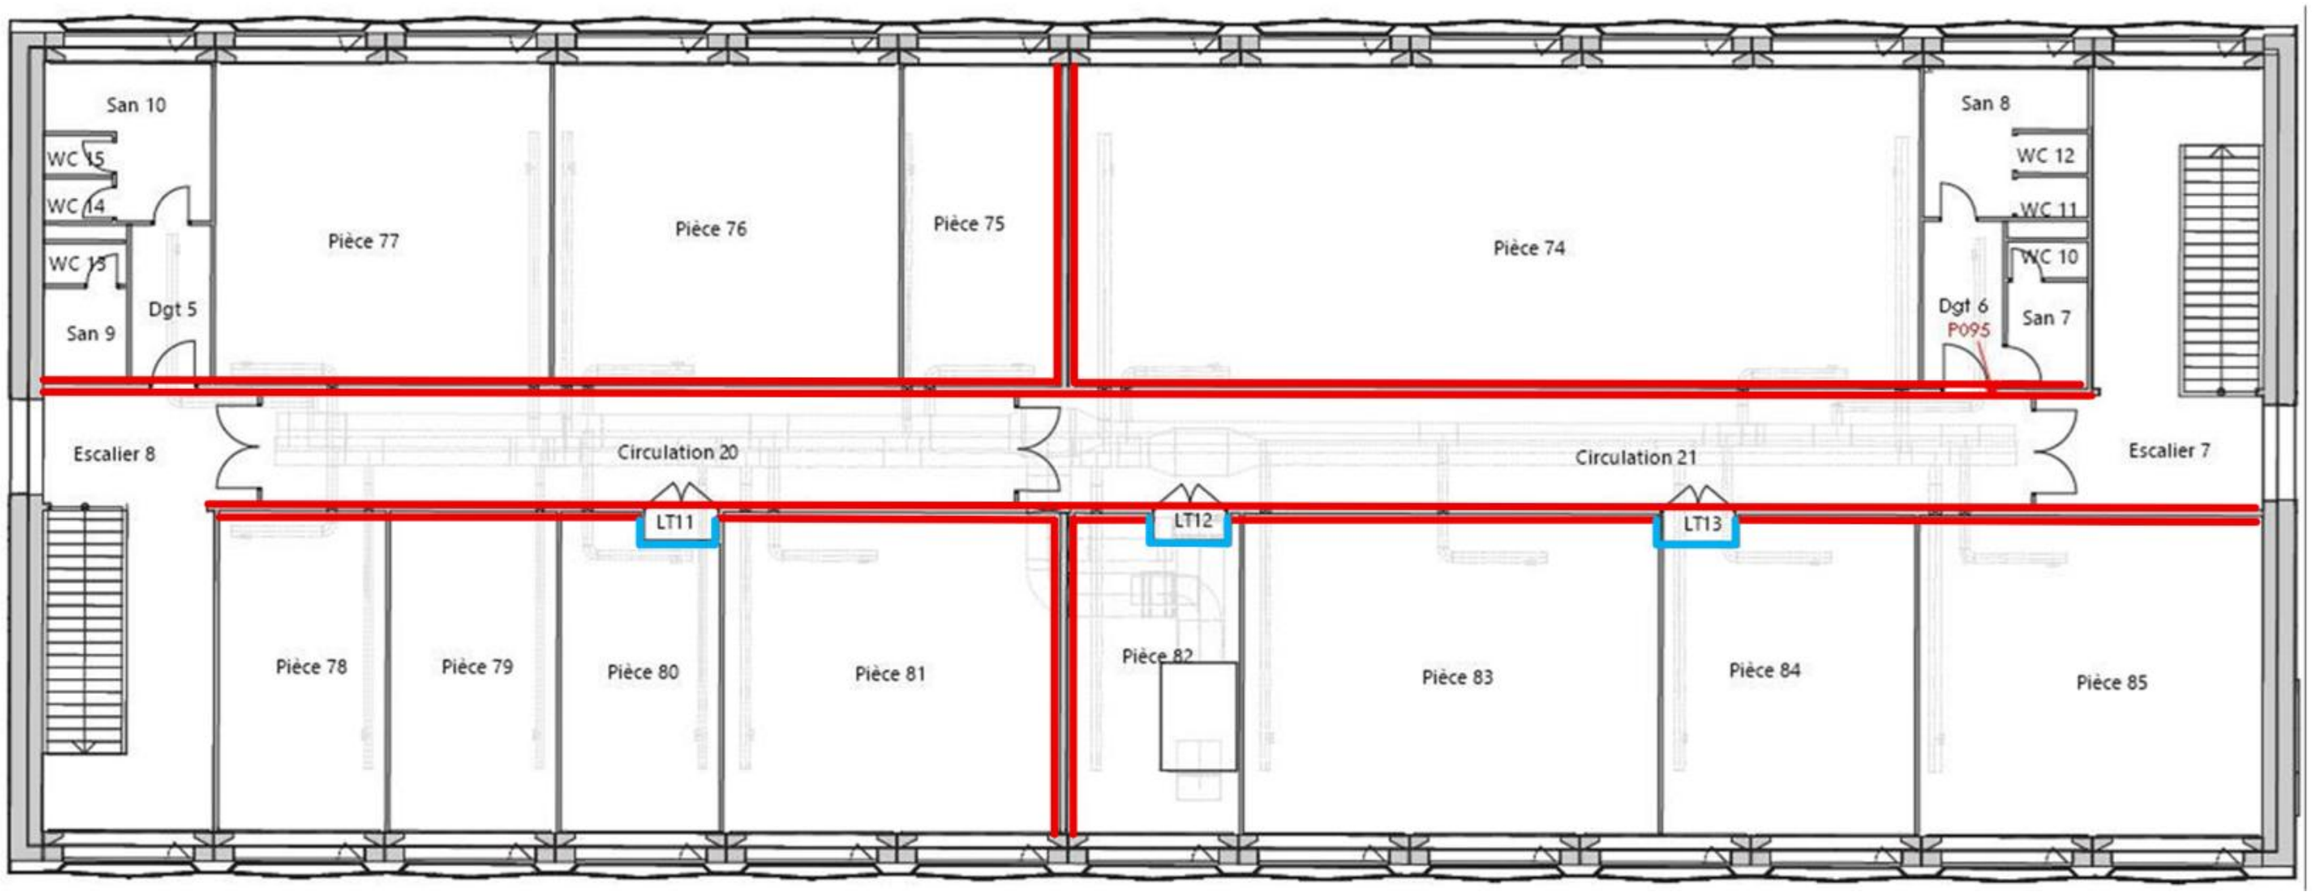


Planche (croquis) de repérage technique : R+3

DIAGOBAH, auteur : M VEGEZZI Thibault
Dossier n° 26LGU0145 du 30/04/2026
Adresse du bien : CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ

	Enduit ciment (murs de refend)
	Enduit de Jointoiement des plaques de plâtre



Matériaux et Produits contenant de l'amiante : R+3 – Murs et cloisons

DIAGOBAH, auteur : M VEGEZZI Thibault
Dossier n° 26LGU0145 du 30/04/2026
Adresse du bien : CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ

	Joint de VR / Joint de mastic / Joint d'étanchéité

Joint d'étanchéité

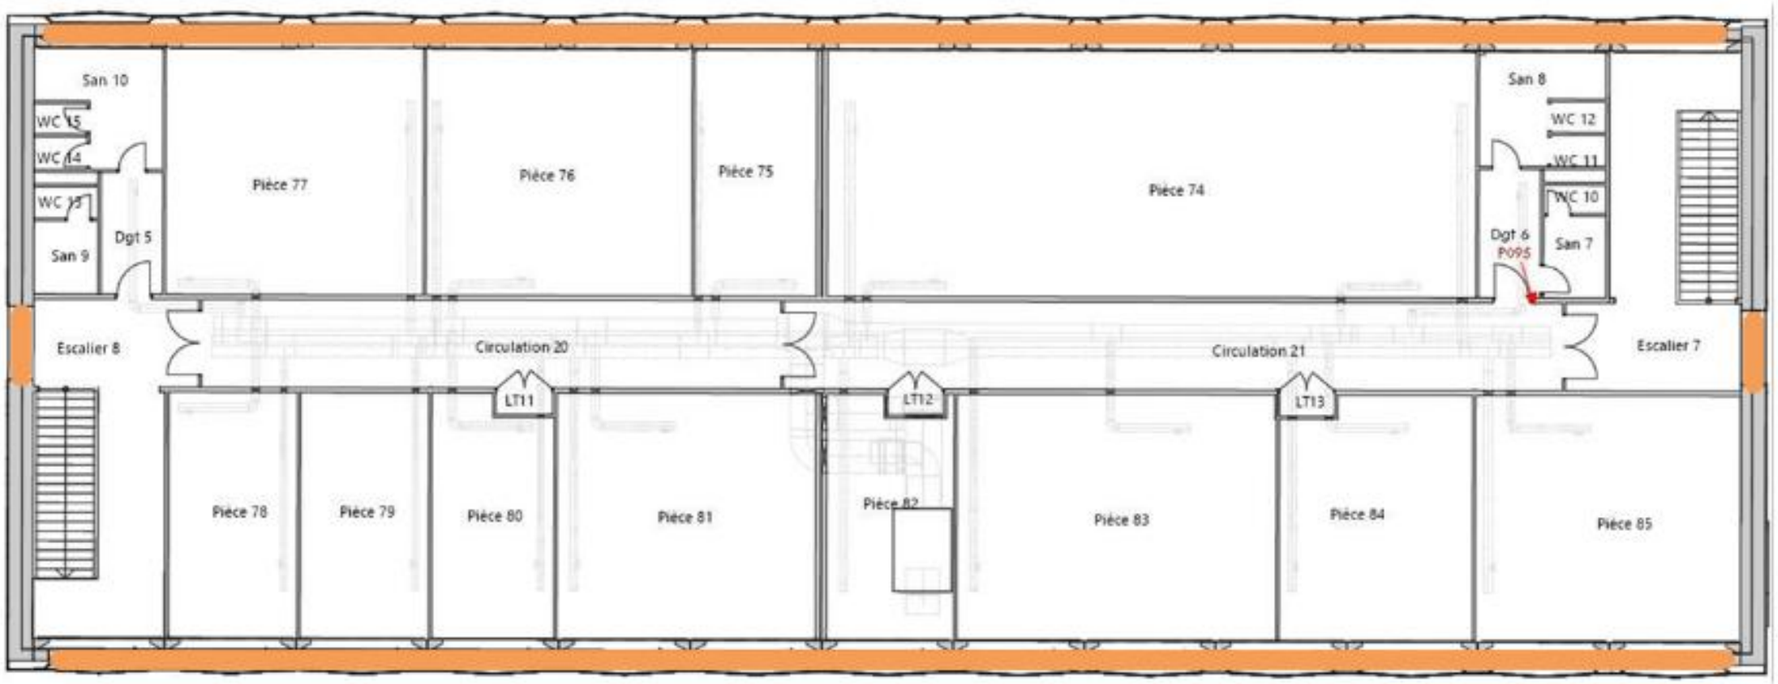


Joint de caisson VR



Joint de mastic





Matériaux et Produits contenant de l'amiante : R+3 - Menuiseries extérieures

DIAGOBAH, auteur : M VEGEZZI Thibault
Dossier n° 26LGU0145 du 30/04/2026
Adresse du bien : CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ

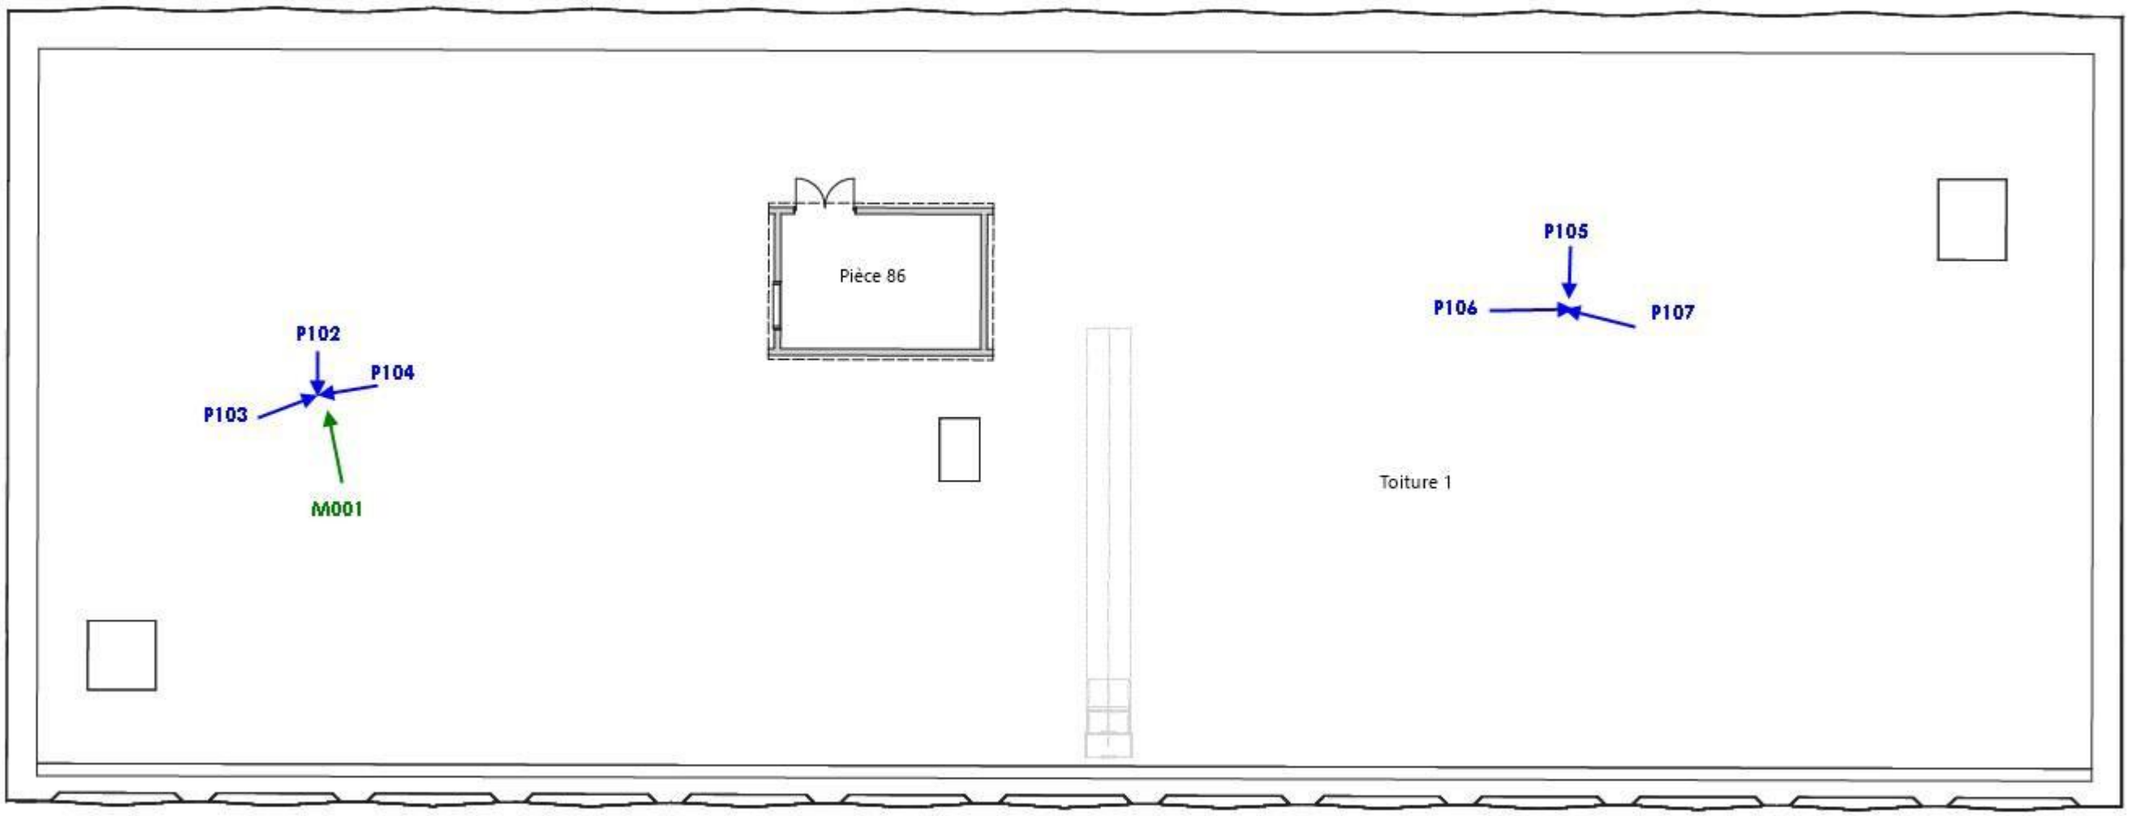


Planche (croquis) de repérage technique : Toiture 1

DIAGOBAH, auteur : M VEGEZZI Thibault
Dossier n° 26LGU0145 du 30/04/2026
Adresse du bien : CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ

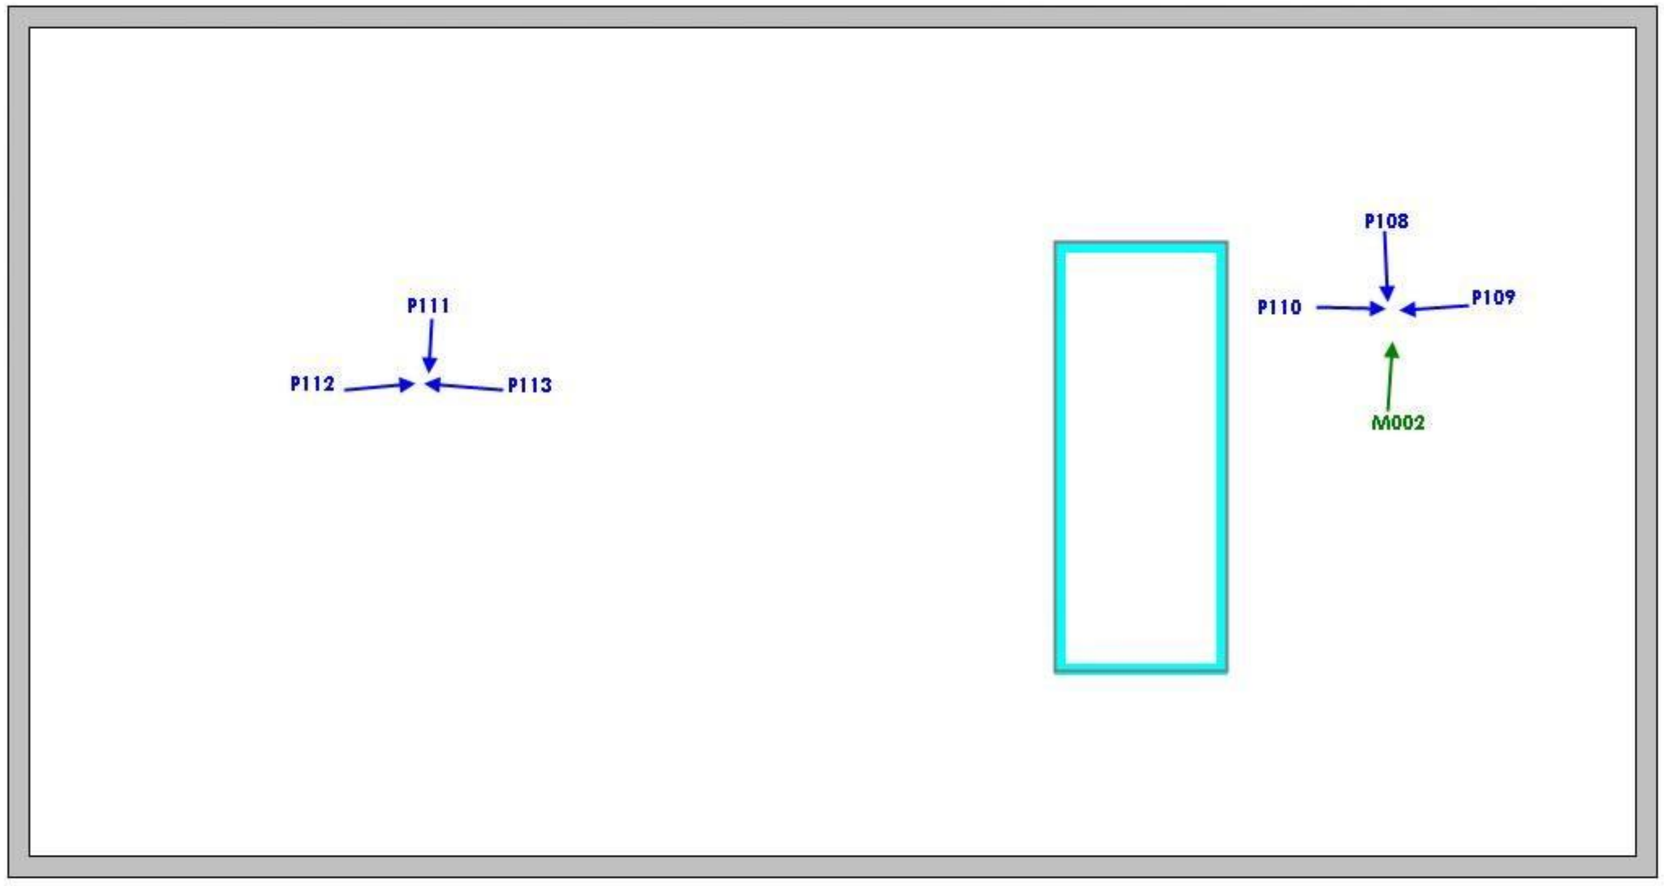
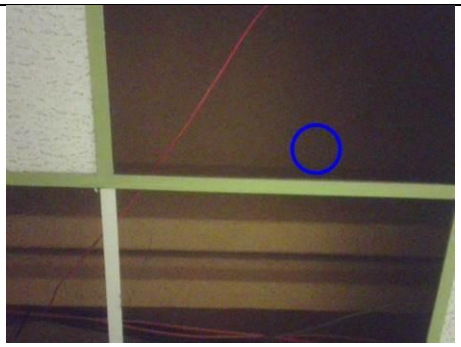


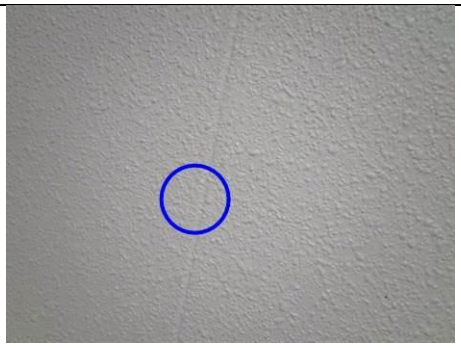
Planche (croquis) de repérage technique : Toiture 2

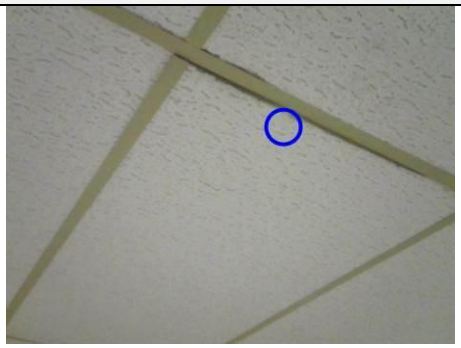
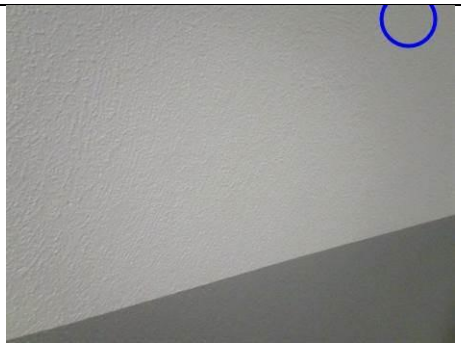
DIAGOBAH, auteur : M VEGEZZI Thibault
Dossier n° 26LGU0145 du 30/04/2026
Adresse du bien : CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ

7.2 Annexe : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

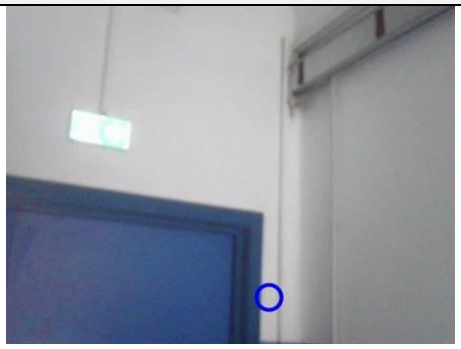
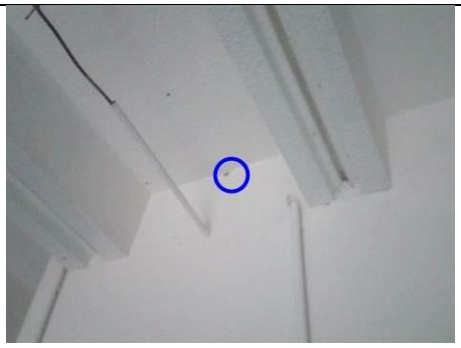
Rouge = Positif ; Vert = Négatif

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P001	Rez-de-Chaussée - Pièce 27	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	
P002	Rez-de-Chaussée - Pièce 27	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	
P003	Rez-de-Chaussée - Pièce 27	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
P004	Rez-de-Chaussée - Pièce 27	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P005	Rez-de-Chaussée - Circulation 8	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	
P006	Rez-de-Chaussée - Circulation 8	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	
P007	Rez-de-Chaussée - Pièce 25	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	
P008	Rez-de-Chaussée - Pièce 25	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P009	Rez-de-Chaussée - Circulation 7	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	
P010	Rez-de-Chaussée - Circulation 7	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	
P011	Rez-de-Chaussée - Circulation 7	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	
P012	Rez-de-Chaussée - Pièce 22	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P013	Rez-de-Chaussée - Pièce 22	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P014	Rez-de-Chaussée - Pièce 19	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	
P015	Rez-de-Chaussée - Pièce 19	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P016	Rez-de-Chaussée - Pièce 19	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P017	Rez-de-Chaussée - Pièce 19	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	
P018	Rez-de-Chaussée - Pièce 19	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	
P019	Rez-de-Chaussée - Pièce 18	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	
P020	Rez-de-Chaussée - Pièce 18	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	

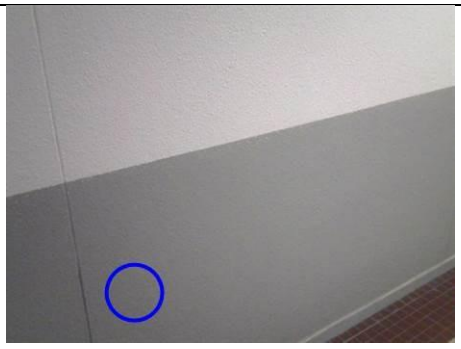
N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P021	Rez-de-Chaussée - Pièce 17	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	
P022	Rez-de-Chaussée - Pièce 25	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic	
P023	Rez-de-Chaussée - Pièce 24	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	
P024	Rez-de-Chaussée - Pièce 13	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	

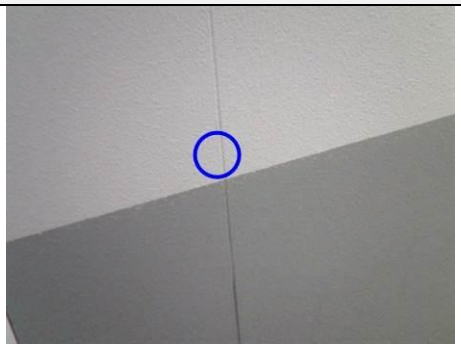
N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P025	Rez-de-Chaussée - Pièce 13	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P026	Rez-de-Chaussée - Pièce 13	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	
P027	Rez-de-Chaussée - Pièce 13	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
P028	Rez-de-Chaussée - Pièce 22	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de caisson de volets	

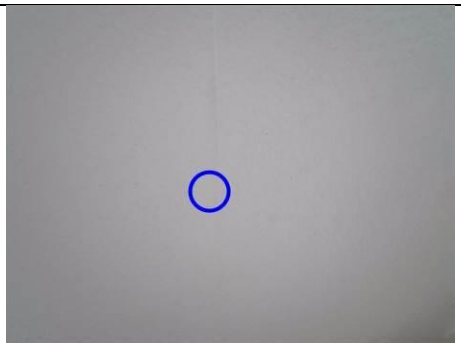
N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P029	Rez-de-Chaussée - Pièce 15	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	
P030	Rez-de-Chaussée - Pièce 15	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	
P031	Rez-de-Chaussée - Pièce 15	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	
P032	Rez-de-Chaussée - Circulation 6	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	

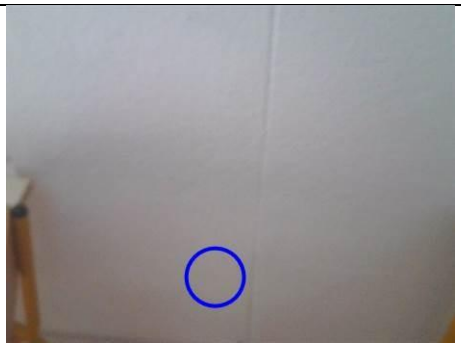
N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P033	Rez-de-Chaussée - Circulation 6	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	 
P034	Rez-de-Chaussée - Circulation 6	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	
P035	Rez-de-Chaussée - Atelier	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P036	Rez-de-Chaussée - Atelier	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	
P037	Rez-de-Chaussée - Atelier	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
P038	Rez-de-Chaussée - Atelier	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint d'assemblage	
P039	Rez-de-Chaussée - Atelier	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint d'assemblage	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P040	R+1 - Pièce 68	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	
P041	R+1 - Pièce 68	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	
P042	Rez-de-Chaussée - Pièce 22	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	
P043	R+1 - Circulation 13	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P044	R+1 - Circulation 13	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	
P045	R+1 - Pièce 65	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	mastic partie basse	
P046	R+1 - Pièce 64	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	
P047	R+1 - Pièce 62	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic	

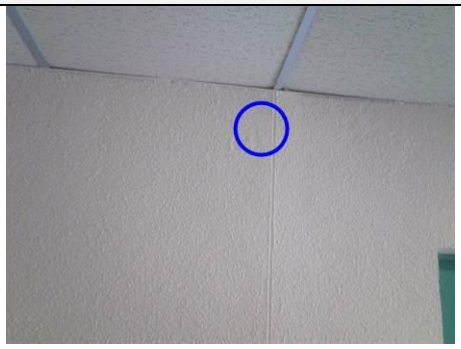
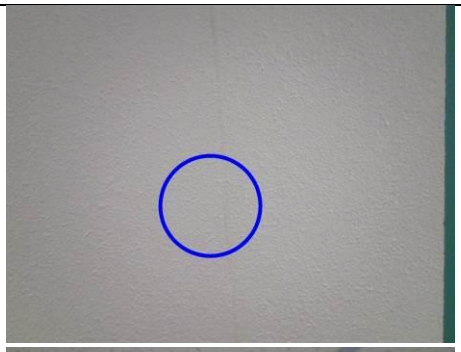
N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P048	R+1 - Pièce 62	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de caisson de volets	
P049	R+1 - Pièce 61	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	
P050	R+1 - Pièce 61	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	
P051	R+1 - Pièce 51	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	mastic partie basse	

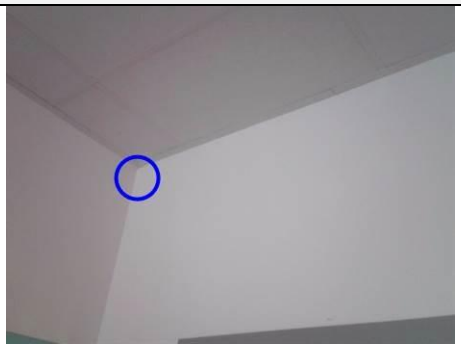
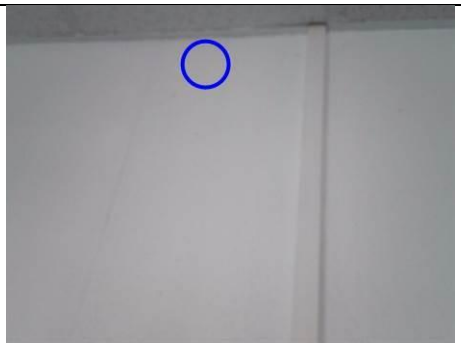
N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P052	R+1 - Pièce 51	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	
P053	R+1 - Pièce 51	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de caisson de volets	
P054	R+1 - Pièce 54	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	
P055	R+1 - Pièce 56	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P056	R+1 - Pièce 53	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic	
P057	R+1 - Pièce 52	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	
P058	R+1 - Pièce 52	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P059	R+1 - Circulation 13	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	

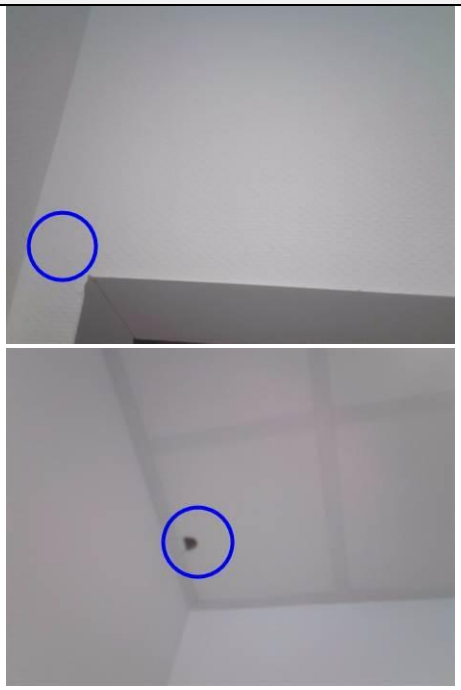
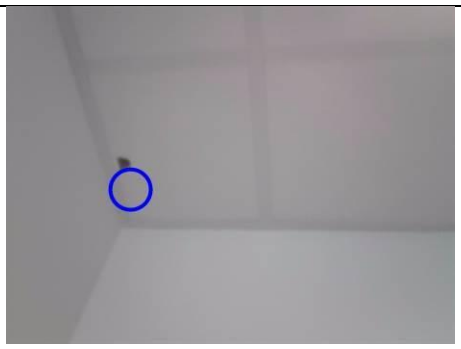
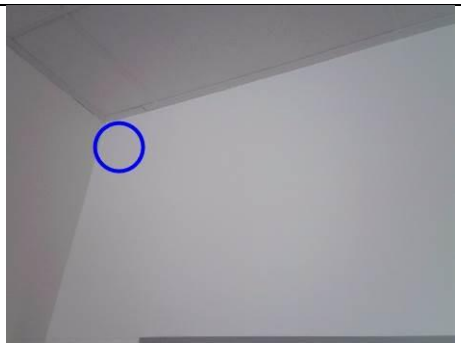
N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P060	R+1 - Pièce 61	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	
P061	R+1 - Pièce 65	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	
P062	R+1 - Circulation 14	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	
P063	R+1 - Pièce 56	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P064	R+1 - Pièce 56	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P065	R+1 - Pièce 51	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	
P066	R+1 - Pièce 64	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	
P067	R+2 - Circulation 19	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	

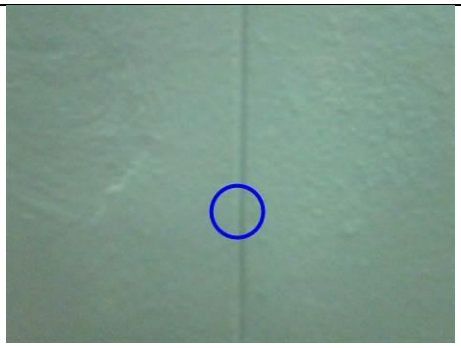
N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P068	R+2 - Circulation 19	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	
P069	R+2 - Circulation 18	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	 
P070	R+2 - Circulation 18	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	

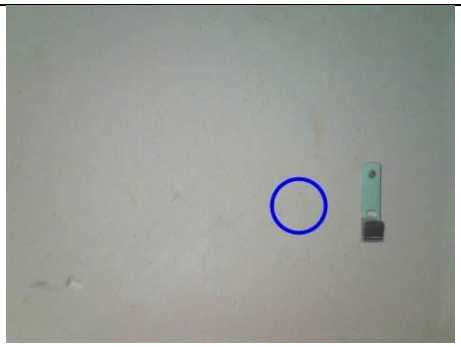
N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P071	R+3 - Dégagement 4	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	
P072	R+3 - Dégagement 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	
P073	R+3 - Dégagement 4	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	
P074	R+2 - Pièce 70	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	

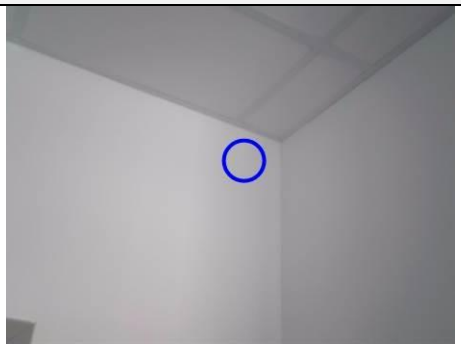
N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P075	R+2 - Pièce 70	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	
P076	R+2 - Pièce 72	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	
P077	R+2 - Pièce 73	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	
P078	R+2 - Dégagement 3	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P079	R+2 - Dégagement 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	
P080	R+2 - Dégagement 3	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	
P081	R+3 - Dégagement 5	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P082	R+3 - Dégagement 5	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	
P083	R+3 - Dégagement 5	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	
P084	R+3 - Pièce 77	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	
P085	R+3 - Pièce 77	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P086	R+3 - Circulation 20	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	
P087	R+3 - Circulation 20	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	
P088	R+3 - Circulation 21	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	
P089	R+3 - Circulation 21	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint de dilatation	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P090	R+3 - Pièce 84	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	
P091	R+3 - Pièce 84	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	
P092	R+3 - Local Technique 13	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	
P093	R+3 - Local Technique 13	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P094	R+3 - Dégagement 6	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	
P095	R+3 - Dégagement 6	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	
P096	R+3 - Dégagement 6	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment projeté	
P097	Rez-de-Chaussée - Circulation 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P098	Rez-de-Chaussée - Circulation 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment projeté	
P099	Rez-de-Chaussée - Circulation 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
P100	R+1 - Circulation 11	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	
P101	R+1 - Circulation 11	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre projeté	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P102	Extérieur - Toiture 1	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	
P103	Extérieur - Toiture 1	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments sous toiture	Pare-vapeur	
P104	Extérieur - Toiture 1	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Produit d'accrochage	
P105	Extérieur - Toiture 1	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P106	Extérieur - Toiture 1	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments sous toiture	Pare-vapeur	
P107	Extérieur - Toiture 1	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Produit d'accrochage	
P108	Toiture 2	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	
P109	Toiture 2	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : pare vapeur	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P110	Toiture 2	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Produit d'accrochage	
P111	Toiture 2	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	
P112	Toiture 2	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : pare vapeur	
P113	Toiture 2	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Produit d'accrochage	

7.3 Annexe : RAPPORT D'ESSAIS

Copie des rapports d'essais :

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D' ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-5070 EN DATE DU 22/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : DIAGOBAH ALSACE 1 Rue René Laennec 67300 Schiltigheim	Réf. Commande ITGA : IT0326-5070 Réf. Commande Client : 26LGU0145_2026_04_14_1130_3517

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 16/04/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18958	
Réf échantillon client : P001 - Enduit a base de platre projete - Rez-de-Chaussee - Piece 27		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJO (4)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18959	
Réf échantillon client : P002 - Panneaux et plaques - Rez-de-Chaussee - Piece 27		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières	
1 Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières (1)	MOLP + META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HNT (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 1/18

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-5070 EN DATE DU 22/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18960	
Réf échantillon client : P003 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Rez-de-Chaussee - Piece 27		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMX (4)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18961	
Réf échantillon client : P004 - Enduit a base de platre projete - Rez-de-Chaussee - Piece 27		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (4)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18962	
Réf échantillon client : P005 - Enduit a base de ciment projete - Rez-de-Chaussee - Circulation 8		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (4)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18963	
Réf échantillon client : P006 - Joint de dilatation - Rez-de-Chaussee - Circulation 8		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
1 ▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (5)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18964	
Réf échantillon client : P007 - Enduit de jointoiement des plaques de platre - Rez-de-Chaussee - Piece 25		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (3) Analyste : NME (4)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18965	
Réf échantillon client : P008 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez-de-Chaussee - Piece 25		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-5070 EN DATE DU 22/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18966	
Réf échantillon client : P009 - Panneaux et plaques - Rez-de-Chaussee - Circulation 7		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières	
1 ▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières (1)	MOLP + META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (5)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18967	
Réf échantillon client : P010 - Enduit a base de ciment projete - Rez-de-Chaussee - Circulation 7		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (4)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18968	
Réf échantillon client : P011 - Joint de dilatation - Rez-de-Chaussee - Circulation 7		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
1 ▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (5)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18969	
Réf échantillon client : P012 - Enduit de jointoiement des plaques de platre - Rez-de-Chaussee - Piece 22		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FJM (4)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18970	
Réf échantillon client : P013 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez-de-Chaussee - Piece 22		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (4)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18971	
Réf échantillon client : P014 - Enduit de jointoiement des plaques de platre - Rez-de-Chaussee - Piece 19		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DIAGOBAH
1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM | Tél : 03 67 97 45 50
4 rue du Bois de la Champelle - 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY | Tél : 03 54 51 58 51
RCS Nancy : 884 296 856 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10825380704

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-5070 EN DATE DU 22/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18972	
Réf échantillon client : P015 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez-de-Chaussee - Piece 19		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJO (4)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18973	
Réf échantillon client : P016 - Enduit a base de ciment projete - Rez-de-Chaussee - Piece 19		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJO (4)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18974	
Réf échantillon client : P017 - Enduit a base de ciment projete - Rez-de-Chaussee - Piece 19		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJO (4)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18975	
Réf échantillon client : P018 - Enduit de jointoiement des plaques de platre - Rez-de-Chaussee - Piece 19		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJO (4)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18976	
Réf échantillon client : P019 - Enduit de jointoiement des plaques de platre - Rez-de-Chaussee - Piece 18		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJO (4)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18977	
Réf échantillon client : P020 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez-de-Chaussee - Piece 18		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMX (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DIAGOBAH
1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM | Tél : 03 67 97 45 50
4 rue du Bois de la Champelle - 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY | Tél : 03 54 51 58 51
RCS Nancy : 884 296 856 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10825380704

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-5070 EN DATE DU 22/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18978	
Réf échantillon client : P021 - Enduit a base de ciment projete - Rez-de-Chaussee - Piece 17		Description ITGA : Peinture / Enduit compact beige en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact beige en vrac (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMX (4)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18979	
Réf échantillon client : P022 - Joint de mastic de fenetre - Rez-de-Chaussee - Piece 25		Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc avec poussières	
1 ▸ Peinture non séparable + Matériau souple blanc avec poussières (1)	META (B) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BPH (5)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18980	
Réf échantillon client : P023 - Enduit a base de ciment projete - Rez-de-Chaussee - Piece 24		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJO (4)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18981	
Réf échantillon client : P024 - Enduit de jointoiement des plaques de platre - Rez-de-Chaussee - Piece 13		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
1 ▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJO (5)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18982	
Réf échantillon client : P025 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez-de-Chaussee - Piece 13		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (4)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18983	
Réf échantillon client : P026 - Enduit a base de ciment projete - Rez-de-Chaussee - Piece 13		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-5070 EN DATE DU 22/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18984	
Réf échantillon client : P027 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Rez-de-Chaussee - Piece 13		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMX (4)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18985	
Réf échantillon client : P028 - Joint de mastic de coffre volet - Rez-de-Chaussee - Piece 22		Description ITGA : Peinture / Matériau mou beige avec poussières	
1 ▸ Peinture non séparable + Matériau mou beige avec poussières (1)	META (B) le 21/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ETW (5)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18986	
Réf échantillon client : P029 - Bandes calicot - Rez-de-Chaussee - Piece 15		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (5)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18987	
Réf échantillon client : P030 - Colle de carrelage - Rez-de-Chaussee - Piece 15		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
1 ▸ Colle grise	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18988	
Réf échantillon client : P031 - Ragreage - Rez-de-Chaussee - Piece 15		Description ITGA : Ragréage gris	
1 ▸ Ragréage gris	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18989	
Réf échantillon client : P032 - Enduit a base de ciment projete - Rez-de-Chaussee - Circulation 6		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-5070 EN DATE DU 22/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18990	
Réf échantillon client : P033 - Bandes calicot - Rez-de-Chaussee - Circulation 6		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (5)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18991	
Réf échantillon client : P034 - Enduit a base de ciment projete - Rez-de-Chaussee - Circulation 6		Description ITGA : Peinture / Enduit compact marron en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact marron en vrac (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (4)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18992	
Réf échantillon client : P035 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Rez-de-Chaussee - Atelier		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMX (4)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18993	
Réf échantillon client : P036 - Ragreage - Rez-de-Chaussee - Atelier		Description ITGA : Ragréage gris	
1 ▸ Ragréage gris	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18994	
Réf échantillon client : P037 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Rez-de-Chaussee - Atelier		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BPH (4)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18995	
Réf échantillon client : P038 - Joint d'assemblage - Rez-de-Chaussee - Atelier		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
1 ▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-5070 EN DATE DU 22/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18996	
Réf échantillon client : P039 - Joint d'assemblage - Rez-de-Chaussee - Atelier		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
1 ▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HNT (5)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18997	
Réf échantillon client : P040 - Bandes calicot - R+1 - Piece 68		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
1 ▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMX (5)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18998	
Réf échantillon client : P041 - Enduit a base de ciment projete - R+1 - Piece 68		Description ITGA : Peinture / Enduit compact beige en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact beige en vrac (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMX (4)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-18999	
Réf échantillon client : P042 - Joint d'etancheite entre menuiserie et structure - Rez-de-Chaussee - Piece 22		Description ITGA : Matériau compact beige et gris en vrac	
1 ▸ Matériau compact beige et gris en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : DMX (4)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19000	
Réf échantillon client : P043 - Enduit a base de ciment projete - R+1 - Circulation 13		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMX (4)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19001	
Réf échantillon client : P044 - Joint de dilatation - R+1 - Circulation 13		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
1 ▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMX (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-5070 EN DATE DU 22/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19002	
Réf échantillon client : P045 - mastic partie basse - R+1 - Piece 65		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
1 ▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMX (5)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19003	
Réf échantillon client : P046 - Joint d'etancheite entre menuiserie et structure - R+1 - Piece 64		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
1 ▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NME (5)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19004	
Réf échantillon client : P047 - Joint de mastic - R+1 - Piece 62		Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc avec poussières	
1 ▸ Peinture non séparable + Matériau souple blanc avec poussières (1)	META (B) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : HNT (5)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19005	
Réf échantillon client : P048 - Joint de mastic de caisson de volets - R+1 - Piece 62		Description ITGA : Peinture / Matériau mou beige	
1 ▸ Peinture non séparable + Matériau mou beige (1)	META (B) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AJO (5)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19006	
Réf échantillon client : P049 - Enduit a base de ciment projete - R+1 - Piece 61		Description ITGA : Peinture / Enduit compact beige en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact beige en vrac (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMX (4)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19007	
Réf échantillon client : P050 - Joint de dilatation - R+1 - Piece 61		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
1 ▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMX (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-5070 EN DATE DU 22/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19008	
Réf échantillon client : P051 - mastic partie basse - R+1 - Piece 51		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
1 ▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMX (5)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19009	
Réf échantillon client : P052 - Joint d'etancheite entre menuiserie et structure - R+1 - Piece 51		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige en vrac (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMX (4)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19010	
Réf échantillon client : P053 - Joint de mastic de caisson de volets - R+1 - Piece 51		Description ITGA : Peinture / Matériau mou beige	
1 ▸ Peinture non séparable + Matériau mou beige (1)	META (B) le 21/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ETW (5)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19011	
Réf échantillon client : P054 - Enduit a base de ciment projete - R+1 - Piece 54		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMX (4)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19012	
Réf échantillon client : P055 - Joint de dilatation - R+1 - Piece 56		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
1 ▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris (1)	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMX (5)
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19013	
Réf échantillon client : P056 - Joint de mastic - R+1 - Piece 53		Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc avec poussières	
1 ▸ Peinture non séparable + Matériau souple blanc avec poussières (2)	META (B) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AJO (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-5070 EN DATE DU 22/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19014	
Réf échantillon client : P057 - Enduit de jointoiement des plaques de platre - R+1 - Piece 52		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SGR
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19015	
Réf échantillon client : P058 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+1 - Piece 52		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SGR
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19016	
Réf échantillon client : P059 - Panneaux et plaques - R+1 - Circulation 13		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières	
1 ▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19017	
Réf échantillon client : P060 - Enduit a base de ciment projete - R+1 - Piece 61		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : DMX
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19018	
Réf échantillon client : P061 - Enduit a base de ciment projete - R+1 - Piece 65		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : DMX
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19019	
Réf échantillon client : P062 - Panneaux et plaques - R+1 - Circulation 14		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières	
1 ▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-5070 EN DATE DU 22/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19020	
Réf échantillon client : P063 - Enduit de jointoiement des plaques de platre - R+1 - Piece 56		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SGR
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19021	
Réf échantillon client : P064 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+1 - Piece 56		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : DMX
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19022	
Réf échantillon client : P065 - Enduit a base de ciment projete - R+1 - Piece 51		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19023	
Réf échantillon client : P066 - Enduit a base de ciment projete - R+1 - Piece 64		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19024	
Réf échantillon client : P067 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - R+2 - Circulation 19		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19025	
Réf échantillon client : P068 - Joint de dilatation - R+2 - Circulation 19		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
1 ▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-5070 EN DATE DU 22/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19026	
Réf échantillon client : P069 - Joint de dilatation - R+2 - Circulation 18		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19027	
Réf échantillon client : P070 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - R+2 - Circulation 18		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19028	
Réf échantillon client : P071 - Bandes calicot - R+3 - Degagement 4		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19029	
Réf échantillon client : P072 - Enduit a base de ciment projete - R+3 - Degagement 4		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : NME
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19030	
Réf échantillon client : P073 - Enduit a base de ciment projete - R+3 - Degagement 4		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : DMX
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19031	
Réf échantillon client : P074 - Enduit a base de ciment projete - R+2 - Piece 70		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LCN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-5070 EN DATE DU 22/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19032	
Réf échantillon client : P075 - Enduit a base de ciment projete - R+2 - Piece 70		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MJO
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19033	
Réf échantillon client : P076 - Enduit a base de ciment projete - R+2 - Piece 72		Description ITGA : Peinture / Enduit compact marron en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact marron en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : NME
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19034	
Réf échantillon client : P077 - Enduit a base de ciment projete - R+2 - Piece 73		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19035	
Réf échantillon client : P078 - Bandes calicot - R+2 - Degagement 3		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19036	
Réf échantillon client : P079 - Enduit a base de ciment projete - R+2 - Degagement 3		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SGR
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19037	
Réf échantillon client : P080 - Enduit a base de ciment projete - R+2 - Degagement 3		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : DMX

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-5070 EN DATE DU 22/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19038	
Réf échantillon client : P081 - Bandes calicot - R+3 - Degagement 5		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : DMX
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19039	
Réf échantillon client : P082 - Enduit a base de ciment projete - R+3 - Degagement 5		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SGR
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19040	
Réf échantillon client : P083 - Enduit a base de ciment projete - R+3 - Degagement 5		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MJO
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19041	
Réf échantillon client : P084 - Enduit a base de ciment projete - R+3 - Rece 77		Description ITGA : Peinture / Enduit compact marron en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact marron en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : DMX
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19042	
Réf échantillon client : P085 - Enduit a base de ciment projete - R+3 - Rece 77		Description ITGA : Peinture / Enduit compact beige en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact beige en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19043	
Réf échantillon client : P086 - Enduit a base de ciment projete - R+3 - Circulation 20		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MJO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-5070 EN DATE DU 22/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19044	
Réf échantillon client : P087 - Joint de dilatation - R+3 - Circulation 20		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MJO
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19045	
Réf échantillon client : P088 - Enduit a base de ciment projete - R+3 - Circulation 21		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MJO
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19046	
Réf échantillon client : P089 - Joint de dilatation - R+3 - Circulation 21		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MJO
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19047	
Réf échantillon client : P090 - Enduit a base de ciment projete - R+3 - Piece 84		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : DMX
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19048	
Réf échantillon client : P091 - Enduit a base de ciment projete - R+3 - Piece 84		Description ITGA : Peinture / Enduit compact beige en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact beige en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MJO
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19049	
Réf échantillon client : P092 - Enduit de jointoiement des plaques de platre - R+3 - Local Technique 13		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : DMX

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-5070 EN DATE DU 22/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France Réf échantillon client : P093 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+3 - Local Technique 13		Réf échantillon ITGA : IT022604-19050 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : DMX
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France Réf échantillon client : P094 - Bandes calicot - R+3 - Degagement 6		Réf échantillon ITGA : IT022604-19051 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
1 ▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : DMX
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France Réf échantillon client : P095 - Enduit a base de ciment projete - R+3 - Degagement 6		Réf échantillon ITGA : IT022604-19052 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BPH
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France Réf échantillon client : P096 - Enduit a base de ciment projete - R+3 - Degagement 6		Réf échantillon ITGA : IT022604-19053 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France Réf échantillon client : P097 - Enduit a base de ciment projete - Rez-de-Chaussee - Circulation 2		Réf échantillon ITGA : IT022604-19054 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : DMX
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France Réf échantillon client : P098 - Enduit a base de ciment projete - Rez-de-Chaussee - Circulation 2		Réf échantillon ITGA : IT022604-19055 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-5070 EN DATE DU 22/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19056	
Réf échantillon client : P099 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Rez-de-Chaussee - Circulation 2		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19057	
Réf échantillon client : P100 - Enduit a base de platre projete - R+1 - Circulation 11		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 26LGU0145 - CAMPUS DE SAULCY GMP 57000 METZ France		Réf échantillon ITGA : IT022604-19058	
Réf échantillon client : P101 - Enduit a base de platre projete - R+1 - Circulation 11		Description ITGA : Peinture / Enduit compact beige en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact beige en vrac	META (A) le 22/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

1.accréditation n° 1-5971

Validé par : Yolann DE CAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

7.4 Annexe
ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

GRILLES D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX OU PRODUIT DE LA LISTE A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

FORT	*MOYEN*	*FAIBLE*
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

FORT	*MOYEN*	*FAIBLE*
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

GRILLES D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX OU PRODUIT DE LA LISTE B

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	*Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation*	*Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation*
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entrainer à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entrainer à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entrainer rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :
- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc…) selon que les risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc…

7.5 Annexe
CONSÉQUENCES RÉGLEMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS

CONSÉQUENCES RÉGLEMENTAIRES SUIVANT L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX OU PRODUIT DE LA LISTE A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :
Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.
Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.
Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.
Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :
I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.
II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

DÉTAIL DES PRÉCONISATIONS SUIVANT L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX OU PRODUIT DE LA LISTE B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.
Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.6 Annexe
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

3. INTERVENTION DE PROFESSIONNELS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

4. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SECURITÉ

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
- *perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;*
- *remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;*
- *travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.*

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

5. GESTION DES DÉCHETS CONTENANT DE L'AMIANTE

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- *de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;*
- *du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux;*
- *de la mairie ;*
- *ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.*

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.7 Annexe : AUTRES DOCUMENTS



LCP CERTIFICATION DE PERSONNES

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°1495

Monsieur VEGEZZI Thibault

Amiante sans mention Selon arrêté du 24 Décembre 2021	**Amiante** Date d'effet : 26/04/2023 : - Date d'expiration : 25/04/2030
Amiante avec mention Selon arrêté du 24 Décembre 2021	**Missions spécifiques, bâtiments complexes** Date d'effet : 26/04/2023 : - Date d'expiration : 25/04/2030
DPE individuel Selon arrêté du 24 Décembre 2021	**Diagnostic de performances énergétique** Date d'effet : 26/04/2023 : - Date d'expiration : 25/04/2030
Electricité Selon arrêté du 24 Décembre 2021	**Etat de l'installation intérieure électricité** Date d'effet : 17/03/2023 : - Date d'expiration : 16/03/2030
Gaz Selon arrêté du 24 Décembre 2021	**Etat de l'installation intérieure gaz** Date d'effet : 17/03/2023 : - Date d'expiration : 16/03/2030
Plomb sans mention Selon arrêté du 24 Décembre 2021	**Constat du risque d'exposition au plomb** Date d'effet : 17/03/2023 : - Date d'expiration : 16/03/2030

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 26/04/2023, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – 33600 PESSAC
Salles d'examens : 71/73, rue Desnouettes – 75015 PARIS
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15000€ - SIRET : 80914919800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 – Code APE : 7022 Z
Enp487@ LE CERTIFICAT V011 du 10-01-2022

Accréditation N° 4-0590 Portée disponible sur www.cofrac.fr



Dominique ROSANO
Agent Général AXA
59, avenue Clemenceau
57100 THIONVILLE
Tel : 03 82 53 58 11
Fax : 03 82 53 58 02
N° ORIAS : 14 005 882

ATTESTATION D'ASSURANCE
CONTRAT N° 10825380704

Je, soussigné Dominique ROSANO, Agent Général AXA FRANCE, dont le siège est 313 Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE Cedex,

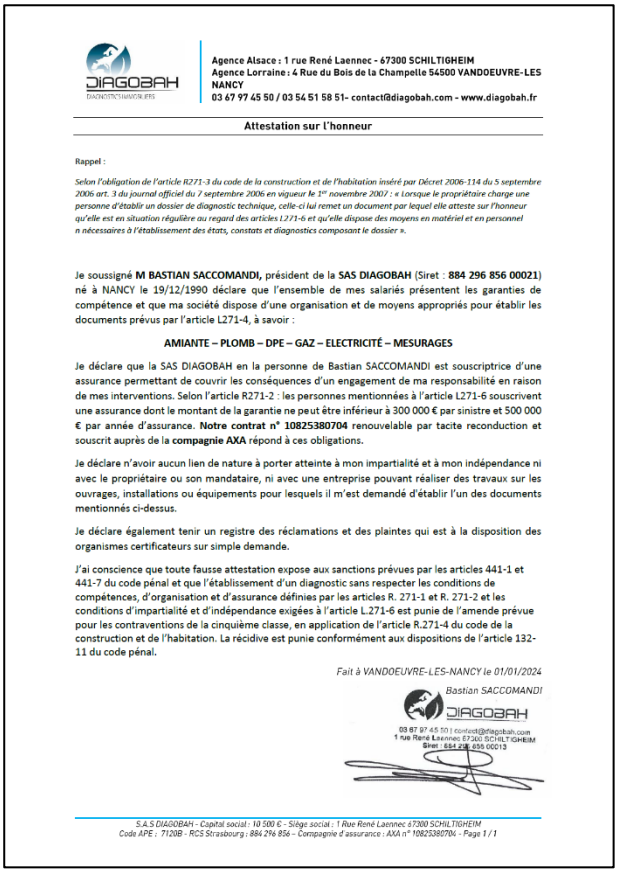
Atteste par la présente que la SAS DIAGOBAH est titulaire auprès de notre agence d'une police « Responsabilité Civile » n°**10825380704** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'elle pourrait encourir dans l'exercice de ses activités :

Diagnostic de Performance énergétique collectif (DPE)
Audit Energétique (AE)
Diagnostic Technique Amiante (DTA) (avant-vente, avant-location, avant-travaux et démolition)
Contrôle visuel après travaux de désamiantage
Diagnostic Plomb (CREP, DRIPP, avant travaux et démolition, plomb dans l'eau)
Etat d'installation intérieure Electricité
Etat d'installation intérieure Gaz
Diagnostic technique Global
Diagnostic gestion des déchets issues de la démolition

Cette attestation est valable du 01/07/2025 au 30/06/2026 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des assurances ou par le contrat.
Elle ne peut nous engager au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Thionville, le 29/12/2025, pour servir et valoir ce que de droit,

D. ROSANO
Votre agent général



DIAGOBAH DIAGNOSTIC IMMOBILIER

Agence Alsace : 1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM
Agence Lorraine : 4 Rue du Bois de la Champelle 54500 VANDOEUVRE-LES NANCY
03 67 97 45 50 / 03 54 51 58 51- contact@diagobah.com - www.diagobah.fr

Attestation sur l'honneur

Rappel :

Selon l'obligation de l'article R271-3 du code de la construction et de l'habitation inséré par Décret 2006-114 du 5 septembre 2006 art. 3 du journal officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007 : « Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel n nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier ».

Je soussigné **M BASTIAN SACCOMANDI,** président de la **SAS DIAGOBAH** (Siret : **884 296 856 00021**) né à NANCY le 19/12/1990 déclare que l'ensemble de mes salariés présentent les garanties de compétence et que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés pour établir les documents prévus par l'article L271-4, à savoir :

AMIANTE – PLOMB – DPE – GAZ – ELECTRICITÉ – MESURAGES

Je déclare que la SAS DIAGOBAH en la personne de Bastian SACCOMANDI est souscriptrice d'une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions. Selon l'article R271-2 : les personnes mentionnées à l'article L271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance. **Notre contrat n° 10825380704** renouvelable par tacite reconduction et souscrit auprès de la **compagnie AXA** répond à ces obligations.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

Je déclare également tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

J'ai conscience que toute fausse attestation expose aux sanctions prévues par les articles 441-1 et 441-7 du code pénal et que l'établissement d'un diagnostic sans respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L.271-6 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, en application de l'article R.271-4 du code de la construction et de l'habitation. La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

Fait à VANDOEUVRE-LES-NANCY le 01/01/2024

Bastian SACCOMANDI

DIAGOBAH
03 67 97 45 50 | contact@diagobah.com
1 rue René Laennec 67300 SCHILTIGHEIM
Siret : 884 296 856 00013

S.A.S DIAGOBAH - Capital social : 10 500 € - Siège social : 1 Rue René Laennec 67300 SCHILTIGHEIM
Code APE : 7120B - RCS Strasbourg : 884 296 856 – Compagnie d'assurance : AXA n° 10825380704 - Page 1 / 1
