
N°	N° hiérarc	Nom de la tâche	Durée	% achevé	Début	Fin	État	Prédécesse
0	**0**	**Rénovation energétique Chalets**	**335,86 jrs**	**0%**	**Ven 18/09/26**	**Ven 28/12/29**	**Tâche future**	
1								
2	**1**	**1 ÉTUDES**	**39 jrs**	**0%**	**Ven 18/09/26**	**Mer 11/11/26**	**Tâche future**	
3	1.1	1.1 Remise DCE	0 jr	0%	Mar 06/10/26	Mar 06/10/26	Tâche future	
4	1.2	1.2 Début consultations	0 jr	0%	Mer 07/10/26	Mer 07/10/26	Tâche future	
5	1.3	1.3 Consultation	3 sem.	0%	Mer 07/10/26	Mar 27/10/26	Tâche future	4
6	1.4	1.4 Analyse des offres	1 sem.	0%	Mer 28/10/26	Mar 03/11/26	Tâche future	5
7	1.5	1.5 Notification des entreprises	1 sem.	0%	Mer 04/11/26	Mar 10/11/26	Tâche future	6
8								
9	**2**	**2 Travaux**	**384,86 jr**	**0%**	**Lun 20/09/27**	**Ven 28/12/29**	**Tâche future**	
10	2.1	2.1 Réunion de lancement + OS	0 jr	0%	Lun 20/09/27	Lun 20/09/27	Tâche future	7
11	2.2	2.2 Période de préparation	1 m	0%	Lun 20/09/27	Mar 19/10/27	Tâche future	10
12								
13	2.3	2.3 Commande fenêtres -BROULA	6 sem.	0%	Mar 28/09/27	Mar 09/11/27	Tâche future	21DF
14	**2.4**	**2.4 Chalet Broula**	**46 jrs**	**0%**	**Lun 18/10/27**	**Ven 31/12/27**	**Tâche future**	
15	2.4.1	2.4.1 Désamiantage	2 sem.	0%	Lun 18/10/27	Ven 29/10/27	Tâche future	
16	2.4.2	2.4.2 Dépose radiateurs	1 jr	0%	Lun 01/11/27	Lun 01/11/27	Tâche future	15
17	2.4.3	2.4.3 Dépose menuiseries	1 sem.	0%	Mar 02/11/27	Lun 08/11/27	Tâche future	16
18	2.4.4	2.4.4 Dépose electricité	1 jr	0%	Lun 01/11/27	Lun 01/11/27	Tâche future	15
19	2.4.5	2.4.5 Dépose contre cloisons	1 sem.	0%	Mar 02/11/27	Lun 08/11/27	Tâche future	18
20	2.4.6	2.4.6 Dépose plafonds	1 sem.	0%	Mar 09/11/27	Lun 15/11/27	Tâche future	19
21	2.4.7	2.4.7 Pose menuiserie extérieure	1 sem.	0%	Mar 09/11/27	Lun 15/11/27	Tâche future	19
22	2.4.8	2.4.8 Pose doublage	2 sem.	0%	Mar 16/11/27	Lun 29/11/27	Tâche future	21
23	2.4.9	2.4.9 Pose faux plafond isolés	2 sem.	0%	Mar 30/11/27	Lun 13/12/27	Tâche future	22
24	2.4.10	2.4.10 Pose elec	3 jrs	0%	Jeu 09/12/27	Lun 13/12/27	Tâche future	23FF
25	2.4.11	2.4.11 Pose lavabo, douche	1 sem.	0%	Mar 30/11/27	Lun 06/12/27	Tâche future	22
26	2.4.12	2.4.12 Carrelage, Faïence	1 sem.	0%	Mar 07/12/27	Lun 13/12/27	Tâche future	25
27	2.4.13	2.4.13 Pose radiateurs	1 sem.	0%	Mar 30/11/27	Lun 06/12/27	Tâche future	22
28	2.4.14	2.4.14 Finitions - peinture	1 sem.	0%	Mar 07/12/27	Lun 13/12/27	Tâche future	23FF
29	2.4.15	2.4.15 Desinstallation Base-Vie	2 jrs	0%	Mar 14/12/27	Mer 15/12/27	Tâche future	28
30	2.4.16	2.4.16 Remise en état, nettoyage	2 jrs	0%	Mar 14/12/27	Mer 15/12/27	Tâche future	28
31								
32	2.5	2.5 Commande menuiseries - Ceutr	6 sem.	0%	Mar 26/09/28	Mar 07/11/28	Tâche future	40DF
33	**2.6**	**2.6 Chalet Ceutrons**	**55 jrs**	**0%**	**Lun 16/10/28**	**Ven 29/12/28**	**Tâche future**	
34	2.6.1	2.6.1 Désamiantage	2 sem.	0%	Lun 16/10/28	Ven 27/10/28	Tâche future	
35	2.6.2	2.6.2 Dépose radiateurs	1 jr	0%	Lun 30/10/28	Lun 30/10/28	Tâche future	34
36	2.6.3	2.6.3 Dépose menuiseries	1 sem.	0%	Mar 31/10/28	Lun 06/11/28	Tâche future	35
37	2.6.4	2.6.4 Dépose electricité	1 jr	0%	Lun 30/10/28	Lun 30/10/28	Tâche future	34
38	2.6.5	2.6.5 Dépose contre cloisons	1 sem.	0%	Mar 31/10/28	Lun 06/11/28	Tâche future	37
39	2.6.6	2.6.6 Dépose plafonds	1 sem.	0%	Mar 07/11/28	Lun 13/11/28	Tâche future	38
40	2.6.7	2.6.7 Pose menuiserie extérieure	1 sem.	0%	Mar 07/11/28	Lun 13/11/28	Tâche future	36
41	2.6.8	2.6.8 Pose doublage	2 sem.	0%	Mar 14/11/28	Lun 27/11/28	Tâche future	40
42	2.6.9	2.6.9 Pose faux plafond isolés	2 sem.	0%	Mar 28/11/28	Lun 11/12/28	Tâche future	41
43	2.6.10	2.6.10 Pose elec	3 jrs	0%	Jeu 07/12/28	Lun 11/12/28	Tâche future	42FF
44	2.6.11	2.6.11 Pose lavabo, douche	1 sem.	0%	Mar 28/11/28	Lun 04/12/28	Tâche future	41
45	2.6.12	2.6.12 Carrelage, Faïence	1 sem.	0%	Mar 05/12/28	Lun 11/12/28	Tâche future	44
46	2.6.13	2.6.13 Pose radiateurs	1 sem.	0%	Mar 28/11/28	Lun 04/12/28	Tâche future	41
47	2.6.14	2.6.14 Finitions - peinture	1 sem.	0%	Mar 05/12/28	Lun 11/12/28	Tâche future	45FF
48	2.6.15	2.6.15 Desinstallation Base-Vie	2 jrs	0%	Mar 12/12/28	Mer 13/12/28	Tâche future	47
49	2.6.16	2.6.16 Remise en état, nettoyage	2 jrs	0%	Mar 12/12/28	Mer 13/12/28	Tâche future	47
50								
51	2.7	2.7 Commande menuiseries - ECON	6 sem.	0%	Mar 25/09/29	Mar 06/11/29	Tâche future	59DF
52	**2.8**	**2.8 CHALET ECONTRES**	**55 jrs**	**0%**	**Lun 15/10/29**	**Ven 28/12/29**	**Tâche future**	
53	2.8.1	2.8.1 Désamiantage	2 sem.	0%	Lun 15/10/29	Ven 26/10/29	Tâche future	
54	2.8.2	2.8.2 Dépose radiateurs	1 jr	0%	Lun 29/10/29	Lun 29/10/29	Tâche future	53
55	2.8.3	2.8.3 Dépose menuiseries	1 sem.	0%	Mar 30/10/29	Lun 05/11/29	Tâche future	54
56	2.8.4	2.8.4 Dépose electricité	1 jr	0%	Lun 29/10/29	Lun 29/10/29	Tâche future	53
57	2.8.5	2.8.5 Dépose contre cloisons	1 sem.	0%	Mar 30/10/29	Lun 05/11/29	Tâche future	56
58	2.8.6	2.8.6 Dépose plafonds	1 sem.	0%	Mar 06/11/29	Lun 12/11/29	Tâche future	57
59	2.8.7	2.8.7 Pose menuiserie extérieure	1 sem.	0%	Mar 06/11/29	Lun 12/11/29	Tâche future	55
60	2.8.8	2.8.8 Pose doublage	2 sem.	0%	Mar 13/11/29	Lun 26/11/29	Tâche future	59
61	2.8.9	2.8.9 Pose faux plafond isolés	2 sem.	0%	Mar 27/11/29	Lun 10/12/29	Tâche future	60
62	2.8.10	2.8.10 Pose elec	3 jrs	0%	Jeu 06/12/29	Lun 10/12/29	Tâche future	61FF
63	2.8.11	2.8.11 Pose lavabo, douche	1 sem.	0%	Mar 27/11/29	Lun 03/12/29	Tâche future	60
64	2.8.12	2.8.12 Carrelage, Faïence	1 sem.	0%	Mar 04/12/29	Lun 10/12/29	Tâche future	63
65	2.8.13	2.8.13 Pose radiateurs	1 sem.	0%	Mar 27/11/29	Lun 03/12/29	Tâche future	60
66	2.8.14	2.8.14 Finitions - peinture	1 sem.	0%	Mar 04/12/29	Lun 10/12/29	Tâche future	65
67	2.8.15	2.8.15 Desinstallation Base-Vie	2 jrs	0%	Mar 11/12/29	Mer 12/12/29	Tâche future	66
68	2.8.16	2.8.16 Remise en état, nettoyage	2 jrs	0%	Mar 11/12/29	Mer 12/12/29	Tâche future	66

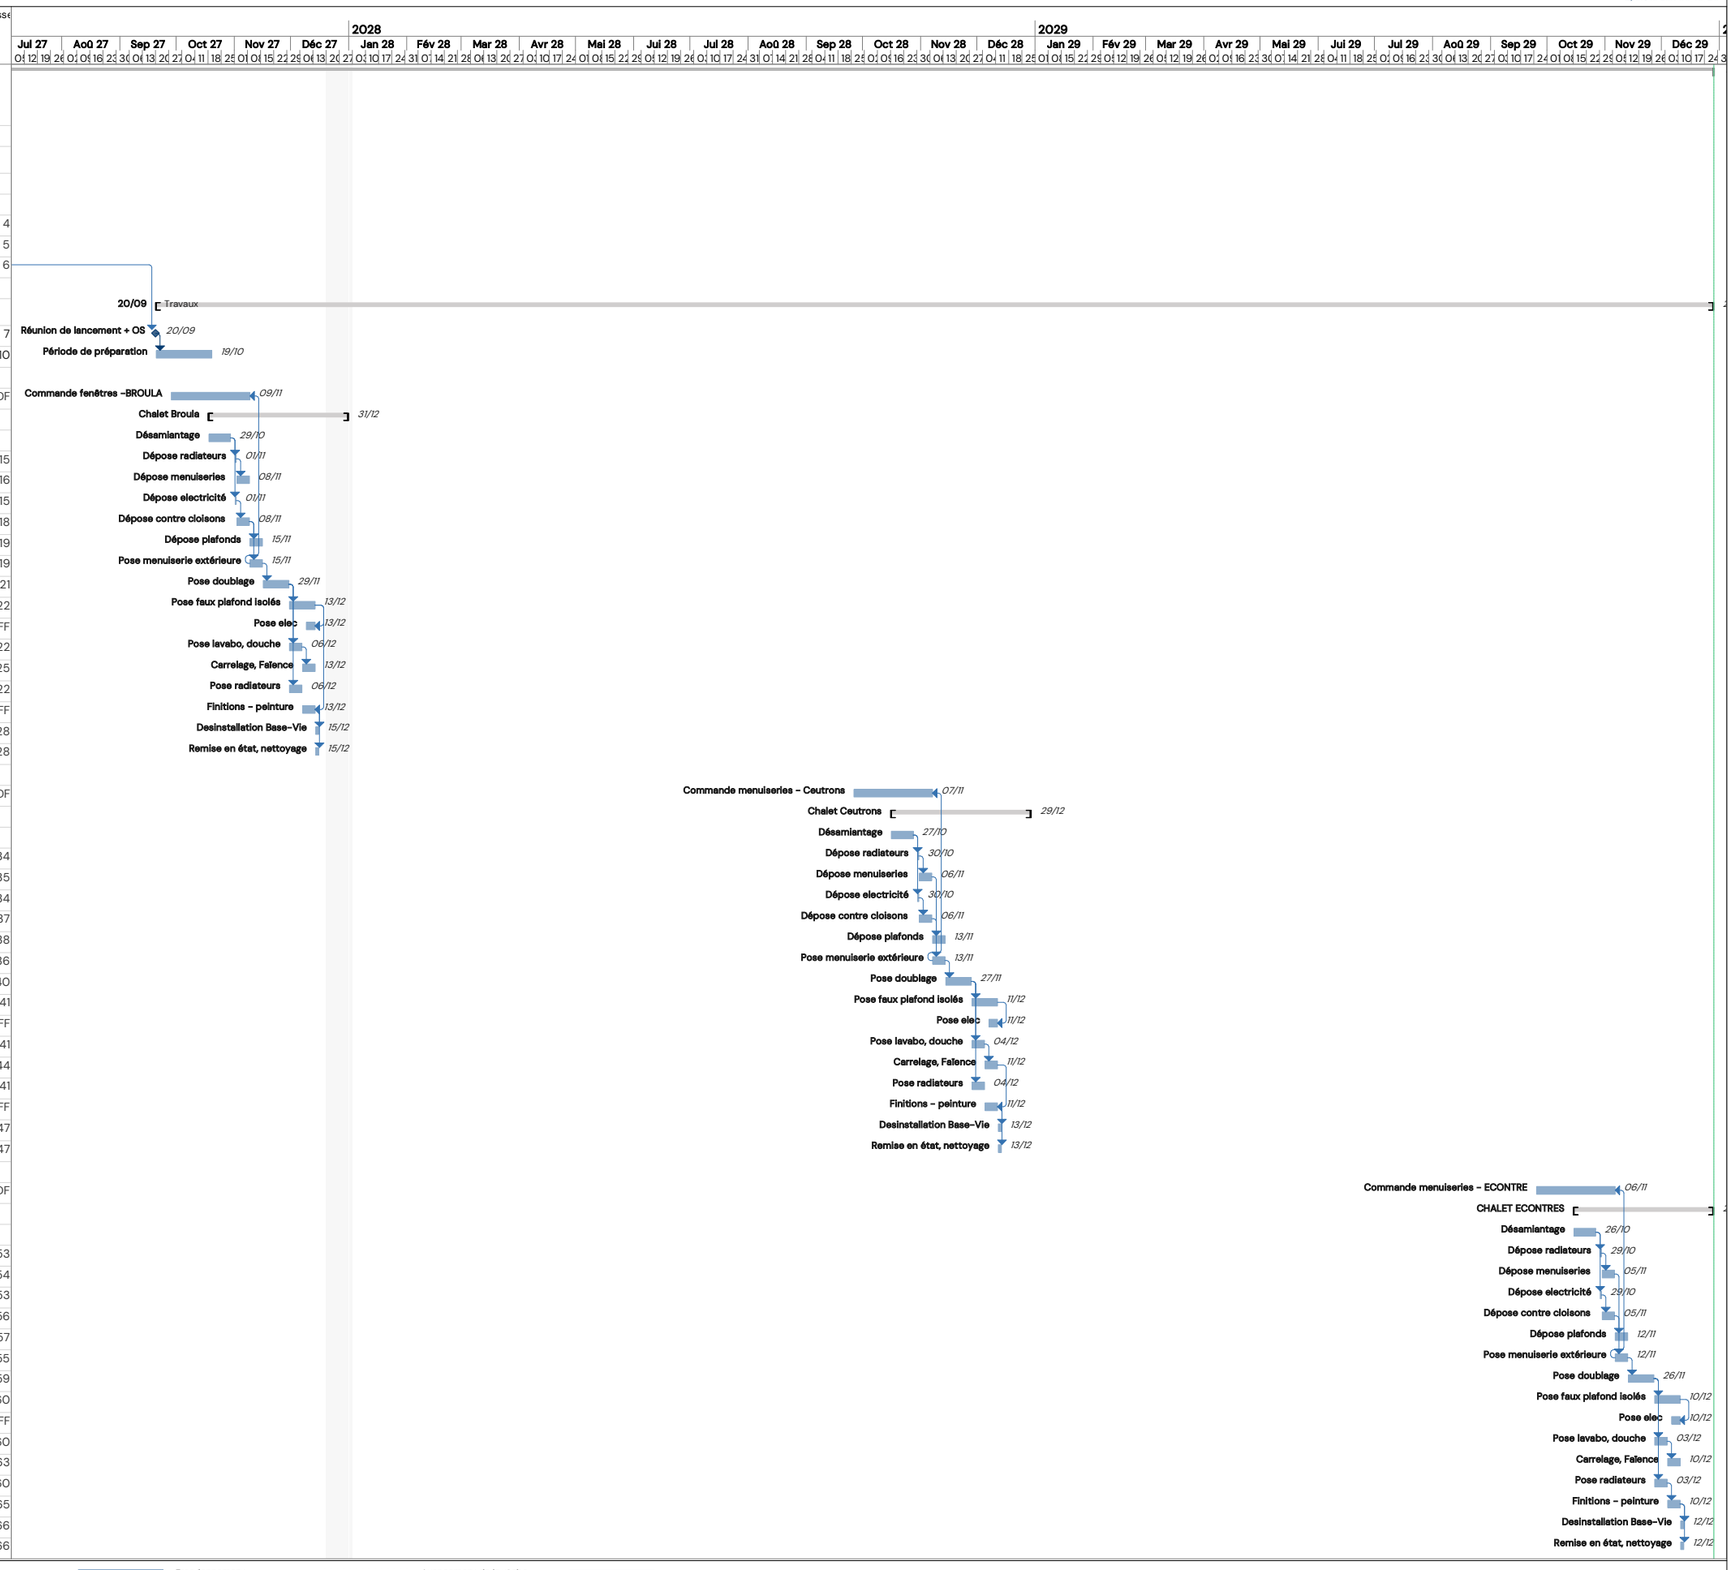

Légende :

Récapitulatif du projet — Avancement récapitulatif — Tâche — Fractionnement — Avancement de la tâche

Récapitulative — Jalon — Critique — Fractionnement critique — Avancement de la tâche critique
